



REVISADO POR: ING. ECHÉ. CASTELLÓ
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Diciembre de 2020.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

49.0 PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGM. CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**49.0 PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN
IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y
PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA,
UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	3 de Julio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 19,248,902.92
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,849,780.58
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	34.46%
Contratista	COMPAÑÍA L&L DESIGN, S.R.L.


SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la instalación de aparatos sanitarios en los baños del 1er y 2do nivel.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA,
UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Torta de piso Salón Parroquial, Iglesia Santa Lucía.

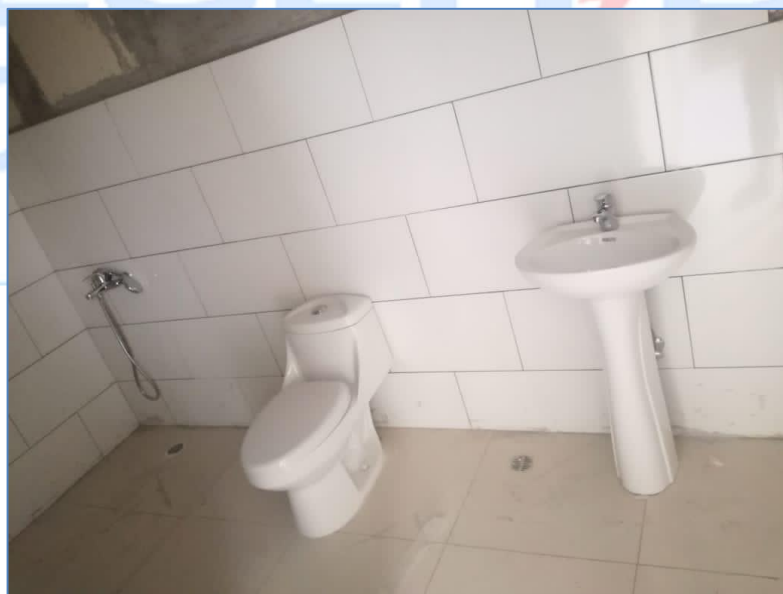

Instalación de aparatos sanitarios en baños, Iglesia Santa Lucía.
