



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO
Diciembre de 2020**



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION PRESA GUAYUBÍN,
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ.**



2

Elaborado por Ing. Sukey Barreras

Líder en Energía Limpia



FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio de Empresas Reunidas de Construcción y Servicios CERCONS-RD. (construcción)	Consorcio ENGECORPS-TYPSA-IECCA (ETI)(supervisión)
Avance General	7%	72.42%,
Monto Original del Proyecto RD\$	2,141,509,601.85	186,715,491.91
Monto Actualizado del Proyecto RD\$	0.00	288,757,245.90
Monto Cubicado a la Fecha RD\$	255,467,802.01	209,115,426.06

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION

Continúa el proceso de elaboración del diseño básico revisado y la Ingeniería de Detalle por parte del diseñador del Contratista para ser sometido a la aprobación por la Supervisión (ETI)-EGEHID. Se le ha autorizado la ejecución de sondeos adicionales en el Dique de Cierre, requeridos para la optimización del diseño básico revisado, se ha actualizado la topografía, se continúa con las excavaciones del estribo derecho e izquierdo de la presa, los accesos provisionales y sus obras de arte, se trabaja en la parte final de las instalaciones de las plantas industriales para su prueba y puesta en operación.

Los trabajos de construcción fueron paralizados mediante Acta de Alguacil del Ministerio de Medio Ambiente en fecha 08/dic/2020, hasta tanto sea aprobada la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto, se sigue trabajando en la ingeniería de detalle para la construcción de las obras objeto de este contrato.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Así mismo se han realizados charlas con diferentes autoridades y representantes comunitarios para la presentación del Proyecto que se ejecuta y los beneficios que presenta en la zona.

Se continua con el proceso de adquisición de los terrenos que serán afectados con la implementación del Proyecto.


SUPERVISION

La Empresa Consultora y de Supervisión, se encuentra en el desarrollo de la Fase II, Supervisión en donde actualmente están en proceso de revisión del diseño básico de los componentes de la obra Presa de Guayubín y la continuación de la revisión de la ingeniería de detalle de los Accesos, y obra de desvío, la aprobación de las instalaciones de campamentos y áreas industriales del Contratista, acompañamiento de las investigaciones de la campaña geotécnica y geofísica adicionales para toma de decisión de optimización del diseño del dique de cierre, control de calidad de los trabajos de excavación que se están ejecutando en los estribos de la Presa, accesos y canal de desvío provisional, revisión y conciliación de las cantidades de obras reportadas por el Contratista en sus cubicaciones mensuales.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

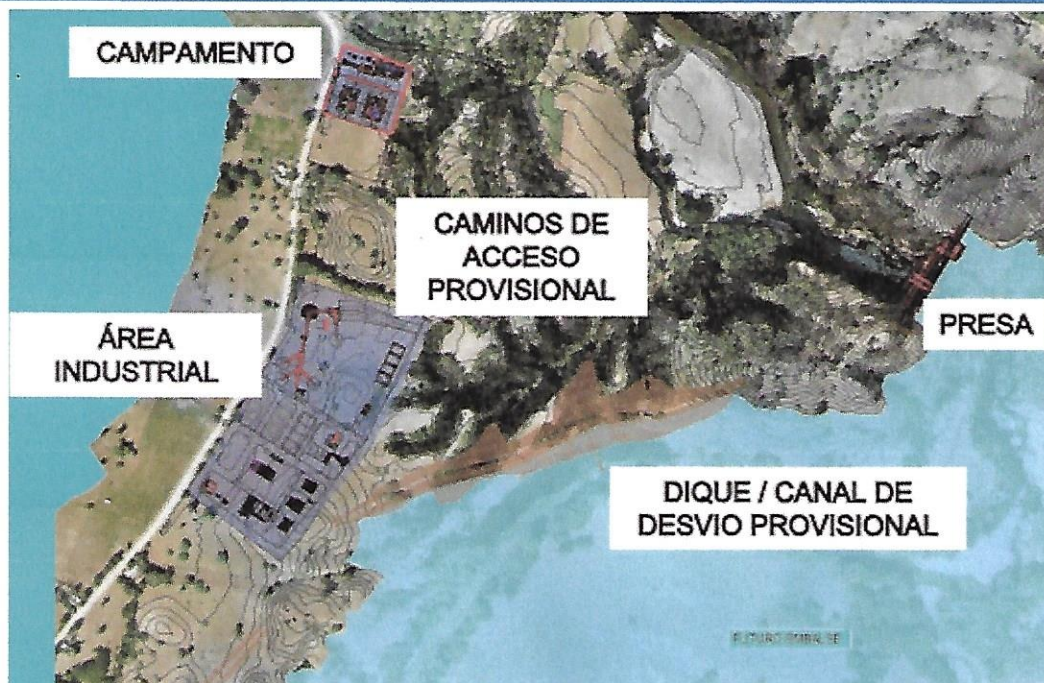

Esquema general de las Instalaciones y obras





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Vistas de Plantas
Industriales



Vista Equipos de Plantas
Industriales





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



Vista Excavación estribo izquierdo y estribo derecho presa

