

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

Informe trimestral

JULIO – SEPTIEMBRE
2025

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

egehid

Contenido

Introducción	3
Dirección De Planificación Y Desarrollo	4
Resumen ejecutivo de las áreas misionales	15
Dirección De Operaciones	15
Dirección De Mantenimiento	18
Dirección De Comercialización	20
Dirección De Desarrollo Hidroeléctrico	21
Dirección De Energía Renovable	23
Dirección De Mantenimiento Y Rehabilitación De Obras Civiles	24
Dirección De Mantenimiento Y Conservación De Infraestructuras	26
Dirección De Proyectos De Obras Civiles	27
Dirección De Tecnología Y Telemática	29
Dirección De Gestión Ambiental	30
Dirección Administrativa	33
Dirección Logística	35
Dirección de Compras y Contrataciones	37
Dirección De Gestión Humana	39
Dirección De Servicios Financieros	41
Contraloría Interna	42
Dirección De Auditoría Interna	44
Dirección Jurídica	45
Dirección De Comunicaciones	47
Gerencia De Bienestar Social	49
Secretaría General	50
Dirección De Seguridad Militar	52
Libre Acceso A La Información	53
Matriz de cumplimiento trimestral POA 2025	55

Introducción

Durante el tercer trimestre del año 2025 (julio–septiembre), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana consolidó importantes avances en el cumplimiento de sus metas operativas, administrativas y estratégicas, reafirmando su compromiso con la eficiencia institucional, la sostenibilidad energética y el desarrollo nacional. Este período se caracterizó por una gestión dinámica, enfocada en garantizar la continuidad operativa de las centrales hidroeléctricas, la ejecución de proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de los procesos internos bajo criterios de transparencia, planificación y mejora continua.

Las acciones desarrolladas durante el trimestre reflejan un esfuerzo articulado entre las distintas áreas de la institución, orientado a optimizar los recursos, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la capacidad técnica y administrativa de la empresa. En el ámbito operativo, se mantuvo un desempeño estable en la generación hidroeléctrica, alcanzando niveles de producción que contribuyeron significativamente al ahorro energético nacional y a la reducción del uso de combustibles fósiles. Paralelamente, se avanzó en la ejecución de obras civiles, proyectos de mantenimiento mayor, iniciativas de energía renovable y programas de sostenibilidad ambiental y social en las zonas de influencia de los proyectos.

En el plano administrativo y de gestión, se fortalecieron los mecanismos de control interno, planificación y seguimiento institucional, promoviendo la eficiencia en los procesos de compras, contrataciones y ejecución presupuestaria. Asimismo, se impulsaron acciones para la recertificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo la norma ISO 9001:2015, y la actualización de los instrumentos de planificación como el Plan Operativo Anual (POA 2025) el cual alcanzó en este trimestre un porcentaje de ejecución de un 97% de sus actividades planificadas entre todas las áreas.

Dirección De Planificación Y Desarrollo

Esta Dirección mantuvo el control con los avances ejecutados en los trimestres anteriores través del trabajo articulado de sus cuatro gerencias. La Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos se mantiene en la la reformulación del Plan Estratégico Institucional 2026–2029, el seguimiento del POA y la elaboración de la Memoria de Gestión 2020– 2024, además de fortalecer la gestión presupuestaria, seguimiento al debido proceso del Plan Anual de Compras y Contrataciones y el registro de proyectos clave en el SNIP. La Gerencia de Calidad de la Gestión reforzó la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de Control Interno, alcanzando altos niveles de cumplimiento normativo, avance en la actualización de la matriz de riesgos y la promoción de una cultura institucional orientada al control y la mejora continua. Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Institucional, participó como representante de la feria del libro y continua en el impulso de la modernización organizativa mediante la actualización de estructuras, el cambio de imagen institucional y el fortalecimiento de la Unidad de Igualdad de Género, así como mejoras en la gestión financiera a través del sistema SAP. Finalmente, la Gerencia de Cooperación Institucional mantuvo vínculos estratégicos con organismos nacionales e internacionales, facilitando la colaboración técnica y el posicionamiento de la empresa en iniciativas de planificación energética y sostenibilidad.

Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Departamento de Planificación Estratégica

Durante el tercer trimestre del año 2025, el Área de Planes Programas y Proyectos (PPP), ha mantenido un ritmo sostenido de trabajo en la ejecución de las actividades correspondientes al Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Anual (POA), y la elaboración de la Memoria Institucional.

En este periodo, se lograron avances significativos en la consolidación de información, coordinación interdepartamental y fortalecimiento de los mecanismos de planificación institucional.

Avances del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029

Durante el periodo julio–septiembre 2025 se avanzó de manera considerable en la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029. En este proceso se realizaron reuniones de trabajo y levantamiento de información con las diferentes áreas, con el propósito de actualizar los ejes estratégicos, objetivos y metas institucionales.

De manera particular, se llevaron a cabo dos reuniones por la plataforma Teams los días 10 y 29 de julio de 2025, orientadas a recopilar información base y coordinar la estructuración del nuevo PEI. Estas sesiones permitieron establecer una visión compartida sobre los lineamientos estratégicos que guiarán el período 2026–2029.

Departamento de Planificación de Compras y Contrataciones

Durante el tercer trimestre del 2025, el Departamento de Planificación de Compras y Contrataciones dio continuidad al seguimiento y validación de los procesos incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), asegurando la eficiencia, transparencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

En este período se analizaron 42 formularios de validación, destacando la Dirección de Mantenimiento con 15 procesos, la Dirección Administrativa con 7, Gestión Humana con 8, Logística con 5, Operaciones con 6, y el Gabinete Social con 1. Del total, cerca del 90% fueron remitidos oportunamente al área de Compras y Contrataciones, reflejando una gestión coordinada entre las direcciones ejecutoras y la unidad planificadora.

Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Presupuesto

El área de Presupuesto dio inicio al proceso de elaboración del anteproyecto del Presupuesto 2026. Con el propósito de asegurar la coherencia y alineación estratégica de las proyecciones presupuestarias, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con

las direcciones y gerencias institucionales. Estas instancias permitieron revisar los lineamientos generales, identificar necesidades y prioridades de cada área, y establecer las bases para la consolidación del anteproyecto 2026, que será presentado en los próximos meses.

Asimismo, se elaboraron los informes mensuales correspondientes al trimestre, los cuales fueron remitidos oportunamente a las áreas involucradas, junto con los hallazgos y recomendaciones derivadas del análisis presupuestario, con el fin de fortalecer la gestión financiera institucional y propiciar una mejora continua en los procesos de planificación y ejecución del gasto. Durante el presente trimestre, el Área de Presupuesto dio inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto del Presupuesto 2026.

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos

Gestión de Registro de Proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Como parte de las funciones de evaluación y gestión de proyectos bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Se presenta el estado actual de los principales proyectos del área energética, así como gestiones institucionales complementarias:

Proyecto de Diagnóstico de las 27 Centrales Hidroeléctricas de la EGEHID Estado actual: Fase de Preinversión. Situación: Sometido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y aprobado para registro en el Sistema de Información del SNIP. Gestión realizada: Evaluación técnica y articulación institucional para su validación conforme a los lineamientos metodológicos del SNIP. Próximo paso: Monitoreo de la ejecución del diagnóstico y uso de resultados para futuras acciones de mejora en la infraestructura hidroeléctrica nacional.

Estudios de Prefactibilidad Técnica y Económica – Proyecto de Acumulación por Hidro-Bombeo Sabaneta (Reservorio Existente), 125 MW

Estado actual: Perfil elaborado, pendiente de revisión. Situación: El perfil se encuentra listo para ser remitido como borrador al MEPyD. Este servirá como modelo base para otros proyectos de hidrobombeo a nivel nacional. Gestión realizada: Coordinación interinstitucional para la formulación del perfil bajo los estándares del SNIP, integrando criterios de sostenibilidad energética y rentabilidad social. Próximo paso: Revisión por parte del MEPyD para su validación e ingreso oficial al sistema.

Proyectos de Parques Solares – Sabana Yegua (Azua) y Sabaneta (San Juan)

Estado actual: Registrados como preinversión en el SNIP. Situación: En proceso de revisión técnica por el MEPyD, con observaciones emitidas a ser integradas próximamente. Gestión realizada: Elaboración y carga de los perfiles al sistema, en línea con las políticas nacionales de energía renovable. Próximo paso: Respuesta a observaciones y sometimiento a la fase de inversión para su ejecución futura.

Proyecto de Hidrobombeo Guaigüí

Estado actual: En fase de formulación. Situación: Se está a la espera de la información técnica clave para elaborar el perfil del proyecto. Gestión realizada: Solicitud formal de datos técnicos a las entidades responsables, como paso previo a su estructuración como proyecto de preinversión. Próximo paso: Elaboración del perfil y su posterior registro en el SNIP.

Gerencia de Calidad de la Gestión

El Área de Calidad de la Gestión, continuó durante el tercer trimestre del año 2025 con las acciones orientadas al fortalecimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con especial énfasis en la preparación institucional para el proceso de recertificación bajo la norma ISO 9001:2015.

Durante este período, se llevaron a cabo visitas técnicas de seguimiento a diversas centrales hidroeléctricas con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de

la Calidad, así como evaluar los avances en la corrección de los hallazgos identificados en auditorías previas.

En el marco de estas visitas, se auditaron los formularios y registros utilizados en las áreas operativas, de presa y administrativas de las diferentes centrales, garantizando así la trazabilidad y el control documental dentro del sistema. Estas actividades permitieron constatar la correcta aplicación de los procedimientos, el uso adecuado de los formatos y la coherencia entre la documentación y las operaciones diarias.

De igual forma, se dio seguimiento a las áreas que forman parte del alcance del Sistema Integrado de Gestión, más allá de las centrales hidroeléctricas. Entre ellas:

Área	Objetivo	Fecha
Central Taveras	Seguimiento para cierre de los hallazgos encontrados en la auditoría externa de indocal	09/09/2025
CCH	Seguimiento a las acciones correctivas para cierre de las conformidades de auditoría externa ISO 9001-2015	15/09/2025
Área de Compras	Seguimientos al cierre de las acciones y verificación de evaluación de proveedores.	17/09/2025

Área	Objetivo	Fecha
Área Jurídica	verificando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables mediante la actualización y control de la matriz legal institucional	19/09/2025

Estas acciones buscan que todas las áreas y centrales se mantengan al día con sus procesos, la documentación y las evidencias requeridas, asegurando así una preparación sólida para el proceso de recertificación ISO 9001:2015.

Cabe resaltar la inclusión de la Central Hidroeléctrica Taveras como central piloto dentro de este proceso, la cual continúa siendo un modelo de referencia en la implementación y consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad, contribuyendo a la estandarización institucional y a la mejora continua de los procesos.

Departamento de gestión de riesgos

Este departamento llevó a cabo las visitas a la diferentes direcciones y gerencias para el monitoreo de la matriz de riesgos, en colaboración con los responsables de cada área. Como resultado, se identificaron un total de 384 riesgos clave, clasificados según su nivel de criticidad de la siguiente manera:

Trimestre	Total, de Riesgos	Bajo	Medio	Alto
3er Trimestre 2025	384	176	81	127

- **Riesgos altos:** Requieren intervención inmediata.
- **Riesgos medios:** Bajo seguimiento y control continuo.
- **Riesgos bajos:** Su monitoreo es periódico.

Visitas técnicas y sensibilización

Durante este trimestre se realizaron visitas técnicas a las centrales hidroeléctricas, en conjunto con el Departamento de Calidad. De las cuales visitamos 06 de 27 centrales, estas jornadas permitieron presentar al personal de las centrales los principales aspectos del sistema de gestión de riesgos, incluyendo:

- Objetivos del sistema.
- Funciones clave y responsabilidades.
- Importancia de la gestión de riesgos para la operación segura y eficiente.
- Etapas del proceso de implementación que se estarán desarrollando.

Centrales Visitadas

Objetivo	Fecha de visita	Nombre de la Central
Presentar la importancia de implementar un Sistema de Gestión de Riesgos en las centrales hidroeléctricas, socializar el proceso de selección de los gestores de riesgos y dar a conocer el programa de capacitación diseñado para su formación.	8/7/2025	Sabana Yegua
	15/7/2025	Las Damas
	9/9/2025	Taveras

Resultados Obtenidos

- Mayor comprensión del personal sobre la importancia y beneficios del Sistema de Gestión de Riesgos en el contexto de las operaciones hidroeléctricas.
- Reconocimiento del rol de los gestores de riesgos, así como claridad sobre los criterios utilizados para su selección.
- Compromiso del personal seleccionado para asumir las funciones como gestores de riesgos en sus respectivas áreas.
- Socialización efectiva del programa de capacitación, generando expectativas claras sobre el proceso de formación y las competencias a desarrollar.
- Recogida de inquietudes o sugerencias locales que contribuyan a ajustar e implementar el sistema de manera más efectiva en cada central.

Durante el tercer trimestre del año 2025, el área de SCAV-AIRE presentó avances significativos en sus procesos de adquisiciones y pagos:

- Se realizaron 178 adquisiciones, de las cuales 93 fueron completadas exitosamente, reflejando una eficiencia del 52%.
- De 449 solicitudes de pago, se completaron 408, alcanzando una eficiencia del 91%.

Departamento de gestión de procesos y desarrollo normativo

Generar la documentación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), conforme a los lineamientos establecidos por las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), a continuación, se describen los resultados por componente NOBACI, aportamos, calificaciones totales del indicador y gráficos que ilustran dichas calificaciones.

Resultados por Componente:

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los cinco componentes evaluados:

1. Ambiente de Control (AMC)–97.67%

- Se consolidó un entorno ético sólido, con un código de conducta

institucional vigente.

- Se fortaleció la estructura organizativa, funciones y responsabilidades claramente definidas.
- Alta dirección comprometida con el control interno y la transparencia.

2. Valoración y Administración de Riesgos (VAR)-92.00%

- Se implementó un sistema sistemático de identificación, análisis y tratamiento de riesgos.
- Se documentaron los riesgos institucionales, sus niveles de impacto y planes de mitigación.
- La gestión de riesgos fue incorporada en la toma de decisiones.

3. Actividades de Control (ADC)-88.00%


- Se establecieron políticas y procedimientos internos normalizados.
- Controles específicos en procesos críticos como contrataciones, pagos y operación técnica.
- Se identifican oportunidades de mejora en la documentación y revisión periódica de controles.

4. Información y Comunicación (IyC) – 81.82%

- Se fortalecieron los canales de comunicación interna y externa existentes y se incorporaron otros.
- Se fortalecieron los mecanismos de reporte, documentación y trazabilidad de información.
- Se fortaleció la estrategia institucional de comunicación efectiva.

5. Monitoreo y Evaluación (MyE)-84.62%

- Se realizaron autoevaluaciones periódicas del sistema de control.
- Auditorías internas apoyaron la identificación de fallas y formulación de medidas correctivas.



Gerencia de Desarrollo Institucional

Uno de los proyectos de mayor impacto en este trimestre fue la revisión y actualización de la estructura organizativa y manuales de funciones, iniciativa clave para fortalecer la eficiencia administrativa y redefinir los roles funcionales dentro de la institución. Durante este período se avanzó en la evaluación de las estructuras existentes, la elaboración de nuevos modelos organizativos y la consolidación de manuales revisados por consultores externos. Este proyecto presentó un progreso sostenido, con un avance físico acumulado del 15% y una participación activa de las áreas técnicas y administrativas que forman parte del proceso de reestructuración institucional.

Otro eje de trabajo fundamental fue la gestión del cambio de marca institucional, orientada a modernizar la identidad visual de la empresa, unificar criterios de comunicación y fortalecer la percepción pública de la organización. En este trimestre se realizaron actividades de validación, revisión de propuestas gráficas, desarrollo de campañas de divulgación y diseño de la nueva identidad corporativa. El proyecto alcanzó un avance físico estimado del 45%, evidenciando un progreso constante en la implementación de los nuevos lineamientos visuales, timbrados, sellos y material institucional.

Asimismo, la gerencia continuó con el plan estratégico de cultura institucional, que busca fomentar los valores organizacionales, la integración del personal y la promoción de un ambiente laboral basado en la colaboración y el compromiso. Se realizaron talleres, reuniones

técnicas y actividades de socialización para fortalecer la identificación de los colaboradores con los objetivos estratégicos de la empresa. El proyecto avanzó hasta un 25% de ejecución, estableciendo las bases para la implementación plena del programa durante el cuarto trimestre.

En materia de gestión administrativa, se avanzó también en la actualización y adquisición de centros de costos y centros de beneficios, con el propósito de mejorar los procesos de control presupuestario, trazabilidad del gasto y gestión financiera institucional.

Durante el trimestre se completaron tareas de validación y aprobación de estructuras, alcanzando un avance físico de 20% y un avance financiero de 25%, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema SAP como herramienta de control interno y planificación.


Resumen ejecutivo de las áreas misionales

Dirección De Operaciones

Generación Hidroeléctrica

En los meses de julio a septiembre de 2025, la generación bruta alcanzó un total de 341,567,520 KWh, equivalente a una generación neta enviada a las redes de 341 millones KWh, con un consumo interno de 6.3 GWh. La capacidad instalada total de 624.51 MW permitió cubrir la demanda energética y superar las metas proyectadas para el trimestre.


Mes	Generación Proyectada (GWh)	Generado (GWh)	Cumplimiento (%)
Julio	127.04	122.30	96.27%
Agosto	147.68	108.01	73.14%
Septiembre	159.54	111.26	69.75%
Total Trimestral	434.26	341.57	78.67%

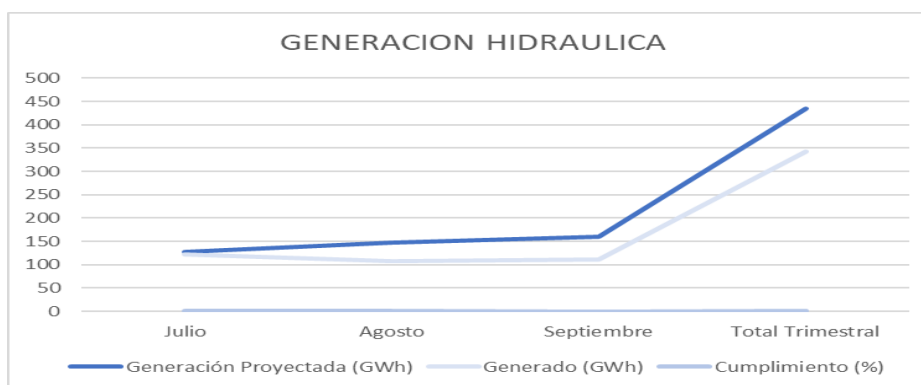

Ahorro de Combustible y Beneficio Económico

Durante este trimestre, la generación hidroeléctrica permitió un ahorro equivalente a **657,549 barriles de petróleo**, lo que representó una economía nacional aproximada de **46.0 millones de US\$**.


Mes	Energía Generada (MWh)	Barriles Ahorrados	Precio Prom. (US\$/BBL)	Economía (US\$)
Julio	122,303	235,445	69.15	17,288,716
Agosto	108,009	207,928	67.87	14,112,041
Septiembre	111,255	214,176	67.99	14,561,829
Total	341,567	657,549	68.34	45,962,586

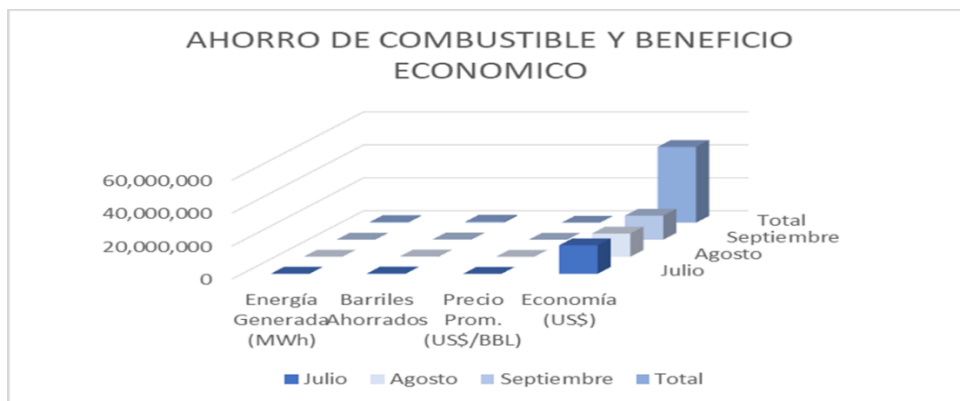

Operación Hidráulica

El volumen de agua turbinado en el trimestre fue de **1,456,892,679 m³**, mientras que el volumen no turbinado ascendió a **199,345,700 m³**, debido principalmente a vertidos controlados y entregas a acueductos y riego.


Mes	Volumen de Entrada (m ³)	Turbinado (m ³)	No Turbinado (m ³)
Julio	444,180,048	544,301,291	68,882,332
Agosto	385,353,871	473,887,146	63,610,980
Septiembre	593,400,634	438,704,242	66,852,388
Total	1,422,934,553	1,456,892,679	199,345,700

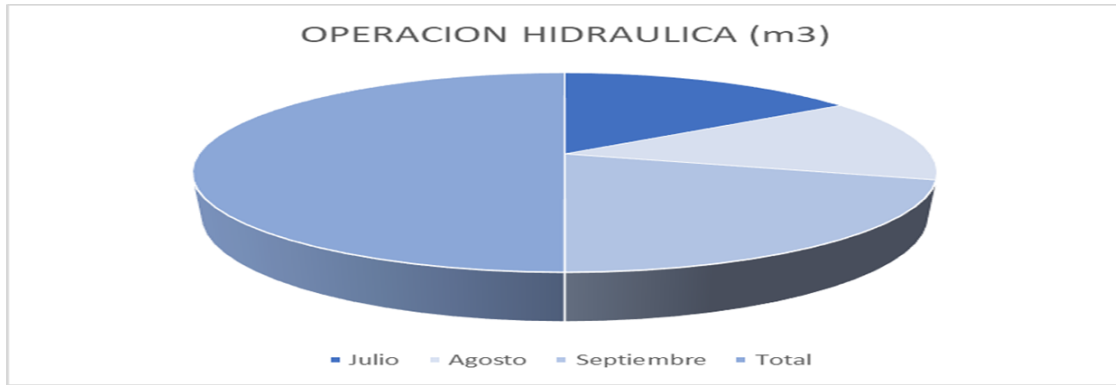

Rendimiento Hidráulico

El rendimiento promedio durante julio–septiembre fue de **0.235 KWh/m³**, mostrando una eficiencia constante en el aprovechamiento del recurso hídrico.

Mes	Rendimiento (KWh/m ³)
Julio	0.225
Agosto	0.227
Septiembre	0.254
Promedio Trimestral	0.235

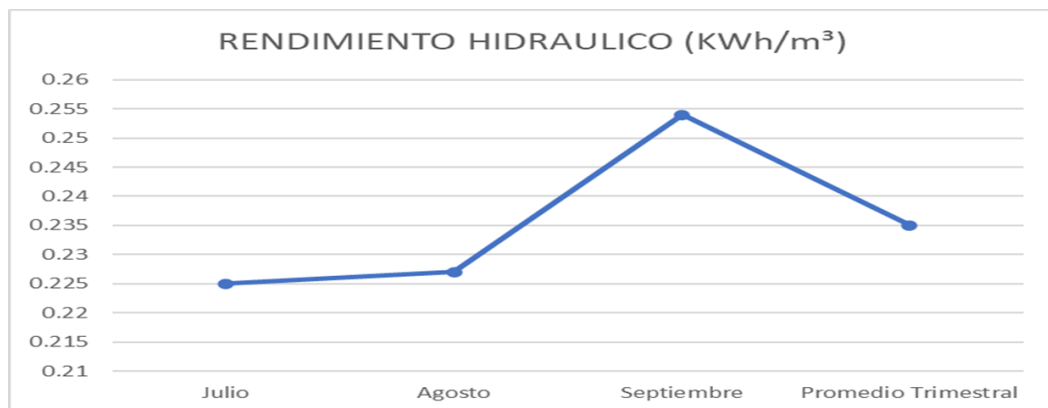

Regulación Primaria de Frecuencia

La calidad del servicio de regulación primaria de frecuencia (RPF) se mantuvo en un nivel sobresaliente, con un promedio de **91.37%**, superando los estándares requeridos por el Organismo Coordinador (OC).

Mes	Calidad RPF (%)
Julio	92.33
Agosto	91.52
Septiembre	90.25
Promedio Trimestral	91.37

Dirección De Mantenimiento

La Dirección de Mantenimiento desarrolló una serie de proyectos de alto impacto con frentes eléctricos, mecánicos, electromecánicos y de redes/subestaciones. El trimestre muestra dos realidades en paralelo: por un lado, hitos concluidos y en ejecución con progreso visible; por el otro, varios expedientes en fase administrativa (sin iniciar) o en condición "detenido" a la espera de trámites de compras y aprobaciones.


En el bloque de logros concluidos, destacan los paquetes del proyecto "Lavado de generadores en diferentes centrales", que cerraron sus hitos operativos y administrativos (levantamiento, SOLPED, validaciones, pagos y seguimiento) con ejecución del 100%, consolidando mantenimiento preventivo crítico de la flota generadora. En la línea mecánica, el "Cambio de componentes de los inyectores – C.H. Pinalito" cumplió todas las etapas de pre-contratación y pagos con 100%, y mantiene seguimiento de obra en ejecución. Asimismo, "Sustitución válvula mariposa – C.H. El Salto" completó pagos y activó la ejecución, mientras que "Contactos fijos para interruptor – C.H. Jigüey" cerró certificación y pago final al 100%. En redes/subestaciones, los paquetes de "Cambio interruptor 145 kV – C.H. Tavera" y "Sustitución de 18 transformadores monofásicos" culminaron todas sus fases técnicas y administrativas con 100% de ejecución, y "Electrificación circuito

exclusivo Rosa Julia de la Cruz (Boba)” cerró con 100% la remisión a compras y certificaciones. También se completaron, dentro de DMRS-2025-021, todas las etapas de instalación del transformador 400 kVA del edificio principal (incluido el seguimiento con 70%), dejando únicamente el pago final pendiente de iniciar.

En ejecución activa se ubican frentes relevantes que transitan la etapa de obras o procesos de compras: mantenimiento a redes y subestaciones con proceso de compras en curso, y análisis fisicoquímicos a transformadores que pasó de remisiones a ejecución (5%) y continúa su ruta de contratación.

En contraste, permanece un volumen significativo de expedientes “sin iniciar” o “detenidos”, típicamente en pasos de remisión a Compras, validaciones o administración. En eléctrico (DMGE) figuran en esta condición los sistemas de excitación Tavera en ejecución inicial (5%), rehabilitación de paneles, SCADA/HMI Aguacate y SCADA Pinalito entre otros. En mecánico (DMGM), permanecen sin activar o detenidos la rehabilitación de turbina Sabana Yegua y Aguacate, así como paquetes de cambio de sellos y válvulas en Monción y Los Toros con avances administrativos parciales.

En proyectos electromecánicos (DMPE), se concentran en “sin iniciar/detenido” varias rehabilitaciones mayores (reguladores de velocidad Tavera/Valdesia/Río Blanco y plantas de tratamiento de agua en Tavera, Valdesia, Rincón, Angostura, Magueyal y Contraembalse Monción). Finalmente, en redes/subestaciones (DMRS), además del citado avance, se mantienen nuevos procesos aún por abrir: transformadores para Jigüey y Jimenoa, mantenimiento mayor de transformadores en Valdesia, calibración equipos de medición y rehabilitación de acople de barra 145 kV.

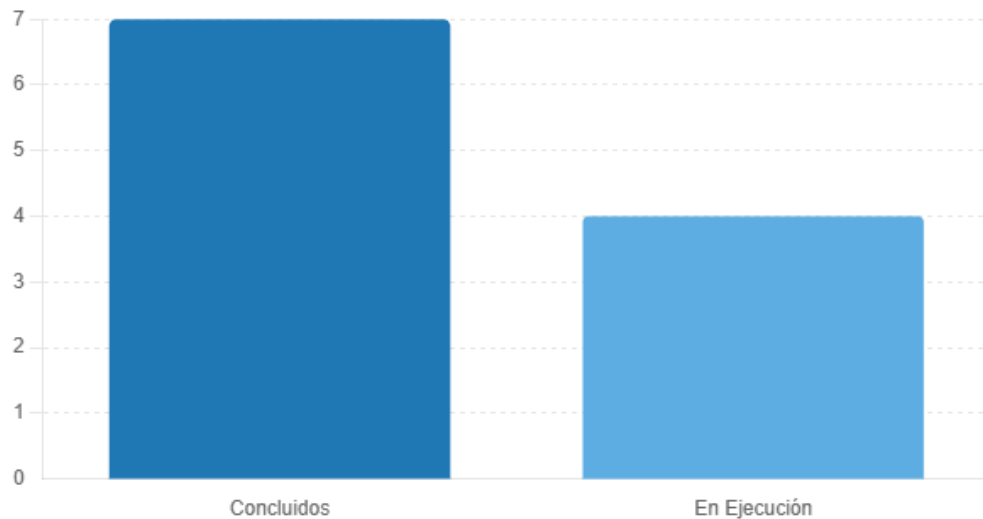

Dirección De Comercialización

En el tercer trimestre del año 2025, se mantuvo un avance sostenido en la ejecución de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento del sistema de medición, la modernización tecnológica y la mejora de los mecanismos de control y eficiencia en la gestión comercial de la energía generada por la institución. Este período se caracterizó por la culminación de varios procesos técnicos y administrativos de adquisición, instalación y habilitación de equipos del Sistema de Medición Comercial (SMC), así como por la planificación de nuevas etapas vinculadas a la digitalización de datos y el monitoreo en tiempo real del consumo energético.

El trimestre julio–septiembre mostró un desempeño positivo, con la finalización de más del 70% de los proyectos previstos, entre ellos la instalación de transformadores de corriente, la habilitación de medidores de energía, y la aprobación de especificaciones técnicas para los sistemas de adquisición de datos. Asimismo, se avanzó en los procesos de licitación y adquisición de software especializado (PLEXOS), herramienta clave para la simulación, análisis y optimización del mercado eléctrico nacional.

En el ámbito de los proyectos tecnológicos, se completaron las tareas relacionadas con el Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), que tiene como propósito fortalecer la estabilidad operativa del sistema y optimizar la gestión de energía renovable en horas de baja demanda. Paralelamente, se avanzó en la verificación de pliegos y especificaciones

técnicas para la adquisición de tarjetas de ethernet y sistemas de comunicación avanzada, los cuales permitirán mejorar la transmisión y registro de datos de medición, garantizando mayor precisión y eficiencia en los reportes energéticos.

Dirección De Desarrollo Hidroeléctrico

El Proyecto Presa Boca de los Ríos (Guayubín), en Santiago Rodríguez, alcanzó un avance físico del 68%, con más de 56,700 m³ de hormigón colocados (82.9% del total previsto). Se desarrollaron trabajos de encofrado, armadura estructural, blindajes hidromecánicos y pantalla de impermeabilización, además de avances en el dique de cierre y la ingeniería de detalle. El monto actualizado del proyecto asciende a RD\$7,183 millones, con beneficios directos para 5,000 hectáreas de riego y control de inundaciones en la Línea Noroeste.



En el Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, se continuó con la ingeniería de detalle y la rehabilitación de caminos de acceso, conforme al acuerdo firmado en febrero de 2023. Este proyecto, con una capacidad instalada de 204 MW, representa un incremento del 33% en la capacidad hidráulica nacional. Se trabaja paralelamente en la adquisición del TBM (Tunnel Boring Machine), con un monto ejecutado superior a US\$42 millones hasta la fecha.

El Proyecto de Consultoría y Supervisión de Las Placetas, a cargo de TYP SA S.A., avanzó en la revisión de los diseños, la asesoría técnica y la supervisión de los caminos de acceso, alcanzando un progreso sostenido bajo la Adenda No. 8 con ejecución acumulada de US\$9.4 millones y plazo extendido hasta septiembre de 2026.

La obra de estabilización del estribo izquierdo de la Presa Pinalito, en Constanza, presentó avances limitados debido a condiciones climáticas y permisos ambientales, alcanzando una ejecución de RD\$32.2 millones (22% del total).

El Reservorio Barranca, en San Juan, destinado al riego agrícola, registró interrupciones por lluvias, pero mantuvo avances en excavaciones y conformación de la laguna, con una ejecución de RD\$24 millones (31% del total).




Finalmente, el Acueducto de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, avanzó de forma sostenida en la instalación de tuberías, válvulas y obras civiles, alcanzando una ejecución de RD\$118.4 millones, equivalentes al 60% del total contratado.

Dirección De Energía Renovable

Durante el tercer trimestre de 2025, la Dirección de Energía Renovable mantuvo la gestión de una agenda amplia y diversificada de proyectos, orientados principalmente a la ejecución y desarrollo de iniciativas fotovoltaicas, eólicas y de almacenamiento energético por hidrobombeo. Las acciones realizadas durante este período abarcaron procesos de construcción, movimientos de tierra, estudios de prefactibilidad, elaboración de diseños, así como la formulación de términos de referencia y procedimientos de licitación.

El análisis correspondiente al período evidencia que la cartera de proyectos mantiene un predominio de iniciativas en fase inicial, con actividades concentradas en la fase de planificación y preparación técnica. Este comportamiento responde al cronograma establecido, que prevé el inicio formal de la ejecución de varias iniciativas hacia el último trimestre del año. Entre los proyectos en esta etapa se encuentran la construcción de los parques solares de Sabana Yegua, Sabaneta, además de los estudios y diseño de Guayubín, Las Placetas, La Gina y Monte Grande y desarrollos eólicos y los sistemas de almacenamiento por bombeo asociados a dichas zonas. En estos casos, las labores se centran en la elaboración de perfiles técnicos y términos de referencia, que representan entre un 20 % y un 30 % del peso total de cada proyecto, sin registrarse aún ejecución física ni financiera al cierre del trimestre.

Por otro lado, los estudios de prefactibilidad para proyectos de acumulación por hidrobombeo en Las Matas de Farfán (1 y 2), La Descubierta y Paraíso muestran un mayor nivel de avance. En dichos casos, las etapas correspondientes a la elaboración y publicación de ofertas fueron concluidas al 100 %, mientras que la fase de revisión de ofertas presenta un progreso cercano al 90 %. Este resultado constituye un hito relevante para la Dirección, al consolidar el avance hacia la adjudicación y posterior desarrollo de proyectos estratégicos que fortalecerán la capacidad de almacenamiento energético del sistema eléctrico nacional.

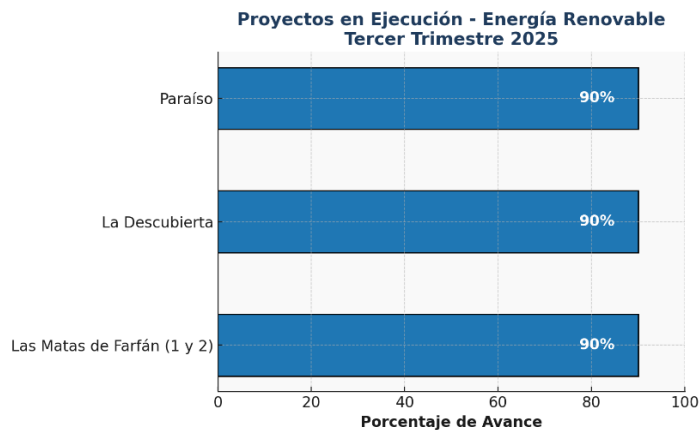

En términos globales, al cierre del tercer trimestre de 2025, la Dirección de Energía Renovable presenta un portafolio compuesto aproximadamente por un 75 % de proyectos en fase inicial, un 20 % en ejecución y un 5 % concluidos. Esta distribución refleja la naturaleza de los proyectos de gran escala, los cuales requieren etapas preliminares extensas de estudios, diseño y procesos licitatorios antes de iniciar su ejecución física.


Dirección De Mantenimiento Y Rehabilitación De Obras Civiles

Durante el trimestre julio–septiembre de 2025, se realizó el seguimiento físico a 40 proyectos bajo la Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles. El análisis incluye todos los proyectos reportados (en ejecución, en proceso de reinicio, rescindidos y otros estados). A continuación, se presenta el promedio mensual de ejecución física y un gráfico comparativo.

Promedio de ejecución física por mes (considerando todos los proyectos):

Mes	Promedio ejecución física
Julio	46.95
Agosto	49.98
Septiembre	54.05

Promedio de Ejecución Física - Julio a Septiembre 2025

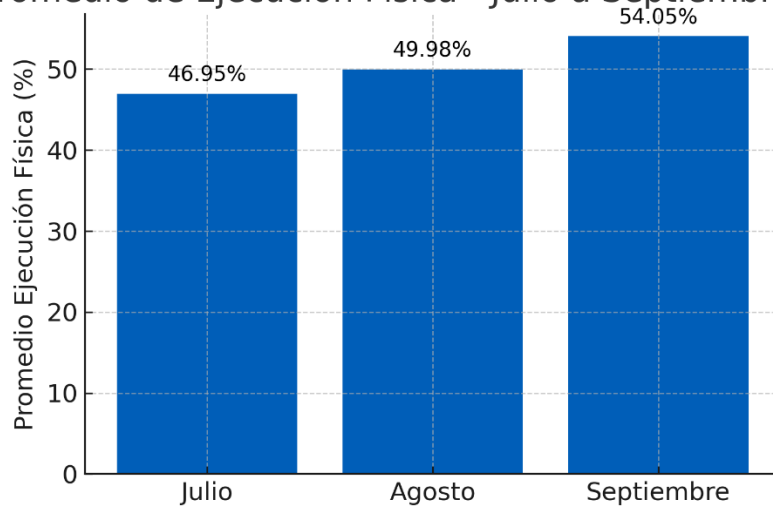

Durante el trimestre julio–septiembre de 2025, la Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles reportó avances variables entre los proyectos, con algunos alcanzando niveles de ejecución próximos a la terminación (100 %) y otros en etapas iniciales o de reinicio. El promedio de ejecución física por mes refleja la incorporación gradual de actividades en agosto y una mejoría adicional en septiembre. Las principales observaciones incluyen la existencia de contratos en proceso de cubicación, contratos con acuerdos interinstitucionales que continúan en ejecución, y proyectos con rescisión y acuerdos municipales.

Los promedios de ejecución física registrados son: Julio 46.95 %, agosto 49.98 % y septiembre 54.05 %. Estos valores fueron calculados considerando todos los proyectos listados (N=40), donde los valores no reportados fueron tratados como cero.

Dirección De Mantenimiento Y Conservación De Infraestructuras

La Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras avanzó en distintos proyectos relacionados con la modernización y cambio de imagen de centrales hidroeléctricas, así como en mejoras de oficinas administrativas. El balance muestra un progreso mixto, con proyectos en ejecución que ya presentan avances visibles y otros que permanecen en fase inicial.

En el grupo de proyectos en ejecución, se destaca el Proyecto de cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua, el cual inició el proceso de inspección y ejecución de actividades, alcanzando un 15% de avance. Asimismo, el Proyecto de cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Los Toros se encuentra en ejecución con un progreso del 75%, evidenciando un desarrollo avanzado en comparación con los demás. Otro proyecto con resultados relevantes es el cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Jimenoa, que alcanzó un 75% de ejecución, destacándose por la finalización y entrega parcial de actividades. Finalmente, el cambio de imagen en la Central Hidroeléctrica Jigüey también presenta un avance del 75%, en fase de generación y ejecución de pedidos, consolidándose entre los proyectos de mayor progreso en este período.

Por otro lado, algunos proyectos permanecen en etapa de planificación o sin iniciar, como el cambio de plafones en oficinas administrativas de Quita Sueño, que aún se encuentra en levantamiento y solicitud de cotizaciones, ambos con 0% de ejecución. De manera similar, la planificación para la ejecución del cambio de imagen en la Central Hidroeléctrica Jigüey y la recepción y entrega final del proyecto Los Toros figuran como proyectos sin avances al cierre del trimestre.

El balance general refleja que, aunque la mayoría de proyectos se encuentran en ejecución, su nivel de avance es heterogéneo: algunos presentan resultados sólidos (entre 60% y 75%), mientras que otros apenas se encuentran en etapa inicial.

Dirección De Proyectos De Obras Civiles

En este trimestre la Dirección de Proyectos de Obras Civiles ha implementado diversos proyectos estratégicos de alto impacto institucional, enfocados en el mejoramiento vial, rehabilitación de carreteras, construcción de obras de arte, instalación de drenajes y fortalecimiento de la señalización. Estas iniciativas no solo tienen como objetivo garantizar la conectividad regional, sino también elevar los niveles de seguridad vial y asegurar la durabilidad de la infraestructura pública. El balance intermedio del año refleja una combinación de proyectos concluidos en su totalidad, otros en plena ejecución y algunos en etapa de inicio o cierre técnico-administrativo.

El análisis de los avances muestra que aproximadamente el 15% de los proyectos se encuentran concluidos, alcanzando un 100% de ejecución física y administrativa. Dentro de este grupo destacan obras puntuales de rehabilitación y reconstrucción, como la carretera Loma La Gallina – La Cabra en La Vega, que aportan valor inmediato a la movilidad local. Por otra parte, un 80% de los proyectos permanecen en fase de ejecución, con niveles de progreso que varían entre el 40% y el 95%. Estos incluyen intervenciones de gran impacto como el asfaltado de calles urbanas, el mantenimiento de caminos vecinales y la construcción de carreteras en provincias clave como San Juan, Santiago, La Vega y San Cristóbal. Finalmente, alrededor de un 5% de las iniciativas se encuentran en fase inicial o en procesos de cierre técnico, representando actividades de menor alcance, pero necesarias para completar el cronograma institucional.

También se destacan otros proyectos completados en su totalidad:

- Limpieza y rehabilitación del canal Nizao–Najayo (Etapa I, 10 km, San Cristóbal), con un 100% de ejecución. Seguimiento constructivo en el mismo canal, también finalizado en un 100%, asegurando la estabilidad hidráulica de la obra.

Dentro del grupo de proyectos en ejecución, un 35% presenta un nivel de avance superior al 80%, lo que los coloca en etapa de culminación y asegura que estarán concluidos en el próximo trimestre. Estas obras, por su grado de avance, garantizan resultados inmediatos para las

comunidades beneficiadas. Otro 50% de los proyectos se ubica en rangos intermedios de ejecución, entre un 40% y un 70%. Aunque mantienen un ritmo constante, demandan mayor atención en la supervisión técnica y la gestión logística para acelerar su entrega. En contraste, cerca de un 10% de los proyectos registra avances limitados (por debajo del 40%), reflejando situaciones de mayor complejidad técnica, financiera o legal que requieren medidas específicas de apoyo para superar los retrasos.

El desempeño general de la Dirección se traduce en un avance físico promedio cercano al 65%, lo que refleja un buen nivel de cumplimiento frente al cronograma anual. La ejecución financiera, por su parte, mantiene una relación adecuada con el progreso físico, evidenciando que los desembolsos realizados están alineados con el desarrollo real de las obras. Es importante destacar que los proyectos con mayores inversiones corresponden a obras de asfaltado urbano, rehabilitación de caminos vecinales y construcción de carreteras de interconexión, lo que asegura un impacto positivo tanto en la movilidad como en la economía regional. Con el ritmo actual de ejecución, las proyecciones apuntan a que, para finales del 2025, la Dirección alcanzará un 80% de ejecución global, consolidando así su compromiso con la conservación de la infraestructura pública.

Dirección De Tecnología Y Telemática

Durante el trimestre julio–septiembre de 2025, la Dirección de Tecnología y Telemática reportó avances la entrega de diferentes aplicaciones web, dentro del proyecto de Nuevas Aplicaciones Web, las cuales se detallan a continuación.

Proyecto	Observacion	Avance
Rediseño del portal institucional egehid.gob.d	Se desarrolló un nuevo diseño moderno, accesible y alineado con las normativas NORTIC, mejorando la experiencia del usuario y la comunicación institucional.	100%
Migración del portal de transparencia a un portal unificado	Se consolidaron los contenidos del portal de transparencia dentro del portal institucional, garantizando mayor eficiencia, trazabilidad y cumplimiento de las normativas de transparencia gubernamental.	100%
Sitio Web “Conoce tus Presas”	Se implementó una plataforma interactiva que permite al público conocer información actualizada sobre las presas administradas por EGEHID, incluyendo datos técnicos, ubicación y nivel de almacenamiento.	100%
Aplicación para la gestión de visitas	Se desarrolló una aplicación interna que permite planificar, registrar y controlar las visitas institucionales, mejorando la organización y seguridad del proceso.	100%

Proyecto	Observacion	Avance
Aplicación para la gestión de asistencia	Se implementó una solución tecnológica para el control de asistencia del personal, optimizando los registros y facilitando la integración con otros sistemas administrativos.	
Digitalización de la Bitácora CCH	digitalizó el registro histórico de la Bitácora CCH, permitiendo su consulta y gestión electrónica para un acceso más ágil y seguro a la información técnica.	
Dashboard de Monitoreo Hídrico y Generación	Se desarrolló un panel de control integrado al portal institucional que muestra en tiempo real los niveles de agua, generación y otros indicadores operativos de las centrales hidroeléctricas.	

Proyecto	Observacion	Avance
Certificación NORTIC A3	EGEHID obtuvo la certificación NORTIC A3, que acredita la implementación de estándares en el uso de redes sociales y medios digitales institucionales.	
Certificación NORTIC A2	Se logró la certificación NORTIC A2, que garantiza el cumplimiento de las normas de accesibilidad web y transparencia digital en los portales institucionales.	
Certificación NORTIC B2 – En espera del certificado	Se completó el proceso de evaluación y validación correspondiente a la NORTIC B2, relativa a la seguridad de la información. El certificado se encuentra en proceso de emisión.	

Dirección De Gestión Ambiental

La Dirección de Gestión Ambiental (DGA) consolidó acciones estratégicas orientadas a la protección de los recursos naturales, la sostenibilidad de las operaciones hidroeléctricas y la promoción de prácticas responsables dentro de las 27 centrales de EGEHID. Las intervenciones se enfocaron en la evaluación técnica ambiental, la reforestación, la educación y sensibilización ambiental, la gestión de acuerdos interinstitucionales y el control sanitario en las instalaciones.

Principales Logros Alcanzados

1. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Supervisión Técnica


Se realizaron 21 inspecciones ambientales en las principales centrales hidroeléctricas del país, verificando el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internas. Estas inspecciones se centraron en la gestión de residuos, vertidos, conservación de recursos hídricos y mantenimiento de embalses, reflejando un nivel de cumplimiento satisfactorio y contribuyendo al fortalecimiento de la cultura ambiental institucional

2. Educación y Concienciación Ambiental

Se desarrolló un programa de formación ambiental dirigido a colaboradores técnicos y administrativos, con énfasis en el uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos, mitigación del cambio climático y buenas prácticas laborales. Los talleres alcanzaron un 90% de satisfacción entre los participantes, reforzando el compromiso de EGEHID con la educación ambiental

3. Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas

Durante el trimestre se reforestaron 35 tareas con más de 3,500 plantas forestales, en coordinación con asociaciones locales de productores y bajo acuerdos con el Fondo Agua Yaque del Norte y COAJA. Además, se completó la adquisición de 200 mil plantas forestales y agroforestales, que serán entregadas en el cuarto trimestre. Estas acciones fortalecen la recuperación de las cuencas hidrográficas y la conservación del suelo

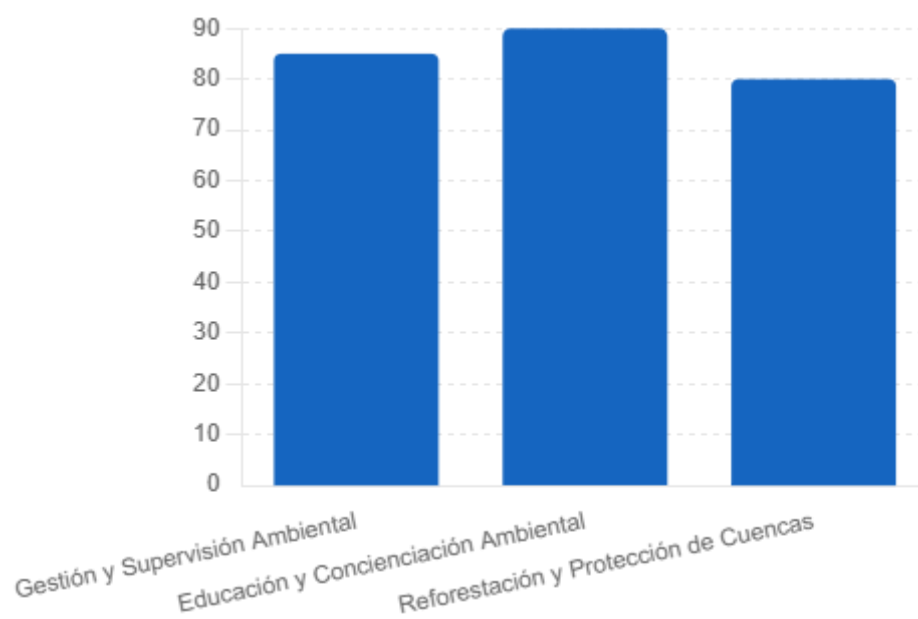

4. Fortalecimiento de Brigadas de Reforestación

Se capacitaron 450 miembros de 80 brigadas forestales mediante 45 talleres sobre técnicas de conservación de suelos, manejo de herramientas agrícolas y protección de taludes. Este proceso formativo garantiza la sostenibilidad de los proyectos de reforestación y la eficiencia en las labores de campo

5. Control Sanitario y Mantenimiento Ambiental


Se ejecutaron jornadas mensuales de fumigación en las 27 centrales hidroeléctricas, oficinas centrales y Quita Sueño, como medida preventiva contra plagas y vectores que puedan afectar las operaciones o la salud del personal. Estas acciones son parte del programa continuo de mantenimiento ambiental y salud ocupacional

6. Producción Piscícola y Monitoreo Hídrico

La Estación Piscícola de Hatillo mantuvo su producción de alevines y avanzó en la licitación de nuevos equipos de laboratorio para monitorear la calidad del agua. Además, se realizaron inspecciones al lago de la Presa de Valdesia, en coordinación con la CAASD, para garantizar los estándares de calidad del agua destinada al acueducto de Santo Domingo

7. Acuerdos Interinstitucionales y Cooperación Ambiental

Se dio seguimiento a nueve acuerdos y convenios ambientales, entre ellos los establecidos con COAJA, Fondo Agua Yaque del Norte, INDOCAFE y la Federación de Campesinos hacia el Progreso (FCHP). Estos acuerdos buscan mejorar la recarga hídrica, la reforestación productiva y la gobernanza climática, contribuyendo directamente al desarrollo sostenible del país

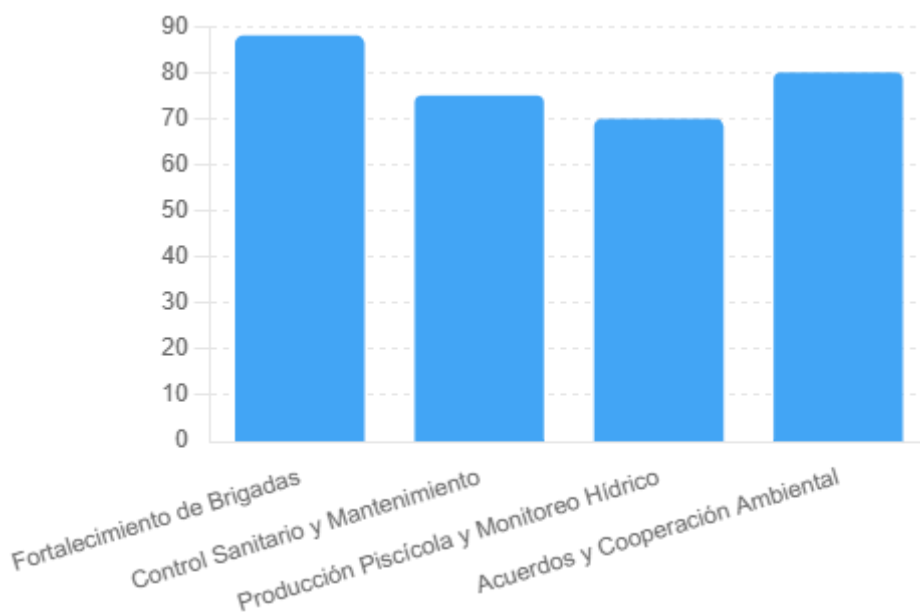


Dirección Administrativa

En el período comprendido entre julio y septiembre de 2025, la Dirección Administrativa desarrolló un conjunto de proyectos orientados al mantenimiento de la infraestructura, la gestión de la flotilla vehicular, la adquisición de suministros estratégicos y la prestación de servicios de apoyo institucional. El balance de este período muestra un panorama equilibrado entre proyectos concluidos, iniciativas en plena ejecución y otros aún pendientes de inicio que están programados para el último trimestre del año.

Entre los proyectos concluidos, destacan las reparaciones de los sistemas de aire acondicionado en el edificio sede, particularmente los chillers 1 y 2, que resultan esenciales para mantener las condiciones de climatización en las oficinas administrativas. También se completaron de manera satisfactoria los inventarios e inspecciones de la flotilla vehicular, incluyendo la verificación de matrículas, placas y seguros, lo cual fortalece el control patrimonial de los recursos. A ello se suma el abastecimiento de materiales ferreteros para reparaciones y mantenimientos en edificios principales, así como la contratación de servicios básicos como el suministro de agua potable embotellada y el mantenimiento de ascensores, ambos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones diarias.

En el grupo de proyectos en ejecución se ubican varias iniciativas de gran relevancia institucional. El mantenimiento mayor de los chillers del edificio sede avanza en un 50% y constituye un esfuerzo clave para asegurar la continuidad de los servicios de climatización. La contratación de servicios de agua potable embotellada presenta un progreso cercano al 80%, garantizando el abastecimiento permanente para las instalaciones. De igual manera, el plan de control y gestión de la flotilla vehicular se encuentra en desarrollo, con un avance del 50%, y tiene como propósito optimizar el uso y supervisión de los recursos de transporte institucional. La gestión de desechos tóxicos, incluyendo aceites, neumáticos y baterías, muestra avances parciales en torno al 50%, lo que refleja el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo. También avanza el plan de instalación de motores y transmisiones automáticas en la flotilla

vehicular, con un 30% de progreso, concentrado principalmente en procesos de compra y logística.

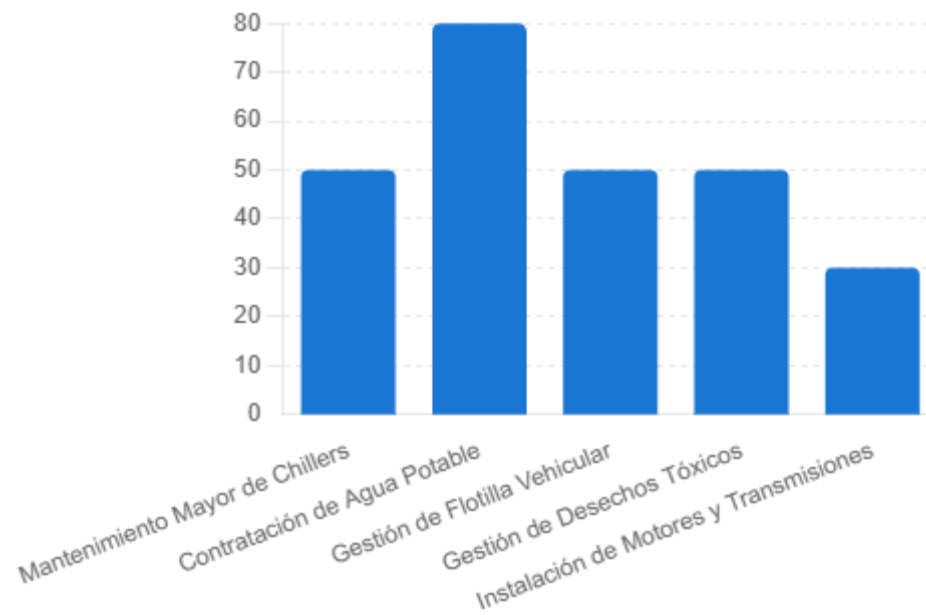

Dirección Logística

En esta etapa del año 2025, se mantuvo un desempeño destacado en la ejecución de proyectos relacionados con la optimización de almacenes, el equipamiento de infraestructura, y el suministro eficiente de materiales de oficina y limpieza a nivel nacional. Las acciones implementadas durante este periodo fortalecen la gestión operativa y garantizan la disponibilidad oportuna de recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. Equipamiento del Almacén Principal

Se culminó de manera satisfactoria el proyecto de equipamiento del almacén principal de EGEHID, alcanzando un 100% de ejecución física en todas las tareas planificadas.

Entre los logros más relevantes se destacan:

- El levantamiento integral de necesidades en infraestructura, mobiliario y equipos.
- La adquisición, instalación y coordinación logística para el montaje de nuevos equipos de almacenamiento.
- Este conjunto de acciones permitió modernizar las instalaciones y optimizar los procesos de recepción, despacho y control de materiales, fortaleciendo la eficiencia institucional.

2. Inventario General de Almacenes a Nivel Nacional

Otro avance importante fue la ejecución del Inventario General de los Almacenes a Nivel Nacional, con un promedio de ejecución del 75% durante el trimestre.

Entre los hitos alcanzados destacan:

- La planificación y formación de equipos técnicos en las diferentes sedes.
- La ejecución física del inventario, mediante conteo manual y escaneo de códigos.
- La revisión, consolidación y envío de resultados a la Dirección de Auditoría Interna.

Este proceso permitió actualizar la base de datos de bienes y materiales institucionales, garantizando un control más preciso de los recursos disponibles y fortaleciendo la transparencia en la gestión logística.


3. Suministro de Materiales Gastables de Oficina y Limpieza

Durante este trimestre, la Dirección de Logística también mantuvo un flujo continuo de suministros de materiales gastables para oficinas y limpieza en todas las dependencias de la empresa.

Se alcanzaron niveles de ejecución entre el 50% y 80%, destacándose los siguientes logros:

- Recepción y despacho de materiales según requerimientos de cada departamento.
- Evaluación periódica de existencias para evitar desabastecimientos o excesos de inventario.
- Priorización de la eficiencia en costos y la optimización del almacenamiento.

Gracias a estas acciones, se logró mantener el abastecimiento regular de insumos, asegurando la operatividad de las áreas administrativas y técnicas.

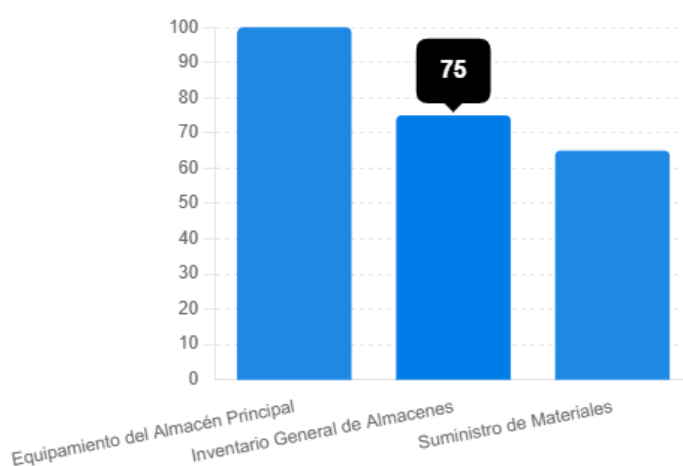


Dirección de Compras y Contrataciones

Durante el año 2025, la dirección se ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento normativo en todos los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras. Estos proyectos en ejecución representan un pilar estratégico para el sostenimiento operativo de la institución, asegurando la provisión oportuna de recursos y fortaleciendo la gestión administrativa.

Uno de los avances más significativos se registra en la ejecución del Plan Anual de Compras (PACC), que constituye la columna vertebral de la gestión de adquisiciones. El plan ha logrado mantener un promedio de ejecución del 50% en tareas clave como la recepción y verificación de solicitudes, la actualización de presupuestos, la publicación de procedimientos y la adjudicación de contrataciones. Este desempeño refleja el esfuerzo por cumplir con las metas establecidas y garantizar que la institución disponga de los insumos necesarios dentro de los plazos previstos.

De igual manera, se encuentra en desarrollo la migración de compras públicas hacia procedimientos especiales, con un progreso cercano al 50%. Esta iniciativa busca modernizar los mecanismos de adquisición, ofreciendo mayor flexibilidad para atender necesidades críticas y estratégicas de la institución. La implementación de este proceso marca un paso importante hacia la actualización de los modelos de compras, adaptándolos a las exigencias actuales y reduciendo riesgos de retrasos en la provisión de bienes esenciales.

En paralelo, se ha dado prioridad al fortalecimiento de las capacidades internas del personal, a través del proyecto de capacitación en compras estratégicas, que presenta un avance del 80%. Esta iniciativa ha permitido dotar a los equipos técnicos de nuevas herramientas para la elaboración de pliegos, gestión de proveedores y cumplimiento normativo, lo que se traduce en procesos de adquisición más ágiles, transparentes y con mayores garantías de calidad.




Asimismo, la ejecución de foros de seguimiento y servicios internos avanza también en un 80%, consolidándose como una estrategia de control y retroalimentación de los procesos de compras. Estos espacios permiten evaluar periódicamente el desempeño de proveedores, identificar áreas de mejora y asegurar que las contrataciones respondan efectivamente a las necesidades institucionales.

Dirección De Gestión Humana

En el transcurso del tercer trimestre del año 2025, la Dirección de Gestión Humana desarrolló proyectos estratégicos orientados a fortalecer la cultura organizacional, los beneficios sociales y el bienestar de los colaboradores. En este período se destacan dos grandes ejes de acción: la creación de políticas internas vinculadas al otorgamiento de becas y la ejecución del programa de reconocimiento al mérito estudiantil de hijos de colaboradores.

En relación con el manual de políticas y procedimientos para el otorgamiento de becas a colaboradores, se avanzó en la definición y estructuración de lineamientos. Aunque las tareas principales relacionadas con la elaboración, revisión y aprobación formal de las políticas aún no registran ejecución, se encuentran en calendario con fechas de cierre estimadas entre septiembre y octubre de 2025. Este proyecto resulta clave para institucionalizar un beneficio que impactará directamente en la motivación y desarrollo profesional del personal.

Por otra parte, el programa de reconocimiento del mérito estudiantil de hijos de colaboradores tuvo un alto nivel de ejecución y se consolidó como uno de los proyectos más relevantes del trimestre. Dentro de sus hitos se incluyeron la recepción y tabulación de documentación académica, la verificación de notas, la programación de pagos de becas y la organización del acto de entrega, que culminó de manera satisfactoria con una participación activa de las familias beneficiadas. Todas estas tareas alcanzaron un cumplimiento del 100%, reflejando eficiencia en la planificación y gestión.



Adicionalmente, la dirección trabajó en la campaña de inducción sobre normas y régimen disciplinario, así como en el lanzamiento de la encuesta de clima laboral. Estos proyectos, aunque aún en fase inicial, buscan fortalecer la comunicación interna y generar datos relevantes para la toma de decisiones sobre el bienestar de los colaboradores y la cultura organizacional.

Dirección De Servicios Financieros

En el marco del tercer trimestre del año 2025, la Dirección Financiera consolidó un desempeño estable y orientado al fortalecimiento de los procesos contables, presupuestarios y de control interno, alcanzando un nivel de ejecución promedio superior al **65%** en la mayoría de sus proyectos estratégicos. Este resultado refleja un cumplimiento consistente en las tareas de registro, control y rendición de cuentas, con un enfoque en la transparencia y la eficiencia administrativa.


Entre los logros más relevantes se destacan los avances en los proyectos de elaboración de informes financieros confiables y oportunos, donde la entrega de reportes semestrales y trimestrales alcanzó niveles de ejecución entre el 65% y 66%, garantizando información oportuna para la planificación y la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, los proyectos de eficiencia en los procesos de cierre contable mostraron un desempeño homogéneo.

La gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar también registró progresos significativos. En pagos y retenciones a proveedores, el avance se mantuvo en el rango del 61% al 67%, lo que evidencia un control adecuado en los compromisos financieros. Por su parte, la eficiencia en el manejo de fondos e ingresos (incluyendo expedientes, escaneo de documentos, emisión de cheques y custodia de caja chica) alcanzó entre 55% y 68%, reforzando la confiabilidad en la administración de los recursos institucionales.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los reportes anuales y la formulación de proyecciones lograron un desempeño promedio del 70%, reflejando avances en la consolidación de informes financieros y la integración de los procesos de planeación con DIGEPRES. Además, los proyectos de registro y control del patrimonio de activos fijos presentaron ejecuciones estables entre el 63% y 67%, fortaleciendo la base patrimonial y el cumplimiento de las normas de administración pública.

Finalmente, la transparencia y rendición de cuentas constituyeron un pilar del trimestre, con reportes enviados a portales oficiales y organismos de control en más de un 65% de avance, evidenciando la

importancia de mantener una comunicación clara y verificable de la gestión financiera.

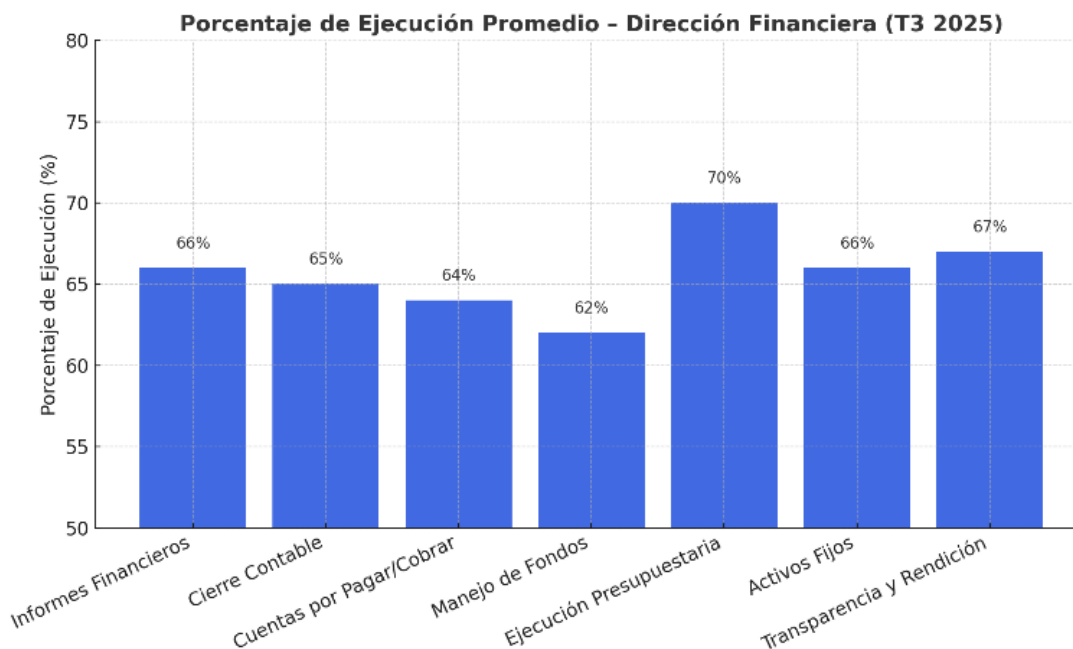

Contraloría Interna

Durante el período de evaluación, la Dirección de Contraloría ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la correcta fiscalización de los proyectos y procesos internos de la institución. El plan estratégico se estructuró en torno a tres grandes ejes: fiscalización técnica y financiera de proyectos, análisis documental e inspección de controles internos y validación de nómina y compensaciones.

1. fiscalización técnica y Financiera de Proyectos

El proyecto busca asegurar que los contratos y proyectos de obras ejecutados por la institución se cumplan conforme a lo estipulado legal y técnicamente.

- Se elaboraron cronogramas de visitas de fiscalización a todas las obras, con un nivel de ejecución del 100% en su programación inicial.

- Las visitas de campo avanzan en un 50% promedio, verificando la calidad de los trabajos y la correcta aplicación de especificaciones técnicas.
- La fiscalización financiera de proyectos en ejecución alcanzó un 50% de avance, fortaleciendo el control sobre las erogaciones realizadas y asegurando coherencia entre la inversión ejecutada y los resultados alcanzados.

Este eje refleja una gestión activa que asegura un control permanente de los recursos invertidos en obras civiles y proyectos estratégicos.

2. Análisis Documental e Inspección de Controles Internos

El proyecto está orientado a la revisión del marco de control interno para prevenir riesgos financieros, administrativos y legales.

- La elaboración de reportes mensuales de control registra un avance del **50%**, asegurando un monitoreo continuo.
- La identificación de riesgos y deficiencias en procedimientos alcanza un 60% de ejecución, lo cual ha permitido realizar recomendaciones tempranas a las áreas responsables.
- La notificación de hallazgos de control presenta un cumplimiento del 60%, fortaleciendo el principio de rendición de cuentas y la mejora continua de procesos.

Este componente evidencia un avance consistente en la consolidación de un sistema de control interno sólido y preventivo.

3. Análisis e Inspección de Controles de Nómina

Este proyecto se centra en la validación de nómina y compensaciones, con el fin de prevenir irregularidades y garantizar la equidad en los pagos al personal.

- Actualmente se encuentra en fase de preparación, con un 30% programado en revisiones preliminares, pero varias tareas aún sin iniciar.
- Las líneas de acción incluyen: validación de procesos de nómina, notificación de hallazgos y elaboración de reportes mensuales.

- Se proyecta que, con el inicio de la fase operativa en el último trimestre, se logre alcanzar los hitos planificados en materia de control y confiabilidad de los pagos de personal.

Dirección De Auditoría Interna


En esta fase trimestral del año 2025, la institución consolidó un nivel de cumplimiento superior al 95% en sus proyectos estratégicos. Este resultado refleja un sólido compromiso con la transparencia y la eficiencia administrativa, al ejecutar auditorías, conciliaciones bancarias, seguimientos y supervisión de obras en ejecución.

En el ámbito de las auditorías financieras y de cumplimiento, se ejecutaron proyectos claves que fortalecen los procesos internos. Entre ellos se destacan la Auditoría al cumplimiento de plazos en los procesos de compras 2024, culminada con un 100% de avance; la Auditoría financiera a las cuentas por pagar 2024, que incluyó la verificación integral de pasivos institucionales; y la Auditoría de software, licencias y arqueos de caja chica 2024, cuyos informes finales fueron remitidos oportunamente. También se completó la Auditoría a la gestión de peritos de compras y contrataciones, y la Auditoría de Seguridad Industrial, ambas con ejecución total. En contraste, la Auditoría de contratos de servicios 2024 quedó con informes pendientes de remisión, programados para el cuarto trimestre.

Las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de enero a septiembre 2024 fueron revisadas en su totalidad. Cada mes se cumplió con la emisión de los informes de conciliación dentro de los plazos establecidos, garantizando un control financiero confiable y transparente.

En cuanto al seguimiento a planes de acción, se logró un 100% de cumplimiento. Esto incluyó la incorporación de hallazgos de auditorías previas y la comunicación de puntos abiertos a las áreas responsables, con el fin de asegurar la atención y cierre de las observaciones señaladas. Cada revisión mensual se completó conforme al cronograma, lo que permitió emitir los informes respectivos en tiempo y forma.

Finalmente, en el área de supervisión de obras, se realizó la verificación de 16 proyectos adjudicados en ejecución. Entre ellos destacan proyectos de infraestructura social y administrativa que fortalecen la operatividad institucional. Las visitas de campo realizadas en septiembre permitieron levantar información directa sobre los avances físicos, y todo el proceso se consolidó en el Informe Trimestral de Obras, entregado a la alta dirección el 30 de septiembre de 2025.

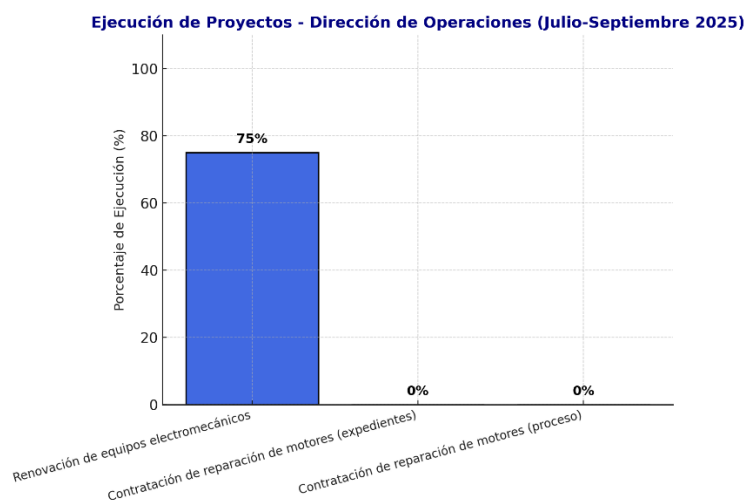

Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica tiene como misión garantizar la seguridad legal de la institución mediante una gestión eficiente y transparente de los procesos contractuales y de los bienes inmuebles. Para cumplir con estos objetivos se desarrollan proyectos estratégicos orientados a la optimización administrativa y a la regularización de activos. Dichos proyectos se dividen en tareas específicas con tiempos definidos y ponderaciones que permiten medir el avance real de su ejecución, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.

Optimización de la Gestión Administrativa

El proyecto "Optimizar la Gestión Administrativa" busca mejorar la trazabilidad, control y eficiencia en el manejo de contratos. Para ello, se han establecido tareas como:

- Revisar el flujo actual de gestión de contratos desde su origen hasta el despacho.
- Identificar cuellos de botella y duplicidades en el proceso.

- Crear y mantener actualizada una base de datos con todos los contratos vigentes y vencidos.
- Establecer alertas para vencimientos y renovaciones.

En el trimestre en curso, este proyecto presenta importantes avances:

- La actualización de bases de datos contractuales registra un 85% de ejecución, lo que garantiza mayor control y acceso a la información legal.
- El establecimiento de alertas para vencimientos y renovaciones avanza en un 80%, fortaleciendo la gestión preventiva de riesgos legales.
- Por otro lado, la revisión de flujos contractuales y la identificación de cuellos de botella se encuentran en un 55% de ejecución, lo que refleja la necesidad de seguir trabajando en la eliminación de duplicidades y en la agilización de procesos internos.

Este proyecto representa un valor estratégico para la dirección, ya que la digitalización y el monitoreo sistemático de contratos fortalecen la seguridad jurídica, optimizan tiempos y reducen riesgos legales.

Registro y Actualización de Bienes Inmuebles


El segundo proyecto en ejecución, "Registro y Actualización de Bienes Inmuebles", está orientado a fortalecer el patrimonio institucional mediante inventarios completos, verificaciones legales y actualización documental. Sus principales tareas son:

- Realizar un inventario con la descripción del inmueble, ubicación y estado.
- Verificar el estatus jurídico de los documentos correspondientes.

En este caso, los resultados muestran:

- Una verificación del estatus jurídico de documentos con un 55% de ejecución, consolidando la seguridad sobre los activos institucionales.
- Un avance del 40% en el inventario de inmuebles, lo cual sienta las bases para una regularización integral de la propiedad institucional.

Este proyecto garantiza certeza legal sobre el patrimonio de EGEHID, facilitando además la toma de decisiones estratégicas en relación con el uso, administración y protección de los activos.

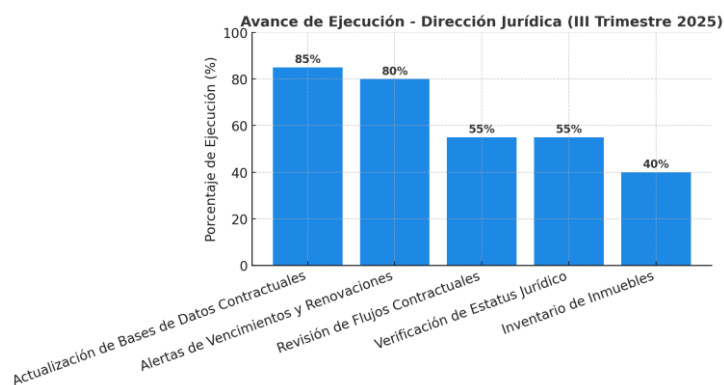

Dirección De Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones mantuvo un ritmo sostenido en la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento del posicionamiento institucional, la gestión editorial y la comunicación digital. El balance muestra avances importantes en campañas publicitarias, una ejecución constante en productos editoriales y un impulso creciente en los contenidos digitales.


En estrategias de campañas publicitarias para el posicionamiento institucional, la mayoría de las fases de planificación y diseño ya se habían completado en el primer semestre, por lo que en este trimestre se concentraron esfuerzos en la colocación en medios, supervisión y seguimiento de impactos, que alcanzó un 50% de ejecución. Esta labor aseguró continuidad a las campañas aprobadas, garantizando su difusión en prensa, radio, TV y medios digitales.

Respecto a la gestión de productos editoriales institucionales, las tareas principales (producción, validación y publicación de contenidos) alcanzaron niveles de ejecución cercanos al 50%. Este avance refleja un trabajo sostenido en la elaboración de boletines, informes y otros materiales de comunicación interna y externa. Aunque el progreso ha

sido gradual, mantiene un desarrollo alineado con los objetivos establecidos en el cronograma anual.

En cuanto a la gestión de contenidos para redes sociales y medios digitales, se observa una mayor dinámica en este trimestre. La redacción, diseño y publicación de piezas para redes sociales muestran porcentajes de ejecución entre 40% y 63%. Este desempeño evidencia un esfuerzo enfocado en mantener activa la presencia institucional en plataformas digitales, diversificando los formatos de comunicación (videos, imágenes, carruseles, reels) y ampliando los indicadores de alcance y engagement.

En conclusión, durante el tercer trimestre de 2025 la Dirección de Comunicaciones consolidó los proyectos iniciados en etapas previas, con resultados destacados en campañas publicitarias y un crecimiento sostenido en el ámbito digital. No obstante, las líneas editoriales requieren reforzar la velocidad de ejecución para asegurar un mayor nivel de cumplimiento hacia el cierre del año.



Gerencia De Bienestar Social

El trimestre julio–septiembre estuvo marcado por avances significativos en la ejecución de proyectos estratégicos, alcanzando un promedio general de avance físico del 41% y financiero del 45%. Este resultado evidencia la continuidad de los programas previstos en el Plan Operativo Anual (POA 2025), consolidando la presencia institucional de la empresa en las comunidades de influencia de las centrales hidroeléctricas. Se fortaleció la articulación con las Gerencias de Bienestar y de Calidad de la Gestión, impulsando la revisión y actualización de procedimientos orientados a obtener la certificación ISO 26000 en materia de responsabilidad social.

Entre los proyectos más relevantes del trimestre se destacan aquellos orientados al fortalecimiento del programa de desarrollo comunitario, mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura social en zonas de influencia, y la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación de los programas de bienestar y participación ciudadana. También se avanzó de manera importante en la ejecución de los planes de emergencia para comunidades hidroeléctricas, con el objetivo de garantizar la resiliencia y la seguridad ante eventos naturales, así como en la coordinación con instituciones locales para la prestación de servicios básicos y el mantenimiento de infraestructuras esenciales.

En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, se promovieron espacios de participación y diálogo con líderes comunitarios, asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos y organizaciones sin fines de lucro. Estas acciones fortalecieron la confianza institucional y permitieron alinear las intervenciones sociales con las necesidades reales de las comunidades beneficiarias. De igual forma, se impulsaron iniciativas orientadas al fomento de la educación, la cultura, el deporte y la protección ambiental, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030

Durante este trimestre, también se logró la suscripción de nuevos acuerdos de colaboración en áreas de infraestructura y deporte, lo que permitirá ampliar las oportunidades de desarrollo local, especialmente en comunidades jóvenes, mediante la mejora de instalaciones y el

impulso de actividades deportivas como vehículo de inclusión social, salud y cohesión comunitaria.

Un logro adicional de alto impacto fue el inicio del proyecto “Ruta Azul” en las 10 provincias del sur del país, una iniciativa estratégica que articula el desarrollo sostenible, el ecoturismo y la protección ambiental. Este proyecto no solo promueve la conservación de los ecosistemas acuáticos y la valorización del patrimonio natural y cultural del sur, sino que también dinamiza las economías locales mediante la generación de empleos verdes y el fortalecimiento de capacidades comunitarias.

De igual forma, se continuaron impulsando iniciativas orientadas al fomento de la educación, con nuestro programa educativo con el suministro de combustible a las asociaciones de estudiantes.

Secretaria General

En el transcurso del tercer trimestre del año 2025, secretaria general concentró sus esfuerzos en la tramitación documental, la gestión de archivo histórico y la adquisición de materiales de oficina y secretaría. Estas acciones son claves para garantizar la continuidad operativa de la institución y el respaldo de sus procesos internos.

Tramitación de comunicaciones internas

Los proyectos de tramitación de las comunicaciones internas avanzaron de forma sostenida, alcanzando un 60% de ejecución promedio. Se priorizó la distribución de documentaciones entre áreas e instituciones, así como el escaneo y la salvaguarda digital de expedientes. Esto representa un avance importante hacia la modernización administrativa y el respaldo electrónico de la información.


Gestión documental y archivo histórico

En paralelo, se dio seguimiento al descargo de documentación de las diferentes áreas hacia el archivo central y la posterior transferencia al archivo histórico. Estas tareas mantuvieron un nivel de ejecución del 60%, consolidando un control más riguroso de los expedientes, con orden secuencial y cronológico. Esta gestión asegura la preservación de

documentos institucionales y facilita el acceso a la información cuando es requerida.

Adquisición de materiales de secretaría

Otro eje de acción relevante fue la adquisición de materiales gastables de secretaría y archivo (solicitud de cajas, soplpeed, fichas técnicas y suministros básicos). Estas actividades se mantuvieron en ejecución con un 50% de cumplimiento promedio, lo que garantiza la provisión de insumos esenciales para el funcionamiento interno de las distintas dependencias.



Dirección De Seguridad Militar

La Dirección Militar ha consolidado durante este trimestre un desempeño ejemplar en la gestión de seguridad y abastecimiento, alcanzando la ejecución total del 100% en todos los proyectos planificados. Esta dirección constituye un pilar estratégico para la institución, ya que asegura tanto la protección física de las instalaciones hidroeléctricas como la operatividad del personal destacado en las mismas.

Uno de los ejes más relevantes fue el abastecimiento de armas y municiones, que representó el 62.5% de la ponderación total. Su ejecución integral garantiza la disponibilidad de recursos estratégicos para la defensa de infraestructuras críticas, reforzando la capacidad de respuesta y disminuyendo riesgos operativos. Este logro refleja una correcta planificación logística y un cumplimiento riguroso de los estándares de seguridad establecidos.


En paralelo, se desarrolló el abastecimiento de raciones alimenticias agrícolas y no agrícolas, que correspondió al 25% del peso total de la planificación. Este proyecto incluyó la planificación, distribución y entrega de insumos para el personal militar, asegurando su bienestar y continuidad en las labores de custodia. La conclusión exitosa de estas tareas contribuye directamente a la moral, disciplina y rendimiento del personal asignado en campo.

Finalmente, el Plan de Seguridad Integral y Funcional de la Dirección Militar, con un 12.5% de la ponderación, también fue culminado de forma satisfactoria. Este plan incorporó medidas preventivas y correctivas orientadas a mitigar riesgos, fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad tanto en las instalaciones como en sus áreas de influencia. Su implementación refuerza la confianza en la solidez institucional de EGEHID frente a eventuales contingencias.

En términos globales, la Dirección Militar logró un equilibrio entre planificación y ejecución, traducido en una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos estratégicos de la institución. La concentración de esfuerzos en el suministro de armamento y municiones evidencia su prioridad dentro del esquema de seguridad,

mientras que el soporte alimenticio y los planes de seguridad integral complementan de manera armónica las operaciones.

Distribución Ponderada de Proyectos - Dirección Militar



Libre Acceso A La Información

Servicio al ciudadano y transparencia institucional

1. Nivel de la satisfacción con el servicio

Resultado del monitoreo de la Carta Compromiso durante el año, todo en orden con este tema, están en cumplimiento todos los involucrados.

En cuanto a las encuestas de satisfacción a nivel interno y externo todo va bien, hasta la fecha no tenemos ninguna queja.

Estadísticamente estamos bien posicionados.

Nuestros Planes de acción para mejora y porcentaje de ejecución a la fecha es seguir vigilantes, persistentes y en cumplimiento de la Ley que nos rige, que es la 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

2. Nivel de cumplimiento acceso a la información

Durante el periodo julio – septiembre 2025 recibimos la cantidad de veintiuna (21) solicitudes de información, diecisiete (17) vía electrónica y cuatro (04) solicitudes vía físico, las cuales fueron atendidas y resueltas satisfactoriamente a excepción de una (01) que se encuentra en proceso de contestación.

3. Resultados sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias.

Referente al Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (311), en este periodo, recibimos una (01) queja, la cual fue resuelta satisfactoriamente.

4. Resultados mediciones del portal de transparencia

Considerando, que el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la Republica Dominicana, y que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración. En este punto estamos en cumplimiento, tanto así, que mes tras mes estamos trabajando para obtener la máxima puntuación otorgada por el SAIP por el cumplimiento de los estándares de transparencia.

Matriz de cumplimiento trimestral POA 2025

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto reparación, remodelación y construcción de área en iglesia católica Santa Lucia.	ubicada entre calle 19 de marzo y parque recreativo en el municipio de las matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,400,797.03	30%	30%	30%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,065,343.93	30%	20%	50%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos	DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,364,306.06	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial	Distrito Municipal Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$19,937,171.87	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel	C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$2,400,000.00	20%	20%	30%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,948,661.40	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$3,429,603.03	40%	25%	20%	85%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cancha en Sabaneta.	municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$6,445,202.41	20%	20%	20%	60%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Edificaciones Varias.	C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$6,319,736.62	30%	30%	30%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Bohechío.	Municipio Bohechío, Provincia San Juan	\$52,722,098.79	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez.	DM Amiama Gómez, provincia Azua. (Magüeyal)	\$5,504,959.36	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play de Beisbol.	Municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$17,432,951.03	20%	20%	30%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria.	Municipio Magueyal, provincia Azua.	\$5,119,612.20	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Militar Caracoles.	Provincia Azua.	\$8,455,572.33	20%	20%	30%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de parque en barrio El Blanco.	Municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$4,621,975.37	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Policial Magueyal.	Provincia Azua.	\$14,401,138.76	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Verja Perimetral Cementerio.	Municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$5,663,094.60	20%	30%	25%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	Municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	\$7,371,781.09	50%	20%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama.	Municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$9,854,889.19	20%	25%	25%	70%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Rehabilitación de Obras Civiles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San José.	Municipio Duverge, provincia Independencia.	\$26,485,034.93	30%	30%	30%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Destacamento Militar Miramar.	Provincia Pedernales.	\$5,865,340.95	50%	25%	25%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto construcción de Funeraria Najayo Arriba.	Provincia San Cristóbal.	\$13,244,808.17	25%	25%	50%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto solución Agua Potable en Comunidades Vista Hermosa.	Comunidades Vista Hermosa, La Plata y La Cuchilla, Villa Altigracia, San Cristóbal, R.D.	\$5,368,373.57	30%	30%	25%	85%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altigracia, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$12,050,947.84	30%	30%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$5,191,211.76	40%	30%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parqueos.	Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$4,204,108.13	30%	40%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén.	C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$6,586,474.55	30%	30%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$4,186,000.00	30%	30%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Unidad de Atención Primaria La Plena.	Provincia San Cristóbal.	\$14,038,530.39	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y	Construcción Multiuso Cambita El Pueblecito.	Provincia San Cristóbal.	\$55,732,285.54	10%	10%	10%	30%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Rehabilitación de Obras Civiles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Cambita, Provincia San Cristóbal.	\$39,228,669.90	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remoción y Construcción acera Perimetral con Adoquines, Bulevar Turístico y Cultural, Jardinería Externa, Liceo Musical Pablo Claudio.	Municipio de San Cristóbal, Prov San Cristóbal	\$11,976,273.74	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Mata Gorda.	Municipio Bani, Provincia Peravia. (Antigua Sabanita Caliente)	\$5,958,891.51	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro Comunal Rio Arriba.	Provincia Peravia.	\$6,757,880.76	5%	20%	5%	30%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Policial Santana.	Municipio de Santana, Provincia Peravia, Rep. Dom.	\$24,068,848.87	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	Municipio de Bani, Provincia Peravia.	\$18,429,148.04	30%	30%	10%	70%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio.	Nizao, Provincia Peravia	\$11,298,515.41	5%	2%	5%	12%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia San Gregorio Magnún.	Provincia Peravia,RD	\$12,330,570.19	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$17,267,651.34	30%	30%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$16,031,992.23	40%	40%	20%	100%
Dirección de Mantenimiento y	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	Provincia San José de Ocoa.	\$17,342,549.56	20%	20%	60%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Rehabilitación de Obras Civiles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Verja Perimetral en Las Casetas de Sonador, Blanco, Arroyon, y en la Válvula Mariposa y Cisterna de Enfriamiento en Casa de Maquinas, C.H. Pinalito, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	C.H. Pinalito, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$2,500,000.00	15%	5%	15%	35%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Comedor y Almacén	C.H. Rio Blanco, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$10,360,090.31	30%	30%	30%	90%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal	Municipio Sabana del Puerto, Provincia Monseñor Nouel.	\$6,294,498.55	50%	25%	25%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro.	Municipio Jayco, Provincia Monseñor Nouel.	\$2,645,311.33	25%	25%	50%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Jayaco.	Bonao, Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	\$17,436,879.34	20%	20%	28%	68%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto.	Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel.	\$14,394,128.86	25%	25%	30%	80%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal.	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega.	\$5,504,959.36	40%	30%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera.	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega	\$6,596,804.39	15%	25%	25%	65%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén.	C.H. Constanza, Municipio Constanza, Provincia La Vega.	\$5,903,911.87	40%	40%	20%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas.	Municipio de Yuna, Provincia La Vega.	\$11,792,991.65	30%	30%	20%	80%
Dirección de Mantenimiento y	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera.	Municipio de Constanza, Provincia La Vega	\$15,615,034.63	30%	40%	30%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Rehabilitación de Obras Civiles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remodelación del Play de Baseball La Estancia.	DM Quita Sueño, Municipio Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$18,725,606.55	40%	30%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Policlínica en el DM Quita Sueño.	Municipio DM Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$10,000,000.00	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos.	Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$15,665,888.09	30%	10%	40%	80%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias .	C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$9,400,531.19	45%	45%	10%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Militar Matancitas.	Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$7,331,676.19	20%	20%	35%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas.	Municipio de San José de Las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$22,269,416.53	15%	15%	25%	55%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria en Las PlacetaS.	Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$15,997,717.00	0%	35%	40%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de Capilla de Fátima.	Municipio Navarrete, Provincia. Santiago de los Caballeros.	\$6,639,145.51	35%	35%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia.	Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$23,756,214.36	25%	10%	40%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria en Caimito.	Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$16,178,054.23	15%	20%	15%	50%
Dirección de Mantenimiento y	Construcción Salón Comunal en Juncalito.	DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,434,472.01	18%	25%	30%	73%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Rehabilitación de Obras Civiles							
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,042,053.99	35%	35%	15%	85%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,345,593.62	30%	5%	10%	45%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel López - Angostura.	Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$5,631,199.33	25%	25%	25%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria en Laguna Salada.	Municipio Laguna Salada, Prov. Valverde, Rep. Dom.	\$5,202,186.60	35%	40%	25%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza.	Municipio Esperanza, Provincia Valverde, R.D.	\$11,835,102.79	25%	25%	25%	75%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Baseball Arroyo Cano.	DM Arroyo Cano, Provincia San Juan	\$29,535,152.43	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Proyecto Casona Seminario Nuestra Señora de las Mercedes.	Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Palacio Municipal La Siembra.	Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro Comunal Boca de Mana, Yaguate.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa Club, Rehabilitación Cancha, Rehabilitación Play y Rehabilitación Iglesia Católica.	DM Hato del Yaque, Villa Bao, Provincia Santiago	\$0.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Oficinas Administrativas, Rehabilitación cocina-comedor	C.H Angostura y Construcción Cuartel en Presa López	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Centro Comunal Las Coles.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa Operadores y Técnicos.	C.H Sabana Yegua	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Provincia San Cristóbal	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino	CH Palomino	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cañada Caquito, Sección Boruga.	Hato Damas San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball en Boca de Blanco.	Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Cruce de Blanco.	Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Centro Comunal Semana Santa y Rehabilitación Centro Comunal Punta de La Peña.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Viviendas Campamento.	C.H Angostura	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Funeraria Boca de Mana.	Yaguaje San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Viviendas Campamento y de la Casa Club .	C.H Tavera, Santiago	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Casa de La Cultura.	Municipio de Palenque, San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play Los Quemados.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play Arroyo Toro.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción casa de operadores en captación Tireito.	C.H. Rio Blanco		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de un centro Comunal y Vivero Agroforestal.	Presa Guayubín		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Country Club Villa Altagracia.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque y Media Cancha Comunidad Contraembalse.	Yaguate, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Municipal de Yaguate y Remodelación Parque Infantil Jose Maria Rivas Bonilla Yaguate.	Yaguate, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Estadio Temístocles Metz San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cementerio Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Compra Mobiliarios y Equipos DMROC			0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Funeraria Sabana Palenque	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación centro comunal Junta de Vecino La Unión.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación centro comunal Cumia Abajo San Cristóbal	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Yabonico.	Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa de Empleados.	CH Domingo Rodríguez Santiago de los Caballeros		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Play de Beisbol Punta Caña.	D.M. Pedro Corto san Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Viviendas y Construcción Caseta Planta de Bombeo.	Campamento CH. Angostura		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Play de Softball San José.	Sabaneta, Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Club Vallecito, Club Arroyo Blanco, Mercado Reconstrucción del piso de la iglesia católica Corazón De Jesus, Meseta Arriba Mención, Centro de Madres Palero.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro Comunal El Vallecito. Rodríguez	Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Boca de los Ríos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro Comunal Los Tabacos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Comunidad El Pastor, San Ignacio de Sabaneta, Construcción Capilla, Reparación Club.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción 50 Viviendas en Centro Poblado Presa de Los Ríos (Adjudicado)	Municipio Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación Edificio campamento de empleados Complejo Monción y Malla Perimetral en el muro del contraembalse.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda,	Matayaya, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remodelación edificación para alojar Sub-Administración y oficinas de Energía Renovable y Medio Ambiente.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remozamiento, redistribución interna del edificio sede EGEHID y construcción edificio comedor y salón multiuso.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Beisbol Sector los Parceleros Municipio Azua Prov. Azua.	Municipio Azua Prov. Azua.		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque Ecológico las caobas.	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$149,482,201.02	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque Ecológico Santa Rita, sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$30,444,834.57	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de 3 Canchas en Comunidades de Doña Ana	Provincia San Cristóbal	\$32,662,654.02	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Lechería.	Municipio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal	\$23,279,449.25	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Pueblo Nuevo.	Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan	\$39,094,964.55	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Presa Monte Grande.	Provincia de Barahona	\$81,984,025.10	15%	10%	5%	30%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Canchas múltiples, en centro poblado presa monte grande.	Provincia Barahona	\$22,880,243.40	20%	0%	0%	20%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play el Fundo.	Municipio Villa Los Almacigo, Provincia Santiago Rodriguez	\$29,155,095.31	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente.	Provincia San Cristóbal	\$39,004,085.85	10%	5%	15%	30%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$3,219,156.35	5%	5%	5%	15%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$3,270,179.00	40%	40%	20%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Escuela Penitenciaria de San Cristóbal	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Adventista Séptimo Día.	Prov San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Templo Nuestra Señora Del Rosario y Construcción Escuela Laboral.	DM El Rosario, Prov San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Católica EL Palmar, Prov San Juan	Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Pagos de (Seguros de Fianzas) de los Proyectos Hidroeléctricos		\$ 189,654.19	40%	40%	5%	85%
Dirección de Gestión Ambiental	Inspección y levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID.		\$ 566,252.54	30%	25%	15%	70%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Reciclaje de Desechos Sólidos		\$ 1,095,091.20	20%	20%	20%	60%
Dirección de Gestión Ambiental	Programa de Concienciación y Sensibilización Ambiental en EGEHID		\$ 108,834.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración institucional entre (EGEHID) y el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (COAJA)		\$ 1,920,600.00	50%	10%	10%	70%
Dirección de Gestión Ambiental	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas		\$ 2,302,101.00	35%	30%	30%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Restauración de la Subcuenca del río San Juan - Proyecto Sabaneta-		\$ 74,829,913.75	0%	0%	40%	40%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Apoyo Penitenciario a la Gestión Ambiental		\$ 536,022.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Reforestación de cuenca Hidrográfica		\$ 1,716,900.00	40%	25%	15%	80%
Dirección de Gestión Ambiental	Creación de un banco de semillas forestales y de brigadas de recolección de semillas		\$ 139,680.00	70%	10%	10%	90%
Dirección de Gestión Ambiental	Producción de Abono Orgánico		-	20%	10%	14%	44%
Dirección de Gestión Ambiental	Acciones de Apoyo a la prevención de incendios forestales		-	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Piscícola		\$ 1,507,380.00	30%	30%	23%	83%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Pago por Servicios Ambientales Hídricos, Cuenca Río Yaque del Norte. Ministerio de Medio Ambiente-COORAASAN-EGEHID.		\$ 12,736,197.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación interinstitucional entre EGEHID y COAJA para el Programa de Gestión Integrada para la Mejora en la Calidad y Cantidad del agua del rio Yaque del Norte con enfoque en desechos solidos		\$10,650,600.00	30%	15%	15%	60%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID y la Federación de Campesinos hacia el Progreso (FCHP)		\$ 2,677,200.00	30%	20%	25%	75%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y las Hermanas Dominicanas de Monteils en la República Dominicana		\$ 1,746,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID - Asociación de Caficultores La Independencia (ASOCAIN)-INDOCAFE		\$ 7,915,200.00	35%	20%	22%	77%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo entre EGEHID y el Consejo de Administración de la Presa de Monción (CONAPREMON)		\$ 2,095,200.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Ambiental	Fumigación y control de insectos y roedores en centrales y edificaciones		\$ 8,380,800.00	30%	30%	30%	90%
Dirección de Gestión Ambiental	Recuperación de Cuenca Alta Yaque del Norte		\$ 1,746,000.00	30%	20%	25%	75%
Dirección de Gestión Ambiental	Fortalecimiento de la gobernanza climática y la seguridad hídrica en la cuenca del Río Nizao, para el aumento de la resiliencia climática		\$ 1,746,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de raciones alimenticias agrícolas y no agrícolas para el personal militar asignado a las diferentes presas y centrales hidroeléctricas	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de armas de fuegos y municiones	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de prendas de vestir y pertrechos militares para el personal militar asignado a la egehid	Nacional		30%	20%	30%	80%
Dirección de Seguridad Militar	Plan de seguridad integral y funcional de la direccion militar	Nacional		30%	40%	30%	100%
Logística	Equipamiento del almacén principal de la EGEHID	Distrito Nacional		20%	40%	20%	80%
Logística	Inventario General de los almacenes a nivel nacional de la EGEHID.	Nacional		20%	30%	30%	80%
Logística	Suministro a todas las unidades de la empresa de material gastable de oficina y limpieza	Nacional		30%	20%	20%	70%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLIDORA DE MATERIALES, HHERRAMIENTAS YEQUIPOS FERREROS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES	Nacional	\$13,544,720.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS A LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICA.		\$489,304.00	30%	20%	10%	60%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS ELECTRICOS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$16,494,025.00	10%	20%	40%	70%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLIDORA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.		\$40,813,550.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	RENOVACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	Nacional	\$74,487,561.00	75%	10%	0%	85%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTROMECHANICOS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	Nacional	\$47,418,566.00	25%	45%	0%	70%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$2,910,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PLANES OPERATIVOS (POA) DEL 2025 DE LAS CENTRALES.	Nacional	\$-	20%	20%	10%	50%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$27,643,297.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA TEMPORADA CICLONICA PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$989,400.00	30%	30%	20%	80%
Dirección de Operaciones	CANTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE CALIBRACION, DE FRESADORAS Y TORDOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES		\$1,746,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICO DIESEL DE LAS DIFRENTES CENTRALES.	Nacional	\$5,529,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUCEO EN POZOS SUBMARINOS EN DIFERENTES CENTRALES.	Nacional	\$4,656,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS.	Nacional	\$3,201,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA UATOMATIZACION DE PLC PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL PINALITO.	Monseñor Nouel	\$5,238,000.00	0%	0%	0%	0%
Contraloría	Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	Nacional	\$600,000.00	30%	30%	30%	90%
Contraloría	Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	Nacional	\$700,000.00	20%	20%	20%	60%
Contraloría	Análisis e inspección del buen funcionamiento de controles de validación de nómina.	Nacional	\$500,000.00	20%	25%	20%	65%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN, AMBAS UNIDADES CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$51,492,000.00	20%	10%	20%	50%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL A AMBAS UNIDADES Y REHABILITACION DE INSTRUMENTACION, CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$75,600,000.00	10%	10%	10%	30%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA MEDIA TENSION, CENTRAL ANGOSTURA.	Santiago	\$42,000,000.00	10%	10%	10%	30%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI A AMBAS UNIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA CENTRAL VALDESIA.	Peravia	\$58,760,000.00	10%	10%	40%	60%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO GENERADOR, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SUSTITUCIÓN CABLES URD GENERADOR AL TRANSFORMADOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA).	María Trinidad Sánchez	\$38,460,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN DE LA CENTRAL SABANETA.	San Juan	\$35,000,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION BLOQUES DE PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES. LOPEZ ANGOSTURA, LAS DAMAS, RINCON, SABANA YEGUA, SABANETA, TAVERA, JIGUEY Y HATILLO.	Nacional	\$17,860,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI, CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ.	San Juan	\$50,530,000.00	20%	10%	20%	50%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL PLC A AMBAS UNIDADES Y HMI DE LA CENTRAL JIGUEY.	San Cristóbal	\$65,500,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS RELES DE PROTECCIONES PARA DIFERENTES CENTRALES. TAVERA, LOPEZ ANGOSTURA, RINCON, HATILLO, LINEAS DE VALDESIA, JIGUEY, SABANETA Y SABANA YEGUA.	Nacional	\$55,000,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	FABRICACIÓN DE UN JUEGO DE 6 CONTACTOS FIJOS EXTERIOR PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA NUOVA MAGRINI GALILEO, TIPO 17 GL 31, PARA SER USADOS EN EL INTERRUPTOR DE SINCRONIZACIÓN UNIDAD NO. 2 EN LA CENTRAL JIGÜEY.	San Cristóbal	\$1,750,000.00	40%	40%	20%	100%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS COMPONENTES DE LOS INYECTORES DE LAS TURBINAS, CENTRAL PINALITO.	La Vega	\$30,500,000.00	30%	30.00%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALISTA PARA LA INSTALACIÓN DEL RODETE, PALETAS DIRECTRIZ, LABERINTOS Y COJINETES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL JIGUEY.	San Cristóbal	\$20,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE COMPONENTES DE LAS VALVULAS ESFERICAS Y COMPUERTAS DE TOMA DEL CONTRAEMBALSE DE MONCION.	Santiago Rodríguez	\$5,720,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN COMPLETA, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TURBINA DE LA UNIDAD I, RODETE Y COMPONENTES SOMETIDOS A DESGASTE, CENTRAL AGUACATE.	San Cristóbal	\$90,000,000.00	30%	30%	20%	80%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION VALVULA MARIPOSA, CENTRAL EL SALTO.	La Vega	\$900,000.00	75%	0%	0%	75%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA DE LA CENTRAL HATILLO.	Sánchez Ramírez	#####	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION TURBINAS DE AMBAS UNIDADES. CAMBIO DE 2 RODETES Y PARTES SOMETIDAS A DESGASTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, CENTRAL RIO BLANCO.	Monseñor Nouel	#####	10%	10%	10%	30%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE SELLOS A LOS MUÑONES DE LAS VALVULAS ESFERICAS EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL MONCION.	Santiago Rodríguez	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE EQUIPOS DE LA TURBINA, CENTRAL BRAZO DERECHO.	Valverde	\$50,000,000.00	10%	10%	10%	30%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA, CENTRAL SABANETA.	San Juan	\$60,000,000.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS SELLOS DEL EJE EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL LOS TOROS.	Azua	\$4,000,000.00	100%	0%	0%	100%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DE LAS OCHO AGUJAS Y OCHO ASIENTOS DE LOS INYECTORES, CENTRAL PINALITO.	La Vega	\$950,000.00	40%	40%	20%	100%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION Y MODERNIZACION PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA VALDESIA.	Peravia	\$30,000,000.00	40%	10%	10%	60%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRUA, CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$100,000,000.00	40%	20%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTORES DE MEDIA TENSION DE LINEA, 12470V, 15KV. C.H. LAS BARIAS, DOMINGO RODRIGUEZ Y RINCÓN.	Nacional	\$9,000,000.00	40%	20%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTOR 145 KV, TANQUE VIVO 1200A, CENTRAL TAVERA	Santiago	\$20,000,000.00	30%	30%	40%	100%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA INHIBIR A 14 TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	Nacional	\$12,000,000.00	35%	35%	30%	100%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DESDE SABANETA HASTA HATILLO	Nacional	\$5,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN LÍNEA DE PRESA 13.8KV, CENTRAL JIGUEY.	San Cristóbal	\$25,000,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE CT'S, PT.S. SUBESTACIÓN HATILLO 1 Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA.	Sánchez Ramírez	\$4,914,000.00	40%	40%	20%	100%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL LAS DAMAS.	Independencia	\$25,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.	Nacional	\$3,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCIÓN DE 18 TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$1,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	ELECTRIFICACION CIRCUITO EXCLUSIVO C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA) - PAYITA - LOS DRAGOS - ARROYO EL MEDIO.	María Trinidad Sánchez	\$150,000,000.00	0%	0%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO A LAS REDES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$12,000,000.00	0%	71.42%	0%	71%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL HATILLO 1.	Independencia	\$25,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FISIQUMICOS A TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CENTRALES	Nacional	\$1,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 400KVA CON TODOS SUS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL EGEHID.	Distrito Nacional	\$1,860,000.00	40%	40%	20%	100%
Gerencia de Bienestar Social	Elaboración y aplicación de políticas y procedimientos de Gestión Social de acuerdo con los estándares internacionales (ISO 26000).	Nacional	\$25,000.00	0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Desarrollo de programas integrales de responsabilidad social en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Nacional	\$75,000.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Gerencia de Bienestar Social	Crear los mecanismos para diagnosticar, monitorear y evaluar los programas de bienestar y beneficios sociales en los proyectos.	Nacional	\$20,000.00	0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Robustecer el programa desarrollo de infraestructura en las comunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades dentro del área de influencia de las centrales hidroeléctricas, las actuales y las que están en proyecto de construcción, mediante la suscripción de acuerdos con las alcaldías y gobernación de esas demarcaciones.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Desarrollar planes de emergencia por desastres para las comunidades dentro del área de influencia de las centrales hidroeléctricas, de forma que se facilite la prestación de servicios de básicos y se garantice el suministro de bienes y servicios necesarios.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Diseñar y ejecutar un programa de salud y seguridad integral de la comunidad.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Diseñar y ejecutar la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria, en asentamientos vulnerables y susceptibles a la mejora.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Gerencia de Bienestar Social	Ejecución del plan de relaciones comunitarias en los proyectos que se ejecutan a nivel nacional.			0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	REPARACIÓN DE LOS CHILER 1 Y 2, DEL SISTEMA DE AC EN EL EDIFICIO SEDE.	Santo Domingo		40%	40%	20%	100%
Dirección Administrativa	Proceso Anual de Abastecimiento de Combustibles en las Instalaciones de la EGEHID.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Mantenimiento y calibración de las Estaciones de Abastecimiento de Combustible y Maquina de recibir el combustible en la EGEHID.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Adquisición de los recibos de Tickets para el despacho y control de combustible de quitasueño.	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Acondicionamiento de la Estación de combustible de Quitasueño.	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Ejecución de mantenimientos correctivos de la flotilla vehicular en talleres externos	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Equipamiento del Tool-Room del taller mecánico	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Plan de abastecimiento de kit de seguridad a la flotilla vehicular	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Plan de abastecimiento de lubricantes para mantenimientos vehiculares.	Nacional		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección Administrativa	Ejecución del suministro de baterías para la flotilla vehicular	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Plan de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Implementación de cambio, alineación y balanceo de neumáticos de la flotilla vehicular en empresa externa	Santo Domingo		40.00%	40%	20%	100%
Dirección Administrativa	Plan de sustitución y/o modernización de la flotilla vehicular EGEHID	Nacional		10%	10%	50%	70%
Dirección Administrativa	Plan de rotulación de la flotilla vehicular	Nacional		50%	20%	10%	80%
Dirección Administrativa	Plan de control y monitoreo de flotilla vehicular a través de plataforma geolocalizador (GPS)	Nacional		30%	10%	10%	50%
Dirección Administrativa	Proyecto de instalación de área para reparación y manejo de neumáticos de la flotilla vehicular	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Plan de instalación de motores y transmisiones automáticas y mecánicas a la flotilla vehicular	Nacional		50%	10%	10%	70%
Dirección Administrativa	PLAN DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES ELECTRICOS (PLANTA ELECTRICA) Y ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE ESTOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, DDH, DDH Y QUITASUEÑO	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE FACILITE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE ASCENSORES DE LA EMPRESA	Santo Domingo		76.66%	10%	10%	97%
Dirección Administrativa	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA Y EQUIPOS PARA LOS TECNICOS DEL ÁREA	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	PLAN DE SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA USO DE LA EMPRESA	Santo Domingo		93.33%	5%	0%	98%
Dirección Administrativa	PLAN DE SUSTITUCIÓN DE PLAFON PARA USO DE LA EMPRESA	Santo Domingo		0	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DDH, CCH Y QUITA SUEÑO	Santo Domingo		40%	40%	20%	100%
Dirección Administrativa	INVENTARIO PARA INSPECCION DE MATRICULA, PLACA Y SEGURO DE LOS VEHICULOS DE NUESTRA FLOTILLA	Nacional		40%	40%	20%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección Administrativa	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO SEDE	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	GESTION DE SOLICITUD DE PLACA FINAL DE LA FLOTILLA VEHICULAR	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	GESTION DE MANEJO DE DESECHOS TOXICOS (ACEITES QUEMADOS, BATERIAS, NEUMATICOS)	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección Administrativa	TRANSFERENCIA DE PLACA CIVIL A OFICIAL	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	Contratación de Servicios de Transporte de Empleados para la Sede y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	GESTION DE CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE ASEGURADORA DE POLIZAS PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	GESTIONAR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA OFICINAS Y COCINAS	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección Administrativa	EJECUCION DEL SUMINISTRO DE UNIFORMES A LAS CONSERJES	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y Ejecución de una Consultoría de Implementación de actualización SCADA						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de la Actualización del sistema SCADA.						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación y actualización de los equipos, sensores y demás dispositivos SCADA de las centrales						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de transductores de stock para respuesta rápida a averías (Localización SCADA)						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Instalación de nuevos sensores de nivel y análisis de agua y rehabilitación de las estaciones hidrometeorológicas.						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Construcción / reconstrucción de casetas						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Reemplazo de radios enlaces e implementación de redundancias						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación de sistemas de alimentación eléctrica múltiples para sitios centrales y repetidores.						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación y prueba de fibra óptica y cámaras en las centrales Magueyal, Hatillo y Sabaneta vía servicio tercerizado						0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de antenas satelitales portátiles para asegurar la continuidad de las comunicaciones						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de VHF Digital						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento de la comunicación VHF con la adquisición de radios portátiles y móviles						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de visitas continuas de revisión/mantenimientos rápidos a los sites de telecomunicaciones						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de dos Servicios contratados de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Radio Enlaces, Fibra Óptica						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de un Servicio tercerizado de mantenimiento a torres, pararrayos, aterrizajes y casetas del sistema de telecomunicaciones						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de radios y baterías AGM de contingencia para el reemplazo de los equipos discontinuados y operando con deficiencias.						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Micro- Datacenters para los sites de Centrales						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de equipos y herramientas / renovación de Data Centers (Alterno)						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación de licencias de Firewalls existentes						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de Firewalls						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del cableado estructurado certificado y equipos de red Sede Central						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de Micro Data Centers Sedes Metropolitanas						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramientas de gestión de infraestructura tecnológica para el mantenimiento y la solución efectiva de incidentes y fallas						0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramienta de Gestión y Protección de Identidad y Credenciales de Acceso						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de herramienta de Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación de un stock de contingencia de Cables Fibra Óptica, STP y UTP						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de mantenimiento puntual al sistema de climatización CCH vía servicios tercerizados						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de un equipo de fusión de fibras para repuesta rápida a reparaciones menores						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de revisión/mantenimientos físicos a los data centers						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de un servicio mantenimiento periódico y suministros de componente para UPS, sistemas de climatización y sistemas de supresión de incendios de Data Centers						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Instalación de un generador eléctrico de contingencia para el data center y red de Sede Central						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Nuevos Computadores Personales 2024						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Aseguramiento de niveles de renovación, actualización y usos adecuados de licencias de Microsoft 365						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	OJO Adquisición e implementación de nuevos programas informáticos y licencias para atención de necesidades de los usuarios						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de actualizaciones de versiones y parchos a servidores						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creación y conservación de un stock de partes para computadoras (discos, memorias RAM, mouses, cables, etc.) para rápida solución de problemas						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ampliación del Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.						0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación de pantallas para presentaciones						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución continua de revisión/mantenimientos físicos a estaciones de trabajo y periféricos						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de la Consultoría de implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Mantener actualización trimestral de las licencias de suscripción de SAP S/4 HANA						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de ARIBA						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de Success Factors						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de consultoría de implementación de Ariba y Success Factors						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratación y ejecución de una consultoría de acompañamiento (contraparte) a la implementación de SAP S/4 HANA						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Actualización continua del website de EGEHID						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de nuevas aplicaciones web (Predictibilidad)						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de tecnología RV para tours virtuales de centrales hidroeléctricas						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de Sistema de Administración de Edificios						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Optimización del uso de la consulta del Maestro de Cedulados de la JCE						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de un Servicio de denuncias anónimas						0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Tecnología y Telemática	Sustitución de Carnets con la nueva imagen						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del sistema CCTV de la empresa						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación del sistema de Control de Accesos y Asistencia						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de controles de acceso en áreas críticas						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de NAS, Discos, cámaras para grabación de videos y creación de stock de contingencia CCTV						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de tarjetas de presentación digitales para funcionarios						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecución de capacitaciones en gestión de proyectos vía Educacion Continuada						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Consultoría de Gestión Ágil de Proyectos						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de Sistema de mesa de ayuda y gestión de proyectos SCRUM						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento del índice eTICge/Obtención de certificaciones OGTIC 2025						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de una plataforma de formación y desarrollo de habilidades digitales para los colaboradores						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementación de una plataforma de formación y desarrollo del staff de Tecnología						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Digitalización del Archivo Central						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de solución de acceso de confianza a las redes						0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e implementación de solución de respuesta a incidentes de redes						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovación de switches de telecomunicaciones						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Nuevos Computadores Personales 2025						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de Impresoras de Inyección						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de equipos multimedia						0%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de equipos móviles						0%
Dirección de Comercialización	Adquisición, Instalación y Habilitación de los Transformadores de Corriente (CT) para el Sistema Medición Comercial (SMC) del punto de conexión Consumo de Estación Valdesia	San Cristóbal	\$4,530,000.00	0%	100%	0%	100%
Dirección de Comercialización	Adquisición, Instalación y Habilitación de Medidores del SMC de las Centrales Hidroeléctricas	Nacional	\$22,746,600.00	40%	20%	40%	100%
Dirección de Comercialización	Solicitud de Adquisición de Software Prime Read para Lectura de Medidores	Nacional	\$14,146,907.50	40%	40%	20%	100%
Dirección de Comercialización	Solicitud de Adquisición de Tarjetas de Ethernet	Nacional	\$12,842,433.19	0%	0%	0%	0%
Dirección de Comercialización	Optimización Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	Nacional	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Comercialización	Rediseño de la estructura organizacional de DC	Nacional	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Comercialización	Almacenamiento BESS Solar- PROYECTO PILOTO	Barahona	\$2,500,000.00	10%	80%	10%	100%
Dirección de Comercialización	Automatización de Despachos y Modelados de Energía	Nacional	\$2,500,000.00	10%	67%	0%	77%
Dirección de Comercialización	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	Nacional	\$291,200,000.00	0%	100%	0%	100%
Dirección de Compras y Contrataciones	Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC)	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Compras y Contrataciones	Migración de Compras públicas a Compras bajo procedimiento especial.	Nacional		30%	30%	40%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Compras y Contrataciones	Actualización de organigrama del área de compras	Nacional		40%	20%	40%	100%
Dirección de Compras y Contrataciones	Capacitación de Personal en Compras Estratégicas	Nacional		20%	40%	40%	100%
Dirección de Compras y Contrataciones	Ejecución de Foros de Seguimiento y servicios internos con las áreas.	Nacional		20%	20%	40%	80%
Dirección Jurídica	Optimizar la Gestión Administrativa	Distrito Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección Jurídica	Gestión y Seguimiento de Procesos	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección Jurídica	Registro y actualización de bienes inmuebles.	Nacional		55%	0%	40%	95%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroelectrica Valdesia	San Cristóbal	\$8,000,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroelectrica Sabaneta	San Juan	\$13,000,000.00	30%	20%	20%	70%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroelectrica Rio Blanco	La Vega	\$2,760,000.00	20%	20%	20%	60%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Mantenimiento de impermeabilización en las diferentes Centrales hidroeléctricas: Magueyal, Las Damas, Los toros, Brazo Derecho, Boba, Baiguate, Jimenoa, Tireito, Arroyon, Los Anones, Edificio Sede, Domingo Rodriguez, Jimenoa, Aniana Vargas, DDH, Almacén de suministro, Gerencia de Transportación, Aguacate, Valdesia, Jigüey.	Nacional	2,640,000				0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Adecuación y Remodelación de la Recepción de Transportación	San Cristóbal	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen Central Hidroelectrica los Toros	Azua	\$2,640,000.00	0%	67.50%	0%	68%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Cambios Plafones en las oficinas administrativas / Quita sueño.	San Cristóbal	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y	Colocación de Cubículos en Medio Ambiente, oficina administrativa y oficina de archivo.	San Cristóbal	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Conservación de Infraestructura							
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	Distrito Nacional	\$6,000,000.00	0%	0	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Jigüey	San José de Ocoa	\$2,640,000.00	0%	75%	0%	75%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	Santiago	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	Santiago Rodríguez	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	San Cristóbal	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Boba	María Trinidad Sánchez	\$500,000.00	0%	75%	0%	75%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto Cambio de Imagen corporativa Central Jimenoa	La Vega	\$12,000,000.00	0%	75%	0%	75%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	CEDE PRINCIPAL	\$2,500,000.00	30%	40%	30%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	CEDE PRINCIPAL	\$5,000,000.00	30%	20%	10%	60%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión de inducción a colaboradores sobre procedimientos vigentes	CEDE PRINCIPAL		40%	40%	10%	90%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Creación del Comité de Calidad Institucional y Implementar el Marco Común de Evaluación (CAF)	CEDE PRINCIPAL		20%	25%	30%	75%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentación y actualización de los procesos internos de la EGEHID	CEDE PRINCIPAL		30%	30%	30%	90%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentación de normativas y controles para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), con la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de 1er. Grado	CEDE PRINCIPAL		30%	35%	20%	85%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Investigación y análisis de potenciales socios y alianzas nacionales e internacionales	CEDE PRINCIPAL		30%	30%	40%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	CEDE PRINCIPAL		25%	30%	35%	90%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Contratación de Empresa Consultora para la elaboración de políticas, procedimientos, instructivos, protocolos y formularios de la EGEHID.	CEDE PRINCIPAL		40%	21%	32%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión de las operaciones, los procesos y las actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes	CEDE PRINCIPAL		35%	35%	10%	80%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Análisis de los procesos, e identificación de procedimientos no documentados, para su elaboración	CEDE PRINCIPAL		55%	25%	0%	80%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión de inducción a colaboradores sobre procedimientos vigentes	CEDE PRINCIPAL		25%	40%	35%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Creación del Comité de Calidad Institución al e Implementar el Marco Común de Evaluación (CAF)	CEDE PRINCIPAL	\$200,000.00	35%	30%	30%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión integrar de Riesgos de EGEHID	CEDE PRINCIPAL		45%	30%	25%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Levantamiento y formulación de las políticas, procedimientos, instructivos y formularios de EGEHID por la empresa consultora Gorico Advisory Group	CEDE PRINCIPAL		40%	35%	25%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Plan de Seguridad 2025	CEDE PRINCIPAL		35%	30%	28%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Actualización de estructuras organizativas.	CEDE PRINCIPAL		35%	40%	25%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización de manual de organización y funciones	CEDE PRINCIPAL		45%	30%	25%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Impulsar una unidad organización para la igualdad y equidad de género.	CEDE PRINCIPAL		25%	35%	40%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la planificación estratégica	CEDE PRINCIPAL		30%	35%	35%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre cambios organización ales	CEDE PRINCIPAL		30%	40%	30%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Reformulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Institución al 2025-2028(PEI)	CEDE PRINCIPAL		40%	30%	30%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Solicitud, elaboración, implementación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA). Implementación de indicadores cuantitativos de tiempo, forma, costo, etc.	CEDE PRINCIPAL		35%	40%	25%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del organigrama institucional	CEDE PRINCIPAL		40%	30%	25%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del Manual de Funciones	CEDE PRINCIPAL		30%	30%	40%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaborar la carta compromiso a la ciudadanía	CEDE PRINCIPAL		30%	30%	35%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Diseño e implementación de indicadores de gestión, para medir el desempeño (evolución del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa)	CEDE PRINCIPAL		35%	25%	40%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria Institución al de la Gestión 2020-2024	CEDE PRINCIPAL		40%	30%	25%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria de Gestión Semestral y Anual de la Egehid	CEDE PRINCIPAL		35%	20%	40%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de informe Trimestrales de ejecución de los procesos POA-PACC-Presupuesto 2025	CEDE PRINCIPAL		35%	35%	30%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado De La Calles Salida De Puñal A La Av. Hispanoamericana. Calle Tuto García. Municipio Puñal, Prov. Santiago. (Incluye: Puente vehicular, obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$122,175,266.94	25%	30%	30%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Limpieza Y Rehabilitación del Canal Nizao - Najayo, (Etapa 1) 10km, Prov. San Cristóbal.	San Cristóbal	\$127,511,712.24	20%	40%	20%	80%
Dirección de Proyectos Especiales	Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroelectrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde (Longitud: 1.38 Kms)	Valverde	\$125,497,731.11	30%	30%	10%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Y Asfaltado Calles Centro D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago. (Longitud: 3.696 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$187,258,961.13	20%	20%	20%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera La Auyama (1.83 Kms), El Naranjito (0.895 Kms), Callejón No.1 (0.774 Kms), D.M. La Cuesta, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago. (Longitud: 3.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$98,754,897.15	20%	20%	20%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera La Cuesta - Loma De Los Palos (4.537 Kms), Prov. Santiago, La Cuesta, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 4.537 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$98,876,496.87	25%	25%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Rincón De Piedra-Carrizal, sajoma (Longitud: 3.02 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltica), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago	Santiago	\$137,873,723.38	30%	35%	35%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado Carretera Acceso Presa Palomino, C.H. Palomino, Prov. San Juan	San Juan	\$241,191,458.00	30%	25%	20%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado Carretera Desde CH Monción Hasta Presa Monción, (Tramo III Desde Presa Monción Hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II Desde CH Monción Hasta Contraembalse (3.50 Kms), Alcantarilla Tubular De 30" En Laguna Próxima Al Campamento De Empleados) E Iluminación De La Corona De La Presa, Prov. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$101,018,535.02	30%	30%	10%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Bacheo Y Recapeo Con Carpeta Asfáltica De 2" Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigüey, sección Los Mineros, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.82 kms, ancho promedio: 7.32 m, incluye: Gaviones y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	San Cristóbal	\$72,402,178.90	30%	35%	35%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Carretera Bao-La Galeta, La Hoya-La Virgen Y La Hoya-El Cuartel (6.98 Km), Central Hidroelectrica Lopez Angostura, Municipio Sabana Iglesias, Prov. Santiago, Zona De Impacto: Bao, La Hoya, La Virgen, El Cuartel, Municipio Sabana Iglesias	Santiago	\$91,753,076.44	35%	35%	30%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Carretera La Sabaneta En Sabana Iglesias (6.986 Km), Central Hidroelectrica Tavera-Bao, Municipio Sabana Iglesias, Provincia Santiago.	Santiago	\$47,082,075.03	10%	15%	35%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Sabaneta, Municipio Sabana Iglesias		\$116,955,539.24	0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	CC (Cagüeyes - Juncalito) - Los Corrales - Damajagua Adentro - Las Carreras Abajo - Las Carreras	Santiago	\$89,079,779.16	35%	10%	15%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Boulevard Hatillo (16.20 Km), Central Hidroelectrica Hatillo, Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez, Zona De Impacto: Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez. LOTE I	Sanchez Ramírez.	\$116,854,621.98	20%	20%	20%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Boulevard Hatillo (16.20 Km), Central Hidroelectrica Hatillo, Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez, Zona De Impacto: Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez. LOTE II	Sanchez Ramírez.	\$681,451,456.12	20%	30%	20%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Calles De Pinalito, Municipio de Jánico, Prov. Santiago (6.695 km) incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico	Santiago	\$329,342,515.27	25%	20%	20%	65%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal, República Dominicana	San Cristóbal		20%	20%	20%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de 50 Viviendas en Centro Poblado Presa los Ríos Municipio de Guayubín, Prov. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez		10%	10%	10%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Calles del Municipio Juan de Herrera, Sabaneta, Prov. San Juan, R.D.	San Juan		25%	25%	40%	90%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Carretera D.M. El Rubio - Los Corocitos (14.9 Km), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 14.90 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$692,372,479.43	10%	20%	10%	40%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Carretera Yerba Buena los corrales, Municipio SAJOMA, C.H. Tavera, Santiago.	Santiago	\$384,600,827.31	10%	10%	15%	35%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Puente cajón Sobre Rio Jamey, Hato Dama, San Cristóbal.	San Cristóbal	\$328,217,152.81	10%	10%	10%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción del Puente Sobre el Arroyo los Calimetes, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal. (puente con super estructura metálica) (longitud: 55 mts, ancho de vía: 02 carriles de 4.50 mts)	San Cristóbal	\$410,608,495.18	25%	25%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Verja Para Protección Boulevard Parque Lineal Tenguerengue, Prov. San Juan (Longitud: 6.60 Kms)	San Juan		10%	15%	15%	40%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Verja Perimetral Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde	Valverde	\$175,937,669.01	25%	25%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles Altos De La Herradura (6.915 Kms), Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Provincia Santiago.	Santiago	\$204,322,198.64	30%	40%	10%	80%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: La Herradura, Municipio Santiago		\$73,767,637.10	35%	30%	25%	90%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles Barrio 5 De abril (2.56 Km), Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal.	San Cristóbal	\$74,107,872.13	15%	15%	50%	80%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Barrio 5 De abril, Municipio San Cristóbal.		\$74,107,872.13	30%	20%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles De Las Charcas (3.67 Km), Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago.	Santiago		30%	25%	15%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Las Charcas, Municipio Santiago		\$101,545,793.43	15%	25%	30%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Carretera de Monción-Contrambalse de Mao, long. 30 km.	Santiago Rodríguez		15%	20%	30%	65%
Dirección de Proyectos Especiales	Cruce de los Quemados-Sabaneta, Prov. Santiago Rodriguez (Long. 23 km)	Santiago Rodríguez	\$98,073,729.63	35%	30%	25%	90%
Dirección de Proyectos Especiales	Diseño Y Construcción De Muro De Protección En el Municipio de Arenoso, Prov. Duarte Etapa 2	Duarte	\$94,524,609.11	25%	25%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temístocles Mets Hasta. 6 De noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote I: Mejoramiento Carretera Sanchez Vieja Y Nuevo Corredor Madre Vieja Sur, Incluye cajón Vial.	San Cristóbal		20%	20%	20%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temístocles Mets Hasta. 6 De noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo Y	San Cristóbal	\$188,601,833.86	35%	20%	20%	75%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
	Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote II: Construcción Puentes Distribuidores.						
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temístocles Mets Hasta. 6 De noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote III: Proyecto: Rehabilitación Carretera Sánchez, Inc. Solución Vehicular De Calle Duarte (5.60 Km). S.	San Cristóbal	\$123,277,096.86	20%	25%	20%	65%
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temístocles Mets Hasta. 6 De noviembre, Ampliación Puente Sobre Río Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Río Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote IV: Puente Sobre Río Yubazo Para conexión Carretera Sainagua Y Protección Rivera Con Gaviones.	San Cristóbal		25%	10%	15%	50%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de 13 Km Camino de Villa Palomino, Prov. de Azua.	Azua	\$56,574,160.44	15%	15%	15%	45%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Caminos Vecinales Municipio de Sabaneta, Prov. San Juan, Grupo 2, Longitud 23.02 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	San Juan	\$52,615,963.84	5%	10%	15%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Caminos Vecinales Zona de la Sierra, Provincia Santiago.	Santiago	\$234,329,791.64	35%	30%	15%	80%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Comunidades Buena Vista, La Yagua, La Laguna, Bacheo Técnico Del Acceso Principal A Valdesia Desde Semana Santa A La Central, Obras Hidraulicas Vía Existente Las Barías Circundantes Central Hidroelectrica Valdesia, Estribo Izquierdo Gavión Puente Principal Acceso A La Central, Prov. Peravia (Longitud: 8.00 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y tratamiento superficial asfáltico doble).	Peravia	\$188,915,199.39	30%	35%	20%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Camino La Canelilla-La Cole. Circundantes Central Hidroelectrica Aguacate, Sección las Coles, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal. (Longitud: 5.40Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal		25%	25%	25%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Camino Sección Majagual-Manomatuey, Municipio Cambita Garabitos, Circundantes Central Hidroelectrica Aguacate, Prov. San Cristóbal. (Longitud:	San Cristóbal		10%	15%	15%	40%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
	7.00Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)						
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Barrio Alto De Los Ubaldos Y San Francisco A Guazumal. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 4.90Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$421,338,397.18	15%	15%	15%	45%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Sección Guazumal - El Firme, La Pangola-La Jicotea, Y Entrada Hacia La Escuela Del Sector La Toma. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 7.10Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$271,255,970.91	30%	30%	15%	75%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes a la Central Hidroeléctrica Monción, Provincia Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$335,479,112.29	10%	15%	10%	35%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Pinalito Y Rio Blanco, Provincia Monseñor Nouel. -	Monseñor Nouel	\$191,457,407.42	15%	10%	10%	35%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Sabana Yegua Y Sabaneta, Provincias Azua Y San Juan.	Azua Y San Juan	\$121,185,436.83	20%	20%	25%	65%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Hatillo Y Rincón, Provincias Monseñor Nouel, La Vega Y Sanchez Ramirez. -	Monseñor Nouel, La Vega Y Sanchez Ramirez		10%	10%	10%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Jiguey y Aguacate, Provincia San Cristóbal-	San Cristóbal	\$326,701,058.74	30%	30%	25%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Valdesia	San Cristóbal	\$178,811,312.45	25%	25%	40%	90%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitación Caminos Circundantes A La C.H. Tavera Lateral Derecho - Longitud 4.5 Km, Jánico-Las Mesetas, Municipio Jánico, Prov. Santiago. (Longitud: 4.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio Jánico, Prov. Santiago.	Santiago	\$481,422,835.14	25%	20%	25%	70%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Baitoa-Tavera De La Vía Guardarraya 9,6 Km, Municipio Baitoa, Prov. Santiago (Longitud: 9.60Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$185,788,369.18	30%	25%	30%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Carretera De Acceso A La Presa Palomino- Longitud 12.5 Km, Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	San Juan	\$182,995,720.31	35%	20%	25%	80%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitación Obras Hidraulicas Vía Existente Las Barías Longitud 5 Km, Sección las Barías, Municipio Bani, Prov. Peravia	Peravia	\$130,166,583.74	30%	40%	15%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Obras de mejoría y adecuación de los balnearios	Santiago	\$92,682,210.79	20%	25%	20%	65%
Dirección de Proyectos Especiales	Preparación De Calles Para Asfaltado De Los Sectores La Esperanza, Monte Adentro, Amor Y Paz, INESPRES, EL INDRHI Y La Unión, El Pozo, Los Corozos, Caminos Vera Del Yuna, Municipio Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez.	Sánchez Ramírez	\$94,769,758.76	25%	25%	10%	60%
Dirección de Proyectos Especiales	Presupuesto Para La Readecuación y Solución De Montaña Con Riesgo De Derrumbes Y Caídas De Rocas En Estaciones 15+640 , 15+615 En Zona De Dren Y Escorrentia De La Montaña, 10+430, Camino Acceso A Presa Palomino Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	San Juan	\$94,909,608.43	30%	10%	15%	55%
Dirección de Proyectos Especiales	Proyecto: Rehabilitación Caminos Vecinales Prov. San Juan, Municipio Las Matas De Farfán, Grupo I, Longitud 18.92 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	San Juan		40%	40%	20%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción camino La Cuesta de Mela y Construcción alcantarilla de cajón, D.M. Guayabal, Prov. Santiago, C.H. Tavera, Republica Dominicana (Incluye: Puente vehicular, obras de arte, señalización, drenaje y capa de rodadura)	Santiago		5%	10%	5%	20%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Capulin-Cañafistol Y Calles Circundantes (6.8 Km), Central Hidroelectrica Domingo Rodriguez, Prov. San Juan.	Prov. San Juan.		5%	10%	5%	20%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Sectores Capulin, Cañafistol		\$937,165,277.86	5%	5%	10%	20%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal La Ceyba, Prov. Monseñor Nouel, Rep.dom.	Monseñor Nouel		5%	10%	5%	20%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Almendrales, Prov. Monseñor Nouel, Rep.dom.	Monseñor Nouel		10%	15%	10%	35%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Botados, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel		5%	5%	5%	15%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Cacaos- Santana, Sección Calderón-Santana, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 13.10 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	San Cristóbal		5%	0%	0%	5%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Capaces Y El Sector El Puente Rio Blanco, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel	\$510,375,168.84	0%	10%	0%	10%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Sección El Guineo-Las 3 Veredas, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.74 Kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$935,726,220.93	1%	5%	1%	7%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Batista (10.20 Km) (Ancho Vía 6.00 M), Municipio Vallejuelo, Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Zona De Impacto: Provincia San Juan.	San Juan	\$141,888,794.82	5%	10%	15%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Rio Arriba Sur (4.65 Km), Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Prov. San Juan, Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Rio Arriba Sur	San Juan	\$91,948,974.97	5%	10%	15%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Alto De La Cana (11.50 Kms), Central Hidroeléctrica Moncion, Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez.	Santiago Rodríguez	\$144,116,846.04	5%	10%	15%	30%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Palmarejo, El Jobo, Altos De La Cana, Los Pinares		\$122,844,160.78	20%	20%	5%	45%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Arroyo Seco C.H. Moncion, Sabaneta, Proy. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez		5%	5%	5%	15%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción carretera cruce carrizal la piedra-La Guazuma, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	Santiago		1%	15%	10%	26%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Puerta Del Mulo (7.58 Kms), Central Hidroeléctrica Moncion, Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez, Zona De Impacto: Alto De La Cana, Arenoso, San Ignacio De Sabaneta.	Santiago Rodríguez		5%	5%	5%	15%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Sabana Tuna-Los Derramaderos-Los Saladillos (6 Kms), Central Hidroeléctrica Sabaneta, Municipio Las Matas De Farfán, Prov. San Juan.	San Juan		5%	5%	5%	15%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Sabana Tuna, Los Derramaderos, Los Saladillos, Las Matas De Farfán.		\$93,097,865.23	40%	20%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción De Calles Gurabo Y Clavijo (19.20 Kms), Central Hidroeléctrica Moncion, Municipio Moncion, Prov. Santiago Rodríguez, Zona De Impacto: Gurabo, Clavijo, Moncion.	Santiago Rodríguez	\$109,269,734.71	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción De Caminos Adyacente A La Presa De Moncion D.M. Moncion (Longitud: 11 kms, Incluye Iluminación, obras de arte, carpeta de pavimento en hormigón asfáltico) Prov. Santiago Rodríguez.	Santiago Rodríguez	\$527,082,928.41	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera (C. C.La Jagüita-Altos Del Aguacate) - Tavera Abajo, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 1.648 Kms, incluye:	La Vega	#####	20%	40%	40%	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
	obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)						
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera El Morro-El Desecho, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.51 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$45,923,145.78	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-Conuco Viejo-El Jobo (1.88 Km), La Jina- Cementerio De Jina Hueca (0.864 Km), D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.865 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$112,466,150.84	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-El Morro, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.60 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$87,939,008.93	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-Loma De La Gallina, La Jina-Loma Del Coco, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.80 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$441,303,331.93	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Obra de Toma del Río Yuna, Acueducto Bonaio, Ubicación Prov. Monseñor Nouel, C.H. Río Blanco	Monseñor Nouel	\$58,425,842.58	10%	20%	10%	40%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Tramo Carretera Las Cruces-(Las Cruces-La Herradura)-Los Ranchos De Tavera (1.23 Km), La Herradura-Embalse Taveras (0.224 Km), Calle Interior La Herradura (0.315 Km), Tramo Carretera Las Cruces (0.352 Km), D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 1.93 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$130,914,915.48	40%	20%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera Loma La Gallina-La Cabra, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 2.86 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$110,623,566.61	20%	40%	40%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Calles San Pedro, Municipio Sabana Iglesias (Longitud: 2.875 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$117,385,399.10	40%	20%	25%	85%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Canal Ysura En Tramos Discontinuos Desde La E-0+000 A E-6+000 (Primera Etapa) Y Desde La E-6+000 A E-15+000 (Segunda Etapa) (15 Km), Central Hidroeléctrica Los Toros, Prov. Azua.	Azua		40%	40%	20%	100%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: D/R: Sistema De Riego Valle De Azua, D/R: Azua.		\$12,261,964.65	0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera Aguas Calientes - Las Placetas DM Placetas, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 8.15 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$37,866,124.67	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera El Rubio - La Celestina (7.05 Km) DM Rubio, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 7.05 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$64,791,146.31	0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa - Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal, Prov. San Cristóbal (Longitud: 5 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	San Cristóbal	\$104,965,881.69	0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Varias Calles, Distrito Municipal Guayabal, Prov. Santiago, Republica Dominicana (Longitud: 3.327 Kms, incluye: obras de arte, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote I	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote II	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote III	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote IV	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Sistema De Riego. Comunidad El Canal, Prov. Ocoa	San José de Ocoa		0%	0%	0%	0%
Dirección de Proyectos Especiales	Terminación De Los Diques Viejo Y Nuevo - Río Caña - Matayaya, Distrito Municipal Matayaya, Las Matas De Farfán, Provincia San Juan.	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Plan Anual de Capacitación año 2025, para los colaboradores de la Egehid.	Nacional	\$25,000,000.00	30%	30%	40%	100%
Dirección de Gestión Humana	Creación de Manual de Políticas y Procedimiento para el Otorgamiento de Becas a Colaboradores de la Egehid.	Nacional	\$100,000.00	20%	20%	25%	65%
Dirección de Gestión Humana	Creación de Manual de Políticas y Procedimiento para realizar descuento a los colaboradores que reprueben, deserten de la capacitación, o renuncien a la empresa luego de esta realizar la inversión.	Nacional	\$0.00	35%	20%	20%	75%
Dirección de Gestión Humana	Gestión y control de los acuerdos interinstitucionales orientados a la educación realizados por la engerid.	Nacional	\$500,000.00	35%	20%	20%	75%
Dirección de Gestión Humana	Campaña de inducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)	Nacional	\$150,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)	Nacional	\$0.00	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Gestión Humana	Análisis de los Descriptivos de Puesto	Nacional	\$400,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Realización de actividades con motivo a la semana de la salud preventiva	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Jornada de visitas de Administradoras de Riesgos de Pensiones y Administradoras de Fondo de Pensiones	Nacional	\$150,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Ejecución del Programa de Salud Preventiva dirigido a las Centrales Hidroeléctricas	Nacional	\$3,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Programa de actividades de Integración de Personal	Nacional	\$8,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Mejora del plan de Inducción y Reinducción	Nacional	\$1,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Ejecución de revisiones periódicas de informes Gerencia de Nomina	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Creación del manual de políticas y procedimiento para la Gerencia de Nomina	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Desarrollo del programa de inauguración de Proyectos EGEHID	Nacional	\$20,000,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Desarrollo Jornada Aniversario de la Empresa	Nacional	\$300,000.00	0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Elaboración del Manual de Amonestación Y llamado de atención	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Gestión Humana	Programa de reconocimiento del mérito estudiantil de hijos de colaboradores	Nacional	\$2,000,000.00	10%	12.50%	0%	23%
Dirección de Auditoría Interna	Ejecución del Programa de Salud Preventiva dirigido a las Centrales Hidroeléctricas	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Programa de actividades de Integración de Personal	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Auditoría Interna	Mejora del plan de Inducción y Reinducción	Nacional		0%	100%	0%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Ejecución de revisiones periódicas de informes Gerencia de Nomina	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Creación del manual de políticas y procedimiento para la Gerencia de Nomina	Nacional		30%	30%	40%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Desarrollo del programa de inauguración de Proyectos EGEHID	Nacional		100%	0%	0%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Desarrollo Jornada Aniversario de la Empresa	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Auditoría Interna	Elaboración del Manual de Amonestación Y llamado de atención	Nacional		40%	40%	###	100%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Auditoría Interna	Programa de reconocimiento del mérito estudiantil de hijos de colaboradores	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera a la Cuenta de Anticipo a Proveedores al 2024	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera Cuenta (Software y Licencias) al 2024	Santo Domingo		100%	0%	0%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Seguimiento A los Planes de Acción Suministrado por las Áreas Auditadas	Santo Domingo		100%	0%	0%	100%
Dirección de Auditoría Interna	Adquisición de Activos fijos del 2023 y 2024	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera de Arqueos de cajas chicas	Nacional		40%	40%	20%	100%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Proyecto de Construcción Presa Guayubín			0%	0%	68%	68%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Proyecto Acueducto Sabaneta		\$133,397,729.53	5%	5%	8%	18%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Ingeniería de Detalle Proyecto Las Placetas		\$3,540,607.57	6%	6%	5%	17%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Adquisición de TBM Proyecto Las Placetas		\$5,939,301.99	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Supervisión Proyecto Las Placetas (Gerenciado DDH)		\$1,202,257.75	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Supervisión Presa Guayubín		\$51,673,931.52	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Contratación de empresa consultora para prestar los servicios de Gerencia Ingeniería y Supervisión de la construcción del proyecto Presa Boca de los Ríos, Presa sobre el Rio Guayubín, del Acueducto Sabaneta (Línea de Impulsión y cárcamo de bombeo), de la reconstrucción de las calles Gurabo-Los Clavijos y Rehabilitación Carretera Cruce quemados-Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez		\$196,658,122.87	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Reservoirio Barranca		\$61,733,743.79	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Hidroeléctrica Artibonito		\$20,388.89	0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en la Ladera Embalse de la Presa Pinalito (Readecuación Estribo Izquierdo Presa Pinalito)		\$114,920,974.58	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Reservoirio Pajonal		\$62,253,133.72	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Actualización de Estudio diseño presupuesto, construcción Presa la Gina		#####	0%	0%	0%	0%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Canal Nizao-Najayo		\$4,134,778.81	40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Rendición y Transparencia de la Información Financiera	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Procedimientos operativos de administración presupuestaria	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Registro y Control del Patrimonio de Activos Fijos	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditorías a los Estados Financieros 2024	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditoría a los Estados Financieros 2020, 2021, 2022, 2023	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditoría de la Contraloría General de la República Dominicana 2023-2024	Distrito Nacional		40%	20%	40%	100%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar, municipio Esperanza, prnovincia Valverde	Valverde		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Republica Dominicana.	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de tierra Parque Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Republica Dominicana.	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, D.M. Punta Caña, provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, D.M. Punta Caña, provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R. D	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de Tierra Parque Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R. D	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R. D	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R. D	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R. D	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de Tierra Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R. D	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R. D	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R. D	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva, municipio Jimaní, Provincia Independencia	Independencia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Eólico Tierra Nueva, municipio Jimaní, Provincia Independencia	Independencia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Eólico Tierra Nueva, Provincia Independencia	Independencia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Eólico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Sabaneta 1 provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía hidrobombeo Sabaneta 2 provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Yacahueque, provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica de proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Las Matas De Farfán 1, provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica de proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Las Matas De Farfán 2, provincia San Juan	San Juan		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo La Descubierta provincia Independencia	Independencia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Paraíso, provincia Barahona	Barahona		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto de acumulación de energía por hidrobombeo Camú (Guaigüi), provincia La Vega	La Vega		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Artibonito	Elías Piña		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Artibonito	Elías Piña		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Guayubín	Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Guayubín	Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Las Placetas	Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Las Placetas	Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Las Placetas	Santiago		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico La Gina	Peravia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico La Gina	Peravia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo La Gina	Peravia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Monte Grande	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Monte Grande	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Monte Grande	Azua		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios Modernización, repotenciación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas existentes	Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Proyecto Eficiencia Energética, Edificio SEDE EGEHID	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva, Provincia Independencia, República Dominicana.	Independencia		0%	0%	0%	0%
Dirección De Energía Renovable	Levantamiento de Potencial de proyectos solares fotovoltaicos flotantes en presas existentes.	Nacional		0%	0%	0%	0%
Secretaría General	Tramitación diaria de las comunicaciones externas de la empresa.	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%

				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025			
				T3			TOTAL TRIMESTRE
DIRECCION	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	97%
Secretaria General	Tramitación diaria de las comunicaciones internas de la empresa.	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Secretaria General	Descargo de documentación de las diferentes áreas al Archivo Central de EGEHID.	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Secretaria General	Descargo de la documentación enviada a partir de 5 años del archivo central al archivo histórico y Recepción de esta.	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Secretaria General	Adquisición de materiales gastables de secretaria gastables y archivo.	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Libre Acceso	Mejorar los procesos de recopilación de informaciones con las áreas para obtener la puntuación máxima otorgada por la Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).	Distrito Nacional		75%	25%	0%	100%
Comunicaciones	Estrategia de Campañas Publicitarias para el Posicionamiento Institucional	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Comunicaciones	Gestión de Productos Editoriales Institucionales	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%
Comunicaciones	Gestión de Contenidos para Redes Sociales y Medios Digitales	Distrito Nacional		0%	0%	0%	0%




 Lic. Gloria Ross
 Dir. Planificación y Desarrollo




 Lic. María Cristina González
 Departamento de Planes, Programas y Proyectos
