

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

Informe trimestral

OCTUBRE – DICIEMBRE
2025

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

egehid

Contenido

Introducción	4
Dirección De Planificación Y Desarrollo	6
Áreas Misionales	20
Dirección De Operaciones	20
Dirección De Mantenimiento	23
Dirección De Comercialización	27
Dirección De Desarrollo Hidroeléctrico	28
Dirección De Energía Renovable	31
Dirección De Mantenimiento Y Rehabilitación De Obras Civiles	33
Dirección De Proyectos De Obras Civiles	35
Dirección De Mantenimiento Y Conservación De Infraestructuras	45
Áreas de apoyo	46
Dirección De Tecnología Y Telemática	46
Dirección De Gestión Ambiental	47
Dirección Administrativa	49
Dirección Logística	52
Dirección de compras y contrataciones	53
Dirección De Gestión Humana	55
Dirección De Servicios Financieros	57
Contraloría Interna	58
Dirección De Auditoría Interna	60
Dirección Jurídica	62
Dirección De Comunicaciones	64
Gerencia De Bienestar Social	65
Secretaría General	67
Dirección De Seguridad Militar	68
Libre Acceso A La Información	69
Matriz de cumplimiento de ejecución POA 2025	71

Introducción

Durante el cuarto trimestre del año 2025 (octubre – diciembre), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) continuó consolidando avances relevantes en el cumplimiento de sus objetivos operativos, administrativos y estratégicos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad energética, la eficiencia institucional y el desarrollo nacional. Este período estuvo marcado por un desempeño favorable en la generación hidroeléctrica, impulsado por condiciones hidrológicas favorables, así como por la continuidad en la ejecución de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de los procesos internos de gestión.

Las acciones desarrolladas durante el trimestre reflejan un esfuerzo articulado entre las distintas áreas de la institución, orientado a optimizar el uso de los recursos, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. En el ámbito operativo, la generación hidroeléctrica alcanzó niveles significativos, contribuyendo al ahorro de divisas y a la reducción del uso de combustibles fósiles, mientras que la gestión de los embalses permitió un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, con impactos positivos en la producción energética y el control de crecidas.

De manera paralela, se registraron avances sustanciales en la ejecución de proyectos de desarrollo hidroeléctrico, energía renovable, mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras, así como en iniciativas de carácter social y ambiental en las zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas. Estas acciones fortalecieron la presencia institucional en las comunidades, generaron empleos y contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.

En el ámbito administrativo y de apoyo, se consolidaron los mecanismos de planificación, control interno, seguimiento presupuestario y gestión de la calidad, destacándose avances en la certificación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, la modernización de procesos, la optimización de la gestión contractual y la mejora en los tiempos de respuesta institucional. Asimismo, se continuó impulsando la transformación tecnológica y la transparencia

en la gestión pública, en coherencia con las políticas del Estado Dominicano.

En conjunto, los resultados alcanzados durante el período octubre-diciembre 2025 evidencian una gestión institucional orientada a resultados, alineada al Plan Estratégico Institucional y al Plan Operativo Anual, que fortalece el rol de EGEHID como actor clave del sector eléctrico nacional y como entidad comprometida con el desarrollo sostenible del país.

Dirección De Planificación Y Desarrollo

Durante el año 2025, la Dirección de Planificación y Desarrollo consolidó su rol estratégico mediante el trabajo articulado de sus cuatro gerencias, garantizando el cumplimiento de las metas institucionales y la continuidad operativa.

La Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos trabajó con éxito en la reformulación del Plan Estratégico Institucional 2026–2029, la elaboración, ejecución y seguimiento de los procesos como POA, Presupuesto, PACC y la culminación de la Memoria de Gestión 2020–2024, además de fortalecer la gestión presupuestaria, seguimiento al debido proceso del Plan Anual de Compras y Contrataciones y el registro de proyectos clave en el SNIP.

La Gerencia de Calidad de la Gestión, durante el año 2025, EGEHID obtuvo la certificación conforme a la norma ISO 9001:2015, consolidando un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, mejora continua y enfoque al cliente. Así mismo reforzó la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de Control Interno, alcanzando altos niveles de cumplimiento normativo, avance en la actualización de la matriz de riesgos y la promoción de una cultura institucional orientada al control y la mejora continua.

Este logro valida la estandarización de los procedimientos institucionales, el control efectivo de la documentación y la capacidad de la organización para planificar, ejecutar y mejorar sus procesos de manera sistemática.

La certificación fortalece la eficiencia operativa, la transparencia y la confianza de las partes interesadas y posiciona a la institución en un nivel superior de madurez organizacional, con una visión preventiva y orientada a resultados.

Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Institucional, participó como representante de la feria del libro y continua en el impulso de la

modernización organizativa mediante la actualización de estructuras, el cambio de imagen institucional y el fortalecimiento de la Unidad de Igualdad de Género, así como mejoras en la gestión financiera a través del sistema SAP. Finalmente, la Gerencia de Cooperación Internacional mantuvo vínculos estratégicos con organismos nacionales e internacionales, facilitando la colaboración técnica y el posicionamiento de la empresa en iniciativas de planificación energética y sostenibilidad.

Gerencia de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes

Programas y Proyectos

Durante este año 2025, el Área de Planes Programas y Proyectos (PPP), ha mantenido un ritmo sostenido de trabajo en la ejecución de las actividades correspondientes al Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Anual (POA), y la elaboración de la Memoria Institucional.

En este periodo, se lograron avances significativos en la consolidación de información, coordinación interdepartamental y fortalecimiento de los mecanismos de planificación institucional.

Reformulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029

Durante este periodo 2025 se avanzó de manera considerable en la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2029. En este proceso se realizaron reuniones de trabajo y levantamiento de información con las diferentes áreas, con el propósito de actualizar los ejes estratégicos, objetivos y metas institucionales.

El Departamento de Planificación Estratégica ha dado seguimiento al avance del Plan Operativo Anual (POA) 2025, el cual obtuvo un porcentaje de ejecución general de 95%, impulsando acciones dirigidas a la actualización y verificación del cumplimiento de las tareas programadas por cada área, además de la elaboración del nuevo Plan Operativo 2026 alineado a los nuevos ejes del Plan Estratégico Institucional 2026-2029.

Con ese propósito, se trabajó con las distintas unidades la revisión y actualización de sus actividades mediante correos electrónicos, circulares oficiales, reuniones y visitas presenciales, con el objetivo de identificar posibles cambios o ajustes necesarios que permitan asegurar el progreso de sus respectivos proyectos.

Asimismo, se instruyó a las áreas responsables para que mantengan su matriz actualizada con las informaciones correspondiente, ya que dicha información es esencial para garantizar la continuidad y coherencia en las etapas siguientes del proceso de planificación y seguimiento. Estas acciones han permitido fortalecer la coordinación interdepartamental y garantizar una mayor precisión en el registro del avance institucional.

- **Memorias e Informes Institucionales de Gestión**

- Elaboración de la Memoria de Gestión Interna 2020-2024**

Durante el período evaluado, se registraron avances significativos en el proceso de elaboración de la Memoria de Gestión Interna 2020-2024. Entre las acciones más relevantes se destacaron la realización de reuniones de trabajo con la consultora responsable, en las cuales se revisó y discutió el primer borrador del documento.

Como resultado de dichas reuniones, se acordó remitir a la consultora Crib Consulting los datos actualizados solicitados, así como las fotografías oficiales de las autoridades de la empresa, información que fue debidamente enviada

Al cierre del período, se permaneció a la espera de la revisión final por parte de las autoridades institucionales, con el objetivo de proceder a la validación y cierre del documento. Estos avances reflejaron un

compromiso sostenido con la transparencia y la sistematización de los logros institucionales alcanzados durante el período evaluado.

Cronología de reuniones para la elaboración de la Memoria de Gestión 2020–2024

Fecha	Actividad / Hito	Participantes	Objetivo / Observaciones	Estado
5/6/2025	Socialización sobre algunas modificaciones de la Memoria de Gestión 2020–2024	Consultor Crib Consulting/Dirección De Planificación	Discutir y solventar observaciones señaladas	Terminado
6/6/2025	Revisión de todas las informaciones faltantes de la Memoria	Consultor Crib Consulting/Dirección De Planificación	Discutir y Analizar algunos datos faltantes	Entregado
25/6/2025	Solicitud	Consultor Crib Consulting	Entregas de Algunas informaciones solicitadas por la Consultora para la terminación de la Memoria	Entregado
1/7/2025	Entrega	PPP	Entrega de Fotos y el material faltante por parte Planificación	Entregado
4/7/2025	Entrega del último contenido para la edición	PPP	finalizada la parte de edición de contenido con todas las informaciones requirente	Entregado
3/9/2025	Reunión para puntualizar algunos temas	Consultor Crib Consulting/Dirección De Planificación	Socializar informaciones necesarias para la finalización	Realizado
26/11/2025	presentación para la memoria de Gestión 2020–2024,	Administrador, Miembro consejo, Consultor Crib Consulting/Dirección De Planificación	Obtener Aprobación, unificar criterios para que no haya confusiones sobre lo solicitado.	Realizado
1/12/2025	Entrega del último borrador	Consultor Crib Consulting	Verificación de que todos los puntos de la gestión 2020–2024 estén cubiertos.	En Revisión

Departamento de Planificación de Compras y Contrataciones

Uno de los avances más significativos fue la reducción de las modificaciones al PACC, como resultado de las mejoras implementadas en el proceso de planificación y del mayor conocimiento de las necesidades por parte de las áreas requirentes. Estas áreas formularon sus requerimientos con mayor anticipación y precisión, lo que se tradujo en una gestión más eficiente y alineada con la demanda de los procesos operativos.

Asimismo, se logró la eliminación casi total de la publicación de procesos no planificados, los cuales se redujeron de 6.35 % en el primer trimestre del año a 1.66 %, gracias a la política institucional impulsada por la Administración, que estableció que todos los procesos debían estar debidamente planificados y que solo se admitirían excepciones en casos de fuerza mayor, debidamente justificados y autorizados por la Máxima Autoridad.

De igual manera, se fortaleció el mecanismo de remisión de solicitudes de compras dentro de los primeros cinco (5) días laborables de cada mes, contribuyendo a una mejor programación de los procesos, mayor control administrativo y una ejecución más oportuna del Plan Anual de Compras y Contrataciones.

Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Presupuesto

Durante el segundo trimestre del año 2025, en alineación con los planes y directrices institucionales, se llevó a cabo la elaboración de los informes presupuestarios mensuales correspondientes, así como del informe trimestral. Asimismo, se completó el informe semestral, el cual consolida los resultados financieros del primer semestre del presente año.

Como parte de este trabajo, y con base en los análisis realizados, se emitieron recomendaciones dirigidas a las áreas responsables, con el objetivo de fortalecer la gestión presupuestaria y promover la mejora continua de los procesos institucionales.

En el marco del fortalecimiento de capacidades técnicas, se gestionó ante la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) la solicitud de participación en los siguientes cursos de formación:

Seguimiento y evaluación presupuestaria

Proceso de formulación presupuestaria anual y plurianual, tanto en su componente físico como financiero

Identificación y clasificación del gasto público relacionado con el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. Adicionalmente, se dio inicio al proceso de formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, con un enfoque particular en el análisis de los montos de arrastre de las diferentes áreas, como paso fundamental para una programación. Este periodo se trabajó con el seguimiento a la ejecución financiera de proyectos, que es un proceso crucial para garantizar la correcta utilización de los recursos asignados, y consistente en monitorear de manera continua el avance de los gastos y la ejecución de las actividades previstas en el proyecto.

Este proceso incluye la revisión de los flujos de fondos, la comparación de los presupuestos iniciales con los gastos reales y la identificación de posibles desvíos o ajustes necesarios.

Además, se generó de manera periódica reportes detallados de la ejecución financiera, desglosados por unidad ejecutora y por provincia de incidencia, lo cual permite un control más preciso y específico de las inversiones en función de las diferentes localidades y entidades encargadas de su gestión.

Estos reportes proporcionan una visión clara del estado financiero de cada proyecto, lo que facilita la toma de decisiones y garantiza la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, se elaboraron los informes mensuales correspondientes al trimestre, los cuales fueron remitidos oportunamente a las áreas involucradas, junto con los hallazgos y recomendaciones derivadas del análisis presupuestario, con el fin de fortalecer la gestión financiera institucional y propiciar una mejora continua en los procesos de planificación y ejecución del gasto. Durante el presente trimestre, el

Área de Presupuesto dio inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto del Presupuesto 2026.

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos

Gestión de Registro de Proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Como parte de las funciones de evaluación y gestión de proyectos bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Se presenta el estado actual de los principales proyectos del área energética, así como gestiones institucionales complementarias:

Proyecto de Diagnóstico de las 27 Centrales Hidroeléctricas de la EGEHID Estado actual: Fase de Reinversión. Situación: Sometido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y aprobado para registro en el Sistema de Información del SNIP. Gestión realizada: Evaluación técnica y articulación institucional para su validación conforme a los lineamientos metodológicos del SNIP. Próximo paso: Monitoreo de la ejecución del diagnóstico y uso de resultados para futuras acciones de mejora en la infraestructura hidroeléctrica nacional.

Gerencia de Calidad de la Gestión

El año 2025 marcó un punto de inflexión para la Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), en materia de calidad, control y madurez organizacional. A lo largo del período enero–diciembre, la institución avanzó de forma sostenida en la consolidación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la optimización de procesos críticos, particularmente en adquisiciones y pagos. Más que ejecutar actividades, el enfoque del año fue ordenar la casa, estandarizar la forma de trabajar y sentar bases sólidas para una gestión moderna, preventiva y orientada a resultados

Certificación ISO 9001:2015

Obtenida a inicio del periodo, lo cual nos permitió fortalecer, consolidar y mejorar de forma continua un sistema de gestión basado en procesos.

Durante 2025 se produjeron avances estructurales en la calidad de la gestión institucional, destacándose:

Diseño, formalización y aprobación de procedimientos del Área de Calidad de la Gestión, estableciendo reglas claras para la planificación, el seguimiento, el control y la mejora continua.

Implementación progresiva de dichos procedimientos, acompañada de socialización en las áreas bajo el alcance del SIG, reduciendo la brecha entre lo documentado y lo que realmente se hace.

Mayor estandarización de los procesos, lo que se tradujo en menos improvisación, menos retrabajo y mayor coherencia operativa.

Preparación técnica sostenida para la recertificación ISO 9001:2015, mediante seguimiento sistemático a hallazgos, acciones correctivas y auditorías internas. En síntesis, la calidad dejó de ser “un requisito” para convertirse en una herramienta de gestión real.

SCAV-AIRE – Resultados Operativos 2025

El sistema SCAV-AIRE mostró mejoras tangibles en eficiencia, control y tiempos de respuesta.

Resultados Clave:

612 adquisiciones gestionadas, con 474 completadas exitosamente (77% de eficiencia).

1,551 solicitudes de pago recibidas, con 1,347 completadas (87% de eficiencia).

Resultados Operativos 2025

Resultados Operativos 2025	
Aportes	745
Compra de bienes	530
Compra de servicios	840
Cubicaciones	28
Expedientes completados	275

Tiempos promedio por fase	37 días
Contratación	57 días
Licitación	42 días
Solicitud	41 días
Recepción	28 días
Notificación de culminación	17 días
Pago	17 días

Se rediseñó el proceso de recepción y gestión de pagos, estableciendo un flujo claro: recepción inicial en Logística y depósito formal en la Dirección de Finanzas.

Resultado directo: el tiempo promedio de pago bajó de 45–60 días a solo 17 días.

Esto no es un ajuste menor: impacta en la confianza de los proveedores, la reputación institucional y la eficiencia financiera. Menos excusas, más resultados.

Sistemas de Calidad

En 2025 se consolidó un enfoque de gestión basado en normas, procesos y evidencia:

Implementación y fortalecimiento de sistemas de calidad orientados a procesos.

Estandarización de procedimientos críticos, reduciendo la variabilidad operativa.

Capacitación y sensibilización del personal en calidad, gestión por procesos y enfoque al usuario.

Integración progresiva de la gestión de riesgos, evaluación del desempeño y mejora continua dentro del SIG.

Estos avances fortalecen la sostenibilidad del sistema y su alineación con los objetivos estratégicos de la institución. No es moda: es estructura.

Certificaciones y Modelos de Excelencia

Durante el año se avanzó estratégicamente en el mantenimiento y fortalecimiento del esquema de certificaciones:

Participación en el Tour de la Calidad 2025, facilitando el intercambio de buenas prácticas y tendencias.

Ejecución de capacitaciones en documentación y gestión documental, mejorando la calidad y el control de la información del SIG.

Sensibilización continua del personal sobre calidad, riesgos y cumplimiento.

Alineación con modelos de excelencia, enfocados en sostenibilidad, innovación y buenas prácticas del sector energético.

Avance en Certificaciones ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021

EGEHID alcanzó un avance aproximado del 90% en la implementación de los Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016) y de Cumplimiento (ISO 37301:2021), encontrándose ambos en fase de auditoría interna.

Este progreso evidencia la existencia de controles, políticas, procedimientos y mecanismos de supervisión alineados con los requisitos normativos, consolidando una cultura institucional de integridad, cumplimiento y prevención.

Departamento de gestión de riesgos

La gestión de riesgos durante 2025 mostró consistencia, control y madurez progresiva:

Seguimiento trimestral a los riesgos identificados en las distintas dependencias.


Predominio de riesgos en niveles bajo y medio, con los riesgos altos controlados y sin variaciones críticas.

Evolución del total de riesgos de 301 a 314, producto de mejoras en los procesos de identificación y evaluación, no de deterioro operativo.

En conjunto, los resultados evidencian una gestión de riesgos alineada con los lineamientos institucionales, fortaleciendo el control interno y apoyando la toma de decisiones oportunas.

Evaluación general y cierre

El desempeño institucional en 2025 fue mixto pero positivo. Algunos indicadores como quejas de clientes, rotación de personal y SIS-Compras alcanzaron niveles satisfactorios, mientras otros presentan oportunidades claras de mejora.

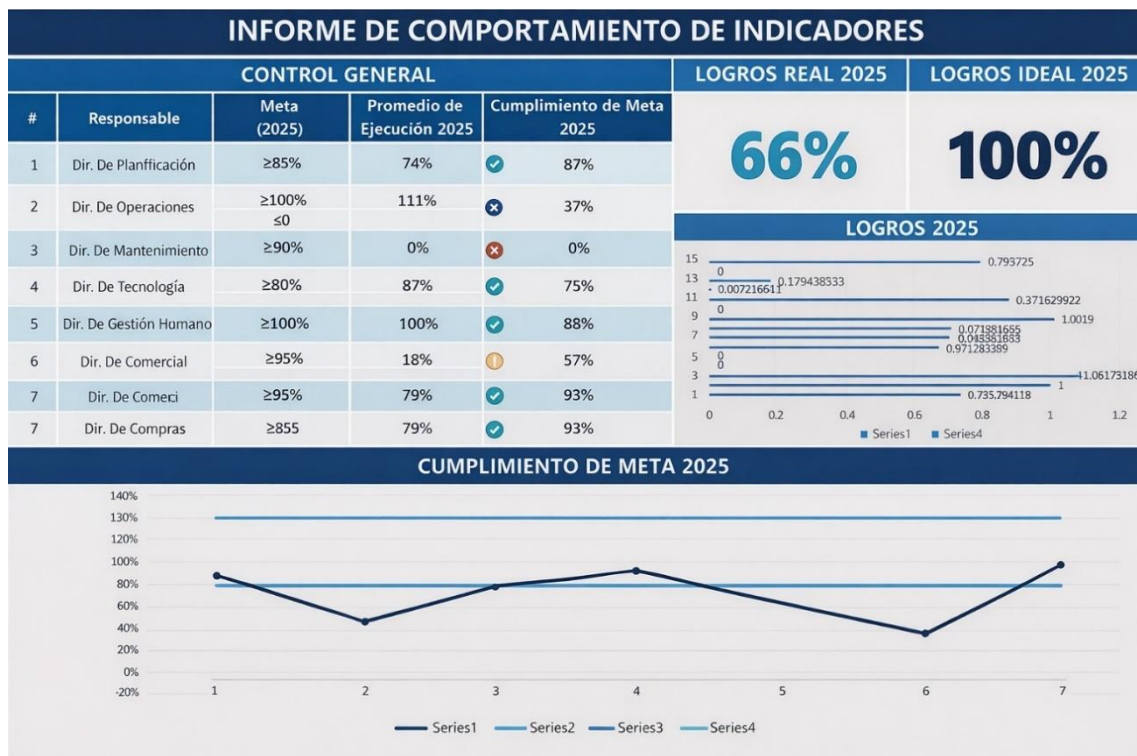

Gerencia de Desarrollo Institucional

La Gerencia de Desarrollo Institucional pone de manifiesto una gestión articulada y coherente entre el Departamento de Gestión de Procesos y Desarrollo Normativo y el Departamento de Desarrollo Institucional, orientada al fortalecimiento de la capacidad organizacional y al logro de los objetivos estratégicos de la entidad.

Estado General de Avance:

Línea Estratégica	% de Avance
Centros de Costos y Beneficios	65%
Gestión de Cambio de Marca	55%
Manual de Organización y Funciones	50%
Estructuras Organizativas	45%
Unidad de Igualdad de Género	40%
Cultura Institucional	5%

Análisis Comparativo de Avance Trimestral

El seguimiento de los últimos tres trimestres permite identificar una tendencia ascendente en el nivel de ejecución de todas las líneas estratégicas, sin retrocesos ni estancamientos relevantes.

Resumen de evolución por línea estratégica

Estructuras Organizativas: avance progresivo desde la fase diagnóstica hasta la formulación de propuestas y ajustes estructurales.

Manual de Organización y Funciones: incremento significativo en el tercer trimestre, reflejando la consolidación del análisis técnico y funcional.

Unidad de Igualdad de Género: crecimiento constante, orientado a la institucionalización y fortalecimiento interno.

Gestión del Cambio de Marca: una de las líneas con mayor estabilidad en el avance, con resultados visibles y medibles.

Cultura Institucional: proyecto iniciado conforme a la planificación estratégica, con avances iniciales controlados.

Centros de Costos y Beneficios: línea con mayor nivel de madurez, con resultados consolidados en los sistemas de gestión.

Principales Hallazgos Estratégicos

- El tercer trimestre presenta el mayor crecimiento acumulado, evidenciando una correcta priorización de esfuerzos.
- Las iniciativas de carácter estructural muestran curvas de avance estables y sostenidas.

- Los proyectos transversales avanzan de manera gradual, asegurando apropiación institucional.
- Existe coherencia entre la planificación estratégica y la ejecución operativa.

Departamento de Gestión de Procesos y Desarrollo Normativo

Gestión de la documentación para implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de primer grado

El diagnóstico del cumplimiento del Control Interno Institucional, de acuerdo a sus cinco (5) componentes de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), implementados en la EGEHID, durante el trimestre 4 2025, se ha ejecutado un total de un 96.12 %, divididos de la siguiente manera:

- 100% corresponde a el componente Ambiente de Control (AMC).
- 96.00% corresponde a el componente Valoración y Administración de Riesgos (VAR).
- 100.00% corresponde a el componente Actividades de Control (ADC).
- 100% corresponde a el componente Información y Comunicación (IYC).
- 84.62% corresponde a el componente Monitoreo y Evaluación (MYE).

Gestión Índice de Control Interno (ICI):

Se logró aportar la evidencia de los indicadores y subindicadores del ICI.

Indicador 1: Diseño y Documentación del Sistema de Control Interno

Sub-Indicador 1.1: Normas Básicas de Control Interno

Durante el trimestre 4 del año 2025, aportamos la documentación pertinente a las Normas Básicas de Control Interno, en la plataforma de la CGRD, estando pendiente la calificación por parte de la CGRD, para poder colocar el avance.

Indicador 2: Eficacia del Sistema de Control Interno

Sub-Indicador 2.1: Cumplimiento de Normas Básicas de Control Interno.

Hemos proyectado para el Primer trimestre del año 2026, el inicio del cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno, de la mano con el área de Contraloría General EGEHID, partiendo del 96.12% de la implementación del trimestre 4 del año 2025.

Sub-Indicador 2.2: Cumplimiento de Normas de Segundo Grado.

Hemos proyectado para el Segundo y tercer trimestre del año 2026, el inicio del cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno de Segundo grado, de la mano con el área de Contraloría General EGEHID, partiendo del 100% de la implementación de las 9 Normas de Segundo grado.

Gestión de Proyecto de Documentación de Políticas y Procedimientos Institucionales, con empresa consultora:

El proyecto de documentación de políticas y procedimientos de las diferentes áreas de la institución, avanza conforme al cronograma establecido por la empresa consultora contratada para el proyecto.

Al final del trimestre 4 del año 2025, se completo la identificación, análisis de procesos/subprocesos, clasificación de los documentos existentes, así como la elaboración de la mayoría de los borradores institucionales bajo el formato del Sistema de Gestión Documental.


Se mantienen en curso las etapas de validación y aprobación con las áreas responsables, con una participación activa de las unidades técnicas.

Áreas Misionales

Dirección De Operaciones



Generación Hidroeléctrica

En el período octubre - diciembre 2025 de una capacidad instalada de 624.51 MW, las Centrales hidroeléctricas generaron un total de 378,773,754 Kwh de Energía Bruta y una generación Neta enviada a las redes de 376,489,388 Kwh, con un consumo de energía de los servicios auxiliares de las Centrales (Consumo de Estación) de 2,284,366 Kwh.

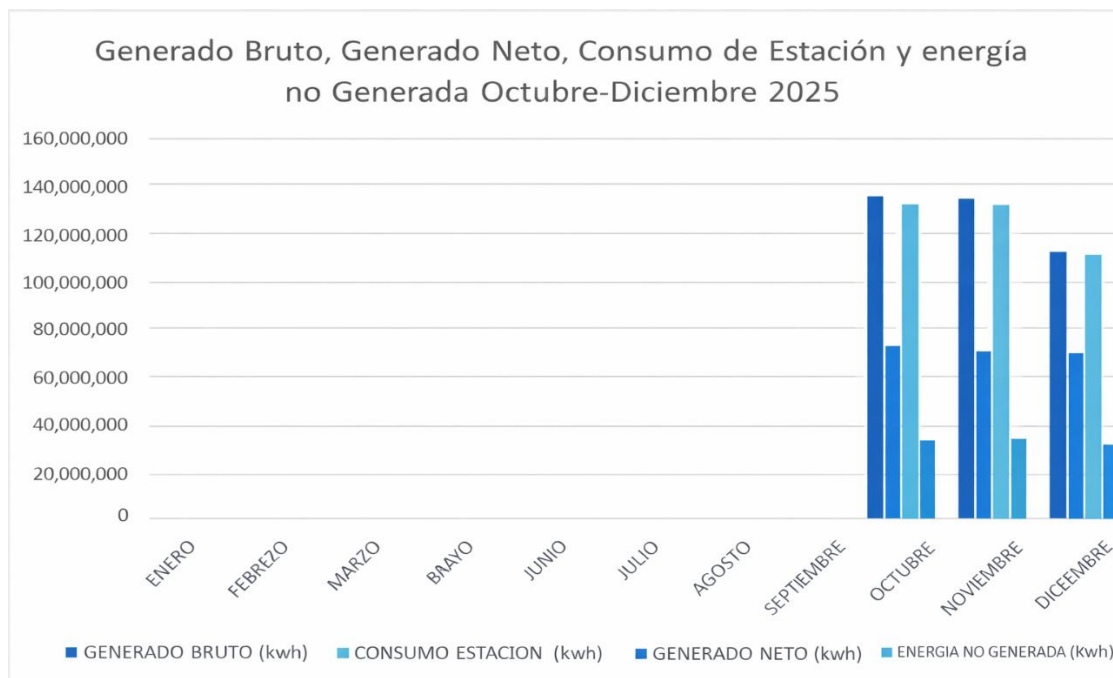

Operación de los embalses

En los embalses de regulación durante este período entraron 2,177,158,044 M³ de agua que se utilizaron para ser turbinadas en las diferentes Centrales. El volumen de agua turbinada en las Centrales fue de 1,408,189,663 M³ con un Rendimiento Hidráulico promedio de 0.268 Kwh/M³. El volumen de agua no turbinado registró la suma de 289,679,041 millones de metros cúbicos.

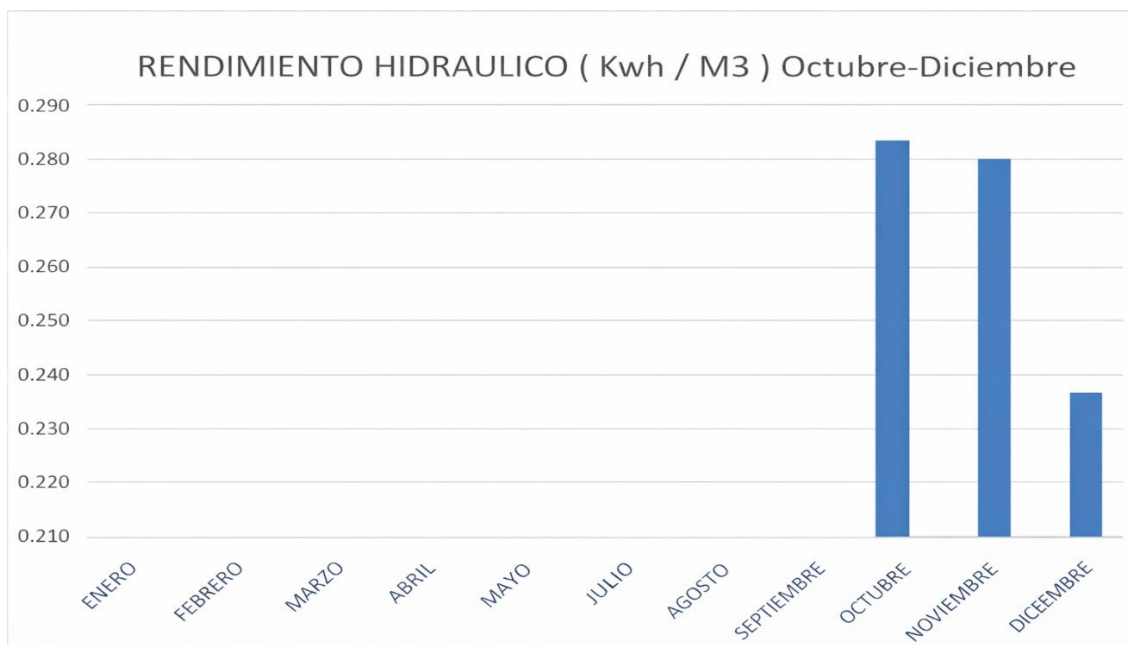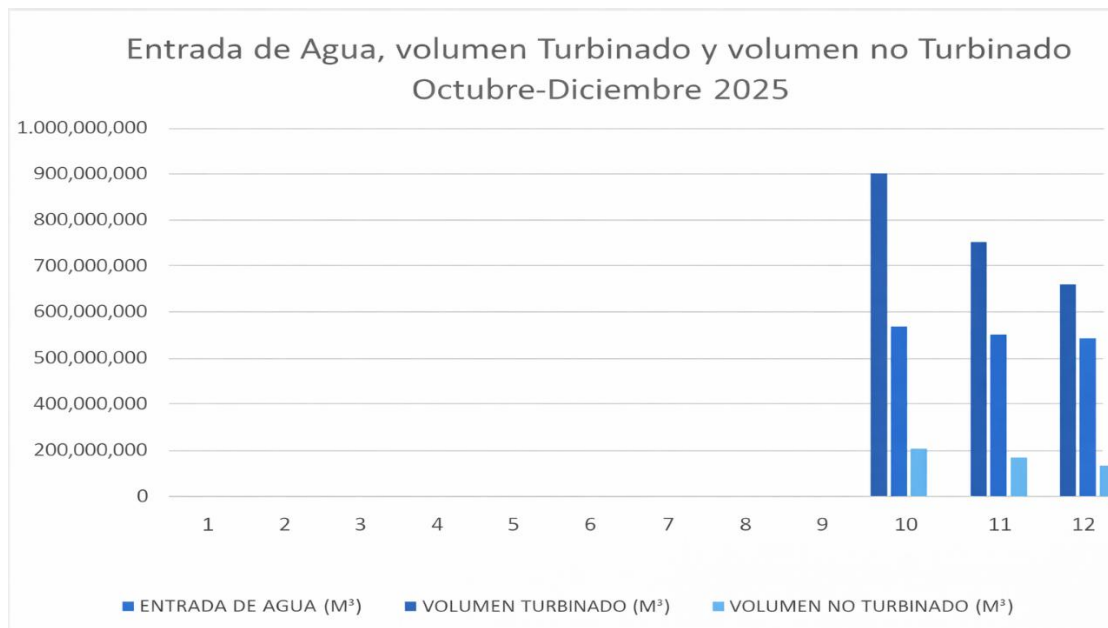

Perdida de energía

La energía no generada o pérdida de energía fue de 68,543,626 Kwh. Esto fue producto de las aguas vertidas por los embalses, desagüe de fondo y aguas extraída para los acueductos.

Este trimestre terminamos con un buen nivel de generación debido al incremento de las lluvias cerca de finalizar el año, específicamente en los meses de octubre y noviembre que mejoraron notablemente la generación. La tabla que le presentamos a continuación muestra los

valores de los parámetros de operación de las Centrales Hidroeléctricas durante el período en cuestión:

PARAMETROS DE INFORME OPERACIÓN GESTION OCTUBRE-DICIEMBRE 2025								
MESES	GENERADO BRUTO (kwh)	CONSUMO ESTACION (kwh)	GENERADO NETO (Kwh)	ENTRADA DE AGUA (M³)	VOLUMEN TURBINADO (M³)	RENDIMIENTO HIDRAULICO (Kwh / M3)	VOLUMEN NO TURBINADO (M³)	ENERGIA NO GENERADA (Kwh)
OCTUBRE	135,863,600	814,657	135,048,943	896,767,003	476,338,291	0.285	115,733,540	22,593,219
NOVIEMBRE	134,410,154	790,819	133,619,335	707,100,752	480,036,264	0.280	106,766,666	29,894,666
DICIEMBRE	108,500,000	678,890	107,821,110	573,290,289	451,815,108	0.239	67,178,835	16,055,741
TOTAL	378,773,754	2,284,366	376,489,388	2,177,158,044	1,408,189,663	0.268	289,679,041	68,543,626

Meta de Generación

Para el año 2025 se estableció una meta técnica de generación de 1,335.61 GWh de energía. El año inició con una generación por encima de la meta mensual establecida, lo que proyectó inicialmente el alcance de aproximadamente 1,500 GWh de energía. Al 31 junio, se alcanzaron 1,457.47 GWh frente a los 1,335.61 GWh planificados para el período, lo que representó un incremento de 9.13 % con respecto a la generación programada.

Dirección De Mantenimiento

Durante el año 2025 la Dirección de Mantenimiento realizó Proyectos para reparación, mantenimiento y corrección de averías de las diferentes Centrales Hidroeléctricas, acorde con el Plan Operativo Anual (POA) 2025, para mantener en operación y garantizar la confiabilidad, seguridad y continuidad del suministro eléctrico en las de dichas centrales.

Gerencia de Mantenimiento Mecánico

Esta gerencia se enfocó en el mantenimiento, reparación y rehabilitación de componentes clave de las turbinas, centrales y presas.

En la siguiente tabla mostramos los detalles trabajados

Central / Presa	Tipo de Actividad	Detalle de la Actividad
Jimenoa	Mantenimiento Mayor	Cambio de placas del Distribuidor de la Turbina (Unidad no alcanzaba el 50% de Carga Nominal).
Aniana Vargas	Mantenimiento Mayor	Rehabilitación de la Minicentral.
Río Blanco	Calibración / Mantenimiento	Detección y calibración de las paletas de la Central # 2.
Río Blanco	Cambio de Componente	Cambio de Sello Flotante del Sello de eje de la unidad # 1.
Río Blanco	Mantenimiento	Limpieza de Los Radiadores de la Unidad # 1.
Jigüey	Mantenimiento	Mantenimiento de Limpieza de Los Radiadores de la Central.
Jigüey	Trabajo Hidromecánico	Trabajo Hidromecánico Central Jigüey de la unidad # 2 (sistema de presión aceite Hidráulico).
Jigüey	Fabricación	Trabajo de Fabricación de tubería de acero Inoxidable Sistema Hidráulico Unidad # 1.
Aguacate	Instalación de Sello	Instalación de sello y pista de Rozamiento a la Central # 1.
Aguacate	Cambio de Sello	Cambio de sello de la Unidad # 2.

Central / Presa	Tipo de Actividad	Detalle de la Actividad
Aguacate	Mantenimiento	Ajuste Distribuidor de la Central.
Aguacate	Cambio de Componente	Cambio de Oring a las paletas de la Unidad # 1.
Presa Aguacate	Reparación	Reparación Tubería de drenaje de Fondo de la compuerta.
Los Toros	Cambio de Sello	Cambio de sello a la Unidad # 1.
Marcos A. Cabral	Reparación	Reparación de compuerta.
Minicentral La Barías	Reparación	Reparación de las Rejas de Toma de la casa Maquina.
Minicentral La Barías	Ajuste	Ajuste servomotor principal.
Presa Jigüey	Reparación	Reparación sistema de Drenaje y colección de aguas.
Sabaneta	Reparación	Reparación Chorro Hueco.

Gerencia de Proyectos Electromecánicos

Esta gerencia se enfocó en la instalación de equipos, la elaboración de especificaciones técnicas y la inspección de mantenimientos.

Tipo de Tarea	Equipo/Sistema	Ubicación
Instalación	Transformador	Subestación Jimenoa
Especificaciones Técnicas	Transformador	Las Damas
Especificaciones Técnicas	Transformador	Jimenoa
Especificaciones Técnicas	Sistema de Control de la Válvula Mariposa	Sabana Yegua
Especificaciones Técnicas	Subestaciones Móviles (69/12.5kV)	General

El departamento de controles técnicos realizó la inspección y revisión de la ejecución de los mantenimientos en las siguientes centrales Hidroeléctricas: Central Las Damas, Central Palomino, Central Sabaneta, Central Sabana Yegua, Central los Toros, Central Magueyal, Central Domingo Rodríguez, Central Jigüey, Central Aguacate, Presa Aguacate, Central Valdesia, Minicentral Nizao-Najayo/Los Anones, Central Baiguaque, Central Aniana Vargas, Central Rio Blanco, Central Rincón, Central Jimenoa, Central Angostura, Central Tavera, Central Monción, Minicentral Brazo Derecho, Minicentral Rosa J. de La Cruz y Central Constanza.

Gerencia de Redes y Subestaciones

Esta gerencia priorizó la corrección de fugas críticas, la respuesta a averías en líneas y el mantenimiento preventivo/correctivo en subestaciones, fortaleciendo la disponibilidad y seguridad operativa.

Logro Principal	Detalle de la Intervención	Ubicaciones / Beneficios
Corrección Crítica de Fuga	Mantenimiento mayor de transformador principal (pruebas eléctricas, sustitución de bushings, soldadura de radiadores, control de humedad).	Central Hatillo
Respuesta Eficiente a Averías	Respuesta a averías en líneas de 13.8 kV, minimizando interrupciones del servicio.	Palomino, Jimenoa, Monción, Jigüey y Río Blanco
Mantenimiento en Subestaciones	Mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando condiciones operativas seguras.	Angostura, Aguacate y otras localidades
Mejora de Sistemas	Instalación y mejora de sistemas de alimentación, comunicación e iluminación.	Presas y centrales (operatividad, seguridad perimetral, servicio a comunidades).

Gerencia de Proyectos Eléctricos


Mantenimiento Eléctrico realizó las siguientes actividades:

- Restablecimiento de medición parámetros críticos funcionamiento del analizador de calidad de energía en la Unidad 1, C.H. Valdesia.
- Reparación de avería en el sistema de excitación C.H. Jimenoa.
- Ensamblaje completo del nuevo transformador de 7 MVA, Minicentral Brazo Derecho.
- Corrección de avería en el sistema de excitación de la Unidad 2 C.H. Aguacate.
- Sustitución y pruebas de ambos contadores de energía C.H. Tavera.
- Sustitución completa de los reguladores de velocidad en ambas unidades, C.H. Jigüey.
- Ajuste de la lógica de control C.H. Tavera.
- Corrección de avería en la fase C del Transformador Principal Minicentral Aniana Vargas.
- Corrección de avería en el interruptor y en el sistema de distribución C.H. Las Damas.
- Cambio del sistema de protecciones de los grupos generadores, el transformador principal y la línea de transmisión C.H. Los Toros.
- Corrección de avería en el indicador de posición del "válvula bypass" C.H. Valdesia.
- Corrección de avería en el sistema de regulación de tensión (excitación) Unidad 1, C.H. Tavera.
- Corrección de avería en el regulador de velocidad Unidad 2, C.H. Aguacate.
- Corrección de los mandos de variar velocidad del sincronizador al regulador de velocidad, C.H. Sabana Yegua.
- Puesta disponible ambos grupos de la C.H. Pinalito, después de detectar en CT de la Fase de la línea Pinalito-Bonao.
- Corrección falla a tierra del rotor Unidad C.H. Valdesia.
- Corrección falla en conductores CT fase C, Unidad 1, C.H. Jigüey.
- Corrección de avería en PLC de la Unidad 2, C.H. Jigüey.
- Sustitución del interruptor del generador por el interruptor lado baja del transformador Minicentral Brazo Derecho.
- Mantenimiento y lavado de la excitatriz de la Unidad 1, C.H. Valdesia.

Dirección De Comercialización

Esta dirección durante el año 2025 ha supervisado la generación de electricidad por parte de nuestras unidades y los ingresos generados mensualmente para el comercio de la energía que se transan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En el detalle mensual se destaca que mayo fue el mes de mayor generación, superando en un 76.89% de las estimaciones, ya que su generación fue de 160.03 GWh. En segundo lugar, está el mes de junio con unos 36.16 GWh adicionales a su programación que era de 99.67 GWh y en tercer lugar noviembre cuya producción fue de 131.84 GWh, colocándose con un 31.42% por encima de la planificación estimada, esto debido a la entrada del huracán Melissa.

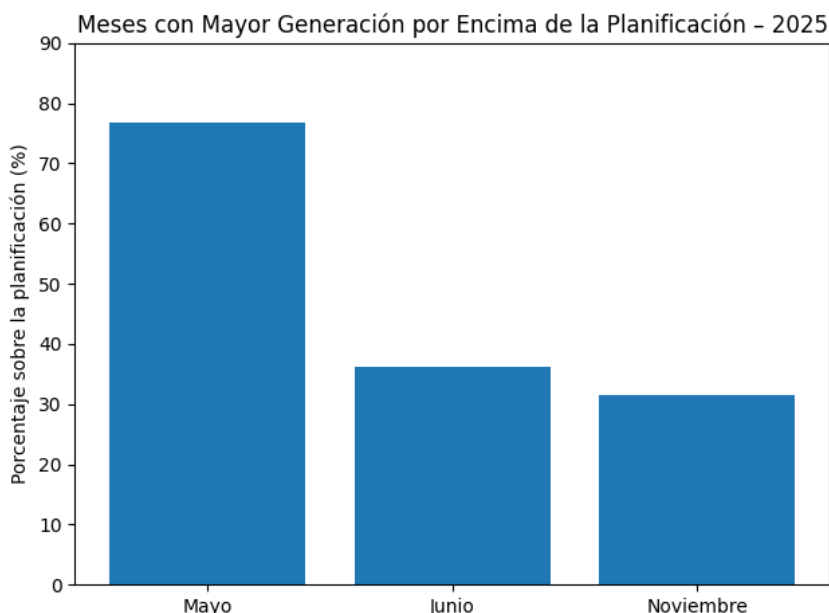

En lo concerniente a la facturación, durante el periodo en cuestión se estimó facturar RD\$11,000 millones. La ejecución actual de RD\$12,906 millones coloca a EGEHID con una meta superada en un 117.32%.

Al igual que en el rubro de generación, los meses de mayor facturación son mayo, octubre y junio con metas superadas por encima al 55%, 34.66% y 34/60% respectivamente.

Destacamos que en este 2025 EGEHID ha incrementado su cartera de clientes, usuarios no regulados, sumándose los agentes TERMOPAC, PETROQUIM, POLYPLAS, Grupo Alaska, INDAL, Centro Cuesta Nacional

Parque Logístico, Centro Cuesta Nacional 27 de febrero, Centro Cuesta Nacional Luperón, Pastas Alimenticias, Padilla y Parque Industrial Duarte. Estos clientes forman se unen a las empresas Multiparques, CORMIDOM, Luz y Fuerzas, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE

La potencia promedio que se ha estado transando es de 548.65 MW, de los cuales 64.91 MW corresponden a los clientes no regulados.

En el rubro regulación de frecuencia, se han obtenido avances importantes en lo que a la facturación se refiere, promediando unos RD\$ 54.27 millones mensuales.

En lo que respecta a las inyecciones de generación para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, de aproximadamente 31 empresas que participan en el referido mercado, EGEHID, en términos promedio, es la generadora número 8 en aportar su producción al país, destacando que para mayo este pasó a ocupar el quinto lugar en cuanto a energía se refiere.

Dirección De Desarrollo Hidroeléctrico

Durante el período evaluado, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), a través de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH), consolidó avances significativos en proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento del parque energético nacional, la gestión sostenible del recurso hídrico y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, en alineación con las políticas públicas de fomento de energías renovables.

Presa Boca de los Ríos (Guayubín)

Se mantuvo como uno de los proyectos más relevantes del año, con un avance físico de construcción del 35%, financiado con recursos del Gobierno Central. Esta infraestructura permitirá:

El control de inundaciones recurrentes en la zona noroeste del país.

El aseguramiento del riego agrícola, beneficiando inicialmente unas 2,495 hectáreas, con proyección de expansión hasta 5,000 hectáreas.

El fortalecimiento del suministro de agua potable al municipio de San Ignacio de Sabaneta.

La futura incorporación de una central hidroeléctrica de 2 MW, basada en energía limpia.

Un impacto socioeconómico directo, con la generación de más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, dinamizando la economía local.

Al cierre del período, el monto ejecutado ascendió a RD\$1,520 millones, de un contrato original de RD\$2,141 millones.

Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas

Durante el año se avanzó de manera sustancial en la ingeniería de detalle y en la rehabilitación del campamento principal, sentando las bases para la reactivación de este proyecto, considerado el de mayor capacidad instalada del país (204 MW) y con una generación anual estimada de 410 GWh.

Este proyecto permitirá:

- Incrementar en aproximadamente 40% la capacidad hidroeléctrica nacional.
- Reducir la dependencia de combustibles fósiles y los costos del subsidio eléctrico.
- Mejorar la regulación hídrica de acueductos y sistemas de riego del norte del país.
- Generar miles de empleos y reactivar la economía regional.

La inversión ejecutada al cierre de 2023 alcanzó USD 8.76 millones, de un monto total contratado de USD 24.56 millones, financiado por el Gobierno Central.

Proyecto Hidroeléctrico Artibonito

Se registraron avances relevantes en la actualización de estudios técnicos, diseños básicos y estudios geotécnicos e hidrológicos, correspondientes a la Etapa I del proyecto. Este contempla la construcción de las presas El Corte I (36 MW) y El Corte II (6 MW), con beneficios binacionales para República Dominicana y Haití.

Entre sus principales aportes destacan:

- La generación de energía limpia adicional al SEN.
- El control de inundaciones y sedimentos en la cuenca del río Artibonito.
- La reducción de importaciones de petróleo, con un ahorro estimado de US\$14 millones anuales.
- Impactos ambientales positivos, como reforestación y proyectos de piscicultura.

Al cierre del año, se encontraba en proceso la gestión de fondos y la contratación del Estudio de Impacto Ambiental, con una ejecución de diseño de US\$3.5 millones.

Recuperación del Contraembalse Las Barías

Durante el año se logró un avance significativo en la recuperación de la capacidad de almacenamiento del contraembalse, mediante la extracción de 677,000 m³ de sedimentos, bajo un esquema de inversión del Consorcio Las Barías.

Beneficios del proyecto:

- Reducir el riesgo de inundaciones.
- Mejorar la disponibilidad de agua para riego y generación.
- Proteger la infraestructura hidráulica existente.
- Fortalecer la gestión ambiental de la cuenca del río Nizao.

La inversión total del consorcio asciende a RD\$

807,295,447.14, con una ejecución acumulada de RD\$97,225,361.52 al cierre del período.

Dirección De Energía Renovable

Uno de los principales hitos del período fue el avance significativo en la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, con una capacidad instalada de 22 MWp, iniciado en marzo de 2025 y con finalización prevista para mayo de 2026. Este proyecto representa un hecho trascendental al constituirse en una de las primeras centrales híbridas hidroeléctrico-solar de EGEHID, integrándose a una central hidroeléctrica existente de 3.9 MW, con una inversión aproximada de RD\$1,106.4 millones. Su ejecución fortalece la eficiencia operativa, optimiza el uso de infraestructuras existentes y contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el marco de la expansión de la capacidad fotovoltaica, se proyectó la contratación de los Proyectos Solares Fotovoltaicos Sabana Yegua y Sabaneta, con capacidades estimadas de 24.98 MWp y 18.28 MWp, respectivamente. Ambos proyectos se encuentran en fase preparatoria, con los movimientos de tierra próximos a licitación, lo que permitirá avanzar hacia su ejecución en el corto plazo.

Desarrollo de proyectos eólicos

En materia de energía eólica, se avanzó en los estudios y diseños definitivos de los Proyectos Eólicos Tierra Nueva y Brazo Derecho, cuya conclusión está prevista para febrero de 2026. De manera conjunta, estos proyectos proyectan una capacidad instalada de 50 MW, representando un aporte relevante a la expansión de la generación renovable y a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Proyectos de Hidrobombeo

Como parte del Máster Plan, se impulsó el desarrollo de proyectos de acumulación por hidrobombeo, orientados a fortalecer la confiabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico. Estos proyectos contemplan:

El aprovechamiento de reservorios existentes, con una capacidad combinada estimada de 758 MW.

La construcción de nuevos reservorios, con una potencia aproximada de 531 MW.

Al cierre del período, los estudios de prefactibilidad técnica y económica registraron un avance del 60%, sentando las bases para decisiones estratégicas de inversión a mediano y largo plazo.

Modernización y repotenciación de centrales hidroeléctricas

De manera complementaria, se avanzó en el Proyecto de Repotenciación, Modernización y Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas, el cual se encuentra en fase de licitación de los estudios de factibilidad. Este proyecto tiene como objetivo evaluar el incremento de hasta un 20% de la capacidad instalada de las centrales actualmente operadas por EGEHID, optimizando la infraestructura existente y fortaleciendo la seguridad energética nacional.

Dirección De Mantenimiento Y Rehabilitación De Obras Civiles

Esta dirección actualmente ejecuta 43 proyectos, de los cuales 7 proyectos tienen como objetivo la optimización de la infraestructura de las centrales y 36 proyectos tienen como objetivo fortalecer la gestión social de la empresa, con un presupuesto total contratado de RD\$1,048,107,003.83. Adicional a eso se han inaugurado 19 proyectos durante este 2025 con un monto contratado ascendente a RD\$234,854,601.84. Es decir que este año se gestionaron de manera exitosa, tanto en avance como, en conclusión, 62 proyectos.

Además del avance significativo del desarrollo de las obras y la mejora sustancial de la supervisión, durante todo el año 2025 en la DMROC se inauguraron 19 obras, por lo que ya aproximadamente 593,800.00 habitantes en todas las comunidades impactadas en las diferentes provincias pueden tener acceso y disfrutar de dichas obras:

No.	Nombre de Proyecto	Municipio	Beneficiarios	Presupuesto Vigente
1	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	D.M Guanito	3,000	23,065,343.93
2	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	D.M Los Caracoles	3,000	6,764,457.86
3	Construcción Destacamento Policial, provincia Azua. (Cuartel policía Magueyal, Azua, RD)	Azua	5,000	15,321,972.66
4	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	Magueyal	3,000	13,946,360.82
5	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.	Tábara Abajo	3,000	5,897,424.87
6	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San José, municipio Duverge, provincia Independencia.	Duvergé	2,000	21,188,003.94
7	Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	Najayo	3,000	10,595,846.53

No.	Nombre de Proyecto	Municipio	Beneficiarios	Presupuesto Vigente
8	Proyecto solución Agua Potable en Comunidades Vista Hermosa, La Plata y La Cuchilla, Villa Altagracia, San Cristóbal, R.D.	Villa Altagracia	5,000	5,368,673.00
9	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	Barrio La Altagracia	2,000	9,640,758.27
10	Unidad de Atención Primaria La Plena, provincia San Cristóbal.	San Cristóbal	500,000	14,038,530.39
11	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	Rancho Arriba	100,000	16,031,992.23
12	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	Rancho Arriba	12,000	22,666,682.10
13	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, DM Juma Bejucal, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.	Bonao	1,000	4,966,669.45
14	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, DM Arroyo Toro, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.	Bonao	1,500	2,645,311.33
15	Construcción de Funeraria Jayaco, DM Jayaco, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	Bonao	20,000	17,436,879.34
16	Construcción de Comedor y Almacén en C.H. Rio Blanco, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	Blanco	N/A	8,288,072.25
17	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega	Tavera	7,500	6,596,804.39
18	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	Sabana Iglesia	53,500	23,756,214.36
19	Terminación de Capilla de Fátima, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	Navarrete	100,000	6,638,604.12
		Totales	824,500.00	234,854,601.84

Dirección De Proyectos De Obras Civiles

Actualmente esta dirección cuenta con 83 proyectos en ejecución los cuales se ejecutan en diferentes regiones del país en donde inciden las centrales hidroeléctricas, impactando directa e indirectamente a los comunitarios, generando fuente de empleos y dinamizando la economía en dichas zonas.

En la siguiente tabla mostramos las cantidades de proyectos donde la empresa ha impactado.

Zona	Provincia	Proyectos
Sur Profundo	Azua	3
	San Juan	8
Sur corto	San Cristóbal	18
	San José de Ocoa	2
Norte Centro	Monseñor Nouel	8
	La vega	7
	Sánchez Ramírez	3
Norte Centro	Santiago	24
	Santiago Rodríguez	9
	Duarte	1
Total, zonas intervenidas		83

A continuación, se listan los proyectos que fueron inaugurados durante el transcurso del año:

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
1	Reconstrucción de Carretera Loma La Gallina-La Cabra, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 2.86 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	201,941,035.02
2	Reconstrucción de Carretera La Jina-Loma De La Gallina D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.80 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	130,660,523.44
3	Reconstrucción de Carretera El Morro-El Desecho, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.51 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	122,461,603.80
4	Reconstrucción de Carretera La Jina-El Morro, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.60 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	111,381,202.60
5	Intervención de Varias Calles en la vía principal del distrito de Tavera:	La Vega	71,257,741.67

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
	-Tramo La Herradura – Cruce de Baitoa.		
	- Tramo La Herradura – Embalse de Tavera (inicia en la Herradura, pasa por el restaurante AquaVista y llega hasta el embalse de Tavera, donde se construyó una rampa con parqueo para acceso vehicular).		
	- Tramo desde la vía principal, próximo al muro de la presa de Tavera, hacia el embalse, pasando por el restaurante de Teo, donde también se construyó una rampa de acceso vehicular.		
	- Tramo desde la carretera principal de Tavera hasta el mirador que construye EGEHID.		
6	Construcción Carretera La Sabaneta – Hoyo del Cercado y Carretera El Flaire – Yerba de Culebra, Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago.	Santiago	234,329,791.64
	Zona De Impacto: Sabaneta, Municipio Sabana Iglesia		
7	Construcción Y Asfaltado Calles De Las Charcas (3.67 Km), Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago.	Santiago	153,041,496.77
	Zona De Impacto: Las Charcas, Municipio Santiago		

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
	Calles asfaltadas (aprox. 6 km en total):		
	1. Calle Niño Tavárez		
	2. Calle Manuel Díaz		
	3. Calle Principal hacia el tanque de CORAASAN		
	4. Entrada Los López		
	5. Calle El Naranja - Cruce Guayacanal		
	6. Calles paralelas al nuevo liceo de Las Charcas		
	7. Calle 3		
	8. Calle 4		
	9. Entradas Calle 5 (incluye 5A, 5B y 5C)		
	10. Calle 6		
	11. Calle 7		
	12. Calle Primera, próximo a Ochoa Las Charcas		
	13. Calles Los Cuervos		
	14. Calles circundantes al cementerio de Las Charcas		
	15. Calle Doña Pura		
	Obras complementarias:		
	• Construcción de dos muros de gaviones en la carretera principal Jánico - Santiago de los Caballeros.		

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de un puente cajón en la carretera que une Las Charcas con La Barranquita. - 		
8	Preparación de calles para asfaltado de los sectores: la esperanza, monte adentro, el pozo, los corozos, camino vero del yuna, las canas, la piñita-la presa de hatillo, municipio villa la mata, provincia Sánchez Ramirez, república dominicana.	Sánchez Ramirez	551,626,494.13
9	Construcción del Puente Sobre el Arroyo los Calimetes, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal. (puente con super estructura metálica) (longitud: 55 mts, ancho de vía: 02 carriles de 4.50 mts)	San Cristóbal	242,684,995.74
10	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal, Prov. San Cristóbal (Longitud: 5 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	San Cristóbal	127,511,712.24
11	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Batista (10.20 Km) (Ancho vía 6.00 M), Municipio Vallejuelo, Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Zona De Impacto: Provincia San Juan.	San Juan	408,310,983.21

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
12	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Rio Arriba Sur (4.65 Km), Central Hidroelectrica Domingo Rodriguez, Prov. San Juan, Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Rio Arriba Sur	San Juan	223,478,378.30
13	Reconstrucción Camino Rincón De Piedra-Carrizal, sajoma (Longitud: 3.02 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago	Santiago	89,079,779.16
14	Construcción Y Asfaltado Calles Altos De La Herradura (6.915 Kms), Central Hidroelectrica Tavera-Bao, Provincia Santiago.	Santiago	188,915,199.39
	Zona De Impacto: La Herradura, Municipio Santiago		
15	Rehabilitación Carretera La Cuesta - Loma De Los Palos (4.537 Kms), Prov. Santiago, La Cuesta, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 4.537 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	116,955,539.24

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
16	Reconstrucción Y Asfaltado Calles Centro D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago. (Longitud: 3.696 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	94,524,609.11
17	Reconstrucción carretera cruce carrizal la piedra-La Guásima, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	Santiago	188,601,833.86
18	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Sección Guazumal - El Firme, La Pangola-La Jicotea, Y Entrada Hacia La Escuela Del Sector La Toma. Circundantes Central Hidroelectrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 7.10Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	204,322,198.64
19	Construcción de Carretera D.M. El Rubio - Los Corocitos (14.9 Km), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 14.90 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de	Santiago	430,998,003.96

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
	pavimentación en hormigón asfáltico)		
20	Carretera Bao-La Galeta, La Hoya-La Virgen Y La Hoya-El Cuartel (6.98 Km), Central Hidroelectrica Lopez Angostura, Municipio Sabana Iglesias, Prov. Santiago, Zona De Impacto: Bao, La Hoya, La Virgen, El Cuartel, Municipio Sabana Iglesias	Santiago	242,089,328.98
21	Reconstrucción Carretera Puerta Del Mulo (7.58 Kms), Central Hidroelectrica Moncion, Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodriguez, Zona De Impacto: Alto De La Cana, Arenoso, San Ignacio De Sabaneta.	Santiago Rodríguez	271,255,970.91
22	Asfaltado y Obras Completarías de Caminos Circundantes a la Central Hidroelectrica Rosa Julia de la Cruz, Long. 13.813 KMS, Ancho de vía 6.0 mts (Segunda Etapa) Provincia Maria Trinidad Sanchez, Zonas de Impacto: Los Memizos, Mata Bonita, Las Gordas, Los Guayabitos, Las Catalinas.	Maria Trinidad Sanchez	225,498,946.70
23	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Baitoa-Tavera De La vía Guardarraya 9,6 Km, Municipio Baitoa, Prov. Santiago (Longitud: 9.60Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	241,191,458.00

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
24	Reconstrucción Camino Vecinal Sección El Guineo-Las 3 Veredas, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.74 Kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	257,027,179.09
25	Reconstrucción Camino Vecinal Capulin-Cañafistol Y Calles Circundantes (6.8 Km), Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Prov. San Juan.	San Juan	185,788,369.18
	Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Sectores Capulin, Cañafistol		
26	Reconstrucción Carretera Sabana Tuna-Los Derramaderos-Los Saladillos (6 Kms), Central Hidroeléctrica Sabaneta, Municipio Las Matas De Farfán, Prov. San Juan. Zona De Impacto: Sabana Tuna, Los Derramaderos, Los Saladillos, Las Matas De Farfán.	San Juan	182,995,720.31
	Mantenimiento Y Rehabilitación Caminos Circundantes A La C.H. Tavera Lateral Derecho – Longitud		
27	4.5 Km, Jánico-Las Mesetas, Municipio Jánico, Prov. Santiago. (Longitud: 4.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en		

No.	Nombre de Proyecto	Provincia	Presupuesto vigente
	hormigón asfáltico), Municipio Jánico, Prov. Santiago.		
28	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Carretera De Acceso A La Presa Palomino- Longitud 12.5 Km, Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	San Juan	109,698,290.60
29	Construcción de tramo carretera las veredas, central hidroeléctrica palomino, prov. san juan, Rep. dom.	San Juan	14,667,459.75
30	Aceras y contenes, municipio blanco, provincia monseñor Nouel.	Monseñor Nouel	2,971,376.24
31	Alquiler hora equipo limpieza acceso caminos de accesos ch. Pinalito y Salto Constanza.	La Vega	3,000,000.00
Inversión Total			5,745,121,843.66

Dirección De Mantenimiento Y Conservación De Infraestructuras

En este informe se muestra la ejecución de los proyectos que están bajo la responsabilidad de esta Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras, en el cual se destacan un punto de partida de cada proyecto al inicio del año, con la finalidad de poder mostrar el desarrollo en su ejecución.

Intervención	Instalaciones / Centrales	Avance
Cambio de imagen e impermeabilización	Magueyal, Las Damas, Los Toros, Aniana Vargas, Brazo Derecho, Jimenoa, Campamento de Valdesia, Edificio Principal, Casetas de radiofrecuencias	100%
Impermeabilización	Rincón, Salto de Constanza, Río Blanco, Hatillo, Casa Operativa San Juan de la Maguana, Muro Presa de Taveras, Muro Presa de Sabaneta, Las Barias, Nizao-Najayo, Aguacate, Palomino, Jigüey	100%

Áreas de apoyo

Dirección De Tecnología Y Telemática

Durante el año 2025, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) fortaleció significativamente su infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, garantizando la continuidad del servicio eléctrico, la seguridad de la información, y una operación más eficiente y moderna, en beneficio directo del país y de la ciudadanía.

Garantía de continuidad del servicio eléctrico

Se realizaron actualizaciones y mantenimientos preventivos a los sistemas tecnológicos críticos que soportan la operación de las centrales hidroeléctricas, reduciendo riesgos de fallas y asegurando la estabilidad del sistema de generación nacional Modernización tecnológica del Estado

Se inició el proceso de implementación de SAP S/4 HANA, plataforma que permitirá una gestión más transparente, integrada y eficiente de los recursos públicos.

Eficiencia y ahorro en el uso de recursos públicos

Se implementó un modelo de renta de impresoras multifuncionales, con la instalación de 138 equipos, optimizando costos operativos y reduciendo el uso de insumos como tóner en zonas alejadas.

Se fortaleció la capacidad interna del personal técnico, reduciendo la dependencia de servicios externos y generando ahorros directos para el Estado.

Monitoreo en tiempo real de presas y embalses

Se mantuvo y fortaleció la red nacional de estaciones de monitoreo de niveles de agua, con equipos tipo radar y burbujas instaladas en más de 20 presas y centrales hidroeléctricas, permitiendo:

- Control del nivel de embalses
- Prevención de inundaciones

- Mejor planificación de la generación eléctrica.

Se instalaron y rehabilitaron estaciones clave en Sabana Yegua, Monción y Bao, mejorando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Fortalecimiento de la seguridad energética nacional

A través del sistema SCADA, se garantizó el monitoreo continuo de las centrales hidroeléctricas, permitiendo una operación más eficiente, segura y coordinada con el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

Se avanzó en el cumplimiento del código de conexión, integrando señales críticas de múltiples centrales, lo que mejora la calidad del servicio eléctrico para toda la población.

Transparencia y Gobierno Digital

EGEHID mantuvo su certificación NORTIC A3 y continuó trabajando para mejorar su posicionamiento en el Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge), reforzando la transparencia y el uso responsable de la tecnología en el sector público.

Dirección De Gestión Ambiental

Durante el año 2025, las acciones realizadas por la Dirección de Gestión ambiental obtuvieron diferentes logros que impactaron positivamente en las diferentes estrategias promovidas por EGEHID en su Plan Estratégico mejorando la gestión ambiental de las cuencas hidrográficas Yaque del Norte, Nizao y Yuna, donde se encuentran las principales hidroeléctricas de la empresa, y que a la vez constituyen las principales cuencas del país. Entre los principales impactos están:

- Se restauraron 1,200 tareas de tierras en comunidades de las cuencas Yuna, Yaque del Norte y Nizao con más de Cien mil árboles forestales de especies nativas y endémicas como Pino criollo, Caoba, Roble, Cabima, y café con sombra.
- Continuación del apoyo al Programa de Pagos por Servicios ambientales (PSA), que aporta incentivos económicos para 62

familias propietarias de terrenos y sistemas agroforestales de la parte media y alta de la cuenca del río Yaqué del Norte de dieciocho comunidades rurales de Jarabacoa y Constanza, a cambio de que ellos preserven la cobertura boscosa de 48 mil 652 tareas de tierra.

- Ampliación del “Apoyo Penitenciario a la Gestión Ambiental”, que consiste en la incorporación de brigadas compuestas por personas privadas de libertad y que están en la fase final de sus condenas para realizar labores de restauración ecológica en cuencas hidrográficas del país, a la cuenca del río San Juan, con el establecimiento de un campamento permanente para la reforestación continua de la cuenca, iniciando con 4 mil tareas para mejorar el medio ambiente y la reinserción socio-económica de personas privadas en libertad.
- Producción de 50,000 plantas forestales en los viveros de la empresa de especies como Pino criollo, Roble, Caoba criolla, Cabima y Bambú entre otras.
- Programa de mantenimiento de presas con una estructura de 80 brigadas rotativas, que suministran empleos durante el año a 4,500 personas, con una inversión de 67 millones de pesos, logrando el objetivo de una adecuada gestión ambiental, y creando medios de vida para los comunitarios.
- Realización de 180 charlas de manejo de cuencas y ambiental ,27 talleres de manejo de desechos sólidos y 27 jornadas de limpieza en las zonas de las presas a estudiantes, comunitarios, técnicos y jornaleros de la empresa involucrando a más de mil personas.
- Estas capacitaciones se combinaron con Jornadas demostrativas de reforestación, prácticas de conservación de suelos y recolección de residuos sólidos en cuerpos de agua.
- Mejoramiento de estación piscícola Hatillo, con equipos nuevos de laboratorio, reparación de estanques, capacitación del personal y liberación de 16 mil alevines en de tilapia nilótica y carpa común en el lago de la presa de Valdesia.
- Inicio del Plan Sabaneta, con la meta de restaurar 50 mil tareas en la subcuenca del río San Juan en los próximos 3 años (2026, 2027 y 2028). El proyecto es una alianza entre EGEHID, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PLAN SAN JUAN, INDOCAFE, UTEPDA e INDRHI. Las acciones iniciaron en el mes de diciembre de 2025.

Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa tuvo por objeto realizar y gestionar todas las actividades y tareas de carácter administrativo orientadas a dotar a la Empresa de las herramientas, equipos, servicios, componentes y materiales necesarios para garantizar las operaciones normales de la entidad. Estas acciones atendieron las demandas originadas por las diferentes dependencias de la institución, cumplieron con las normativas y controles establecidos y se alinearon a la misión y al plan estratégico de la Administración.

Asimismo, la Dirección asumió la responsabilidad de viabilizar las acciones de la Administración, apoyándose en las diferentes Direcciones, Gerencias y Departamentos que brindaron soporte a la gestión institucional.

Plan operativo ejecutado 2025

Se brindó apoyo a dieciséis (16) Asociaciones de Estudiantes Universitarios en Quitasueños, a las cuales se suministró combustible de manera continua durante el período 2021–2025, con un consumo mensual aproximado de 1,260 galones de gasoil.

En los proyectos desarrollados en Guayubín, supervisados por la Dirección de Proyectos, se apoyó la operación mediante la introducción de siete (7) y hasta ocho (8) equipos amarillos, con un consumo estimado de 700 galones semanales.

Se apoyó anualmente el Operativo Semana Santa, en coordinación con la Gobernación de San Cristóbal y las entidades de socorro, mediante un aporte de combustible que osciló entre 800 y 1,016 galones de gasoil.

Este apoyo se extendió igualmente a diversas Centrales Hidroeléctricas, tanto en la Zona Sur como en la Zona Norte, durante el referido operativo.

Se dio seguimiento y supervisión a los proyectos gestionados por la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH), garantizando el apoyo logístico requerido.

Con motivo del aniversario de la empresa, las áreas de Protocolo y Gestión Humana hicieron un uso más frecuente del combustible para los traslados al Altar de la Patria, la iglesia y otras actividades vinculadas a la organización del evento.

Durante las inauguraciones de obras, las áreas de Protocolo, Dirección de Comunicaciones y otras dependencias involucradas utilizaron combustible para cumplir con las agendas institucionales y los traslados a comunidades y centrales hidroeléctricas.

La Dirección de Gestión Ambiental incrementó el consumo de combustible debido a la ejecución de fumigaciones planificadas durante los fines de semana en distintas centrales hidroeléctricas.

Las direcciones de Mantenimiento, Operaciones, Tecnología y CCH realizaron viajes constantes, bajo un esquema de atención 24/7, para la solución de averías en los sistemas de comunicación de las centrales hidroeléctricas, para lo cual la Dirección Administrativa brindó el apoyo logístico necesario mediante el suministro de gasoil.

Se suministró combustible a las plantas de emergencia ubicadas en Nabiza, Curro, Mogote, CCH y Quitasueños, garantizando la continuidad operativa ante eventualidades.


Gerencia de transportación

Durante el año 2025, la Gerencia de Transportación fortaleció su compromiso con la eficiencia operativa y el mantenimiento adecuado de la flotilla vehicular. A través de la implementación de acciones estratégicas, se avanzó de manera significativa en el fortalecimiento de la capacidad de servicio y operación institucional.

Avances alcanzados:

Modernización de la flotilla vehicular, la Empresa oficializó la adquisición de una moderna flotilla vehicular que garantizó el adecuado funcionamiento operativo de la institución. Se recibieron treinta y seis (36) camionetas, tres (3) camiones volteos, un (1) camión tipo furgón, un (1) autobús con capacidad para treinta (30) pasajeros, tres (3) minibuses de dieciséis (16) pasajeros, ocho (8) jeepones y cinco

(5) camionetas totalmente eléctricas, incorporándose así la EGEHID al mercado de los vehículos eléctricos y al uso de energías renovables.

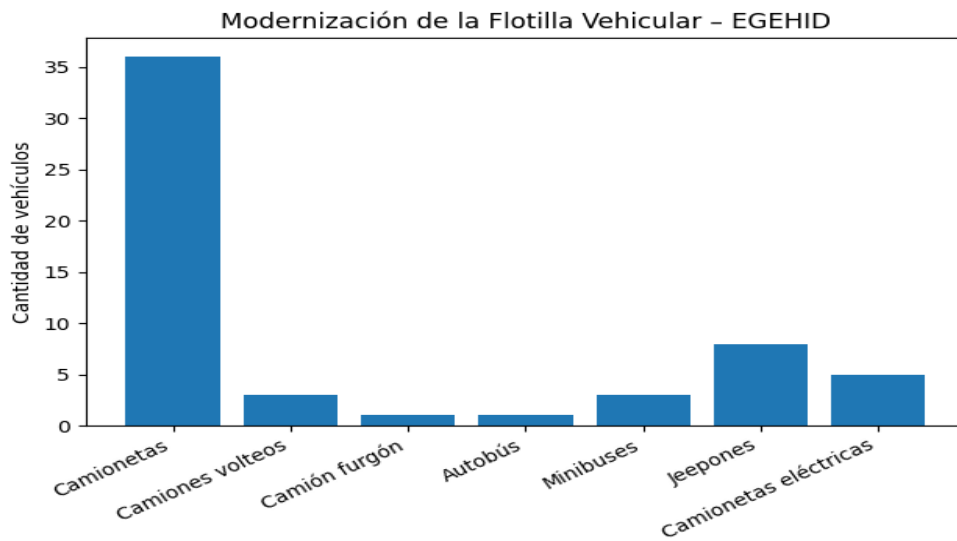

Se concluyó satisfactoriamente el proyecto de sustitución de placas civiles por placas gubernamentales en parte de la flotilla vehicular, viabilizados el proceso de exoneración de impuestos correspondiente.

Gestión de recolección de desechos, se contrató una empresa para la recolección de desechos generados por los mantenimientos vehiculares, tales como lubricantes usados, neumáticos y baterías, eliminándose focos de contaminación ambiental.

Gerencia de Servicios Generales

Las acciones ejecutadas por esta dependencia fortalecieron de manera significativa las condiciones operativas, funcionales y ambientales de la institución. Los trabajos realizados mejoraron la infraestructura física, optimizaron el funcionamiento de los sistemas eléctricos, sanitarios y de climatización, y garantizaron la continuidad de los servicios de apoyo esenciales para las distintas áreas administrativas y operativas.

Estas intervenciones contribuyeron a crear espacios de trabajo más seguros, cómodos y eficientes, redujeron riesgos operativos y minimizaron interrupciones en las labores diarias, tanto en el Edificio Principal como en las centrales hidroeléctricas.

Dirección Logística

Durante el año 2025, el Departamento de Logística sostuvo la implementación de las estrategias orientadas a optimizar los procesos de almacenamiento, distribución y gestión de inventarios. Las mejoras aplicadas desde inicios de año se reflejaron en una mayor eficiencia operativa, un mejor control de los bienes y mayor estabilidad en los procesos de suministro institucional.

Asimismo, se mantuvieron los avances logrados en trimestres anteriores, se garantizó la continuidad del servicio y se aseguró el cumplimiento oportuno de los requerimientos internos.

Inventario general de almacenes

Se logró la ejecución del inventario general en la totalidad de los almacenes de la empresa, alcanzándose un 100 % de avance al cierre del año.

Se mantuvo el uso del sistema de gestión de inventarios como herramienta principal para el registro continuo, lo que fortaleció la trazabilidad de los bienes.

Optimización del almacenamiento

Se sostuvieron los beneficios obtenidos a partir de la reestructuración del almacén principal y del almacén de repuestos de vehículos, lo que permitió una mayor capacidad de almacenamiento y un mejor flujo de materiales.

Continuó la disminución de bienes en stock y mejoraron los tiempos de entrega, lo que contribuyó al cumplimiento eficiente de los requerimientos operativos.

Capacitación del personal

Se completó satisfactoriamente la capacitación dirigida a los almacenistas y al personal administrativo de las centrales hidroeléctricas

Esta formación reforzó la correcta digitación de las salidas en el sistema, mejoró la calidad de los registros y fortaleció la gestión del inventario en tiempo real.

Continuidad en los procesos de suministro

Se mantuvo la ejecución eficiente de los suministros institucionales, garantizándose la disponibilidad oportuna de materiales gastables, materiales de limpieza y productos de consumo frecuente.

No se presentaron interrupciones significativas en los procesos logísticos, lo que aseguró la estabilidad operativa durante todo el período.

El Departamento de Logística cerró el año con un desempeño estable y con la ejecución completa del inventario general, cumpliendo el 100 % de lo programado. Se sostuvieron los avances operativos, se fortaleció el control de los materiales y bienes y se mantuvo la eficiencia en los procesos de suministro. Los resultados reflejaron una gestión disciplinada, ordenada y alineada con los objetivos establecidos para el período

Dirección de compras y contrataciones

La Dirección de Compras y Contrataciones, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, realizó diversos procesos de compras con la finalidad de dar respuesta oportuna a las necesidades de la institución.

Dichos procesos se ejecutaron conforme a la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas, específicamente la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 416-23, así como los manuales de procedimientos, formularios estándar, circulares y resoluciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de órgano rector del sistema.

Procesos de compras por debajo del umbral

Compras por debajo del umbral	
Estado del Procedimiento	Cantidad
Adjudicado	43
Abierto	1
Cancelados	1
Desierto	6
Total, general	51

Procesos de compras menores

Procesos de compras menores	
Estado del Procedimiento	Cuenta de Proceso de Compra
Abierto	4
Adjudicado	104
Cancelado	1
Desierto	16
Evaluación	1
Total, general	126

Procesos adjudicados a MiPymes

Compras para MiPymes y MiPymes mujer	
Normal	161
MiPymes	68
MiPymes Mujer	47
Total, Procesos	276

Dirección De Gestión Humana

Durante el año 2025, la Dirección de Gestión Humana desarrolló acciones orientadas al fortalecimiento del capital humano institucional, en coherencia con el lineamiento estratégico "Optimizar la Gestión del Capital Humano", priorizando iniciativas de alto impacto, resultados oportunos y el fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana, conforme a lo establecido en su Plan Operativo Anual (POA).

Desarrollo Organizacional

En el marco del fortalecimiento institucional, se dio seguimiento a la revisión y actualización anual de los procesos de la Dirección de Gestión Humana, así como a la actualización y análisis del Manual de Funciones y Perfiles de Cargos, en coordinación con la Dirección de Planificación.

Asimismo, se implementó el nuevo Formulario de Evaluación por Acuerdos de Desempeño, actualizado para el período 2025, y se realizó el seguimiento a la aplicación de las políticas de Calidad, Antisoborno y Compliance, en coordinación con la Gerencia de Calidad.

Reclutamiento, Selección y Relaciones Laborales

Durante el período evaluado, se fortalecieron los procesos de inducción y reinducción institucional, tanto grupales como individuales,

garantizando la integración efectiva del personal de nuevo ingreso y la socialización de las normativas, políticas internas y beneficios institucionales.

En materia de relaciones laborales, se registraron en el sistema SIRLA un total de 102 nuevos ingresos y 176 salidas, predominando los desahucios y la finalización de pasantías, evidenciando el seguimiento sistemático a la dinámica laboral de la institución.

Procesos de Nómina

La Dirección aseguró la correcta gestión de los procesos de nómina, incluyendo el control de horas extras, dietas y viáticos, alcanzando durante el período enero - diciembre de 2025 un monto total gestionado de RD\$119.36 millones, garantizando la transparencia, oportunidad y cumplimiento normativo en los pagos al personal.

Formación y Educación Continua

La Gerencia de Formación y Educación Continua mantuvo un desempeño destacado durante el año, ejecutando acciones orientadas al fortalecimiento de competencias técnicas, blandas y de liderazgo.

Durante el segundo y cuarto trimestre de 2025 se desarrollaron actividades formativas en distintas regiones del país, acumulando más de 800 horas de capacitación, con la participación de más de 1,300 colaboradores.

Las capacitaciones priorizaron temas como comunicación asertiva, inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, herramientas tecnológicas y energías renovables, con una inversión aproximada de RD\$2.94 millones, evidenciando el compromiso institucional con la formación integral del personal.

Becas Institucionales

Como parte de la inversión en el desarrollo del talento humano, durante el cuarto trimestre de 2025 se aprobó una (1) beca de maestría, por un monto de RD\$285,000.00, orientada al fortalecimiento académico y profesional de los colaboradores.

Visitas Educativas

En el marco de la vinculación institucional con el sector educativo, EGEHID recibió durante el tercer trimestre de 2025 a 65 estudiantes y docentes, quienes realizaron visitas educativas a las centrales hidroeléctricas Valdesia y Tavera - Bao, fortaleciendo el conocimiento sobre generación de energía limpia, sostenibilidad ambiental y operación de infraestructuras hidroeléctricas.

Dirección De Servicios Financieros

La facturación correspondiente al período evaluado ascendió a un monto aproximado de RD\$5,940 millones, lo que representó un 60 % de ejecución en el período actual.

Estos ingresos se distribuyeron en los siguientes renglones del mercado eléctrico: energía, potencia, derecho de conexión y regulación de frecuencia.

Fuente financiamiento	Fuente específica	Proyectado 2024 (rd\$mm)	Alcanzado 2024 (rd\$mm)	Índice de ejecución %
30	9995 - ventas de servicios	9,821.76mm	5,940.00mm	60.48%
Total, general		9,821.76MM	5,940.00mm	60.48%

Procedimientos y Políticas de Cobros

Durante el período evaluado, se mantuvo una gestión de cobros oportuna, mediante la conciliación periódica con los clientes. Este proceso se desarrolló de manera coordinada con la Dirección de Comercialización, lo que permitió un mayor control de la documentación y una organización adecuada de los expedientes.

Para el fortalecimiento de esta gestión, se implementaron mecanismos de contacto directo con los clientes, tales como llamadas telefónicas,

correos electrónicos y el envío de documentación física a través del servicio de mensajería institucional.

Asimismo, se realizó una revisión periódica de las cuentas por cobrar en el sistema, verificándose fechas, montos y detalles de cada registro.

Finalmente, se avanzó en el proceso de elaboración de las políticas y procedimientos de Cuentas por Cobrar, en alineación con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), con el objetivo de fortalecer el control y la transparencia institucional

Cuentas Por Cobrar

Instituciones	2024	2023
CDEEE	36,326,262,977.69	36,326,262,977.69
EDEESTE	18,285,359,090.29	18,422,782,941.35
EDENORTE	10,971,004,804.59	12,600,096,818.5
EDESUR	7,315,781,129.28	7,337,971,527.56
ETED	12,422,209.00	2,363,148.00


Contraloría Interna

Durante el período de evaluación, la Dirección de Contraloría ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la correcta fiscalización de los proyectos y procesos internos de la institución. El plan estratégico se estructuró en torno a tres grandes ejes: fiscalización técnica y financiera de proyectos, análisis documental e inspección de controles internos y validación de nómina y compensaciones.

1. fiscalización técnica y Financiera de Proyectos

El proyecto busca asegurar que los contratos y proyectos de obras ejecutados por la institución se cumplan conforme a lo estipulado legal y técnicamente.

- Se elaboraron cronogramas de visitas de fiscalización a todas las obras, con un nivel de ejecución del **100%** en su programación inicial.
- Las visitas de campo avanzan en un **50% promedio**, verificando la calidad de los trabajos y la correcta aplicación de especificaciones técnicas.
- La fiscalización financiera de proyectos en ejecución alcanzó un **50% de avance**, fortaleciendo el control sobre las erogaciones realizadas y asegurando coherencia entre la inversión ejecutada y los resultados alcanzados.

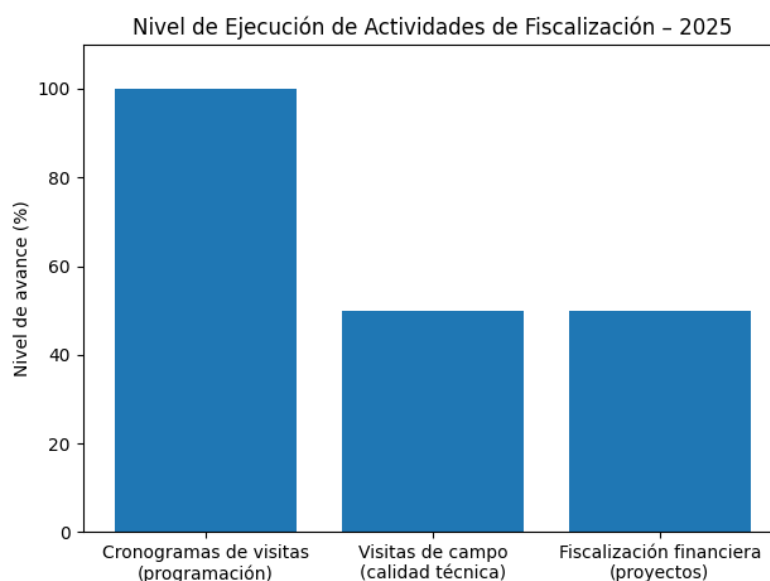

Este eje refleja una gestión activa que asegura un control permanente de los recursos invertidos en obras civiles y proyectos estratégicos.

2. Análisis Documental e Inspección de Controles Internos

El proyecto está orientado a la revisión del marco de control interno para prevenir riesgos financieros, administrativos y legales.

- La elaboración de reportes mensuales de control registra un avance del **50%**, asegurando un monitoreo continuo.
- La identificación de riesgos y deficiencias en procedimientos alcanza un 60% de ejecución, lo cual ha permitido realizar recomendaciones tempranas a las áreas responsables.
- La notificación de hallazgos de control presenta un cumplimiento del 60%, fortaleciendo el principio de rendición de cuentas y la mejora continua de procesos.

Este componente evidencia un avance consistente en la consolidación de un sistema de control interno sólido y preventivo.

3. Análisis e Inspección de Controles de Nómina

Este proyecto se centra en la validación de nómina y compensaciones, con el fin de prevenir irregularidades y garantizar la equidad en los pagos al personal.

- Actualmente se encuentra en fase de preparación, con un 30% programado en revisiones preliminares, pero varias tareas aún sin iniciar.
- Las líneas de acción incluyen: validación de procesos de nómina, notificación de hallazgos y elaboración de reportes mensuales.
- Se proyecta que, con el inicio de la fase operativa en el último trimestre, se logre alcanzar los hitos planificados en materia de control y confiabilidad de los pagos de personal.

Dirección De Auditoría Interna

Partiendo de la responsabilidad que como Dirección de Auditoría Interna le correspondió a la institución, se desarrolló un amplio plan de trabajo con el propósito de colaborar con la gestión de la Administración de la EGEHID durante el período 2025.

Este proceso se apoyó en la estructura organizativa del área, dividida en cinco (5) departamentos, lo que permitió formular recomendaciones orientadas a agregar valor a las actividades y procesos desarrollados en las áreas auditadas, a fin de que cada tarea se realizara bajo los principios de eficiencia y eficacia.

Departamento de auditoría financiera

- Se realizaron seis (6) auditorías financieras durante el período 2025.
- Se evaluó de manera significativa la cuenta Construcciones en Proceso, destacando su impacto en los estados financieros bajo los renglones de activos y gastos.
- Se emitieron recomendaciones orientadas a la correcta reclasificación contable de proyectos de obras sociales, en apego a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a los

procedimientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

- Se recomendó la elaboración de un Manual de Políticas y Procedimientos para la gestión de Construcciones en Proceso, así como el cierre oportuno de proyectos para mejorar la razonabilidad de los estados financieros.
- Se auditó la compra de Activos Fijos (períodos 2023–2024), fortaleciéndose las recomendaciones sobre control, codificación, inventarios físicos y difusión del manual correspondiente.
- Departamento de Auditoría Técnica
- Se realizaron auditorías a proyectos de obras finalizadas durante el período 2024–2025.
- Se articularon acciones conjuntas entre la Dirección Jurídica, Contraloría y Auditoría, cuyos acuerdos sirvieron de base para la formulación de políticas y procedimientos institucionales.

Departamento de Auditoría de gestión

- Se evaluó la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos institucionales.
- Se realizó el levantamiento de información del proceso de peritaje de la EGEHID.
- Se emitieron recomendaciones para fortalecer los controles en la designación de peritos, asegurando competencias técnicas, acreditaciones y experiencia.
- Se recomendó la capacitación continua y el uso obligatorio de los formatos estándar de informes establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, mejorando la oportunidad y calidad de los procesos.

Departamento de auditoría de cumplimiento

- Se verificó el cumplimiento de leyes, normativas y políticas internas en los procesos institucionales.
- Se elaboró el informe final sobre plazos y tiempos en los procesos de compras y contrataciones del período 2024.
- Se identificaron debilidades relevantes, tales como el uso de normativas derogadas, fraccionamiento de compras,

incumplimiento de plazos legales y la ausencia de un manual de compras aprobado por la DGCP.


- Se formularon recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia y el cumplimiento normativo.
- Unidad de Seguimiento a Planes de Acción
- Se monitoreó el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en auditorías internas y externas.
- Se creó una matriz de hallazgos, que permitió consolidar observaciones, responsables, plazos y avances.

Dirección Jurídica

Durante el año se fortaleció el cumplimiento normativo y el soporte institucional, en consonancia con los lineamientos estratégicos de Fortalecer la Gestión Operativa-Administrativa y Operar con Rentabilidad Sostenible. Las acciones desarrolladas consolidaron una operación jurídica más eficiente y orientada a resultados, destacándose los avances en la emisión de opiniones legales, la gestión contractual, el manejo de litigios, la regularización inmobiliaria y el apoyo transversal a las áreas sustantivas de la institución.

Dentro de los principales logros alcanzados en 2025, ingresaron 2,838 comunicaciones legales y se emitieron 2,956, entre opiniones, informes, solicitudes de información, remisiones y devoluciones, lo que permitió dar respuesta oportuna a más del 95 % de los requerimientos institucionales.

Se registraron ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema T.R.E. (Trámite Regular Estructurado), un total de 144 contratos para la emisión de certificaciones. De estos, se emitieron 74 certificaciones, correspondientes a 26 contratos de obras y 48 contratos de bienes y servicios, así como 60 adendas, incluyendo la regularización de contratos de ejercicios anteriores bajo la Ley 83-24. Quedaron pendientes de certificación 11 contratos.

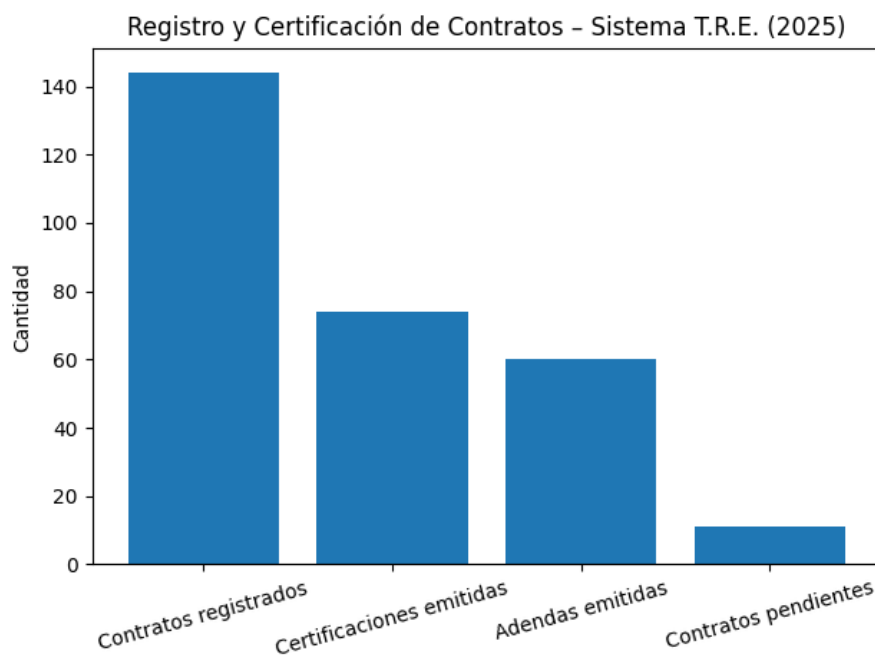

Asimismo, se originaron 240 contratos y se gestionaron 180 adendas, lo que fortaleció la seguridad jurídica de los compromisos contractuales asumidos por la institución. En coordinación con el Gabinete Social y otras instituciones del Estado, se suscribieron 18 acuerdos interinstitucionales orientados a impulsar iniciativas de desarrollo comunitario en las zonas de influencia hidroeléctrica.

Finalmente, se sostuvo la representación institucional en más de 80 procesos judiciales activos en las áreas inmobiliaria, laboral, civil, penal, administrativa y contenciosa administrativa. Se cerraron cuatro (4) impugnaciones de compras a favor de la institución y se mantuvieron estrategias de resolución temprana orientadas a minimizar riesgos financieros y preservar la reputación institucional. El área inmobiliaria gestionó 117 procesos con el propósito de defender a la institución ante posibles registros en los alrededores de las centrales hidroeléctricas. Asimismo, se impulsó el proyecto de regularización parcelaria y se logró la obtención de seis (6) nuevos títulos de propiedad.

Se realizaron verificaciones técnicas y diligencias vinculadas a procesos de expropiación en proyectos estratégicos, tales como Presa Dos Bocas, El Higüero y Arenoso.

Esta dirección acompañó proyectos de alto impacto, entre ellos el Máster Plan, los procesos de reformulación contractual bajo la Ley 83-

24, iniciativas de hidro-bombeo, acuerdos de inversión y estrategias sectoriales. Se garantizó el cumplimiento de los procedimientos de Compras y Contrataciones, desde la fase de planificación hasta el cierre contractual, lo que contribuyó a una gestión pública transparente, eficiente y alineada con las buenas prácticas administrativas.

Los resultados alcanzados evidenciaron un área jurídica más robusta, eficiente y preparada para responder a los desafíos legales asociados a la expansión y modernización del sector hidroeléctrico nacional.

Dirección De Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones mantuvo un ritmo sostenido en la transparencia de la gestión pública y la vinculación directa del Estado con la ciudadanía, especialmente en comunidades ubicadas en zonas de influencia de proyectos hidroeléctricos.

Información oportuna y derecho ciudadano a la información

Se garantizó la difusión permanente, clara y oportuna de informaciones relacionadas con la operación de presas, generación eléctrica y manejo de embalses, especialmente durante eventos climáticos y situaciones de riesgo, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la población.

Se fortaleció la comunicación preventiva sobre el estado de las presas y niveles de embalses, apoyando la toma de decisiones de las autoridades y la protección de comunidades aguas abajo. Se promovió una comunicación alineada con los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, mediante la difusión de datos verificables, actividades institucionales y resultados de gestión.

Se apoyó la socialización de proyectos con comunidades, líderes locales, autoridades municipales y veedurías ciudadanas, fomentando la participación social y la confianza en las instituciones del Estado.

Presencia institucional y comunicación estratégica del estado

Se coordinó la cobertura comunicacional de inauguraciones, visitas oficiales, actos institucionales y actividades comunitarias, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios.

Se trabajó de manera articulada con la Presidencia de la República, ministerios y otras entidades públicas, asegurando coherencia en los mensajes y alineación con las políticas públicas del Gobierno.

Gerencia De Bienestar Social

Durante el año 2025, la Gerencia de Bienestar y Asistencia Social fortaleció su rol como vínculo solidario entre la institución y las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos hidroeléctricos. A través de un enfoque estratégico basado en la responsabilidad social y el desarrollo comunitario sostenible, se ejecutaron diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de miles de personas.

En el ámbito comunitario, se desarrollaron acciones de alto impacto social en zonas cercanas a los proyectos hidroeléctricos, priorizándose la educación, la salud, el deporte y la asistencia social. Estas intervenciones contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones con las comunidades y a la sostenibilidad social de los proyectos institucionales.

Como parte de su misión, la Gerencia canalizó donaciones y aportes directos en los sectores de salud, educación, cultura, deporte e infraestructura, atendiendo las necesidades más apremiantes identificadas en las comunidades. En materia de salud, se brindó apoyo a centros médicos mediante la cobertura de procedimientos, la adquisición de medicamentos y la realización de intervenciones dirigidas a personas de escasos recursos.

En el área educativa, se apoyó a asociaciones estudiantiles mediante incentivos en combustible y la entrega de útiles escolares, equipos tecnológicos, mobiliario y reparaciones menores en centros educativos, contribuyéndose a la mejora de las condiciones de enseñanza. Asimismo, en el ámbito cultural y deportivo, se realizaron aportes para el desarrollo de actividades culturales y el

acondicionamiento de espacios deportivos, promoviéndose la identidad comunitaria, la integración social y estilos de vida saludables.

A continuación, se presentarán los principales logros del año 2025:

Lanzamiento del Proyecto Ruta Azul, una iniciativa estratégica orientada al desarrollo integral de las diez provincias del sur, enfocada en ampliar oportunidades, fortalecer la economía local, promover el turismo sostenible e impulsar la infraestructura comunitaria de la región.

Fortalecimiento de la infraestructura comunitaria mediante acuerdos interinstitucionales que permitieron la construcción, terminación y equipamiento de cuarteles policiales, centros comunales, miradores turísticos, canchas deportivas, funerarias municipales y centros de atención primaria en distintas provincias del país.

Apoyo significativo a los gobiernos locales, mediante la entrega de recursos para impulsar obras prioritarias y mejorar los servicios públicos, contribuyendo al desarrollo territorial y a la organización comunitaria.

Ampliación del impacto en salud, con aportes para procedimientos médicos, compra de medicamentos, apoyo a centros de atención primaria, jornadas médicas, programas preventivos y asistencia a personas de bajos recursos, fortaleciendo la cobertura y la atención comunitaria.

Impulso a la educación, respaldando asociaciones de estudiantes mediante incentivos semanales en combustible y dotando escuelas con útiles escolares, equipos tecnológicos, mobiliario y reparaciones menores que mejoran la calidad del entorno educativo.

Fomento de la cultura, apoyando eventos y actividades artísticas y folklóricas en diversas provincias, especialmente en las diez provincias del sur, promoviendo la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento del tejido social.

Promoción del deporte y la recreación, mediante la construcción y mejora de instalaciones deportivas y el apoyo a programas de

formación juvenil, incentivando estilos de vida saludables y espacios seguros para la comunidad.

Contribución a la sostenibilidad ambiental, a través del aporte mensual al Fondo Agua Yaque del Norte para el proyecto de protección y reforestación de la cuenca del Río Yaque del Norte, fortaleciendo la gestión ambiental y la preservación de recursos hídricos.

Fomento de la transparencia y participación social, mediante el acuerdo con el Plan Estratégico de San Cristóbal para implementar veeduría ciudadana en proyectos locales, garantizando supervisión, rendición de cuentas y confianza institucional.

Secretaria General

Logros Obtenidos:

Tramitación de comunicaciones externas e internas:

Se ha logrado ejecutar satisfactoriamente la tramitación diaria de las comunicaciones externas e internas, garantizando que las comunicaciones recibidas sean gestionadas y distribuidas de manera eficiente a las áreas correspondientes. Esto ha permitido mantener una correcta circulación de información tanto dentro de la institución como con entidades externas.

Organización y transferencia documental:

Se ha Avanzado en la gestión documental, desde la recepción documental que vienen del archivo de gestión hasta la organización de la documentación existente en el archivo central de la institución. A través de una clasificación secuencial y cronológica, se ha facilitado el acceso y almacenamiento adecuado de los documentos, lo que optimiza el proceso de control documental, inventario de archivo y garantizar consulta futura.

La transferencia de documentos del año anterior al archivo central ha sido realizada parcialmente, con la entrega y resguardo de documentos que ya no son de uso inmediato.

Gestión de consultas documentales:

La gestión de consultas se ha ejecutado eficazmente, con la entrega oportuna de documentos solicitados por las diferentes áreas para su revisión. Esta actividad ha sido crucial para garantizar la disponibilidad de la información requerida para otros procesos administrativos y operativos.

Proceso de solicitudes administrativas:

Se ha avanzado en la elaboración de solicitudes de compra y mantenimiento, cumpliendo con la fase inicial de preparación de las fichas técnicas y la subida al sistema SCAV. Esto ha permitido una preparación adecuada para los procesos de adquisición de recursos necesarios tema de información sobre concursos y contrataciones. La norma ISO 9001-2015 esta norma internacional permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto con el ciclo PVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistema de gestión.

Dirección De Seguridad Militar

El propósito primordial de la Dirección de Seguridad Militar consiste en establecer normas y disposiciones que colaboren con la capacitación y concientización del personal de seguridad militar y policial, para lograr mayor efectividad del servicio en cada una de las atribuciones que se le asignen en su misión, con el más alto grado de profesionalidad y humanismo.

Colaborar con el buen funcionamiento de las diferentes áreas de servicio y administrativas, de forma tal que la presencia e intervención, garanticen un mayor rendimiento en las labores, como resultado de la armonía y tranquilidad que le pueda proporcionar la seguridad al personal que labora en el edificio y dependencias. Sustentar el desempeño en el fiel cumplimiento a las leyes nacionales vigentes, normas, reglas y disposiciones establecidas por el administrador de "EGEHID", utilizando las herramientas necesarias para prevenir cualquier pérdida o deterioro de las instalaciones, equipos, materiales

Libre Acceso A La Información


La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) se consolidó durante el año 2025 como un instrumento interno y externo de fomento de la transparencia institucional. En este ámbito, se mantuvo el cumplimiento de los lineamientos establecidos y se evidenció la participación responsable de todos los actores involucrados.

En relación con las encuestas de satisfacción, tanto a nivel interno como externo, se obtuvieron resultados favorables, no registrándose quejas hasta la fecha y evidenciándose un posicionamiento estadístico adecuado en los indicadores de percepción ciudadana.

En cuanto a los planes de acción para la mejora, se mantuvo un seguimiento constante, con énfasis en la vigilancia permanente, la persistencia y el estricto cumplimiento de la Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.

Nivel de Cumplimiento del Acceso a la Información

Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, se recibieron un total de noventa y tres (93) solicitudes de información, de las cuales setenta y nueve (79) ingresaron por vía electrónica y catorce (14) por vía física. Del total recibido, ochenta y nueve (89) solicitudes fueron atendidas y resueltas satisfactoriamente, mientras que cuatro (4) quedaron en proceso de respuesta.



Resultados del Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (311).

En lo relativo al Sistema 311, durante el período evaluado se recibieron dos (2) quejas, las cuales fueron humanadas y resueltas de manera satisfactoria.

Resultados de las Mediciones del Portal de Transparencia

Considerando que el derecho de acceso a la información pública se reconoció como un principio fundamental consagrado en diversas convenciones internacionales ratificadas por la República Dominicana, y que este derecho contribuyó al fortalecimiento de la democracia representativa y a la transparencia de la gestión pública, la institución mantuvo el cumplimiento de los estándares establecidos.

En este sentido, se trabajó de manera continua, mes tras mes, para alcanzar y sostener la máxima puntuación otorgada por el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), como resultado del cumplimiento de los criterios y estándares de transparencia institucional.

Matriz de cumplimiento de ejecución POA 2025



			% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025													
			T1			T2			T3			T4				
Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto reparación, remodelación y construcción de área en iglesia católica Santa Lucía.	ubicada entre calle 19 de marzo y parque recreativo en el municipio de las matas de farfan, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,400,797.03	95%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	96%	95%	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$23,065,343.93	90%	5%	5%	90%	5%	5%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos	DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,364,306.06	20%	0%	25%	0%	20%	25%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial	Distrito Municipal Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$19,937,171.87	80%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel	C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$2,400,000.00	95%	5%	0%	95%	5%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$7,948,661.40	60%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	94%	96%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén.	C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$3,429,603.03	90%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cancha en Sabaneta.	municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$6,445,202.41	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Edificaciones Varias.	C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$6,319,736.62	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Bohechío.	Municipio Bohechío, Provincia San Juan	\$52,722,098.79	5%	10%	15%	5%	10%	15%	0%	0%	0%	94.00%	100%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez.	DM Amiama Gómez, provincia Azua. (Magüeyal)	\$5,504,959.36	30%	5%	5%	30%	5%	5%	0%	0%	0%	100%	96.00%	95%	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play de Beisbol.	Municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$17,432,951.03	80%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria.	Municipio Magueyal, provincia Azua.	\$5,119,612.20	40%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Militar Caracoles.	Provincia Azua.	\$8,455,572.33	95%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de parque en barrio El Blanco.	Municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$4,621,975.37	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Policial Magueyal.	Provincia Azua.	\$14,401,138.76	80%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Verja Perimetral Cementerio.	Municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$5,663,094.60	82%	0%	0%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	Municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	\$7,371,781.09	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Vijajama.	Municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$9,854,889.19	70%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San José.	Municipio Duverge, provincia Independencia.	\$26,485,034.93	90%	0%	5%	90%	0%	5%	0%	0%	0%	94.00%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Destacamento Militar Miramar.	Provincia Pedernales.	\$5,865,340.95	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94.00%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Proyecto construcción de Funeraria Najayo Arriba.	Provincia San Cristóbal.	\$13,244,808.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	98%
Dirección de Mantenimiento	Proyecto solución Agua Potable en	Comunidades Vista Hermosa, La Plata y La Cuchilla, Villa Altigracia, San Cristóbal, R.D.	\$5,368,373.57	94%	5%	0%	94%	5%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
y Rehabilitación de Obras Civiles	Comunidades Vista Hermosa.															
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$12,050,947.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$5,191,211.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parqueos.	Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$4,204,108.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén.	C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristobal	\$6,586,474.55	75%	5%	10%	75%	5%	10%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal.	\$4,186,000.00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Mantenimiento	Unidad de Atención Primaria La Plena.	Provincia San Cristóbal.	\$14,038,530.39	60%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Multiuso Cambita El Pueblecito.	Provincia San Cristóbal.	\$55,732,285.54	30%	5%	5%	30%	5%	5%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Cambita, Provincia San Cristóbal.	\$39,228,669.90	15%	3%	2%	15%	3%	2%	0%	0%	0%	94%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remoción y Construcción Acera Perimetral con Adoquines, Bulevar Turístico y Cultural, Jardinería Externa, Liceo Musical Pablo Claudio.	Municipio de San Cristobal, Prov San Cristóbal	\$11,976,273.74	50%	5%	5%	50%	5%	5%	0%	0%	0%	96%	95%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cancha Deportiva Mata Gorda.	Municipio Bani, Provincia Peravia. (Antigua Sabanita Caliente)	\$5,958,891.51	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	96.00%	95%	97%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro Comunal Río Arriba.	Provincia Peravia.	\$6,757,880.76	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Policial Santana.	Municipio de Santana, Provincia Peravia, Rep. Dom.	\$24,068,848.87	60%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	Municipio de Bani, Provincia Peravia.	\$18,429,148.04	55%	0%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio.	Nizao, Provincia Peravia	\$11,298,515.41	10%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia San Gregorio Magnún.	Provincia Peravia,RD	\$12,330,570.19	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$17,267,651.34	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.	\$16,031,992.23	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	Provincia San José de Ocoa.	\$17,342,549.56	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Verja Perimetral en Las Casetas de Sonador, Blanco, Arroyon, y en la Válvula Mariposa y Cisterna de Enfriamiento en Casa de Maquinas, C.H. Pinalito, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	C.H. Pinalito, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$2,500,000.00	15%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	94.00%	100%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento	Construcción de Comedor y Almacén	C.H. Rio Blanco, Municipio Blanco, Provincia Monseñor Nouel.	\$10,360,090.31	90%	0%	5%	90%	0%	5%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal	Municipio Sabana del Puerto, Provincia Monseñor Nouel.	\$6,294,498.55	98%	0%	2%	98%	0%	2%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro.	Municipio Jayco, Provincia Monseñor Nouel.	\$2,645,311.33	98%	0%	0%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Jayaco.	Bonao, Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	\$17,436,879.34	68%	12%	10%	68%	12%	10%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto.	Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel.	\$14,394,128.86	70%	3%	2%	70%	3%	2%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal .	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega.	\$5,504,959.36	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera.	Junta Municipal Tavera, Municipio Tavera, Provincia La Vega	\$6,596,804.39	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén.	C.H. Constanza, Municipio Constanza, Provincia La Vega.	\$5,903,911.87	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas.	Municipio de Yuna, Provincia La Vega.	\$11,792,991.65	79%	0%	0%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	96%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera.	Municipio de Constanza, Provincia La Vega	\$15,615,034.63	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remodelación del Play de Baseball La Estancia.	DM Quita Sueño, Municipio Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$18,725,606.55	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	90%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Policlínica en el DM Quita Sueño.	Municipio DM Quita Sueño, Provincia Sánchez Ramírez.	\$10,000,000.00	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos.	Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$15,665,888.09	70%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias .	C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$9,400,531.19	95%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Destacamento Militar Matancitas.	Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	\$7,331,676.19	70%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas.	Municipio de San José de Las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$22,269,416.53	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas.	Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$15,997,717.00	70%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	Terminación de Capilla de Fátima.	Municipio Navarrete, Provincia. Santiago de los Caballeros.	\$6,639,145.51	90%	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia.	Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$23,756,214.36	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria en Caimito.	Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$16,178,054.23	40%	5%	5%	40%	5%	5%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Salón Comunal en Juncalito.	DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,434,472.01	45%	0%	5%	45%	0%	5%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,042,053.99	70%	10%	10%	70%	10%	10%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López-Angostura.	DM Baitoa, Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$6,345,593.62	40%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Cuartel López - Angostura.	Municipio Baitoa, Prov. Santiago de los Caballeros.	\$5,631,199.33	60%	5%	5%	60%	5%	5%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria en Laguna Salada.	Municipio Laguna Salada, Prov. Valverde, Rep. Dom.	\$5,202,186.60	95%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza.	Municipio Esperanza, Provincia Valverde, R.D.	\$11,835,102.79	65%	0%	0%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Baseball Arroyo Cano.	DM Arroyo Cano, Provincia San Juan	\$29,535,152.43	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%	94%	96%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Proyecto Casona Seminario Nuestra Señora de las Mercedes.	Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Palacio Municipal La Siembra.	Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	90%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro Comunal Boca de Mana, Yaguaté.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa Club, Rehabilitación Cancha, Rehabilitación Play y Rehabilitación Iglesia Católica.	DM Hato del Yaque, Villa Bao, Provincia Santiago	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Oficinas Administrativas, Rehabilitación cocina-comedor	C.H Angostura y Construcción Cuartel en Presa López	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Centro Comunal Las Coles.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	94%	96%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa Operadores y Técnicos.	C.H Sabana Yegua	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	Construcción Club Deportivo Los Buitres	Provincia San Cristóbal	\$0.00	20%	10%	10%	20%	10%	10%	0%	0%	0%	94%	90%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
y Rehabilitación de Obras Civiles	(Segunda Etapa), Provincia San Cristóbal															
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino	CH Palomino	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Cañada Caquito, Sección Boruga.	Hato Damas San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball en Boca de Blanco.	Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Cruce de Blanco.	Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Centro Comunal Semana Santa y Rehabilitación Centro Comunal Punta de La Peña.	Provincia San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Viviendas Campamento .	C.H Angostura	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Funeraria Boca de Mana.	Yaguatae San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación de Viviendas Campamento y de la Casa Club .	C.H Tavera, Santiago	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Casa de La Cultura.	Municipio de Palenque, San Cristóbal	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play Los Quemados.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Play Arroyo Toro.	Bonao, Monseñor Nouel		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción casa de operadores en captación Tíreito.	C.H. Rio Blanco		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	94%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de un centro Comunal y Vivero Agroforestal .	Presa Guayubín		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Country Club Villa Altigracia.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque y Media Cancha Comunidad Contraembalse.	Yaguatae, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Municipal de Yaguatae y Remodelación Parque Infantil Jose Maria Rivas Bonilla Yaguatae.	Yaguatae, Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento	Estadio Temístocles Metz San Cristóbal.	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Cementerio Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Funeraria Municipal en Doña Ana.	Municipio Doña Ana, San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Compra Mobiliarios y Equipos DMROC			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Funeraria Sabana Palenque	Provincia San Cristobal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación centro comunal Junta de Vecino La Unión .	Provincia San Cristobal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación centro comunal Cumia Abajo San Cristóbal	Provincia San Cristobal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Yabonico.	Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Casa de Empleados .	CH Domingo Rodríguez Santiago de los Caballeros		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Play de Beisbol Punta Caña.	D.M. Pedro Corto san Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Viviendas y Construcción Caseta Planta de Bombeo .	Campamento CH. Angostura		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Play de Softball San José.	Sabaneta, Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Club Vallecito, Club Arroyo Blanco, Mercado Reconstrucción del piso de la iglesia católica Corazón De Jesus, Meseta Arriba Mención, Centro de Madres Palero.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Centro Comunal El Vallecito. Rodríguez	Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Baseball Boca de los Ríos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	Construcción Centro Comunal Los Tabacos.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Comunidad El Pastor, San Ignacio de Sabaneta, Construcción Capilla, Reparación Club.	San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción 50 Viviendas en Centro Poblado Presa de Los Ríos (Adjudicado)	Municipio Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Reparación Edificio campamento de empleados Complejo Monción y Malla Perimetral en el muro del contraembalse.	Provincia Santiago Rodríguez		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda,	Matayaya, Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	96%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remodelacion Edificacion para alojar Sub-Administración y oficinas de Energía Renovable y Medio Ambiente.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Remozamiento, redistribución interna del edificio sede EGEHID y construcción edificio comedor y salón multiuso.	Santo Domingo, RD.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	90%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play de Beisbol Sector los Parceleros Municipio Azua Prov. Azua.	Municipio Azua Prov. Azua.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque Ecologico las caobas.	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$149,482,201.02	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Parque Ecologico Santa Rita, sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	Sector Los Nova, Provincia San Cristóbal	\$30,444,834.57	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de 3 Canchas en Comunidades de Doña Ana	Provincia San Cristóbal	\$32,662,654.02	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Lechería.	Municipio Villa Altgracia, Provincia San Cristóbal	\$23,279,449.25	0%	0%	8%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	95%	95%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Play Pueblo Nuevo.	Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan	\$39,094,964.55	20%	0%	8%	20%	0%	8%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Mercado Presa Monte Grande.	Provincia de Barahona	\$81,984,025.10	15%	3%	2%	15%	3%	2%	0%	0%	0%	95%	95%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Canchas Multiples, en centro poblado presa monte grande.	Provincia Barahona	\$22,880,243.40	20%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento	Construcción Play el Fundo.	Municipio Villa Los Almacigo, Provincia Santiago Rodríguez	\$29,155,095.31	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
y Rehabilitación de Obras Civiles																
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente.	Provincia San Cristóbal	\$39,004,085.85	20%	10%	5%	20%	10%	5%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$3,219,156.35	15%	0%	5%	15%	0%	5%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	Municipio Buena Vista, Provincia La Vega.	\$3,270,179.00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Escuela Penitenciaria de San Cristobal	Provincia San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Adventista Septimo Día.	Prov San Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Templo Nuestra Señora Del Rosario y Construcción Escuela Laboral.	DM El Rosario, Prov San Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	Construcción Iglesia Católica EL Palmar, Prov San Juan	Provincia San Juan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	95%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Pagos de (Seguros de Fianzas) de los Proyectos Hidroeléctricos		\$189,654.19	35%	15%	15%	0%	10%	0%	5%	5%	5%	96%	94%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Gestión Ambiental	Inspección y levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID.		\$566,252.54	10%	8%	10%	8%	8%	10%	6%	4%	2%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Reciclaje de Desechos Sólidos		\$1,095,091.20	5%	10%	10%	1%	1%	5%	1%	1%	1%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Programa de Concienciación y Sensibilización Ambiental en EGEHID		\$108,834.00	5%	10%	7%	0%	0%	0%	1%	10%	1%	96%	96%	95%	96%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración institucional entre (EGEHID) y el Consejo de Apoyo a Jarabacoa (COAJA)		\$1,920,600.00	8%	10%	7%	40%	25%	5%	5%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Gestión Ambiental	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas		\$2,302,101.00	5%	10%	15%	10%	8%	9%	8%	8%	9%	95%	95%	95%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Restauración de la Subcuenca del río San Juan -Proyecto Sabaneta-		\$74,829,913.75	5%	3%	5%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto de Apoyo Penitenciario a la Gestión Ambiental		\$536,022.00	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	95%	98%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Reforestación de cuenca Hidrográfica		\$1,716,900.00	3%	5%	7%	0%	0%	10%	0%	0%	5%	92%	96%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Gestión Ambiental	Creación de un banco de semillas forestales y de brigadas de recolección de semillas		\$139,680.00	5%	7%	7%	10%	10%	40%	10%	1%	1%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Gestión Ambiental	Producción de Abono Orgánico		-	5%	5%	5%	10%	20%	10%	20%	10%	14%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Gestión Ambiental	Acciones de Apoyo a la prevención de incendios forestales		-	3%	3%	3%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Piscícola		\$1,507,380.00	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	23%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Gestión Ambiental	Proyecto Pago por Servicios Ambientales Hídricos, Cuenca Río Yaque del Norte. Ministerio de Medio Ambiente- COORAASAN-EGEHID.		\$12,736,197.00	1%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación interinstitucional entre EGEHID y COAJA para el Programa de Gestión Integrada para la Mejora en la Calidad y Cantidad del agua del río Yaque del Norte con enfoque en desechos sólidos		\$10,650,600.00	1%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID y la Federación		\$2,677,200.00	5%	5%	5%	5%	5%	1%	1%	2%	3%	100%	95%	98%	98%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	de Campesinos hacia el Progreso (FCHP)															
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y las Hermanas Dominicas de Monteils en la República Dominicana		\$1,746,000.00	1%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo de colaboración entre EGEHID - Asociación de Caficultores La Independencia (ASOCAIN)-INDOCAFE		\$7,915,200.00	1%	2%	2%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo entre EGEHID y el Consejo de Administración de la Presa de Monción (CONAPREMON)		\$2,095,200.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Gestión Ambiental	Fumigación y control de insectos y roedores en centrales y edificaciones		\$8,380,800.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Gestión Ambiental	Recuperación de Cuenca Alta Yaque del Norte		\$1,746,000.00	1%	2%	2%	20%	25%	10%	10%	5%	5%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Dirección de Gestión Ambiental	Fortalecimiento de la gobernanza climática y la seguridad hídrica en la cuenca del Río Nizao, para el aumento de la resiliencia climática		\$1,746,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%	
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de raciones alimenticias agrícolas y no agrícolas para el personal militar asignado a las diferentes presas y centrales hidroeléctricas	Nacional									100%	100%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de armas de fuego y municiones	Nacional									0%	100%	100%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Seguridad Militar	Abastecimiento de prendas de vestir y pertrechos militares para el personal militar asignado a la egehid	Nacional									0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Seguridad Militar	Plan de seguridad integral y funcional de la dirección militar	Nacional		3%	3%	3%	30%	30%	40%	100%	0		95%	96%	95%	95%	
Logística	Equipamiento del almacén principal de la EGEHID	Distrito Nacional		0%	10%	20%	20%	20%	40%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%	
Logística	Inventario General de los almacenes a nivel nacional de la EGEHID.	Nacional								0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%	
Logística	Suministro a todas las unidades de la empresa de material	Nacional		0%	0%	0%	40%	20%	30%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	gastable de oficina y limpieza															
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLIDORA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETEROS PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES	Nacional	\$13,544,720.00	0%	0%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS A LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICA.		\$489,304.00	1%	2%	9%	30%	40%	10%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS ELECTRICOS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$16,494,025.00	1%	4%	9%	20%	40%	10%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLIDORA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.		\$40,813,550.00	5%	5%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Operaciones	RENOVACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.	Nacional	\$74,487,561.00	5%	20%	16%	25%	40%	10%	75%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTROMECHANICOS A	Nacional	\$47,418,566.00	2%	3%	5%	25%	45%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	LAS CENTRALES HIDROELECTRICA.															
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$2,910,000.00	2%	4%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Operaciones	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PLANES OPERATIVOS (POA) DEL 2025 DE LAS CENTRALES.	Nacional	\$-	25%	45%	30%	40%	20%	20%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Operaciones	ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$27,643,297.00	0%	5%	6%	25%	40%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Operaciones	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA TEMPORADA CICLONICA PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Nacional	\$989,400.00	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Operaciones	CANTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE CALIBRACION, DE FRESADORAS Y TORDOS DE LAS DIFERENTES CENTRALES		\$1,746,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DIESEL DE LAS DIFERENTES CENTRALES.	Nacional	\$5,529,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUCEO EN POZOS SUBMARINOS EN DIFERENTES CENTRALES.	Nacional	\$4,656,000.00	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS.	Nacional	\$3,201,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Operaciones	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA UATOMATIZACION DE PLC PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL PINALITO.	Monseñor Nouel	\$5,238,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Contraloría	Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	Nacional	\$600,000.00	8%	8%	8%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	96%	96%	95%	96%



				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												
				T1			T2			T3			T4			
Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	95%
Contraloría	Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	Nacional	\$700,000.00	8%	8%	8%	20%	30%	40%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Contraloría	Análisis e inspección del buen funcionamiento de controles de validación de nómina.	Nacional	\$500,000.00	8%	8%	8%	40%	25%	23%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN, AMBAS UNIDADES CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$51,492,000.00	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL A AMBAS UNIDADES Y REHABILITACION DE INSTRUMENTACION, CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$75,600,000.00	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA MEDIA TENSION, CENTRAL ANGOSTURA.	Santiago	\$42,000,000.00	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI A AMBAS UNIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA CENTRAL VALDESIA.	Peravía	\$58,760,000.00	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO GENERADOR, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SUSTITUCIÓN CABLES URD GENERADOR AL TRANSFORMADOR DE LA CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA).	María Trinidad Sánchez	\$38,460,000.00	0%	0%	0%		30%	0%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN DE LA CENTRAL SABANETA.	San Juan	\$35,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION BLOQUES DE PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES. LOPEZ ANGOSTURA, LAS DAMAS, RINCON, SABANA YEGUA, SABANETA, TAVERA, JIGUEY Y HATILLO.	Nacional	\$17,860,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC Y HMI, CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ.	San Juan	\$50,530,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL PLC A	San Cristóbal	\$65,500,000.00	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	AMBAS UNIDADES Y HMI DE LA CENTRAL JIGUEY.															
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS RELES DE PROTECCIONES PARA DIFERENTES CENTRALES. TAVERA, LOPEZ ANGOSTURA, RINCON, HATILLO, LINEAS DE VALDESIA, JIGUEY, SABANETA Y SABANA YEGUA.	Nacional	\$55,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	FABRICACIÓN DE UN JUEGO DE 6 CONTACTOS FIJOS EXTERIOR PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA NUOVA MAGRINI GALILEO, TIPO 17 GL 31, PARA SER USADOS EN EL INTERRUPTOR DE SINCRONIZACIÓN UNIDAD NO. 2 EN LA CENTRAL JIGÜEY.	San Cristóbal	\$1,750,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	100%	100%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS COMPONENTES DE LOS INYECTORES DE LAS TURBINAS, CENTRAL PINALITO.	La Vega	\$30,500,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	100%	92.50%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALISTA PARA LA INSTALACIÓN DEL RODETE, PALETAS DIRECTRIZ, LABERINTOS Y COJINETES DE LA	San Cristóbal	\$20,000,000.00	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	TURBINA EN LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL JIGUEY.															
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE COMPONENTES DE LAS VALVULAS ESFERICAS Y COMPUERTAS DE TOMA DEL CONTRAEMBASE DE MONCION.	Santiago Rodríguez	\$5,720,000.00	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN COMPLETA, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TURBINA DE LA UNIDAD 1, RODETE Y COMPONENTES SOMETIDOS A DESGASTE, CENTRAL AGUACATE.	San Cristóbal	\$90,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION VALVULA MARIPOSA, CENTRAL EL SALTO.	La Vega	\$900,000.00	4%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA DE LA CENTRAL HATILLO.	Sánchez Ramírez	\$100,000,000.00	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION TURBINAS DE AMBAS UNIDADES. CAMBIO DE 2 RODETES Y PARTES SOMETIDAS A DESGASTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, CENTRAL RIO BLANCO.	Monseñor Nouel	\$100,000,000.00	0%	0%	2%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE SELLOS A LOS MUÑONES DE LAS VALVULAS ESFERICAS EN	Santiago Rodríguez	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	AMBAS UNIDADES, CENTRAL MONCION.															
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE EQUIPOS DE LA TURBINA, CENTRAL BRAZO DERECHO.	Valverde	\$50,000,000.00	0%	0%	2%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACION DE LA TURBINA, CENTRAL SABANETA.	San Juan	\$60,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE LOS SELLOS DEL EJE EN AMBAS UNIDADES, CENTRAL LOS TOROS.	Azua	\$4,000,000.00	0%	0%	0%	10%	50%	40%	100%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DE LAS OCHO AGUJAS Y OCHO ASIENOS DE LOS INYECTORES, CENTRAL PINALITO.	La Vega	\$950,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	40%	100%	94%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION Y MODERNIZACION PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA VALDESIA.	Peravia	\$30,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCION, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRUA, CENTRAL TAVERA.	Santiago	\$100,000,000.00	0%	0%	20%	0%	20%	0%	0%	0%	100%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN DE LÍNEA, 12470V, 15KV. C.H. LAS BARIAS, DOMINGO RODRIGUEZ Y RINCÓN.	Nacional	\$9,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	95%	96%	95%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO INTERRUPTOR 145 KV, TANQUE VIVO 1200A, CENTRAL TAVERA	Santiago	\$20,000,000.00	0%	0%	20%	0%	20%	0%	100%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA INHIBIR A 14 TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	Nacional	\$12,000,000.00	0%	0%	20%	0%	20%	0%	100%	100%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DESDE SABANETA HASTA HATILLO	Nacional	\$5,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Dirección de Mantenimiento	REHABILITACIÓN LÍNEA DE PRESA 13.8KV, CENTRAL JIGUEY.	San Cristóbal	\$25,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Mantenimiento	CAMBIO DE CT'S, PT'S. SUBESTACIÓN HATILLO 1 Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA.	Sánchez Ramírez	\$4,914,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL LAS DAMAS.	Independencia	\$25,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.	Nacional	\$3,500,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento	SUSTITUCIÓN DE 18 TRANSFORMADORES MONOFASICOS PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$1,500,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento	ELECTRIFICACION CIRCUITO EXCLUSIVO C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA) - PAYITA - LOS DRAGOS - ARROYO EL MEDIO.	María Trinidad Sánchez	\$150,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	MANTENIMIENTO A LAS REDES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Nacional	\$12,000,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	71.42%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Mantenimiento	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/12.4 7200KV/10-14 MVA, CENTRAL HÁTILLO I.	Independencia	\$25,000,000.00	0%	0%	20%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FISIQUMICOS A TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CENTRALES	Nacional	\$1,500,000.00	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Mantenimiento	CONTRATACION DE COMPAÑÍA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 400KVA CON TODOS SUS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL EGEHID.	Distrito Nacional	\$1,860,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	95%	98%	98%
Gerencia de Bienestar Social	Elaboración y aplicación de políticas y procedimientos de Gestión Social de acuerdo a los estándares internacionales (ISO 26000).	Nacional	\$25,000.00	0%	0%	0%	0%	20%	30%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Gerencia de Bienestar Social	Desarrollo de programas integrales de responsabilidad social en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Nacional	\$75,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Gerencia de Bienestar Social	Crear los mecanismos para diagnosticar, monitorear y evaluar los programas de	Nacional	\$20,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%	
				T1			T2			T3			T4				
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	bienestar y beneficios sociales en los proyectos.																
Gerencia de Bienestar Social	Robustecer el programa desarrollo de infraestructura en las comunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades dentro del area de influencia de las centrales hidroeléctricas, las actuales y las que estan en proyecto de construccion, mediante la suscripcion de acuerdos con las alcaldis y gobernacion de esas demarcacion.	Nacional								0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%	
Gerencia de Bienestar Social	Desarrollar planes de emergencia por desastres para las comunidades dentro del area de influencia de las centrales hidroeléctricas, de forma que se facilite la prestación de servicios de basicos y se garantice el suministro de bienes y servicios necesarios.	Nacional								0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%	
Gerencia de Bienestar Social	Diseñar y ejecutar un programa de salud y	Nacional								0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	seguridad integral de la comunidad.																
Gerencia de Bienestar Social	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	Nacional									0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Gerencia de Bienestar Social	Diseñar y ejecutar la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa	Nacional									0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Gerencia de Bienestar Social	Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria, en asentamientos vulnerables y susceptibles a la mejora.	Nacional									0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Gerencia de Bienestar Social	Ejecucion del plan de relaciones comunitarias en los proyectos que se ejecutan a nivel nacional.										0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	REPARACIÓN DE LOS CHILER 1 Y 2, DEL SISTEMA DE AC EN EL EDIFICIO SEDE.	Santo Domingo		25%	10%	10%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	95%	96%	95%	95%	
Dirección Administrativa	Proceso Anual de Abastecimiento de	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Combustibles en las Instalaciones de la EGEHID.															
Dirección Administrativa	Mantenimiento y calibración de las Estaciones de Abastecimiento de Combustible y Maquina de recibir el combustible en la EGEHID.	Nacional		8%	27%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección Administrativa	Adquisicion de los recibos de Tickets para el despacho y control de combustible de quita sueño.	San Cristóbal		8%	27%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	96%	95%	94%
Dirección Administrativa	Acondicionamiento de la Estacion de combustible de Quita sueño.	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección Administrativa	Ejecución de mantenimientos correctivos de la flotilla vehicular en talleres externos	Nacional		8%	27%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	Equipamiento del Tool-Room del taller mecánico	San Cristóbal		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección Administrativa	Plan de abastecimiento de kit de seguridad a la flotilla vehicular	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección Administrativa	Plan de abastecimiento de lubricantes para mantenimientos vehiculares.	Nacional		10%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección Administrativa	Ejecución del suministro de baterías para la flotilla vehicular	Nacional		10%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	96%	95%	94%
Dirección Administrativa	Plan de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular	Nacional					0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	98%	94%
Dirección Administrativa	Implementación de cambio, alineación y balanceo de neumáticos de la flotilla vehicular en empresa externa	Santo Domingo		10%	10%	5%	0%	0%	0%	87.50%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	Plan de sustitución y/o modernización de la flotilla vehicular EGEHID	Nacional		0%	30%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	95%	96%	95%	95%
Dirección Administrativa	Plan de rotulación de la flotilla vehicular	Nacional		10%	0%	25%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección Administrativa	Plan de control y monitero de flotilla vehicular a través de plataforma geolocalizadora (gps)	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección Administrativa	Proyecto de instalación de área para reparación y manejo de neumáticos de la flotilla vehicular	Nacional		0%	32%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección Administrativa	Plan de instalación de motores y transmisiones automáticas y mecánicas a la flotilla vehicular	Nacional		10%	16%	14%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección Administrativa	PLAN DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	Santo Domingo		2%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES ELECTRICOS (PLANTA ELECTRICA) Y ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE LOS MISMOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, DDH, DDH Y QUITASUEÑO	Santo Domingo		10%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE FACILITE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE ASCENSORES DE LA EMPRESA	Santo Domingo		10%	15%	20%	0%	0%	0%	76.66%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección Administrativa	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE	Santo Domingo		10%	15%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	HERRAMIENTAS DE PLOMERIA Y EQUIPOS PARA LOS TECNICOS DEL ÁREA															
Dirección Administrativa	PLAN DE SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	Santo Domingo		0%	32%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA USO DE LA EMPRESA	Santo Domingo		10%	15%	15%	0%	0%	0%	93.33%	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección Administrativa	PLAN DE SUSTITUCIÓN DE PLAFON PARA USO DE LA EMPRESA	Santo Domingo		0%	10%	35%	0%	0%	0%	0	0%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección Administrativa	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DDH, CCH Y QUITA SUEÑO	Santo Domingo		0%	10%	35%	15%	20%	20%	100%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%
Dirección Administrativa	INVENTARIO PARA INSPECCION DE MATRICULA, PLACA Y SEGURO DE LOS VEHICULOS DE NUESTRA FLOTILLA	Nacional				10%	20%	30%	30%	100%	100%	100%	90%	95%	95%	93%
Dirección Administrativa	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO SEDE	Santo Domingo				10%	17%	25%	35%	0%	0%	0%	95%	96.00%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección Administrativa	GESTION DE SOLICITUD DE PLACA FINAL DE LA FLOTILLA VEHICULAR	San Cristóbal					36%	30%	20%	0%	0%	0%	95%	95%	95%	95%
Dirección Administrativa	GESTION DE MANEJO DE DESECHOS TOXICOS (ACEITES QUEMADOS, BATERIAS, NEUMATICOS)	Nacional					31%	25%	25%	0%	100%	50%	96%	95%	94%	95%
Dirección Administrativa	TRANSFERENCIA DE PLACA CIVIL A OFICIAL	Nacional					0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%	95%	94%	94%
Dirección Administrativa	Contratación de Servicios de Transporte de Empleados para la Sede y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución.	Nacional					36%	25%	25%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección Administrativa	GESTION DE CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE ASEGURADORA DE POLIZAS PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS	Nacional		10%	0%	0%	32%	25%	25%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección Administrativa	GESTIONAR COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA OFICINAS Y COCINAS	Nacional				10%	22%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección Administrativa	EJECUCION DEL SUMINISTRO DE UNIFORMES A LAS CONSERJES	Santo Domingo					0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	95%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratacion y Ejecucion de una Consultoria de Implementación de actualizacion SCADA			0%	0%	22%	20%	20%	20%				96%	95%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion de la Actualizacion del sistema SCADA.			0%	0%	29%	17%	20%	7%				96%	95%	98%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion y actualizacion de los equipos, sensores y demas dispositivos SCADA de las centrales			0%	0%	26%	36%	20%	3%				96%	96%	95%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creacion de un stock de transductores de stock para respuesta rapida a averias (Localizacion SCADA)			0%	0%	5%	31%	20%	3%				90%	95%	98%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e Instalación de nuevos sensores de nivel y analisis de agua y rehabilitación de las estaciones hidrometeorológicas.			0%	0%	22%							90%	95%	95%	93%
Dirección de Tecnología y Telemática	Construcción / reconstruccion de casetas			0%	0%	0%	36%	7%	3%				100%	95%	94%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Reemplazo de radios enlaces e implementacion de redundancias			0%	0%	63%	32%	6%	6%				94%	95%	98%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalacion de sistemas de alimentación eléctrica múltiples para sitios centrales y repetidores.			0%	0%	0%	22%	8%	8%				96%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalación y prueba de fibra óptica y cámaras en las centrales			0%	0%	2%							95%	96.00%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Magueyal, Hatillo y Sabaneta vía servicio tercerizado															
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e instalacion de antenas satelitales portatiles para asegurar la continuidad de las comunicaciones			0%	0%	0%	16%	3%	3%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de VHF Digital			0%	0%	93%	33%	6%	6%				95%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento de la comunicacion VHF con la adquisicion de radios portatiles y moviles			0%	0%	0%	0%	0%	14%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion de visitas continuas de revision/mantenimientos rapidos a los sites de telecomunicaciones			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de dos Servicios contratados de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Radio Enlaces, Fibra Optica			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de un Servicio tercerizado de mantenimiento a torres, pararrayos, aterrizajes y cassetas del sistema de telecomunicaciones			0%	0%	2%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Tecnología y Telemática	Creacion de un stock de radios y baterias AGM de contingencia para el reemplazo de los equipos descontinuados y operando con deficiencias.			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e instalacion de Micro-Datacenters para los sites de Centrales			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e Implementacion de equipos y herramientas / renovacion de Data Centers (Alterno)			0%	0%	8%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion de licencias de Firewalls existentes			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e Implementación de Firewalls			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion del cableado estructurado certificado y equipos de red Sede Central			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de Micro Data Centers Sedes Metropolitanas			0%	0%	11%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de herramientas de gestion de			0%	0%	7%	0%	0%	0%				96%	94%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	infraestructura tecnologica para el mantenimiento y la solucion efectiva de incidentes y fallas															
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de herramienta de Gestión y Proteccion de Identidad y Credenciales de Acceso			0%	0%	6%	0%	0%	0%				91%	96%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de herramienta de Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad			0%	0%	6%	0%	0%	0%				96%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creacion de un stock de contingencia de Cables Fibra Optica, STP y UTP			0%	0%	2%	0%	0%	0%				95%	96%	95%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion de mantenimiento puntual al sistema de climatizacion CCH via servicios tercerizados			0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	95%	98%	98%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion de un equipo de fusion de fibras para repuesta rapida a reparaciones menores			0%	0%	0%	0%	0%	0%				91%	95%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion continua de revision/mantenimientos fisicos a los data centers			0%	0%	30%	0%	0%	0%				96%	95%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratacion y ejecucion de un servicio mantenimiento periodico y suministros de componente para UPS , sistemas de climatizacion y sistemas de supresion de incendios de Data Centers			0%	0%	0%	0%	0%	0%				92%	95%	98%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e Instalacion de un generador electrico de contingencia para el data center y red de Sede Central			0%	0%	0%	0%	0%	0%				92%	96%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e instalacion de Nuevos Computadores Personales 2024			0%	0%	4%	0%	0%	0%				90%	95%	98%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Aseguramiento de niveles de renovacion, actualizacion y usos adecuados de licencias de microsoft 365			0%	0%	0%	0%	0%	0%				90%	95%	95%	93%
Dirección de Tecnología y Telemática	OJO Adquisicion e implementacion de nuevos programas informaticos y licencias para atencion de necesidades de los usuarios			0%	0%	4%	0%	0%	0%				100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion continua de actualizaciones de versiones y parchos a servidores			0%	0%	42%	0%	0%	0%				94%	95%	98%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Creacion y conservacion de un stock de partes para computadoras (discos, memorias RAM, mouses, cables, etc) para rapida solucion de problemas			0%	0%	3%	0%	0%	0%				96%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ampliacion del Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Instalacion de pantallas para presentaciones			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion continua de revision/mantenimient os fisicos a estaciones de trabajo y perifericos			0%	0%	30%	0%	0%	0%				95%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion de la Consultoria de implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana			0%	0%	49%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Mantener actualizacion trimestral de las licencias de subscripcion de SAP S/4 HANA			0%	0%	39%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e Implementacion de ARIBA			0%	0%	7%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e Implementacion de Success Factors			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratacion y ejecucion de consultoria de implementacion de Ariba y Success Factors			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Contratacion y ejecucion de una consultoria de acompañamiento (contraparte) a la implementacion de SAP S/4 HANA			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Actualizacion continua del website de EGEHID			0%	0%	98%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de nuevas aplicaciones web (Predictibilidad)			0%	0%	2%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de tecnologia RV para tours virtuales de centrales hidroelectricas			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de Sistema de Administracion de Edificios			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Optimizacion del uso de la consulta del Maestro de Cedulados de la JCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de un Servicio de denuncias anonimas			0%	0%	0%	0%	0%	0%				96%	94%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Sustitucion de Carnets con la nueva imagen			0%	0%	99%	0%	0%	0%				91%	96%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion del sistema CCTV de la empresa			0%	0%	0%	0%	0%	0%				96%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion del sistema de Control de Accesos y Asistencia			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96%	95%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e instalacion de controles de acceso en areas criticas			0%	0%	99%	0%	0%	0%				100%	95%	98%	98%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion de NAS, Discos, Camaras para grabacion de videos y creacion de stock de contingencia CCTV			0%	0%	0%	0%	0%	0%				91%	95%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de tarjetas de presentacion digitales para funcionarios			0%	0%	0%	0%	0%	0%				96%	95%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Ejecucion de capacitaciones en gestion de proyectos via Educacion Continuada			0%	0%	3%	0%	0%	0%				92%	95%	98%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Consultoria de Gestión Agil de Proyectos			0%	0%	0%	0%	0%	0%				92%	96%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de Sistema de mesa de ayuda y gestion de proyectos SCRUM			0%	0%	6%	0%	0%	0%				90%	95%	98%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Fortalecimiento del indice eTICge/Obtencion de certificaciones OG TIC 2025			0%	0%	33%	0%	0%	0%				90%	95%	95%	93%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de una plataforma de formación y desarrollo de habilidades digitales para los colaboradores			0%	0%	12%	0%	0%	0%				100%	95%	94%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Implementacion de una plataforma de formación y desarrollo del staff de Tecnologia			0%	0%	12%	0%	0%	0%				94%	95%	98%	96%
Dirección de Tecnología y Telemática	Digitalizacion del Archivo Central			0%	0%	0%	0%	0%	0%				96%	96%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de solucion de acceso de confianza a las redes			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisicion e implementacion de solucion de respuesta a incidentes de redes			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Renovacion de switches de telecomunicaciones			0%	0%	6%	0%	0%	0%				95%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de Nuevos Computadores Personales 2025			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de Impresoras de Inyección			0%	0%	0%	0%	0%	0%				95%	96.00%	94%	95%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición e instalación de equipos multimedia			0%	0%	4%	0%	0%	0%				94%	95%	94%	94%
Dirección de Tecnología y Telemática	Adquisición de equipos móviles			0%	0%	0%	0%	0%	0%				94%	94%	95%	94%
Dirección de Comercialización	Adquisición, Instalación y Habilitación de los Transformadores de Corriente (CT) para el Sistema Medición Comercial (SMC) del punto de conexión Consumo de Estación Valdesia	San Cristóbal	\$4,530,000.00	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Comercialización	Adquisición, Instalación y Habilitación de Medidores del SMC de las Centrales Hidroeléctricas	Nacional	\$22,746,600.00	0%	10%	5%	30%	30%	30%	0%	100%	100%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Comercialización	Solicitud de Adquisición de Software Prime Read para Lectura de Medidores	Nacional	\$14,146,907.50	0%	20%	5%	30%	20%	25%	0%	100%	0%	94%	95%	94%	94%
Dirección de Comercialización	Solicitud de Adquisición de Tarjetas de Ethernet	Nacional	\$12,842,433.19	0%	0%	5%	0%	15%	15%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Comercialización	Optimización Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	Nacional	\$2,500,000.00	0%	0%	4%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Comercialización	Rediseño de la estructura organizacional de DC	Nacional	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	94%	95%
Dirección de Comercialización	Almacenamiento BESS Solar- PROYECTO PILOTO	Barahona	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	0%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Comercialización	Automatización de Despachos y Modelados de Energía	Nacional	\$2,500,000.00	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	67%	0%	96%	94%	94%	95%
Dirección de Comercialización	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	Nacional	\$291,200,000.00	25%	15%	0%	10%	50%	0%	0%	100%	0%	91%	96%	94%	94%
Dirección de Compras y Contrataciones	Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC)	Nacional		0%	0%	0%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Compras y Contrataciones	Migración de Compras públicas a Compras bajo procedimiento especial.	Nacional		0%	0%	0%	40%	20%	40%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Compras y Contrataciones	Actualización de organigrama del área de compras	Nacional		25%	25%	25%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Dirección de Compras y Contrataciones	Capacitación de Personal en Compras Estratégicas	Nacional		30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	91%	95%	95%	94%
Dirección de Compras y Contrataciones	Ejecución de Foros de Seguimiento y servicios internos con las áreas.	Nacional		10%	10%	10%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	96%	95%	94%	95%
Dirección Jurídica	Optimizar la Gestión Administrativa	Distrito Nacional		8%	7%	9%	30%	40%	30%	82.50%	0	55%	92%	95%	98%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección Jurídica	Gestión y Seguimiento de Procesos	Nacional		7%	8%	6%	40%	30%	30%	0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Dirección Jurídica	Registro y actualización de bienes inmuebles.	Nacional		9%	6%	5%	30%	30%	20%	55%	0%	40%	90%	95%	98%	94%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Valdesia	San Cristóbal	\$8,000,000.00	0%	0%	0%	30%	25%	40%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Sabaneta	San Juan	\$13,000,000.00	20%	20%	20%	25%	35%	40%	0%	15%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto del Cambio de imagen de la Central Hidroeléctrica Río Blanco	La Vega	\$2,760,000.00	20%	10%	10%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Mantenimiento de Impermeabilización en las diferentes Centrales hidroeléctricas: Magueyal, Las Damas, Los toros, Brazo Derecho, Boba, Baiguate, Jimenoa, Tireito, Arroyon, Los Anones, Edificio Sede, Domingo Rodríguez, Jimenoa, Aniana Vargas, DDH, Almacén de suministro, Gerencia	Nacional	2,640,000	40%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	de Transportacion, Aguacate, Valdesia, Jigüey.															
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Adecuacion y Remodelacion de la Recepcion de Transportacion	San Cristóbal	\$2,640,000.00	10%	10%	20%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen Central Hidroelectrica los Toros	Azuá	\$2,640,000.00	50%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	67.50%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Cambios Plafones en las oficinas administrativas / Quitá sueño.	San Cristóbal	\$2,640,000.00	50%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Colocacion de Cubiculos en Medio Ambiente, oficina administrativa y oficina de archivo.	San Cristóbal	\$2,640,000.00	25%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	Distrito Nacional	\$6,000,000.00	10%	5%	5%	0%	25%	25%	0%	0	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Jigüey	San José de Ocoa	\$2,640,000.00	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	Santiago	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	Santiago Rodríguez	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	San Cristóbal	\$2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto de Cambio de Imagen corporativa Central Boba	María Trinidad Sánchez	\$500,000.00	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	Proyecto Cambio de Imagen corporativa Central jimenoa	La Vega	\$12,000,000.00	0%	0%	0%	25%	25%	25%	0%	75%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Cede principal	\$2,500,000.00	12%	12%	12%	25%	30%	40%	30%	40%	55%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Cede principal	\$5,000,000.00	12%	12%	12%	0%	0%	0%	30%	20%	10%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión de inducción a colaboradores sobre procedimientos vigentes	Cede principal		12%	12%	12%	0%	0%	0%	5%	7%	10%	94%	95%	98%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Planificación y Desarrollo	Creación del Comité de Calidad Institucional y Implementar el Marco Común de Evaluación (CAF)	Cede principal		12%	12%	12%	35%	28%	25%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentación y actualización de los procesos internos de la EGEHID	Cede principal		12%	10%	10%	30%	40%	30%	15%	10%	11%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentación de normativas y controles para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCI), con la aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de 1er. Grado	Cede principal		1%	2%	2%	30%	30%	30%	30%	35%	20%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Investigación y análisis de potenciales socios y alianzas nacionales e internacionales	Cede principal		1%	1%	2%	25%	20%	20%	20%	25%	22%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Cede principal		12%	12%	12%	25%	25%	25%	22%	27%	30%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Contratación de Empresa Consultora para la elaboración de políticas, procedimientos, instructivos, protocolos y formularios de la EGEHID.	Cede principal		12%	12%	12%	40%	25%	35%	40%	21%	32%	92%	94%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión de las operaciones, los procesos y las actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes	Cede principal		5%	10%	5%	30%	35%	35%	35%	3%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Análisis de los procesos, e identificación de procedimientos no documentados, para su elaboración	Cede principal		10%	5%	5%	50%	25%	25%	55%	25%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión de inducción a colaboradores sobre procedimientos vigentes	Cede principal		5%	5%	5%	25%	50%	25%	26%	46%	35%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Creación del Comité de Calidad Institucional e Implementar el Marco Común de Evaluación (CAF)	Cede principal	\$200,000.00	5%	5%	5%	30%	30%	40%	35%	30%	45%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión integral de Riesgos de EGEHID	Cede principal		10%	10%	10%	40%	40%	20%	45%	40%	26%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Levantamiento y formulación de las políticas, procedimientos, instructivos y formularios de EGEHID por la empresa	Cede principal		5%	5%	5%	35%	35%	30%	40%	35%	35%	94%	95%	98%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	consultura Gorico Advisory Group															
Dirección de Planificación y Desarrollo	Implementación del Plan de Seguridad 2025	Cede principal		5%	5%	5%	30%	25%	25%	35%	30%	28%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Actualización de estructuras organizativas.	Cede principal		5%	5%	5%	40%	40%	20%	45%	40%	25%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización de manual de organización y funciones	Cede principal		5%	5%	5%	40%	40%	20%	45%	45%	25%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Impulsar una unidad organizacional para la igualdad y equidad de género.	Cede principal		5%	5%	5%	35%	35%	30%	40%	35%	40%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre avances y cambios en la planificación estratégica	Cede principal		3%	2%	2%	30%	30%	30%	40%	35%	35%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Definir procedimientos para emitir informes periódicos sobre cambios organizacionales	Cede principal		2%	2%	2%	30%	30%	35%	35%	40%	30%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Reformulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2025-2028(PEI)	Cede principal		10%	10%	10%	40%	40%	20%	45%	45%	30%	90%	90%	100%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Solicitud, elaboración, implementación y seguimiento del Plan	Cede principal		12%	12%	12%	40%	40%	20%	45%	40%	25%	94%	90%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Operativo Anual (POA). Implementación de indicadores cuantitativos de tiempo, forma, costo, etc.															
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del organigrama institucional	Cede principal		3%	1%	1%	50%	20%	30%	55%	30%	26%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Revisión y actualización del Manual de Funciones	Cede principal		3%	2%	1%	20%	25%	55%	23%	26%	35%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaborar la carta compromiso a la ciudadanía	Cede principal		2%	2%	2%	25%	25%	25%	30%	30%	35%	90%	90%	100%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Diseño e implementación de indicadores de gestión, para medir el desempeño (evolución del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa)	Cede principal		2%	2%	2%	30%	30%	35%	40%	35%	40%	94%	90%	95%	93%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria Institucional de la Gestión 2020-2024	Cede principal		30%	30%	20%	40%	40%	20%	40%	30%	25%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de Memoria de Gestión Semestral y Anual de la Egehid	Cede principal		0%	0%	0%	25%	35%	40%	35%	20%	40%	100%	100%	100%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	Elaboración de informe Trimestrales de ejecución de los	Cede principal		12%	12%	12%	35%	35%	30%	40%	35%	30%	100%	100%	100%	100%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	procesos POA-PACC-Presepeusto 2025															
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado De La Calles Salida De Puñal A La Av. Hispanoamericana. Calle Tuto García. Municipio Puñal, Prov. Santiago. (Incluye: Puente vehicular, obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$122,175,266.94				94%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Limpieza Y Rehabilitacion del Canal Nizao - Najayo, (Etapa 1) 10km, Prov. San Cristóbal.	San Cristóbal	\$127,511,712.24				60%	15%	15%	0%	0%	20%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provinvia Valverde (Longitud: 1.38 Kms)	Valverde	\$125,497,731.11				50%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Y Asfaltado Calles Centro D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago. (Longitud: 3.696 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta	Santiago	\$187,258,961.13				40%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	de pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera La Auyama (1.83 Kms), El Naranjito (0.895 Kms), Callejón No.1 (0.774 Kms), D.M. La Cuesta, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago. (Longitud: 3.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$98,754,897.15				60%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera La Cuesta - Loma De Los Palos (4.537 Kms),Prov. Santiago, La Cuesta, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 4.537 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$98,876,496.87				50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucion Camino Rincón De Piedra-Carrizal, sajoma (Longitud: 3.02 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y	Santiago	\$137,873,723.38				95%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico),Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago															
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado Carretera Acceso Presa Palomino, C.H. Palomino, Prov. San Juan	San Juan	\$241,191,458.00				53%	10%	10%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Asfaltado Carretera Desde CH Monción Hasta Presa Monción, (Tramo III Desde Presa Monción Hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II Desde CH Monción Hasta Contraembalse (3,50 Kms), Alcantarilla Tubular De 30" En Laguna Próxima Al Campamento De Empleados) E Iluminación De La Corona De La Presa, Prov. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$101,018,535.02				60%	3%	3%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Bacheo Y Recapeo Con Carpeta Asfáltica De 2" Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigüey, Seccion Los Mineros,	San Cristóbal	\$72,402,178.90				95%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.82 kms, ancho promedio: 7.32 m, incluye: Gaviones y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Carretera Bao-La Galeta, La Hoya-La Virgen Y La Hoya-El Cuartel (6.98 Km), Central Hidroeléctrica Lopez Angostura, Municipio Sabana Iglesias, Prov. Santiago, Zona De Impacto: Bao, La Hoya, La Virgen, El Cuartel, Municipio Sabana Iglesias	Santiago	\$91,753,076.44				95%	1%	1%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Carretera La Sabaneta En Sabana Iglesias (6.986 Km), Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Municipio Sabana Iglesias, Provincia Santiago.	Santiago	\$47,082,075.03				35%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Sabaneta, Municipio Sabana Iglesias		\$116,955,539.24				90%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	CC (Cagüeyes - Juncalito) - Los Corrales - Damajagua	Santiago	\$89,079,779.16				55%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Adentro - Las Carreras Abajo - Las Carreras															
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Boulevard Hatillo (16.20 Km), Central Hidroeléctrica Hatillo, Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez, Zona De Impacto: Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez. LOTE I	Sanchez Ramirez.	\$116,854,621.98				60%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Boulevard Hatillo (16.20 Km), Central Hidroeléctrica Hatillo, Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez, Zona De Impacto: Prov. Monseñor Nouel Y Prov. Sanchez Ramirez. LOTE II	Sanchez Ramirez.	\$681,451,456.12				64%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Calles De Pinalito, Municipio de Jánico, Prov. Santiago (6.695 km) incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico	Santiago	\$329,342,515.27				50%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Central Hidroeléctrica Valdesía, Provincia San	San Cristóbal	\$766,740,939.26				40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Cristóbal, República Dominicana															
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de 50 Viviendas en Centro Poblado Presa los Rios Municipio de Guayubin, Prov. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$843,858,907.65				20%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Calles del Municipio Juan de Herrera, Sabaneta, Prov. San Juan, R.D.	San Juan	\$1,488,036,568.02				94%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Carretera D.M. El Rubio - Los Corocitos (14.9 Km), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 14.90 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$692,372,479.43				30%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Carretera Yerba Buena los corrales, Municipio SAJOMA, C.H. Tavera, Santiago.	Santiago	\$384,600,827.31				25%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción de Puente Cajon Sobre Rio Jamey, Hato Dama, San Cristóbal.	San Cristóbal	\$328,217,152.81				20%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%



				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												
				T1			T2			T3			T4			
Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción del Puente Sobre el Arroyo los Calimetes, Municipio Los Cacaos, Prov. San cristobal. (puente con super estructura metalica) (longitud: 55 mts, ancho de vía: 02 carriles de 4.50 mts)	San Cristóbal	\$410,608,495.18				50%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Verja Para Protección Boulevard Parque Lineal Tenguerengue, Prov. San Juan (Longitud: 6.60 Kms)	San Juan	\$242,684,995.74				43%	16%	16%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Verja Perimetral Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroelectrica Brazo Derecho, Jicome, Provinvia Valverde	Valverde	\$175,937,669.01				75%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles Altos De La Herradura (6.915 Kms), Central Hidroelectrica Tavera-Bao, Provincia Santiago.	Santiago	\$204,322,198.64				80%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: La Herradura, Municipio Santiago		\$73,767,637.10				94%	2%	2%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles Barrio 5 De Abril (2.56 Km),	San Cristobal	\$74,107,872.13				70%	3%	3%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal.															
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Barrio 5 De Abril, Municipio San Cristóbal.		\$209,997,990.96				60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcción Y Asfaltado Calles De Las Charcas (3.67 Km), Central Hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago.	Santiago	\$430,998,003.96				60%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Las Charcas, Municipio Santiago		\$101,545,793.43				66%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Construcion Carretera de Monción- Contraembalse de Mao, long. 30 km.	Santiago Rodríguez	\$234,269,350.80				60%	5%	5%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Cruce de los Quemados-Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez (Long. 23 Km)	Santiago Rodríguez	\$98,073,729.63				70%	10%	10%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Diseño Y Construcción De Muro De Protección En el Municipio de Arenoso, Prov. Duarte Etapa 2	Duarte	\$94,524,609.11				60%	15%	15%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temistocles Mets Hasta. 6 De Noviembre, Ampliación Puente Sobre Rio Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De Noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Rio Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote I: Mejoramiento Carretera Sánchez Vieja Y Nuevo Corredor Madre Vieja Sur, Incluye Cajon Vial.	San Cristóbal	\$226,909,687.90				60%	5%	5%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temistocles Mets Hasta. 6 De Noviembre, Ampliación Puente Sobre Rio Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A	San Cristóbal	\$188,601,833.86				70%	10%	10%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%	
				T1			T2			T3			T4				
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De Noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Rio Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote II: Construcción Puentes Distribuidores.																
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temistocles Mets Hasta. 6 De Noviembre, Ampliación Puente Sobre Rio Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De Noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Rio Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote III:	San Cristóbal	\$123,277,096.86				60%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Proyecto: Rehabilitación Carretera Sánchez, Inc. Solución Vehicular De Calle Duarte (5.60 Km).S.															
Dirección de Proyectos Especiales	La Construcción Solución Vial Desde Antigua Carretera Sanchez Play Temistocles Mets Hasta. 6 De Noviembre, Ampliación Puente Sobre Rio Nigua, Paso A Desnivel 1, Paso A Desnivel 2, Distribuidor En Autopista 6 De Noviembre (14 Km), Rehabilitación Carretera Sanchez Con Solución Vial De Calle Duarte, Puente Sobre Rio Yubazo Y Protección Rivera Con Gaviones, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal. Lote IV: Puente Sobre Rio Yubazo Para Conexión Carretera Sainagua Y Protección Rivera Con Gaviones.	San Cristóbal	\$124,498,204.90				50%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de 13 Km Camino de Villa	Azua	\$56,574,160.44				40%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Palomino, Prov. de Azua.															
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Caminos Vecinales Municipio de Sabaneta, Prov. San Juan, Grupo 2, Longitud 23.02 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	San Juan	\$52,615,963.84				20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Caminos Vecinales Zona de la Sierra, Provincia Santiago.	Santiago	\$234,329,791.64				70%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitacion Caminos Comunidades Buena Vista, La Yagua, La Laguna, Bacheo Tecnico Del Acceso Principal A Valdesia Desde Semana Santa A La Central, Obras Hidraulicas Via Existente Las Barias Circundantes Central Hidroelectrica Valdesia, Estribo Izquierdo Gavion Puente Principal Acceso A La Central, Prov. Peravia (Longitud: 8.00 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y	Peravia	\$188,915,199.39				80%	3%	3%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	tratamiento superficial asfáltico doble).															
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitacion Camino La Canelilla-La Cole. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Sección las Coles, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal. (Longitud: 5.40Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimientación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$124,758,699.58				70%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitacion Camino Sección Majagual-Manomatuey, Municipio Cambita Garabitos, Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Prov. San Cristobal. (Longitud: 7.00Kms, incluye: obras de arte, señalización y	San Cristóbal	\$533,953,763.66				35%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%	
				T1			T2			T3			T4				
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)																
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitacion Caminos Barrio Alto De Los Ubaldo Y San Francisco A Guazumal. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal (Longitud: 4.90Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$421,338,397.18				35%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%	
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitacion Caminos Sección Guazumal - El Firme, La Pangola-La Jicotea, Y Entrada Hacia La Escuela Del Sector La Toma. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal (Longitud: 7.10Kms,	San Cristóbal	\$271,255,970.91				70%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes a la Central Hidroeléctrica Monción, Provincia Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$335,479,112.29				30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Pinalito Y Río Blanco, Provincia Monseñor Nouel.-	Monseñor Nouel	\$191,457,407.42				30%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Sabana Yegua Y Sabaneta, Provincias Azua Y San Juan.	Azua Y San Juan	\$121,185,436.83				60%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas: Hatillo Y Rincón, Provincias Monseñor Nouel, La Vega Y Sanchez Ramirez.-	Monseñor Nouel, La Vega Y Sanchez Ramirez	\$274,656,627.39				20%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantess	San Cristóbal	\$326,701,058.74				80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Centrales Hidroeléctricas: Jigüey y Aguacate, Provincia San Cristóbal-															
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento de Vías de acceso circundantess Centrales Hidroeléctricas: Valdesia	San Cristóbal	\$178,811,312.45				94%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitación Caminos Circundantes A La C.H. Tavera Lateral Derecho - Longitud 4.5 Km , Jánico-Las Mesetas, Municipio Jánico, Prov. Santiago. (Longitud: 4.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio Jánico, Prov. Santiago.	Santiago	\$481,422,835.14				60%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos Baitoa- Tavera De La Via Guardarraya 9,6 Km, Municipio Baitoa, Prov. Santiago (Longitud: 9.60Kms, incluye: obras de arte y carpeta de	Santiago	\$185,788,369.18				80%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitacion De La Carretera De Acceso A La Presa Palomino- Longitud 12.5 Km, Derivacion Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	San Juan	\$182,995,720.31				70%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Mantenimiento Y Rehabilitacion Obras Hidraulicas Vía Existente Las Barías Longitud 5 Km , Sección las Barías, Municipio Bani, Prov. Peravía	Peravía	\$130,166,583.74				80%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Obras de mejoría y adecuación de los balnearios	Santiago	\$92,682,210.79				60%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Preparación De Calles Para Asfaltado De Los Sectores La Esperanza, Monte Adentro, Amor Y Paz, INESPRES, EL INDRHI Y La Unión, El Pozo, Los Corozos, Caminos Vera Del Yuna, Municipio Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramírez.	Sánchez Ramírez	\$94,769,758.76				50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Proyectos Especiales	Presupuesto Para La Readecuación y Solución De Montaña Con Riesgo De Derrumbes Y Caídas De Rocas En Estaciones 15+640 , 15+615 En Zona De Dren Y Escorrentia De La Montaña, 10+430, Camino Acceso A Presa Palomino Derivacion Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	San Juan	\$94,909,608.43				60%	5%	5%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Proyecto: Rehabilitacion Caminos Vecinales Prov. San Juan, Municipio Las Matas De Farfan, Grupo I, Longitud 18.92 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	San Juan	\$249,451,400.34				95%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción camino La Cuesta de Mela y Construcción alcantarilla de cajon, D.M. Guayabal, Prov. Santiago, C.H. Tavera, Republica Dominicana (Incluye: Puente vehicular, obras de arte, señalización, drenaje y capa de rodadura)	Santiago	\$1,050,965,661.36				15%	4%	4%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Capulin-Cañafistol Y Calles Circundantes (6.8 Km), Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Prov. San Juan.	Prov. San Juan.	\$974,984,560.02				15%	4%	4%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Sectores Capulin, Cañafistol		\$937,165,277.86				18%	6%	6%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal La Ceyba, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel	\$1,046,339,431.78				18%	3%	3%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Almendrales, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel	\$521,404,559.84				30%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Botados, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel	\$1,792,275,096.55				5%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Cacaos- Santana, Sección Calderón-Santana, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 13.10 kms, incluye: Drenaje, estructuras,	San Cristóbal	\$877,449,787.93				5%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Los Capaces Y El Sector El Puente Río Blanco, Prov. Monseñor Nouel, Rep.Dom.	Monseñor Nouel	\$510,375,168.84				5%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Sección El Guineo-Las 3 Veredas, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.74 Kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	San Cristóbal	\$935,726,220.93				5%	10%	10%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Batista (10.20 Km) (Ancho Vía 6.00 M), Municipio Vallejuelo, Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Zona De Impacto: Provincia San Juan.	San Juan	\$141,888,794.82				20%	10%	10%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Camino Vecinal Vallejuelo-Río Arriba Sur (4.65 Km), Central	San Juan	\$91,948,974.97				20%	10%	10%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Hidroeléctrica Domingo Rodríguez, Prov. San Juan, Zona De Impacto: Municipio Vallejuelo, Rio Arriba Sur															
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Alto De La Cana (11.50 Kms), Central Hidroeléctrica Monción, Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez.	Santiago Rodríguez	\$144,116,846.04				20%	13%	13%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Palmarejo, El Jobo, Altos De La Cana, Los Pinares		\$122,844,160.78				40%	3%	3%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Arroyo Seco C.H. Monción, Sabaneta, Proy. Santiago Rodríguez	Santiago Rodríguez	\$576,909,666.18				10%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción carretera cruce carrizal la piedra-La Guazuma, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	Santiago	\$242,089,328.98				20%	20%	20%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Puerta Del Mulo (7.58 Kms), Central Hidroeléctrica Monción, Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago	Santiago Rodríguez	\$550,263,808.14				10%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Rodríguez, Zona De Impacto: Alto De La Cana, Arenoso, San Ignacio De Sabaneta.															
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Carretera Sabana Tuna-Los Derramaderos-Los Saladillos (6 Kms), Central Hidroeléctrica Sabaneta, Municipio Las Matas De Farfan, Prov. San Juan.	San Juan	\$225,498,946.70				10%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: Sabana Tuna, Los Derramaderos, Los Saladillos, Las Matas De Farfan.		\$93,097,865.23				90%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción De Calles Gurabo Y Clavijo (19.20 Kms), Central Hidroeléctrica Moncion, Municipio Moncion, Prov. Santiago Rodríguez, Zona De Impacto: Gurabo, Clavijo, Moncion.	Santiago Rodríguez	\$109,269,734.71				100%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción De Caminos Adayacentes A La Presa De Moncion D.M. Moncion (Longitud: 11 kms, incluye Iluminacion, obras de arte, carpeta de pavimento en	Santiago Rodríguez	\$527,082,928.41				100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	hormigón asfáltico) Prov. Santiago Rodríguez.															
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera (C. C.La Jagüita-Altos Del Aguacate) - Tavera Abajo, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 1.648 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$104,536,059.05				100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera El Morro-El Desecho, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.51 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$45,923,145.78				100%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-Conuco Viejo-El Jobo (1.88 Km) , La Jina-Cementerio De Jina Hueca (0.864 Km) , D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.865 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de	La Vega	\$112,466,150.84				100%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-El Morro, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.60 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$87,939,008.93				90%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción de Carretera La Jina-Loma De La Gallina, La Jina-Loma Del Coco, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.80 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$441,303,331.93				90%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Obra de Toma del Río Yuna, Acueducto Bonaó, Ubicación Prov. Monseñor Nouel, C.H. Río Blanco	Monseñor Nouel	\$58,425,842.58				40%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Proyectos Especiales	Reconstrucción Tramo Carretera Las Cruces- (Las Cruces-La Herradura)-Los Ranchos De Tavera	La Vega	\$130,914,915.48				100%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%	
				T1			T2			T3			T4				
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	(1.23 Km), La Herradura-Embalse Taveras (0.224 Km), Calle Interior La Herradura (0.315 Km), Tramo Carretera Las Cruces (0.352 Km), D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 1.93 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)																
Dirección de Proyectos Especiales	Recosntrucción de Carretera Loma La Gallina-La Cabra, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 2.86 Kms, incluye: obras de arte, drenaje , señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	La Vega	\$110,623,566.61				100%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%	
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitacion Calles San Pedro, Municipio Sabana Iglesias (Longitud: 2.875 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$117,385,399.10				80%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Canal Ysura En Tramos Discontinuos Desde La E-0+000 A E-6+000 (Primera Etapa) Y Desde La E-6+000 A E-15+000 (Segunda Etapa) (15 Km), Central Hidroeléctrica Los Toros, Prov. Azua.	Azua	\$245,929,501.48				90%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Zona De Impacto: D/R: Sistema De Riego Valle De Azua, D/R: Azua.		\$12,261,964.65				0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera Aguas Calientes - Las Placetas DM Placetas, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 8.15 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago	\$37,866,124.67				0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Carretera El Rubio - La Celestina (7.05 Km)DM Rubio, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 7.05 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de	Santiago	\$64,791,146.31				0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	pavimentación en hormigón asfáltico)															
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal, Prov. San Cristóbal (Longitud: 5 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	San Cristóbal	\$104,965,881.69				0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación Varias Calles, Distrito Municipal Guayabal, Prov. Santiago, Republica Dominicana (Longitud: 3.327 Kms, incluye: obras de arte, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	Santiago								0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote I	San Cristóbal								0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote II	San Cristóbal								0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote III	San Cristóbal									0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Rehabilitación y ampliación Carretera Cambita Los Cacaos Lote IV	San Cristóbal									0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Proyectos Especiales	Sistema De Riego. Comunidad El Canal, Prov. Ocoa	San José de Ocoa									0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Proyectos Especiales	Terminación De Los Diques Viejo Y Nuevo - Río Caña - Matayaya, Distrito Municipal Matayaya, Las Matas De Farfan, Provincia San Juan.	San Juan									0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Gestión Humana	Plan Anual de Capacitación año 2025, para los colaboradores de la EgehíD.	Nacional	\$25,000,000.00	25%	25%	25%	20%	20%	30%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%	



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Gestión Humana	Creación de Manual de Políticas y Procedimiento para el Otorgamiento de Becas a Colaboradores de la egehid.	Nacional	\$100,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Gestión Humana	Creación de Manual de Políticas y Procedimiento para realizar descuento a los colaboradores que reprobren, deserten de la capacitación, o renuncien a la empresa luego de esta realizar la inversión.	Nacional	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	94%	96%	96%	95%
Dirección de Gestión Humana	Gestión y control de los acuerdos interinstitucionales orientados a la educación realizados por la engerid.	Nacional	\$500,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Humana	Campaña de inducción de Normas y Régimen Disciplinario(Relaciones Laborales)	Nacional	\$150,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	96%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Gestión Humana	Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)	Nacional	\$0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Humana	Análisis de los Descriptivos de Puesto	Nacional	\$400,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	94%	96%	95%
Dirección de Gestión Humana	Realización de actividades con motivo a la semana de la salud preventiva	Nacional								0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Humana	Jornada de visitas de Administradoras de Riesgos de Pensiones y Administradoras de Fondo de Pensiones	Nacional	\$150,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	92%	96%	94%
Dirección de Gestión Humana	Ejecución del Programa de Salud Preventiva dirigido a las Centrales Hidroeléctricas	Nacional	\$3,000,000.00							0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Gestión Humana	Programa de actividades de Integración de Personal	Nacional	\$8,000,000.00							0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Gestión Humana	Mejora del plan de Inducción y Reinducción	Nacional	\$1,000,000.00							0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Humana	Ejecución de revisiones periódicas de informes Gerencia de Nomina	Nacional								0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Gestión Humana	Creación del manual de políticas y	Nacional								0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	procedimiento para la Gerencia de Nomina															
Dirección de Gestión Humana	Desarrollo del programa de inauguración de Proyectos EGEHID	Nacional	\$20,000,000.00							0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Gestión Humana	Desarrollo Jornada Aniversario de la Empresa	Nacional	\$300,000.00							0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Gestión Humana	Elaboración del Manual de Amonestación Y llamado de atención	Nacional								0%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Gestión Humana	Programa de reconocimiento del mérito estudiantil de hijos de colaboradores	Nacional	\$2,000,000.00							10%	12.50%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Auditoría Interna	Ejecución del Programa de Salud Preventiva dirigido a las Centrales Hidroeléctricas	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Auditoría Interna	Programa de actividades de Integración de Personal	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Auditoría Interna	Mejora del plan de Inducción y Reinducción	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Auditoría Interna	Ejecución de revisiones periódicas de informes Gerencia de Nomina	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	96%	96%	94%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				T1			T2			T3			T4			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Dirección de Auditoría Interna	Creación del manual de políticas y procedimiento para la Gerencia de Nomina	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	25%	100%	0%	100%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Auditoría Interna	Desarrollo del programa de inauguración de Proyectos EGEHID	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Auditoría Interna	Desarrollo Jornada Aniversario de la Empresa	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	95%	95%	93%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera a la Cuenta de Anticipo a Proveedores al 2024	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	94%	96%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera Cuenta (Software y Licencias) al 2024	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	94%	95%	98%	96%
Dirección de Auditoría Interna	Seguimiento A los Planes de Acción Suministrado por las Áreas Auditadas	Santo Domingo		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Auditoría Interna	Adquisición de Activos fijos del 2023 y 2024	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	92%	100%	94%
Dirección de Auditoría Interna	Auditoría Financiera de Arqueos de cajas chicas	Nacional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	99%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Proyecto de Construcción Presa Guayubin		\$1,852,259,330.54	5%	2%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	68%	90%	90%	90%	90%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Proyecto Acueducto Sabaneta		\$133,397,729.53	0%	1%	5%	8%	10%	12%	5%	5%	8%	94%	94%	95%	94%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Ingeniería de Detalle Proyecto Las Placetas		\$3,540,607.57	5%	6%	4%	5%	7%	2%	6%	6%	5%	94%	94%	95%	94%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Adquisición de TBM Proyecto Las Placetas		\$5,939,301.99	1%	1%	1%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Supervisión Proyecto Las Placetas (Gerenciado DDH)		\$1,202,257.75	8%	11%	10%	10%	12%	14%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Supervisión Presa Guayubin		\$51,673,931.52	4%	3%	6%	15%	20%	0%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Contratación de empresa consultora para prestar los servicios de Gerencia Ingeniería y Supervisión de la construcción del proyecto Presa Boca de los Ríos, Presa sobre el Río Guayubin, del Acueducto Sabaneta (Línea de Impulsión y cárcamo de bombeo), de la reconstrucción de las calles Gurabo-Los Clavijos y Rehabilitación Carretera Cruce quemados-Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez		\$196,658,122.87	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Reservoirio Barranca		\$61,733,743.79	0%	3%	10%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Hidroeléctrica Artibonito		\$20,388.89	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	94%	94%	95%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en la Ladera Embalse de la Presa Pinalito (Readecuación Estribo Izquierdo Presa Pinalito)		\$114,920,974.58	2%	5%	8%	12%	10%	0%	0%	0%	0%	91%	96%	94%	94%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Construcción Reservorio Pajonal		\$62,253,133.72	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96%	96%	94%	95%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Actualización de Estudio diseño presupuesto, construcción Presa la Gina		\$1,203,231,293.02	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	96%	95%	95%
Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Canal Nizao-Najayo		\$4,134,778.81	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Servicios Financieros	Rendición y Transparencia de la Información Financiera	Distrito Nacional											91%	95%	95%	94%
Servicios Financieros	Eficienzar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables	Distrito Nacional											96%			94%
Servicios Financieros	Eficienzar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento	Distrito Nacional											92%	95%	98%	95%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Servicios Financieros	Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar	Distrito Nacional									0%	0%	0%	92%	96%	95%	94%
Servicios Financieros	Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	95%	98%	98%
Servicios Financieros	Procedimientos operativos de administración presupuestaria	Distrito Nacional									0%	76%	0%	91%	95%	95%	94%
Servicios Financieros	Registro y Control del Patrimonio de Activos Fijos	Distrito Nacional									0%	0%	0%	96%	92%	94%	94%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditorías a los Estados Financieros 2024	Distrito Nacional									100%	0%	45%	92%	95%	98%	95%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditoría a los Estados Financieros 2020, 2021, 2022, 2023	Distrito Nacional									40%	0%	0	92%	96%	95%	94%
Servicios Financieros	Adquisición de los Servicios de Auditoría de la Contraloría General de la República Dominicana 2023-2024	Distrito Nacional									0%	0%	0	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar,	Valverde									0%	0%	0%	98%	98%	98%	98%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Republica Dominicana.	San Juan									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de tierra Parque Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Provincia San Juan, Republica Dominicana.	San Juan									0%	0%	0%	94%	96%	94%	95%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, D.M. Punta Caña, provincia San Juan	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, D.M. Punta Caña, provincia San Juan	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R.D	Azua									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de Tierra Parque Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R.D	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M.	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	Villarpando, Prov. Azua, R.D																
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, D.M. Villarpando, Prov. Azua, R.D	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R.D	San Juan									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Dirección De Energía Renovable	Movimiento de Tierra Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R.D	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R.D	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Municipio Juan Herrera, Prov. San Juan, R.D	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva, municipio Jimaní, Provincia Independencia	Independencia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Eólico Tierra Nueva, municipio Jimaní,	Independencia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	Provincia Independencia																
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Proyecto Eólico Tierra Nueva, Provincia Independencia	Independencia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Construcción Proyecto Eolico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Brazo Derecho, municipio Esperanza, provincia Valverde	Valverde									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Sabaneta 1 provincia San Juan	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía hidrobombeo	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
	Sabaneta 2 provincia San Juan																
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Yacahueque, provincia San Juan	San Juan									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica de proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Las Matas De Farfán 1, provincia San Juan	San Juan		100							0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica de proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Las Matas De Farfán 2, provincia San Juan	San Juan		100							0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo La Descubierta provincia Independencia	Independencia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



				% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												
				T1			T2			T3			T4			
Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	95%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto acumulación de energía por hidrobombeo Paraíso, provincia Barahona	Barahona		100						0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseños Proyecto de acumulación de energía por hidrobombeo Camú (Guagüí), provincia La Vega	La Vega								0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Artibonito	Elías Piña								0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Artibonito	Elías Piña								0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Guayubín	Santiago Rodríguez								0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Guayubín	Santiago Rodríguez								0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Las Placetas	Santiago									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Las Placetas	Santiago									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Las Placetas	Santiago									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico La Gina	Peravia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico La Gina	Peravia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo La Gina	Peravia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Solar Fotovoltaico Monte Grande	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto Eólico Monte Grande	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios de prefactibilidad técnica-económica y diseños básicos Proyecto de acumulación por Hidrombeo Monte Grande	Azua									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios Modernización, reopotenciación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas existentes	Nacional									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Proyecto Eficiencia Energetica, Edificio SEDE EGEHID	Distrito Nacional		0							0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Dirección De Energía Renovable	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva, Provincia Independencia, República Dominicana.	Independencia									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	T1			T2			T3			T4			95%	
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E		
Dirección De Energía Renovable	Levantamiento de Potencial de proyectos solares fotovoltaicos flotantes en presas existentes.	Nacional									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Secretaría General	Tramitación diaria de las comunicaciones externas de la empresa.	Distrito Nacional									0%	0%	0%	94%	92%	94%	93%
Secretaría General	Tramitación diaria de las comunicaciones internas de la empresa.	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Secretaría General	Descargo de documentación de las diferentes area al Archivo Central de EGEHID.	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Secretaría General	Descargo de la documentaciones enviada a partir de 5 años del archivo central al archivo Histórico y Recepcion de la misma.	Distrito Nacional									0%	0%	0%	94%	94%	95%	94%
Secretaría General	Adquisicion de materiales gastables de secretaria gastables y archivo .	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Libre Acceso	Mejorar los procesos de recopilación de informaciones con las áreas para obtener la puntuación máxima otorgada por la Solicitud de Acceso a la	Distrito Nacional									100%	25%	0%	100%	100%	100%	100%



% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025

			T1				T2			T3			T4			
--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	----	--	--	----	--	--	--

Dirección	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO APROBADO 2025	% EJECUCION FISICA MENSUAL 2025												95%
				ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNI O	JULIO	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	
	Información Pública (Saip).															
Comunicacione s	Estrategia de Campañas Publicitarias para el Posicionamiento Institucional	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%
Comunicacione s	Gestión de Productos Editoriales Institucionales	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%
Comunicacione s	Gestión de Contenidos para Redes Sociales y Medios Digitales	Distrito Nacional									0%	0%	0%	100%	100%	100%


 Lic. Gloria Ross
 Dir. Planificación y Desarrollo


 Lic. María Cristina Gómez
 Departamento de Planes, Programas y Proyectos
