



Informe del trimestre abril-junio 2024 y Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

2024

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



egehid

Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
Información Institucional EGEHID	4
Misión:	4
Visión:.....	4
Valores:	4
Resumen ejecutivo de las áreas Misionales.....	5
➤ Informe de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)	5
1- Construcción Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín).....	6
2- Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	8
3- Proyecto Hidroeléctrico Artibonito.....	10
4- Recuperación del Contraembalse Las Barias.....	12
➤ Informe de la Dirección de Energía Renovable (ER).....	13
1-Primer Proyecto Híbrido (Hidroeléctrico-Solar) Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho:	14
2-Proyectos Solares Fotovoltaicos en estudios y diseños.....	14
3-Proyectos Eólicos.....	15
4-Proyectos de Hidrobombeo	15
➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento.....	16
1-Gerencia de Mantenimiento Mecánico:.....	17
2- Gerencia de Redes y Subestación:.....	17
3- Gerencia Mecánica:.....	17
4- Gerencia Eléctrica:.....	18
➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura.	18
➤ Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles (DMROC).....	19
➤ Desempeño de la Gerencia de Proyectos Especiales (PE)	20
Resumen ejecutivo de las áreas de apoyo	21
➤ Informe de la Dirección de Gestión Humana	21
Desarrollo Organizacional	22
Gerencia de Formación y Educación Continua	23
➤ Dirección de Servicios Financieros.....	25
Procedimientos de Políticas de Cobros:	25
Cuentas Por Cobrar valores en RD\$	26
Cumplimientos de Políticas de pagos	26
➤ Dirección de Contraloría.....	27

➤ Dirección Jurídica	28
Área De Contrataciones:	30
Área Inmobiliaria:	30
Área Administrativa / Contenciosa Administrativa:	30
Área Penal:	31
Área Civil:	31
➤ Dirección de Logística	31
➤ Dirección de Planificación y Desarrollo	32
A- Gerencia de Planes Programas y Proyectos (PPP)	32
B- Gerencia Gestión de la Calidad	33
➤ Informe de Gestión de Dirección de Auditoría Interna	36
➤ Informe de la Dirección de Comunicación	37
➤ Dirección de Compras y Contrataciones	40
Procesos de Compras por debajo del umbral	41
Procesos de Compras Menores	42
Procesos de Comparación de Precios	42
Procesos de Licitación Pública Nacional	43
Proceso de Compra bajo modalidad de Excepción	43
Empresas MIPYME Y MIPYME MUJER adjudicadas.	44
Resumen de Procedimientos de Compras del periodo enero-junio 2024	44
➤ Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional	45
Plan Operativo Anual (POA) EGEHID 2024	47
Ejecución del primer semestre de los proyectos y /o actividades del Plan Operativo Anual 2024 (POA)	49

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país.

Con el cumplimiento Plan Estratégico 2019-2026, el seguimiento a través del Plan Operativo Anual (POA) 2024, el Presupuesto, y el Plan Anual de Compras y Contrataciones, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, nos place presentar este informe trimestral de gestión institucional para el período comprendido de abril-junio 2024.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de egehid ha centrado y empeñado su accionar en cuatro pilares claves: La potencialización y mejoramiento de las operaciones, nuevos proyectos de expansión, implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia administrativa y de procedimientos, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

En lo adelante presentaremos un informe ejecutivo de cada área misional, operativa y de apoyo de la institución, resaltando las ejecuciones relevantes del correspondiente al trimestre finalizado del año 2024.

Información Institucional EGEHID

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) es propiedad del Estado dominicano. La EGEHID administra actualmente 27 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 624.5 megavatios de energía renovable. La generación promedio anual es de 1,480 GWh, lo que representa aproximadamente el 12% de la producción energética del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Propuesta de valor:

Somos una empresa comprometida con el suministro de electricidad generada con fuentes renovables, operativamente confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

Propósito:

Impulsar el desarrollo sostenible de la República Dominicana generando energía eléctrica de calidad con fuentes renovables.

Misión:

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con estándares internacionales, apoyado en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

Visión:

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la República Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

Valores:

- Integridad.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso.
- Responsabilidad social.
- Confianza.
- Respeto.
- Lealtad

Resumen ejecutivo de las áreas Misionales

➤ Informe de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH)

La Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (DDH) de la EGEHID ha continuado con sus esfuerzos de dar seguimiento oportuno a las obras que gerencia, dando soluciones técnicas a los problemas presentados por cada uno de los proyectos que están bajo su responsabilidad. En este periodo se han realizado reuniones ampliadas tanto en las oficinas de la EGEHID como en el sitio de obra con las empresas proyectistas responsables de la revisión de los diseños tanto del Proyecto Guayubín como del Proyecto Las Placetas.

En cuanto a los avances en la construcción del Proyecto Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín), se continúa con la colocación de hormigón masivo en los bloques de la presa la colocación de acero de refuerzo, de lo que han de ser las pilas centrales y laterales que conformarán las galerías de desvío, entre otras actividades de construcción. Asimismo, se realizó la primera y segunda vista pública del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, con las presencias de autoridades de Egehid, de autoridades de la comunidad, representante del Ministerio de Medio Ambiente y lugareños invitados, en donde Egehid presenta el Proyecto a los asistentes y el consultor que realizará el informe de Estudio de Impacto Ambiental toma las primeras impresiones y aspiraciones de los comunitarios al implementar la construcción de la obra y con la segunda vista pública se presenta los resultados del informe del estudio de impacto ambiental para conocimiento de los lugareños.

Con fines de cumplir con el cronograma de construcción una vez iniciada la ejecución de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, se aprueba la adquisición de un equipo TBM (Tunnel Boring Machine), para la excavación de los túneles a sección completa en un plazo menor y con mayor eficiencia en comparación con el uso de otras tecnologías convencionales, ya que el proceso de diseño y puesta en obra de la TBM dura aproximadamente un(1) año, tiempo que es ganado al dar la orden de adquisición de este equipo en esta etapa del Proyecto.

Los trabajos de recuperación del embalse de la presa Las Barias en el segundo trimestre están a la espera de la autorización por parte del INDRHI para retomar los trabajos, cuya autorización depende del requerimiento de riego de los trabajadores agrícolas de la zona que están en pleno proceso de siembra. Esta Dirección desde el mes de febrero de 2024 ha asumido la Gerencia de la obra de Rehabilitación del sistema de Riego y Limpieza del Canal Nizao – Najayo con el objetivo de mejorar las condiciones hidráulicas original y garantizar que los caudales de riego lleguen a las Juntas de Regantes

DDH ha inspeccionado el revestimiento de 1km de canal de un total de 6.3km, bermas de acceso y pasos peatonales y vehiculares para facilitar el paso seguro para los peatones y los vehículos. En esta etapa se construyeron 6 puentes vehiculares y 6 puentes peatonales.

Resultados de los proyectos en ejecución del DDH:

1- Construcción Presa Boca de Los Ríos (Presa Guayubín)

El Proyecto construcción Presa de Guayubín, localizado a 10 km. de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez consta de una presa principal en hormigón de una altura de unos 34.60m sobre el Rio Guayubín, y un Dique de Cierre lateral con núcleo de arcilla con alturas variables entre 1.5 y 11.60 m aproximadamente, en la margen izquierda.

Este proyecto es ejecutado con fondos del Gobierno Central aportado por los recursos propios de Egehid y aprobados por el Honorable Consejo de Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, cuyo avance físico de construcción está en un 42% de ejecución.

Son varios los beneficios esperados con la construcción de este Proyecto entre los que podemos citar:

* El de control de avenidas que ocurren en temporadas ciclónicas y avenidas naturales de los ríos producto del cambio climático en cualquier época del año, causando daños irreparables a la agricultura y a la ganadería que afectan directamente la economía particular de la zona y del país.

*Garantizar el suministro de agua para las tierras actualmente bajo riego, unas 2.495 Ha.

*Incorporar nuevas tierras que no se cultivaban por la falta de agua para riego, con la cual se alcanzaría un total de tierra irrigable de unas 5000 Ha.

*La construcción de una Central Hidroeléctrica de unos 2,000Kw de capacidad instalada.

* La construcción de una toma de agua para abastecer acueducto que se construirá en la zona con el propósito de disminuir al máximo el déficit de abastecimiento de agua potable que por décadas ha sufrido la provincia de Santiago Rodríguez, cuyo diseño fue sometido a INAPA para su aprobación y llamado a licitación de esta obra.

* La construcción de vías de accesos asfaltadas comunidades que antes no tenían ningún tipo de comunicación, así como el mejoramiento de los accesos existente desde y hacia el Proyecto, obra ejecutada por el Contrato principal de la Presa.

* La construcción de viviendas para personas de escasos recursos y de familias que serán directamente afectadas con la construcción de la presa, subproyecto que se ejecuta en cumplimiento de la Responsabilidad social de la EGEHID, el cual gestionó ante el Gobierno Central la construcción de viviendas con techos de hormigón armado, cuya gerencia de la ejecución será a través del MIVED con recursos de la EGEHID.

Datos económicos del Proyecto

Monto Contrato original RD\$	Monto Ejecutado a marzo 2024 RD\$	Fuente de Financiamiento
2,724,069,700.86	1,834,153,210.01	Gobierno Central

Impacto Directo en la zona en la etapa de construcción.

La construcción de la presa influye directamente en la activación de la economía de la zona con la creación de más de 1000 empleos directos, de los lugareños, y más de tres mil indirectos, como son el uso de los comercios, hoteles, viviendas entre otros. Otro de los beneficios indirectos es la transferencia en el aprendizaje de nuevos oficios que pueden usar como modo de vida una vez finalice la construcción. El control ambiental de los accesos desde y hacia la presa en zonas pobladas, mediante la humectación de las calles de forma continua que evita el levantamiento de polvos.

2- Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas

El complejo Hidroeléctrico Las Placetas está ubicado en el Distrito Municipal Las Placetas en el Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago. Este proyecto aprovechará un salto de 517 m aproximadamente. El circuito hidráulico, contempla el trasvase de aguas desde la Presa en Mata Grande sobre el Río Bao hasta la Presa en Los Limones sobre el Río Jagua. El arreglo general del Proyecto prevé la construcción de dos (2) presas y un Contraembalse en hormigón compactado con rodillo, localizadas en Mata Grande, los Limones y el Higüero; 2 casas de máquinas las cuales pueden operar independiente una de la otra. La capacidad instalada total, será de aproximadamente 204 Mw, las unidades generarán un total de 416GWh/año. Este concepto busca maximizar la generación de energía durante las horas pico.

Este Proyecto es reactivado a los fines de dar continuidad a las políticas de estado de incrementar el mercado energético nacional utilizando como medio de generación las fuentes renovables en el año 2020 con la revisión del diseño básico consolidado presentado en el año 2010, en donde se actualizó este diseño con la incorporación de una nueva presa para un mejor rendimiento del proyecto y mayor capacidad instalada de generación, el cual fue aprobado a inicio del año 2022 al igual que se concilio la Oferta técnica Económica de ejecución de obras. La reactivación de este Proyecto implica además los trabajos de habilitación del campamento que por 10 años estuvo cerrado sin operación y se requiere su habilitación para el inicio de los trabajos de construcción.

Entre los trabajos previos para la ejecución de las obras principales de este Proyecto, Las Partes identificaron la necesidad de establecer vías de accesos más apropiadas, así como la readecuación de las carreteras que, por razones del tiempo transcurrido, se encuentran deterioradas, así como la necesidad de realizar la readecuación de los Balnearios de las zonas aledañas al Proyecto.

Esta etapa del Contrato es denominada SERVICIOS PRELIMINARES FASE III del Proyecto que comprenden los componentes de:

- a) ingeniería de detalle parcial del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas (Presa Mata Grande, Los Limones e Higüero); y
- b) Las Obras civiles y Viales (unos 117.29 Kms de carreteras, accesos y obras de interés social como son la rehabilitación de balnearios de las zonas aledañas),

todo este alcance está previsto en el Acta de Acuerdo sobre Rehabilitación y Caminos de Accesos de fecha 23 de febrero 2023 y el adendum No. 9 firmado, además del adendum No. 10 firmado por las Partes para la adquisición de la TBM. El proceso constructivo de las obras principales de este Proyecto se iniciará con la firma del adendum de construcción y el aprovisionamiento de fondos sean estos del sector privado o Gubernamental.

Beneficios del Proyecto

- * Incrementar el parque energético nacional utilizando energía limpia y renovable, reduciendo los costos nacionales de generación al reemplazar las plantas térmicas con altos costos de operación para así reducir los montos pagados con el subsidio de Tarifa Eléctrica, mejorando la balanza comercial y disminución de la dependencia de petróleo internacional.
- * Incrementar aproximadamente 40% de la capacidad instalada que tenemos en materia de energía hidráulica en el país.
- * Mejora en los acueductos de Bao, Moca y Santiago debido que los embalses que abastecen estos acueductos tendrán un mayor volumen de regulación.
- * Mejora en los caudales para todo el sistema de irrigación que depende del canal Yaque del Norte.
- * Generación de más de tres mil empleos directos, que ayudará en la mitigación de la demanda de puestos de trabajo de la región.
- * Reactivación de la economía de la zona con el uso de comercios, hoteles, y otras actividades.
- * Rehabilitación de carreteras y accesos de la zona de influencia del Proyecto actualmente deteriorada.

Datos económicos del Proyecto a partir de la reactivación del Contrato con el adendum No. 06

Monto Contrato Gerenciado por DDH, a partir de Reactivación de obra (USD)	Monto Ejecutado a marzo/2024 hasta Adendum No. 10 (USD)	Fuente de Financiamiento
58,567,400.28 7	31,427,279.78	Gobierno Central

Impacto Directo en la zona con la reactivación de este Proyecto.

Al momento de reactivarse este Proyecto, los comunitarios solicitaron a la Egehid algunas obras prioritarias de servicios de su comunidad y que se han construido con los recursos de la Institución asignados al capítulo de Responsabilidad Social, entre ellas están: aceras, contenes, centros comunales, cuarteles policiales, arreglos de calles entre otras solicitudes, otro de los beneficios que se destaca en la zona de influencia del Proyecto con su reactivación, es el incremento de la actividad comercial de las zonas próxima al área del Proyecto, la creación de empleos directos de unas 60 personas y otras actividades de beneficio a la zona.

3- Proyecto Hidroeléctrico Artibonito.

El Proyecto hidroeléctrico Artibonito, está ubicado sobre el río Artibonito en la Provincia Elías Piña, cerca de la frontera con Haití, en el cual se ha proyectado construir una presa en el sitio El Corte y un contra embalse en el sitio Pedro Santana, ambas con fines de generación hidroeléctrica. En este periodo se está en proceso de contratación de un experto en presupuesto de obras hidráulicas para iniciar las reuniones de conciliación y aprobación de la Oferta Técnica Económica sometida por el Contratista para la construcción del Proyecto, una vez aprobado en el último trimestre del año 2023 por parte de la EGEHID el Diseño Básico, con la cual se concluye la Fase I Etapa 1

El tipo de estructura presentado en este diseño básico comprende la construcción de una presa en el sitio El Corte tipo gravedad de hormigón compactado con rodillo, con altura máxima de 115.00 metros, vertedero de solera libre, con capacidad de almacenamiento de 157.5 millones de m³ de agua, estará equipada con dos (2) turbinas Francis horizontal con capacidad total instalada de 36 Mw.

Las características de la presa a implementarse en el sitio de Pedro Santana es del tipo gravedad de hormigón compactado con rodillo, con altura máxima de 53.50 metros, vertedero de solera libre, capacidad de almacenamiento de 16.83 millones de m³, la cual estará equipada con dos turbinas Francis con capacidad instalada de 6Mw, para una generación continua de la central las 24 horas al día los siete días de la semana.

En fecha 24 de febrero 2024, se celebra la primera vista pública en la comunidad de Pedro Santana, provincia Elías Piña, con presencia de las autoridades locales, funcionarios de la EGEHID y lugareños de la zona de influencia del proyecto a los fines presentar el proyecto y tomar las primeras impresiones y aspiraciones de los comunitarios al implementar la construcción de la obra.

Beneficios del Proyecto

* Generación de energía a partir de recursos renovables, incidiendo de manera favorable en la disminución de las importaciones de petróleo del país y su respectiva economía con la disminución del desembolso para esta importación, que, estimando el barril a US\$50.00 dólares, traería al país un ahorro de 14 millones de dólares en un año.

*Aportar al sistema energético nacional una generación adicional de energía limpia de 123,365.28 Mwh/año, disminuyendo así los costos de generación eléctrica con respecto a la generación eléctrica utilizando combustibles fósiles, a la vez que contribuye mejorar la calidad del medio ambiente.

*Reforestación de las márgenes del Río Artibonito, impidiendo el acelerado proceso de desertificación que está ocurriendo en la región

*La implementación de proyectos de piscicultura, con la introducción de diferentes especies de peces en los embalses de las dos hidroeléctricas, contribuyendo a la generación de riquezas y empleos directos e indirectos, además de mejorar la oferta de alimentos a la población de la región.

*El control de sedimentación del Río Artibonito que perjudica la operación de la Hidroeléctrica de Peligre, localizada aguas abajo del mismo río, en territorio haitiano, aumentando la vida útil de esta hidroeléctrica, colaborando con el país vecino.

*El control de avenidas que se producirá en el embalse de El Corte I redundará en un mejor aprovechamiento de las aguas del Río Artibonito y por ende una mejor producción de la hidroeléctrica de Peligre, colaborando con el país vecino.

* Mejora en las condiciones de voltaje actuales en toda la región, con la nueva línea de transmisión conectará las centrales con San Juan de la Maguana, además, facilitará la creación del anillo de 138 KV con la región noroeste.

* Generación de fuentes de trabajo para la mano de obra local, en el periodo de construcción y posterior operación, lo que aumentará su poder de compra, mejorando las actividades comerciales de la región.

Datos económicos del Proyecto:

Monto Contrato Actualizado de Reactivación de obra USD	Monto Ejecutado a marzo 2024 USD	Fuente de Financiamiento
4,293,549.40	3,653,339.70	Gobierno Central

4- Recuperación del Contraembalse Las Barias

El Contraembalse las Barias fue inaugurada por el Gobierno dominicano en el año 1976, cuya capacidad de almacenamiento original era de 3.0 millones de metros cúbicos (MMC), el cual ha venido disminuyendo por el deterioro de la cuenca y los arrastres producidos en la cuenca como se pudo comprobar en la batimetría realizada en 1995, diecinueve años más tarde, cuyos resultados fue la confirmación de la disminución de la capacidad de almacenamiento del Contraembalse a unos 1.7 MMC,

equivalente a una pérdida de almacenamiento de un 43%, que si actualizamos este deterioro progresivo a este tiempo se pudiera decir que el Contraembalse está en su capacidad mínima de almacenamiento que esta es una zona muy expuesta a grandes crecidas especialmente del rio Nizao y afluentes a consecuencia de fenómenos atmosféricos como huracanes, tormentas tropicales, vaguadas entre otras.

La ejecución de estos trabajos se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con la finalidad de que los usuarios de los sistemas de riego agua abajo del Contraembalse mantenga agua disponible para riego sin que esto afecte su sistema de siembra, que al igual que la EGEHID y el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA) harán además de forma conjunta la supervisión de estos trabajos. El volumen total extraído al mes de junio/2023 es de 413,729M3

Beneficios del Proyecto:

Reducir el riesgo de desastres que puedan afectar a la población, garantizando la protección de propiedades y la conservación de la infraestructura hidráulica del Contraembalse.

El restablecimiento de la capacidad de almacenamiento del Contraembalse y recuperar así la capacidad instalada inicialmente de la Central Hidroeléctrica.

Disminución de las Perdidas por generación de EGEHID con respecto a la energía entregada al SENI.

Ayudas y obras de Responsabilidad Social corporativa a requerimiento de las alcaldías, comunidades, sociedad civil, que contribuyan al desarrollo de las comunidades aledañas al área de influencia de la Presa.

Contribuir a la Seguridad Hídrica de las zonas agrícolas ubicadas aguas debajo de la Central Hidroeléctrica, al mejorar la capacidad de almacenamiento.

➤ Informe de la Dirección de Energía Renovable (ER)

La Dirección de Energía Renovable es un pilar esencial en el aumento de la producción de energía eléctrica en el país, destacándose como una empresa líder en energía limpia. Su trabajo abarca la planificación, estudios, diseño y construcción de proyectos relacionados con fuentes de energía renovable. Enfocados principalmente en proyectos fotovoltaicos, eólicos y de hidrobombeo, contribuyen de manera significativa a los objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana, promoviendo la generación de energía limpia y la conservación del Medio Ambiente.

Ya que en este primer semestre el proyecto solar Fotovoltaico Brazo Derecho, con una capacidad de 3 MWp, ha tenido un avance significativo, se espera completar en julio de 2024, este proyecto marcará un hito al convertirse en la primera central híbrida de EGEHID la cual ya tiene instalada una hidroeléctrica de 2.8 MW.

En ese mismo orden, durante el período de enero a junio de 2024 se completaron los estudios y diseños de los proyectos Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez, Solar Fotovoltaico Sabana Yegua y Solar Fotovoltaico Sabaneta.

Estos proyectos, estimados en tener capacidades instaladas de 22, 24.98 y 18.28 MWp respectivamente, representan importantes avances. Actualmente, se encuentra en ejecución el Movimiento de Tierra para la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez. En el Máster Plan de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana se incluye la implementación de proyectos de acumulación por hidrobombeo, diseñados para ampliar aún más la

capacidad energética. Entre estos proyectos se destacan el Hidrobombeo Sabaneta y Guagüí, los cuales iniciarán sus estudios y diseños definitivos este año. En cuanto a los proyectos eólicos, la EGEHID comenzará los estudios y diseños definitivos en el 2024 para los Proyectos Eólicos Tierra Nueva y Brazo Derecho. Se estima que estos proyectos en conjunto tendrán una capacidad de 60 MW, marcando un paso significativo en la expansión de la capacidad energética del país.

1-Primer Proyecto Híbrido (Hidroeléctrico-Solar) Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho:

En julio 2024 se finalizará la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar de 3MWp. Cabe destacar que en dicha central ya existe una central Hidroeléctrica, la cual opera con una potencia instalada de 2.8 MW, por lo que será la primera central híbrida de esta empresa. En la actualidad, este proyecto cuenta con un avance de un 96% de acuerdo con el cronograma de la obra.

A continuación, se presentan los avances de Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho el cual tendrá una potencia instalada de 3MWp, para una producción anual esperada de 5.44 GWh.

Aspectos Generales	
Contratista	RAAS Solar S.R.L.
Capacidad	3 MWp
Autorización Ambiental	Aprobado
Monto del contrato	RD\$377.00 MM*
Cubicado	RD\$368.22
% Cubicado	98%
Avance Físico	96%
Finalización	jul-24

2-Proyectos Solares Fotovoltaicos en estudios y diseños

No.	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Beneficiarios (habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha Estimada de Inicio	Estado actual
1	Domingo Rodríguez Solar, San Juan	22	61,033	36.62	5.54	2024	Fase 1 Movimiento de tierra (Contratado)
							Fase 1 en Proceso de Licitación

No.	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Beneficiarios (habitantes)	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha Estimada de Inicio	Estado actual
2	Sabaneta Solar, San Juan	18.28	55,800	33.48	5.07	2024	Finalizado en espera de recepción de cubicación por parte del contratista
3	Sabana Yegua Solar, Azua	24.98	77,217	46.33	7.01	2024	Finalizado en espera de recepción de cubicación por parte del contratista
4	Proyecto fotovoltaico Tierra Nueva, Independencia	35	107,550	64.53	9.76	2024	Finalizado en espera de recepción de cubicación por parte del contratista
Total		100.26	301,600	180.96	27.38	-	-

3-Proyectos Eólicos

Actualmente la EGEHID presenta los siguientes proyectos eólicos, los cuales están en proceso de licitación:

No.	Proyecto	Capacidad Instalada (MW)	Beneficiarios	Producción Media Anual Esperada (GWh)	Inversión (US\$ MM)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Fecha de inicio de estudios y Diseño
1	Parque Eólico Tierra Nueva, Independencia	50	340,000	204	109	30.87	En proceso de adjudicación
2	Brazo Derecho Eólico, Valverde	10	55,550	33.33	19	5.04	Declarado desierto. Para licitación en julio

4-Proyectos de Hidrobombeo

Este tipo de proyectos almacena energía bombeando agua desde un embalse inferior a un embalse superior en hora de baja demanda, para generar electricidad en hora de alta demanda (Hora Punta). Son aptas para regular frecuencias, cargas y voltajes. Tiene potencias elevadas y rápida entrada al sistema eléctrico. A continuación, se muestran los proyectos en carpeta de esta categoría

No.	Proyecto	Rango Estimado de Capacidad a Instalar (MW)	Ubicación	Beneficiario	Producción Media Anual Esperada (GWh) (4h diarias)	Ahorro Anual de Combustible (Millones US\$)	Estado actual	Fecha de Inicio
En Reservorios Existentes								
1	Hidrobombeo Sabaneta Reservorio No. 1	125	San Juan	304,167	182.5	27.61	En proceso de evaluación de oferta técnica	2024 (Estudios y Diseño)
2	Hidrobombeo Sabaneta Reservorio No. 2	206	San Juan	501,267	300.76	45.51	En proceso de evaluación de oferta técnica	2024 (Estudios y Diseño)
3	Proyecto de Acumulación por Bombeo Camú (Guaigüí)	300	La Vega	730,000	438	66.27	En proceso de elaboración TDR Estudios y Diseños definitivos	2024 (Estudios y Diseño)
En Reservorios Nuevos								
4	Las Matas de Farfán 1613-548	27	San Juan	65,700	39.42	5.96	En proceso de elaboración TDR Estudios y Diseños definitivos	2025 (Estudios y Diseño)
5	Las Matas de Farfán 1185-548	39	San Juan	94,900	56.94	8.62		
6	La Descubierta 5946-3187	77	Independencia	187,367	112.42	17.01		

➤ **Informe de la Dirección de Mantenimiento**

Para el año 2024 la Dirección de Mantenimiento programó en su plan operativo anual (POA) la realización de Proyectos para Rehabilitación, Modernización y mantenimiento de las diferentes Centrales Hidroeléctricas.

Ahorro económico en Combustibles

Durante los primeros meses de este año, han estado fuera de servicio varias centrales de mayor principalía en el SENI, por lo que esta ha trabajado arduamente, para mantener en operación todas nuestras Centrales Hidroeléctricas y poder sustentar parte del déficit de generación en el sistema, lo que ha significado en ahorro en compra de combustible de alrededor de 89.5 Millones de dólares y una contribución significativa en mantener la estabilidad del Sistema. Al finalizar el Semestre enero-junio 2024, se han ejecutado y finalizado los siguientes mantenimientos:

1-Gerencia de Mantenimiento Mecánico:

- Cambio del Sello del Eje de la Turbina UG-2 C.H. Aguacate.
- Corrección de Avería Válvula del Chorro Hueco C.H. Rincón.
- Ajuste del Distribuidor UG-2 C.H. Rio Blanco.
- Limpieza de Radiadores C.H. Hatillo.
- Cambio Retenedora By-Pass de la Válvula Mariposa Minicentral Aniana Vargas.
- Limpieza de Radiadores C.H. Las Damas.
- Cambio del Obturador de la Válvula Motorizada C.H. Jiguey.
- Fabricación de Radiador del Generador de la Unidad 1 en la C.H. Hatillo.

2- Gerencia de Redes y Subestación:

- Corrección de Avería e Instalación de Poste en la Central de Jiguey.
- Mantenimiento y Traslado de Máquina de Filtrado C.H. Valdesia.
- Supervisión de Habilitación de Línea Valdesia-Jiguey y Configuración de Relé de Línea en Valdesia.
- Reconstrucción del Sistema de Aterrizaje C.H. Rincón.
- Mantenimiento Subestación C.H. Los Toros.

3- Gerencia Mecánica:

- Durante este periodo en la Gerencia de Proyectos Electromecánicos, se han elaborado las Especificaciones Técnicas de los siguientes Proyectos:
- Instalación Sistema de Enfriamiento del Tipo APEMA Cerrado para los Generadores de la C.H. Aguacate.
- Transformador de Potencia 138/13.8kV, 46/61.5MVA Central Jiguey.
- Adquisición e Instalación Transformador de Potencia C.H. Las Damas.

4- Gerencia Eléctrica:

- Puesta en Servicio Generador Minicentral Rosa Julia De La Cruz (Boba).
- Corrección de Avería Unidad No. 2, C.H. Aguacate.
- Corrección de Avería Unidad No. 1, C.H. Tavera.
- Corrección de Falla en Interruptor Generador Minicentral Aniana Vargas.
- Mantenimiento Diesel de Emergencia Minicentral Rosa Julia de la Cruz (Boba)
- Mantenimiento Circuito de Control Válvula Chorro Hueco Presa Rincón.
- Reconfiguración Subestación C.H. Valdesia.
- Corrección de Avería Unidad No. 1, C.H. Rio Blanco.
- Corrección de Avería Protección Eléctrica Subestación Palomino.
- Corrección de Avería en PLC, Unidad No.1 Contraembalse Monción.
- Instalación Nueva Estación de Ingeniería C.H. Rio Blanco.
- Corrección de Avería en cables salida del generador C.H. Rio Blanco.
- Mantenimiento Celda 13.8 Kv C.H. Monción.
- Corrección de Avería Unidad No. 1 C.H. Tavera.
- Sustitución de los Equipos Analizadores de Calidad en diferentes Centrales Hidroeléctricas: C.H. Monción, C.H. Rio Blanco y C.H. Rincón.

➤ Informe de la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura.

En este segundo trimestre se ha estado trabajando con los requerimientos para la contratación de una compañía ejecutora para inicial el proyecto de adecuación y cambio del diseño de los espacios internos estructurales del edificio principal, en conjunto con la Dirección de Obras Civiles, en ese mismo orden, se adecuaron los espacios que tenemos disponibles en la casona, para que en el proceso los colaboradores que se vean afectados puedan continuar con sus labores, mientras concluye el proceso de reestructuración de las áreas. Se concluyeron los trabajos de impermeabilización para las Centrales Hidroeléctricas Rincón, Salto de Constanza, Rio Blanco, Hatillo y Palomino, pero se está solicitando una adenda ya que la vibración que tienen las Centrales está causando grietas en algunos puntos y vamos a reforzar en las Centrales impermeabilizadas.

En el mismo sentido estamos realizando el cambio de imagen de las diferentes Centrales Hidroeléctricas como son: Salto de Constanza, Jimenoa, las oficinas administrativas de Quitasueño. Para concluir tenemos el levantamiento realizado por los ingenieros y supervisores de los proyectos de aceras, contenes y asfaltados de los sectores aledaños a las instalaciones de Quitasueño, y solicitamos al Departamento de Proyectos Especiales de EGEHID someter dichos proyectos. Con estos proyectos podemos lograr un impacto social en esta comunidad, en el que los moradores quedaran satisfechos con el trabajo realizado por la empresa.

➤ **Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles (DMROC)**

Esta dirección durante el primer semestre enero 2024/junio2024 continúa acoplada a los lineamientos estratégicos de la empresa: Fortalecer la Gestión Social y Optimizar la Gestión del Capital Humano, tramitando y ejecutando Proyectos de Edificaciones de carácter Social y Operacional, encaminados a la consecución de los objetivos de dichos lineamientos. Al iniciar el año, esta dirección gestionó 79 proyectos, de los cuales, 4 no habían iniciado y 8 se encontraban en proceso de cierre técnico. En el curso del semestre fueron inaugurados 7 proyectos con una inversión de RD\$70,598,057.44 y un impacto poblacional de 32,800 beneficiarios.

Iniciamos 4 de los proyectos pendientes teniendo a la fecha 74 proyectos en ejecución, de los cuales 17 están en etapa de terminación con posibilidades de inaugurarse en el 3er trimestre de este año 2024. Los proyectos de carácter social responden a las necesidades más demandadas por las provincias en la cuales nuestros proyectos hidroeléctricos impactan directamente y donde se hace necesario apoyarles en sus necesidades. Los proyectos comunitarios que venimos ejecutando se ha priorizado a los renglones más requeridos y necesarios de las comunidades, los cuales se ajustan al Plan Operativo Anual presentado por la empresa y a los temas más relevantes en el programa presentado de gobierno. Los proyectos correspondientes a este semestre tienen una inversión de RD\$718,574,862.01. con un impacto poblacional directo de 1,392,300 personas. Y los que están en ejecución en junio 2024 luego de las inauguraciones del semestre son 58 proyectos con una inversión de RD\$618,476.38 y un impacto poblacional de 832,000 beneficiarios.

A continuación, se muestra la cantidad de proyectos, divididos por zona y provincias:

Zona	Provincias	Proyectos
Sur Profundo	Azua	9
	San Juan de la Maguana	12
	Independencia	1
	Pedernales	1
Sur Corto	San Cristóbal	11
	Peravia	6
	San José de Ocoa	1
Norte Centro	Monseñor Nouel	7
	La Vega	4
	Sánchez Ramírez	1
	María Trinidad Sánchez	3
Norte Centro	Santiago	10
	Valverde	2
Total		68

➤ Desempeño de la Gerencia de Proyectos Especiales (PE)

Esta Gerencia durante el año 2024 continúa acoplada a los lineamientos estratégicos de la empresa. Actualmente esta cuenta con 101 proyectos en ejecución los cuales se ejecutan en diferentes regiones del país en donde inciden las centrales hidroeléctricas, impactando directa e indirectamente a los comunitarios, generando fuente de empleos y dinamizando la economía en dichas zonas; a continuación, presentamos una breve descripción de estos.

Organizando los proyectos en ejecución por zona, tendríamos la tabla y gráfica siguiente:

Zona	Provincia	Proyectos
Sur Profundo	Azua	2
	San Juan	13
	Independencia	0
	Pedernales	0
Sur Corto	San Cristóbal	23
	Peravia	2
	San José de Ocoa	0
Norte Centro	Monseñor Nouel	8
	La Vega	8
	Sánchez Ramírez	1
	María Trinidad Sánchez	1
Norte Centro	Santiago	40
	Valverde	2
	Duarte	1
Total		101

Resumen ejecutivo de las áreas de apoyo

➤ Informe de la Dirección de Gestión Humana

El objetivo principal de esta Dirección es dar seguimiento a nuestro lineamiento estratégico “Optimizar la Gestión del Capital Humano” dando así más importancia a los proyectos que generen resultados rápidos y sean efectivos, así como como fortalecer los subsistemas de gestión humana. Esta Dirección se ha enfocado en el desarrollo de los planes de acción, los cuales contemplan realizar programas de capacitación, acuerdos interinstitucionales y el fortalecimiento de la cultura del conocimiento

Egehid cuenta con 2,346 empleados de los cuales 530 son Mujeres y 1,816 son Hombres, divididos en los diferentes grupos ocupacionales:

Grupo Ocupacional	Femenino	Masculino	Total
Grupo 1	114	485	599
Grupo 2	181	238	419
Grupo 3	141	775	916
Grupo 4	78	241	319
Grupo 5	16	77	93
Total	530	1816	2346

Entendiendo que la manera de crear vínculos entre los colaboradores y de sentirse valorados, hemos realizado un conjunto de acciones que denominado cronograma de actividades de integración, para cultivar un buen clima institucional y ayudar al proceso de adaptación a los nuevos colaboradores.

Cumpliendo con el desarrollo del cronograma de actividades de integración, citamos las que se han llevado a cabo en este Primer Semestre del 2024.

Actividad	Acción
San Valentín (14 de febrero)	Se envió correo masivo felicitando y motivando a los colaboradores a compartir entre sus compañeros de trabajo y realizar actividades para compartir y estrechar lazos entre los mismos.
Día de la Independencia Nacional (27 de febrero)	Ofrenda floral para el Altar de la Patria. Entrega de banderines dominicana para el personal del Edificio Sede y transeúntes para el fomento de los valores patrios. Se Entregaron pin de la Bandera Nacional para todo el personal, los mismos fueron utilizados durante el mes la Patria.
Día Internacional de la Mujer	Actividad con el Administrador e invitados, para presentar el primer grupo de 25 mujeres Técnico Profesionales que ingresaron a nuestra empresa directamente en nuestras centrales hidroeléctricas, como parte de un programa de inserción laboral de 100 mujeres en el área técnico profesional que desarrolla el departamento de Reclutamiento y Selección. Envío de correo masivo alusivo al día. Entregar de bouquet de rosas Brindis de mimosa, bocadillos y la ambientación de saxofonista con pal participación del personal femenino de la zona metropolitana.

Desarrollo Organizacional

Levantamiento de información y elaboración de Procesos de la Dirección de Gestión Humana, firmados y listos para la socialización, en las áreas de Reclutamiento y Selección, Compensación y Beneficios y Relaciones Laboral, estos procesos son neurálgicos para los subsistemas de esta dirección.

Se han iniciado la actualización y análisis del manual de funciones y perfiles de cargos, realizando la distribución según el grupo ocupacional adecuado, y adicional se trabajó con las descripciones de puestos de las áreas de la Dirección de tecnología y actualmente la Dirección de Gestión Humana, así como el grupo ocupacional 5, la meta es culminar con la actualización y creación de las carpetas de manuales de cargo. Se trabajo con la Matriz de Riesgo de la mano con la Gerencia de Calidad, teniendo como resultado, visualizar cuales son los Riesgos principales del área.

Con la Evaluación desempeño, se envió el Formulario de evaluación por acuerdos, recopilando las metas de cada departamento, para finalizar el diciembre del 2024. Durante este primer semestre, se desarrolló el programa de inserción laboral de 100 mujeres técnico profesional a nuestras centrales hidroeléctricas, donde ya se han ingresado un total de 54 técnicas e ingenieras. El departamento de Relaciones laborales cumpliendo con su planificación

muestra sus indicadores, donde podemos evidenciar estas labores. En este periodo se registraron en el SIRLA 35 nuevos ingresos y 59 salidas.

Relaciones laborales



Proceso de Nomina

Los indicadores del área de nómina del 1er Semestre 2024



Gerencia de Formación y Educación Continua

La Gerencia de Formación y Educación Continua, ha llevado a cabo un plan de acción que ha consistido en la ejecución de actividades formativas para los colaboradores de la empresa, esta llevó a cabo 4 acciones formativas, 3 de estas se llevaron a cabo en la Zona Metropolitana y 1 en Zona Nizao, con una inversión de RD\$4,181,979,69, el total del personal capacitado fue 206 de los cuales 71 fueron mujeres y 135 hombres.

No.	Capacitación	Zona	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mujeres	Hombres	Total de la capacitación
1	Diplomado en Organización y Gestión de Eventos	Zona Metropolitana	19/01/2024	3/11/2024	0	1	11,000.00 DOP
2	Encuentro Anual de Altos Ejecutivos de CECACIER	Zona Metropolitana	24/01/2024	27/01/2024	1	2	10,524.00 DOP
3	Curso Manejo de Conflictos	Zona Nizao	21/03/2024	21/03/2024	5	13	34,800.00 DOP
4	Curso Servicio al Cliente	Zona Metropolitana	22/03/2024	22/03/2024	12	9	34,800.00 DOP
5	Curso Servicio al Cliente	Zona Metropolitana	5/4/2024	5/4/2024	17	4	34,800.00 DOP
6	Curso Supervisión y Liderazgo	Zona Sur	9/4/2024	11/4/2024	7	14	100,920.00 DOP
7	Gestión de Nóminas y Despidos	Zona Metropolitana	15/4/2024	6/3/2024	2	0	26,135.46 DOP
8	XXII Congreso Regional de Auditoría Interna, Control de Gestión, Riesgo y Finanzas (CRAICG 2024)	Zona Metropolitana	30/5/2024	2/6/2024	8	11	1,810,291.50 DOP
9	Diplomado Regulación y Transición Energética del Sector Eléctrico	Zona Metropolitana	28/5/2024	1/8/2024	1	1	32,500.00 DOP
10	Diplomado en Dirección en Marketing	Zona Metropolitana			1	0	21,375.00 DOP
11	Funcionamiento y Manejo de Software de Calidad de Potencia PQSCADA	Zona Metropolitana	19/3/2024	22/03/2024	0	5	987,878.07 DOP
12	Sistema Solares de Bombeo de Agua (Segunda Fase)	Zona Metralino	10/6/2024	14/6/2024	1	1	0.00 DOP

No.	Capacitación	Zona	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Mujeres	Hombres	Total de la capacitación
13	Seguridad y Salud Ocupacional	Zona Centro	20/06/2024	20/06/2024	4	20	99,061.00 DOP
14	Gestión Efectiva de Procesos	Zona Metropolitana	25/6/2024	27/6/2024	10	17	228,680.00 DOP
15	Sistema Lógico Programable (PLC)	Zona Sur	25/6/2024	13/8/2024	0	19	
16	Seguridad y Salud Ocupacional	Zona Sur	28/6/2024	28/6/2024	5	18	

➤ Dirección de Servicios Financieros

Desempeño Administrativo y Financiero

El siguiente cuadro muestra la ejecución alcanzada en los ingresos para el periodo enero-junio 2024.

FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	PROYECTADO 2024 (RD\$MM)	ALCANZADO 2024 (RD\$MM)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN %
30	9995 - VENTAS DE SERVICIOS	9,821.76MM	5,940.00MM	60.48%
Total, general		9,821.76MM	5,940.00MM	60.48%

Procedimientos de Políticas de Cobros:

En la actualidad mantenemos una gestión de cobros oportunos, conciliando con los clientes periódicamente, este proceso se trabaja en conjunto con la Dirección de Comercialización para tener un mayor control de los documentos y una organización adecuada. Para el mismo hemos implementado contacto directo con los clientes vía telefónica, correos electrónicos y envíos de documentos de manera física a través de nuestras mensajerías.

Mantener una revisión periódica en el sistema de las cuentas por cobrar, como son las fechas, los montos, detalles, etc. Actualización de la información del cliente, tener un buen control de los pagos, para poder compensar a tiempo, comunicación continua con nuestro cliente, entre otras cosas que agreguen valor al proceso actual.

Nos encontramos en el proceso de la creación de las políticas y procedimientos en Cuentas por Cobrar acorde con las Normas Básicas de Control Internos (NOBACI).

Cuentas Por Cobrar valores en RD\$

INSTITUCIONES	2024	2023
CDEEE	36,326,262,977.69	36,326,262,977.69
EDEESTE	18,285,359,090.29	18,422,782,941.35
EDENORTE	10,971,004,804.59	12,600,096,818.5
EDESUR	7,315,781,129.28	7,337,971,527.56
ETED	12,422,209.00	2,363,148.00
	72,910,830,210.85	74,689,477,413.10

Cumplimientos de Políticas de pagos

Las políticas establecidas para pago son de contado, contra entrega de la mercancía, a excepción de acuerdos contractuales que deberán cumplir con lo acordado. Para las cuentas pagar con empresas relacionadas los mismos son autorizados por la Administración General.

Balance cuentas por pagar 30-06-2024 sector no financiero valores en RD\$ (Corte Provisional de Enero a junio 2024 y 2023)

NOMBRE DEL PROVEEDOR	2024	2023
CORPORACION EMPRESAS ESTATALES ELECTRICAS	1,071,427,816.20	1,071,427,816.20
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	5,663,586.36	3,455,721.36
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	487,855.00	57,497.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	233,329.00	1,754,270.29
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	19,917,742,810.58	19,824,998,549.05
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	404,950,070.62	520,650,070.66
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	22,063,499.97	77,857,499.97
TOTALES EN RD\$	21,422,568,967.73	21,500,201,424.53

➤ Dirección de Contraloría

Durante este semestre, la Dirección de Contraloría en EGEHID se ha encargado de supervisar y fiscalizar el uso eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos de la empresa. Durante este trimestre hemos realizado evaluaciones sobre políticas internas, la detección y prevención de irregularidades, así como el aseguramiento del cumplimiento normativo y legal en todas las operaciones de la entidad. Estas acciones reflejan nuestro compromiso con la transparencia, eficiencia y mejora continua en la gestión de los recursos públicos. Hemos obtenido varios logros, como a continuación:

- Fiscalización de más de 300 proyectos, se ha realizado una revisión exhaustiva y seguimiento riguroso, garantizando transparencia y eficiencia en su ejecución.
- Fortalecimiento en los controles de recepción de almacén, se han implementado medidas para reforzar los controles en la recepción de materiales en almacén, asegurando la integridad de los recursos y optimizando los procesos logísticos.
- Digitalización y estandarización de procesos de revisión, se ha avanzado significativamente en la digitalización y estandarización de los procesos de revisión, lo que ha permitido una mayor agilidad y uniformidad en la gestión de los recursos.

Proyecto de digitalización de los procesos de solicitudes, contrataciones y pagos de la institución:

Sabiendo que el gobierno tiene en ejecución varias medidas que fomentan la eficiencia de las instituciones, como el programa burocracia cero y transformación digital, este proyecto de digitalización de los procesos administrativos y financieros de pago a proveedores contiene la compactación de más de 100 tareas operativas que incluye a usuarios, procesos y validaciones, que con la ayuda de la plataforma "SCAV AIRE" digitalizamos y marcamos un hito en la gestión pública siendo pioneros en llevar a cabo este tipo de proyecto bajo lineamientos gubernamentales.

Estos pasos operativos han sido cuidadosamente diseñados y ejecutados para abarcar todo el espectro de nuestras operaciones, desde la solicitud inicial de

bienes, servicios y obras hasta la aprobación final y la ejecución del proyecto. Esta incorporación transformará por completo la manera en que gestionamos nuestros procesos de solicitudes, contrataciones y pagos.

Nuestros esfuerzos no solo se han centrado en la implementación de un sistema más completo, sino también en mejorar significativamente la eficiencia y los controles internos. Basados en nuestra evaluación inicial, estimamos que la introducción de estos pasos operativos reducirá en alrededor de un 40% los tiempos en primera instancia de estos procesos.

➤ **Dirección Jurídica**

La función principal de esta dirección es proporcionar asesoría legal, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, mitigar conflictos, regular las relaciones con terceros, así como asegurar la sostenibilidad y responsabilidad social de las operaciones, hemos cumplido con los requerimientos de las diferentes dependencias de la institución, velando siempre por el respeto y apegados a la normativa y las leyes, sin importar las limitaciones y riesgos presentados.

Comunicaciones, Respuestas, Informes y Opiniones Legales

Respecto de los trámites administrativos laborales, fueron realizados 72 descargos, correspondientes a 62 por prestaciones laborales y 10 por asistencia económica, ambos en apoyo a la gestión y función del departamento de Recursos Humanos y Financiero y Tesorería.

En el área inmobiliaria mediante el proceso de titulación masiva (Plan de Titulación) realizada en Jorgillo Vallejuelo, Provincia San Juan de la Maguana, se han emitido en conjunto ciento ocho (108) certificados de títulos de propiedad a distintos campesinos y parceleros, en conjunto con el departamento de Agrimensura.

Se está trabajando el proceso de saneamiento de las Centrales JJ Puello – Domingo Rodríguez, San Juan de la Maguana y Central Magueyal, en Azua, así como la Central Rio Blanco y Central Rincón de Yuboa- Aniana Vargas, Piedra Blanca de Bonao y Bonao, con el objetivo de titular a nombre de la Egehid los terrenos que ocupan las referidas estructuras y con ello salvaguardar la seguridad jurídica del inmueble, como parte del Proyecto de Regularización

Parcelaria de la empresa. Dando apoyo al departamento de DDH y en conjunto con el departamento de Agrimensura y Contraloría Interna de la Egehid, se han adquirido y pagado alrededor de 105 expediente para el Proyecto de la Presa de Guayubín.

Esta Dirección registró 1339 entrada de documentos con distinta finalidad y procedimiento. Durante este semestre se elaboraron 1,299 comunicaciones, divididas de acuerdo como se describe a continuación:

Procesos	Cantidades
Solicitudes Información	528
Comunicaciones de Procedimientos	183
Informes Legales	112
Combustible	48
Remisiones de Documentación	153
Devoluciones	73
Opiniones Legales	202

Respecto de los trámites administrativos Laborales, fueron realizados 72 descargos, correspondientes a 62 por prestaciones laborales y 10 por asistencia económica. Fueron solicitados 49 pagos a notarios, como honorarios de legalizaciones de los contratos, actas y descargos.

Respecto de los procesos administrativos de contrataciones, fueron evaluadas en calidad de perito 14 procesos de comparación de precios, 11 procesos de licitaciones públicas nacionales, y 01 proceso de excepción. Fueron recibidas 63 notificaciones de actos de alguacil correspondientes a procesos e intimaciones varias, las cuales fueron atendidas de acuerdo con el requerimiento realizado.

Esta Dirección Jurídica notificó 27 actos de alguacil como respuestas o acciones llevadas a cabo por la institución.

Evolución y resultados de las distintas áreas durante el Primer Trimestre del 2024.

Área De Contrataciones:

Durante este semestre elaboramos cientos veintiséis (126) contratos y cientos trece (113) adendas, clasificados como se describe a continuación:

Contratos	Cantidades
Contratos de Trabajo	7
Obras	32
Bienes y Servicios	30
Publicidad	0
Pasantías	56
Alquiler	1
Comercialización	4
Adendas	Cantidades
Adendas de Obras	95
Adendas de Servicios	18

Área Inmobiliaria:

En el área inmobiliaria mediante el proceso de titulación masiva (Plan de Titulación) realizada en Jorgillo Vallejuelo, Provincia San Juan de la Maguana, se han emitido en conjunto ciento ocho (108) certificados de títulos de propiedad a distintos campesinos y parceleros, en conjunto con el departamento de Agrimensura. Se está trabajando el proceso de saneamiento de las Centrales JJ Puello – Domingo Rodríguez, San Juan de la Maguana y Central Magueyal, en Azua, así como la Central Rio Blanco y Central Rincón de Yuboa- Aniana Vargas, Piedra Blanca de Bonaó y Bonaó, con el objetivo de titular a nombre de la Egehid los terrenos que ocupan las referidas estructuras y con ello salvaguardar la seguridad jurídica del inmueble, como parte del Proyecto de Regularización Parcelaria de la empresa. Dando apoyo al departamento de DDH y en conjunto con el departamento de Agrimensura y Contraloría Interna de la Egehid, se han adquirido y pagado alrededor de 105 expediente para el Proyecto de la Presa de Guayubin.

Área Administrativa / Contenciosa Administrativa:

En el área Administrativa cerramos a favor de la Egehid cuatro (04) expedientes sobre impugnación de procesos de compras y contratación pública, de las cuales no han sido ejercido recurso jerárquico llevados por antes la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Respecto de los procesos contenciosos administrativos cursados en tribunal tenemos tres (03) Expedientes, de los cuales 1 está en recurso de amparo, 1 en recurso de revisión constitucional y 1 en demanda en justiprecio.

Área Penal:

En el área Penal hemos cursado seis (06) procesos en etapas judiciales, cuatro (04) de ellos con seguimiento desde años anteriores y dos (02) del presente año, todos con medida de coerción impuesta

Área Civil:

Respecto de las acciones civiles estamos trabajando once (11) procesos todos relativos a Demandas en Daños y Perjuicio. De estos procesos uno (01) se encuentran en Estado de Fallo, los demás en procesos por ante la Corte Civil.

➤ **Dirección de Logística**

En este primer semestre del año, hemos concluidos con la reorganización de más del 80% de todos los almacenes de la institución, así como también en el conteo físico de los bienes y materiales que se encuentran en cada uno de ellos. Iniciamos con el equipamiento del nuevo Centro de Distribución de Quitasueño, en el cual fueron instaladas todas las tremerías que conlleva el área y hemos ido organizando los mobiliarios que van llegando, así como también los materiales recibidos de suministro, transportación, y mantenimiento. Por su parte, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a las áreas y aumentar la eficiencia en los tiempos de entrega, implementamos el envío de los bienes, organizando rutas estratégicas que disminuyan el costo de transporte.

Para tener un mayor control del inventario y que pueda verificarse de manera automática, pusimos en marcha la digitación de entrada, salida y traspaso de materiales a través del sistema SAP. En otro orden, a fin de salvaguardar los bienes y materiales que se encuentran en los almacenes y en las instalaciones de Quitasueño, hemos establecido controles de accesos y estamos en proceso de gestionar la colocación de más cámaras de seguridad que deben ser instaladas en los puntos ciegos de todos los almacenes a nivel nacional.

➤ Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo de la EGEHID continúa apoyando a las áreas en la implementación y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2026, el cual se sigue a través del Plan Operativo Anual (Poa). Para este semestre dicho plan consta de 458 actividades de planes de acción estratégicos, repartidos entre todas las áreas de la empresa, y el cual nos permitirá garantizar y mantener la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano.

Objetivos Alcanzados de la dirección

A- Gerencia de Planes Programas y Proyectos (PPP)

A través de esta gerencia mantuvimos el seguimiento constante a las áreas para la planificación, elaboración y ejecución de las actividades pautadas, para así poder llevar a cabo mediante los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de la Institución, y el cumplimiento de cada uno de los procesos que encaminan dicho plan como POA, PACC, Proyectos y el Presupuesto anual.

Durante este semestre esta gerencia se ha mantenido capacitando los colaboradores de las diferentes áreas en cuanto a la elaboración y ejecución correcta de los procesos de seguimiento (Poa -PACC- Presupuesto) a través de talleres, comunicaciones, visitas a las áreas ejecutoras y demás acciones que nos permitan así lograr eficientizar las labores en todas las Direcciones y Gerencia de la institución

El Plan Operativo Anual (POA), es uno de los procesos que nos permite darle seguimiento a las áreas a través de las actividades correspondientes que van dirigidas al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, para la dirección tener un mejor control y las informaciones requeridas al tiempo correspondiente se ejecutó el proyectos de Power Bussines Intelligent en el 2023, en coordinación con la Dirección de Tecnología, quienes en este primer semestre del 2024 están dando soporte con el diseño de algunas pantallas (Dash Board) que nos permitan visualizar los datos en línea para el control y monitoreo de los procesos de la institución y su avance de ejecución. Se ha estado trabajando en los procesos para la implementación de los Códigos SNIP en los proyectos de la empresa y

además del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Compra y Contrataciones PACC, validando la inclusión de los proyectos con todos los requerimientos necesarios y acorde a la programación contempladas. Desde esta gerencia también trabajamos con el seguimiento y correcta ejecución de las partidas presupuestarias.

B- Gerencia Gestión de la Calidad

Este informe semestral proporciona una actualización detallada sobre el progreso en la implementación de las normas ISO de Calidad 9001, Antisoborno 37001 y Compliance 37301, conforme al contrato entre REBIRTH CONSULTING S.R.L y EGEHID. Durante este semestre, se han alcanzado varios hitos significativos y se han identificado áreas de mejora. A continuación, se presenta un resumen de los pasos ejecutados durante este período.

Levantamientos de las diferentes matrices

- ✓ Matriz de Riesgos y Oportunidades: Se realizó un levantamiento de todos los riesgos asociados a la producción y generación de energía en todas las direcciones de la EGEHID.
- ✓ Matriz Legal: Se ha completado el levantamiento de la matriz legal, identificando y analizando los requisitos legales aplicables a la organización en relación con los estándares ISO seleccionados.
- ✓ Matriz de Partes Interesadas: Se ha llevado a cabo el análisis de las partes interesadas relevantes para el SIG, identificando sus necesidades, expectativas y su impacto en las operaciones de la organización.
- ✓ Matriz SIPOC: Se han elaborado las matrices SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) para las áreas incluidas en el mapa de procesos, lo que ha permitido visualizar y comprender mejor los flujos de trabajo y sus interacciones.
- ✓ Fichas de Procesos: Donde se recogen las características más relevantes para el control de las actividades recogidas de cada área.

Creación de procedimientos y política del SGI

- ✓ Quejas y solicitudes: Se procedió a la creación de un manual de quejas y solicitudes, así como también la implementación de un correo institucional para la gestión de quejas de los clientes y partes interesada.
- ✓ Política de Calidad: Fue definida y aprobada por la Administración de la Empresa de Generación Hidroeléctrica y actualmente está en proceso de divulgación.
- ✓ Solicitud de cambio en el SGI: fue creado el procedimiento y los formularios correspondiente a la gestión de cambio del SIG.

Capacitación continua sobre el Sistema Integrado de Gestión

- ✓ Mesa de trabajo: se llevó a cabo una mesa de trabajo con todas las Direcciones de la EGEHID, los días 05 y 11 de marzo del 2024 para levantar y completar los riesgos y oportunidades asociados a cada dirección.
- ✓ Gestión Efectiva de los Procesos: se impartió los días 25 y 27 de junio del 2024 con una duración de 16 horas. Con la colaboración del INDOCAL.
- ✓ Curso virtual: Interpretación de la Norma ISO 37001 y 37301: con la ayuda de un consultor internacional se impartió la capacitación y sensibilización de las Antisoborno y de Compliance con el objetivo de crear una cultura enfocada en la transparencia institucional.

El 07/07/2023 la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana suscribió con Rebirth Consulting, S.R.L. el Contrato 125/2023 para la implementación, acompañamiento y certificación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad (ISO 9001:2015), Antisoborno (ISO 37001:2016), y Cumplimiento (ISO 37301:2021).

El nivel de avance general es de un 85.98%. El proyecto se estructuró en cinco etapas:

- ✓ 1ra etapa: Diagnóstico Inicial
- ✓ 2da etapa: Capacitación
- ✓ 3ra etapa: Diseño e Implementación del SIG
- ✓ 4ta Etapa: Auditoría Interna
- ✓ 5ta etapa: Certificación

Los esfuerzos realizados nos colocan en la 3ra. etapa. La tabla a continuación muestra el nivel de avance logrado, con relación a los resultados esperados.

Resultados Esperados	Nivel de Avance (%)
Elaborar, e implementar los requisitos y documentos relacionados con el SIG según el resultado del diagnóstico inicial, además de la documentación necesaria para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos del SIG.	75%
Mejora de la satisfacción del cliente	75%
Identificación y control de riesgos y oportunidades	95%
Cumplimiento de las normas y regulaciones	70%
Mejora en la gestión de la ética y el cumplimiento	70%
Fortalecimiento de la cultura ética y la responsabilidad social en la organización	70%
Control operacional del Sistema Integrado de Gestión	65%
Total Avance	74.28%

El avance en cuanto a la metodología y procedimientos de esta 3ra. etapa es de un 90.37%, como se muestra a continuación.

Metodología y Procedimiento	Nivel de Avance (%)
Establecer un análisis del contexto y su relación con los objetivos estratégicos	100%
Identificar los procesos de la organización y su relación con los objetivos estratégicos	100%
Definir indicadores de desempeño	75%
Establecer los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos necesarios	100%
Identificar riesgos y oportunidades, establecer controles y verificación de eficacia	95%
Establecimiento de la política y objetivos del SIG	100%
Monitoreo y medición del desempeño de los procesos y del SIG	75%
Establecimiento de un canal de denuncias y mecanismos de seguimiento y respuesta	78%
Total Avance	90.37%

Esta etapa fueron completadas en un 93.28%, y son las siguientes:

Metodología y Procedimiento	Nivel de Avance (%)
Mapa de procesos	100%
Ficha de procesos	95%
Políticas y procedimientos documentados Matriz de riesgos y oportunidades	95%
Plan de acciones	95%
Formatos de seguimiento y medición	95%
Canal de denuncias y herramientas de seguimiento y respuesta	78%
Análisis de causa raíz	95%
Total Avance	93.28%

➤ Informe de Gestión de Dirección de Auditoría Interna

Actividades realizadas en el trimestre abril-junio 2024

Leyes y normativas que rigen la Institución: Esta consiste en Fortalecer el Sistema de Control Interno, teniendo una matriz que nos muestre toda la normativa que rige la EGEHID, directamente y minimizando los riesgos que se puedan presentar en el dado caso de no cumplir con las normativas vigentes.

Dependencia	Tarea	Responsable	Entregable	% Ejecución
Auditoría Cumplimiento	Matriz del Levantamiento de las Leyes y Normativas que rigen la Institución.	Auditor de Cumplimiento	Informe de Auditoría	20%

Auditoría de gestión al área de seguridad industrial de la EGEHID.

El resultado y los beneficios esperados de esta auditoría es fortalecer el sistema de control interno en las diferentes etapas contractual, minimizando los riesgos que impactan a la Institución.

Dependencia	Tarea	Responsable	Entregable	% Ejecución
Auditoría de Gestión	Levantamiento de los Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna	Auditor de Gestión	Informe de Auditoría	85%
	Matriz de Riesgos y Oportunidades	Auditor de Gestión	Informe de Auditoría	95%

Auditoría de los diferentes rubros que componen los estados financieros de la empresa.

Con este se busca eficientizar y agregar valor a todos los procesos financieros de la entidad que se encuentran dentro del alcance de nuestros procedimientos, al igual que mejorar.

➤ Informe de la Dirección de Comunicación

A continuación, presentamos los boletines más relevantes que la de la dirección de comunicaciones de la EGEHID ha incidido en este primer periodo 2024.

Mes de inicio	Nombre del Proyecto	Descripción	Lugar	Inversión	Beneficiario
/Enero 2024	Reconstrucción de la obra de toma del acueducto de Bonao sobre el río Yuna	Recuperación del dique de hormigón armado, obra de toma y muro de gaviones	Monseñor Nouel	94,909,608.43	Bonao, Los Quemados, Blanco, La Villa y El Chorro.
/Enero 2024	Construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús	Obra a requerimiento de la comunidad	Municipio de Cambita	39,228,669.90	Cambita
/Enero 2024	Construcción del Multiuso de Cambita Pueblecito	Se dio el primer palazo para comenzar este proyecto	Cambita	55,732,285.54	Cambita Pueblecito
/Enero 2024	LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO	Iniciados los trabajos de construcción de la jardinería exterior	San Cristóbal	9,581,018.99	
/Enero 2024	Rehabilitación del canal Ysura	Iniciamos los trabajos de rehabilitación del canal Ysura, en Azua, que riega más de 10,000 hectáreas de una amplia variedad de plantaciones agrícolas y zona ganadera	Azua	\$ -	Se trata de varios tramos de esta importante infraestructura hídrica construida en 1978 y que se sirve de agua de la presa de Sabana Yegua, sobre el río Yaque del Sur
/Enero 2024	Reconstrucción de más de 24 kilómetros de carreteras	Iniciamos los trabajos de reconstrucción de más de 24 kilómetros de carreteras.	Santiago Rodríguez	798,192,490.6	Comunican a múltiples comunidades de la provincia de Santiago Rodríguez

Mes de inicio	Nombre del Proyecto	Descripción	Lugar	Inversion	Beneficiario
/Enero 2024	reconstrucción de más de 27 kilómetros de carreteras en los municipios de Vallejuelo y Las Matas de Farfán	Compromiso social de la empresa con las comunidades aledañas a las presas y las hidroeléctricas	San Juan	\$ -	Domingo Rodríguez y Sabaneta
/Enero 2024	Reconstrucción de las carretera de las diferente comunidades	Reconstrucción de la carretera de las comunidades Sabana Tuna, Los Derramaderos y Los Saladillos, de una longitud de 6 kilómetros	Las Matas de Farfán	182,995,720.3	Comunidades
/Enero 2024	Múltiples obras viales	Iniciamos múltiples obras viales en varias comunidades de la provincia de Santiago	Santiago	548,003,690.6	Como parte de los aportes sociales del Complejo Hidroeléctrico Tavera-Bao. Y en el marco del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa estatal
/Enero 2024	Inauguración del Recinto de la Universidad ISA	constituye un aporte de la hidroeléctrica de Palomino a las acciones orientadas al desarrollo sostenible de las provincias de la región suroeste del país	San Juan	508,537,269.	Región Suroeste del país
/Febrero 2024	La Reconstrucción y Ampliación de la carretera que comunica los municipios de Cambita y los Cacaos	La nueva vía impulsará el ecoturismo y garantizará mayores niveles de seguridad para los trabajadores de la EGEHID,	Cambita y Los Cacaos	4,009 MM	La comunidad y las maquinarias que diariamente se movilizan hacia las diferentes presas y centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del río Nizao.

Mes de inicio	Nombre del Proyecto	Descripción	Lugar	Inversion	Beneficiario
/Febrero 2024	Construcción de la carretera Yerba Buena-Los Corrales	para una carretera de 16.70 kilómetros, con sus correspondientes obras de arte, sistema de drenaje, alcantarillas tipo cajón y carpeta asfáltica de dos pulgadas, todo lo cual conlleva un gran movimiento de tierra.	San José de Las Matas (Santiago)	521,404,559.8	Las comunidades de la zona de influencia del complejo hidroeléctrico Tavera-Bao y López-Angustura.
/Febrero 2024	Construcción del muro de protección del río Yuna, en el municipio Arenoso	Inició los trabajos de construcción del muro de protección del río Yuna, en el municipio Arenoso, provincia Duarte.	Provincia Duarte	\$ -	Las comunidades de Arenoso y Aguacate
/Febrero 2024	Reacondicionamiento de la vía que comunica a Villa Palomino con Bohechío.	Se trata de un camino vecinal de 13 kilómetros de longitud, trabajado en material base con doble riego asfáltico, además, incluye drenaje habilitación de los pasos y obras de arte	Azua	121,185,436.7	Villa Palomino, Bohechío
/Marzo 2024	Puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico José Alberto Madé, del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep),	Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), en el distrito municipal de Santana, Nizao	Peravia	\$ -	27,000 beneficiarios
/Marzo 2024	Plan de Capacitación del Proyecto de Desarrollo de Las Placetas	El representante de la constructora AG, explicó que se inició con un grupo de 30 personas y que con el programa se	En Las Placetas	\$ -	4,500 jóvenes y adultos

Mes de inicio	Nombre del Proyecto	Descripción	Lugar	Inversion	Beneficiario
		pretende alcanzar 4,500 jóvenes y adultos, de forma gratuita.			
/Marzo 2024	centro comunal a la comunidad de Cambita Sterling	La obra se enmarca en el programa de responsabilidad social de la empresa y viene a contribuir con el desarrollo integral de esta zona.	San Cristóbal	\$ -	Cambita Sterling
/Abril 2024	Cuartel Policial Rancho Arriba	La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) hizo entrega del recién construido cuartel policial en el municipio de Rancho Arriba.	San José de Ocoa	17, 267,651.34	Las comunidades aledañas al complejo hidroeléctrico Jigüey
/Mayo 2024	Construcción de la carretera desde el contraembalse de la presa de Monción, en Santiago Rodríguez, hasta la ciudad de Mao.	Es una obra de 16 kilómetros de longitud conecta numerosas comunidades entre ambas provincias	Provincia de Valverde	527 millones	Las comunidades aledañas como aporte del Complejo Hidroeléctrico de Monción.

Adicional de esos proyectos cubrimos otras actividades del ámbito administrativo y operacional de la EGEHID.

➤ Dirección de Compras y Contrataciones

La gerencia de Compras y Compras y Contrataciones durante los meses abril/junio 2024, ha realizado diferentes procesos de compras con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la institución. Dichos procesos se realizan conforme la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas, Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su Reglamento de Aplicación, emitido mediante Decreto núm. 416-23, así como los manuales de procedimientos, formularios estándar,

circulares y resoluciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas del órgano rector del sistema.

Durante este periodo, la EGEHID ha publicado procesos compras y contrataciones por un monto total de RD\$ 6,986,611,417.96, bajo las distintas modalidades de procedimientos establecidos en la Ley.


En todos los procesos de compras y contrataciones llevados en cabo por la empresa, se han respetado los principios de transparencia, legalidad, participación y de buena administración, llevando a cabo procedimientos apegados a las normativas vigentes, así como las resoluciones y recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

A continuación, presentamos el detalle por los diferentes procesos que se han realizado hasta la fecha, así como los montos ejecutados. A saber:

Procesos de Compras por debajo del umbral

Hemos ejecutado 48 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de compras por debajo del umbral, en el periodo enero-junio 2024, según se detalla a continuación:


Estado del Procedimiento	Cantidad	Monto Total
Adjudicado	37	RD\$ 3,966,313.00
Cancelado	1	RD\$ 110,000.00*
Abierto	3	RD\$ 382,623.00*
Borrador	1	RD\$ 170,982.00*
Desierto	5	RD\$ 588,381.60*
Evaluacion	1	RD\$ 64,900.00
Total general	48	RD\$ 5,283,199.60

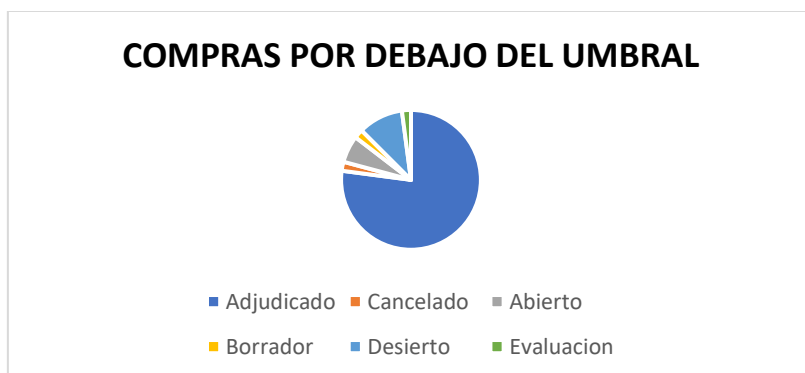

Procesos de Compras Menores

Se han llevado a cabo 46 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de compra menor, en el periodo enero-junio 2024, según se detalla más abajo.


Estado del Procedimiento	Cantidad	Monto Total
Adjudicado	37	RD\$32,184,757.00
Abierto	4	RD\$ 4,905,900.00*
Desierto	3	RD\$ 3,593,511.66*
Evaluación	1	RD\$ 900,000.00*
Publicados	1	RD\$ 1,552,390.00*
Total general	46	RD\$ 43,136,558.66

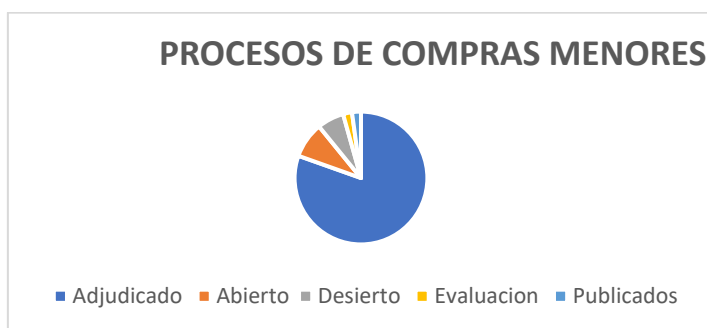

Procesos de Comparación de Precios

Se han llevado a cabo 17 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de comparación de precios, en el periodo enero-junio 2024, según se detalla en la tabla.


Estado del Procedimiento	Cantidad	Monto Total
Adjudicado	3	RD\$ 48,498,679.50
Abierto	5	RD\$ 216,436,795.00*
Desierto	2	RD\$ 59,488,545.20*
Evaluación	7	RD\$ 131,913,458.65*
Total general	17	RD\$ 456,337,478.35



Procesos de Licitación Pública Nacional

Se han llevado a cabo 16 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, en el periodo enero-junio 2024, según se detalla en la tabla.


Estado del Procedimiento	Cantidad	Monto Total
Adjudicado	1	RD\$ 35,542,336.32
Publicado	5	RD\$ 4,984,097,136.00*
Abierto	1	RD\$ 33,000,000.00*
Desierto	2	RD\$ 37,129,103.33*
Evaluación	7	RD\$ 1,231,503,991.70*
Total general	16	RD\$ 6,321,272,567.35

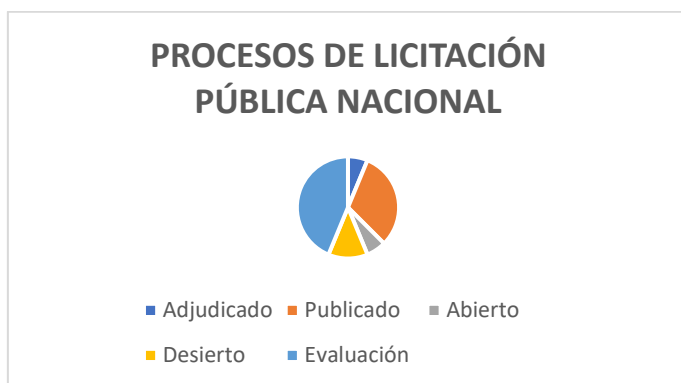

Proceso de Compra bajo modalidad de Excepción

Se han llevado a cabo 6 procesos de compras y contrataciones bajo la modalidad de Excepción, en el periodo abril-junio 2024, según se detalla más abajo.


Estado del Procedimiento	Cantidad	Monto Total
Adjudicado	3	RD\$ 119,161,614.00
Abierto	2	RD\$ 28,420,000.00*
Cancelado	1	RD\$ 13,000,000.00*
Total general	6	RD\$ 160,581,614.00



Empresas MIPYME Y MIPYME MUJER adjudicadas.

En el periodo enero-junio 2024, hemos manejado un total de 129 Procedimientos de compras en los primeros 6 meses de gestión en los cuales han salido adjudicado empresas MIPyME y MIPyME MUJER.


EMPRESAS MIPYME Y MIPYME MUJER ADJUDICADAS	
Normal	89
Mipyme	37
Mipyme Mujer	22



Resumen de Procedimientos de Compras del periodo enero-junio 2024

A continuación, el resumen por modalidades de compra que se han ejecutado en el referido periodo, con los montos totales por tipo de proceso y el monto general de lo ejecutado por la EGEHID.

Resumen de Procedimientos de Compras	Monto RD\$
Compras por Debajo del Umbral	RD\$ 5,283,199.60
Compras Menores	RD\$ 43,136,558.66
Comparación de Precios	RD\$ 456,337,478.35
Licitación Pública Nacional	RD\$ 6,321,272,567.35
Procesos de Excepción	RD\$ 160,581,614.00

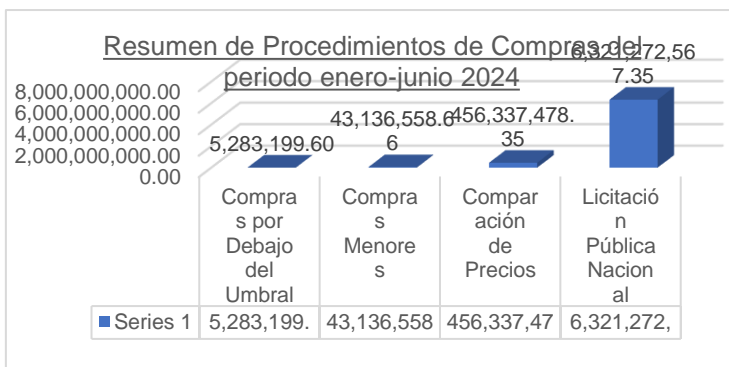

➤ **Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional**

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública se ha convertido en un instrumento interno y externo de fomento a la transparencia. Durante el semestre enero-junio 2024, un total de veintiséis (26) solicitudes de información fueron recibidas y tramitadas como establece la Ley 200-04 y su reglamento, de las cuales veinticinco (25) solicitudes fueron contestadas satisfactoriamente y una (01) en proceso de contestación.

Los cuadros que adjuntamos evidencian el interés de los usuarios del sistema eléctrico en conocer el manejo de los fondos que se le asigna a la institución y su destino final, de ahí las pocas solicitudes de información, ya que en nuestro Portal de Transparencia los usuarios pueden encontrar detalladamente lo que requieren. Mientras que en el cuadro de las calificaciones se puede observar y evidenciar el empeño y responsabilidad dedicados a la publicación de información requerida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

En cuanto al Sistema de Administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias 311, en el periodo enero - junio 2024, no recibimos nada, pero nos mantenemos vigilantes con el mismo. Esta empresa se ha convertido en una fuente de información para aspectos académicos y un referente obligatorio para inversionistas locales e internacionales interesados en el mercado eléctrico dominicano.

Solicitudes de Información recibidas abril-junio 2024

Meses	Cantidad Solicitudes de información
Enero	04
Febrero	9
Marzo	3
Abril	04
Mayo	04
Junio	2
Total	26

Calificación de las evaluaciones mensuales al portal de transparencia EGEHID

Mes	Calificación
Enero	81.48
Febrero	86.42
Marzo	92.78
Abril	93.37
Mayo	Pendiente
Junio	Pendiente
Promedio	88.51

Plan Operativo Anual (POA) EGEHID 2024

Para el año 2024, se han formulado 463 proyectos y/o actividades, con un presupuesto de RD\$29,466,040,567.91, distribuidos en los distintos lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 de la siguiente manera:

Áreas que impactan cada lineamiento

Lineamientos	Áreas que impactan lineamiento
1. Incrementar La Generación De Electricidad Con Fuentes Renovables	DDH, Tecnología, Energía Renovable
2. Fortalecer La Gestión Operativa Y Administrativa	Contraloría/Planificación, Administración
3. Impulsar El Desarrollo Tecnológico Y Digital	Dir. Tecnología y Telemática
4. Mejorar La Gestión Ambiental.	Dir. Medio Ambiente
5. Fortalecer La Gestión Social.	Bienestar y Asistencia Social, Proyecto Especiales/ MROC
6. Optimizar La Gestión Del Capital Humano.	Dir. Gestión Humana
7. Operar Con Rentabilidad Sostenible.	Comercialización/Financiera/Operaciones

Proyectos Inversión por Lineamientos

Lineamiento Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
1 Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables	48	\$16,911,713,506.42	57.39
2 Fortalecer la gestión operativa y administrativa	84	\$31,717,927.00	0.11
3 Impulsar el desarrollo tecnológico y digital	29	\$265,155,876.81	0.90
4 Mejorar la gestión ambiental	22	\$417,722,253.51	1.42
5 Fortalecer la gestión social	150	\$9,669,639,060.56	32.82
6 Optimizar la gestión del capital humano	35	\$311,879,004.62	1.06
7 Operar con rentabilidad sostenible	95	\$1,858,212,938.98	6.31
Total	463	\$29,466,040,567.90	100.00

Proyectos Inversión por Objetivos

Objetivo Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
Lineamiento Estratégico 1: Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables			
1.a. Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles	10	\$13,209,205,506.29	44.83
1.b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central	18	\$1,609,988,000.12	5.46
1.c. Diversificar la matriz de generación de energía renovable	20	\$2,092,520,000.01	7.10
Lineamiento Estratégico 2: Fortalecer la gestión operativa y administrativa			
2.a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución	60	\$17,157,987.00	0.06
2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos	16	\$2,919,940.00	0.01
2.c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional	4	\$-	0.00
2.d. Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos	4	\$11,640,000.00	0.04
Lineamiento Estratégico 3: Impulsar el desarrollo tecnológico y digital			
3.a. Fortalecer la gestión de tecnología informática y operativa de la organización	12	\$40,362,025.91	0.14
3.b. Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización	16	\$219,993,850.90	0.76
3.c. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa	1	\$4,800,000.00	0.02
Lineamiento Estratégico 4: Mejorar la gestión ambiental			
4.a. Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas	2	\$69,557,659.20	0.24
4.b. Instrumentar mecanismos para el pago de servicios ecosistémicos	3	\$18,532,281.60	0.06
4.c. Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental	2	\$13,776,480.00	0.05
4.d. Eficientizar el manejo de residuos generados en la producción de energía	0	\$-	0.00
4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental	12	\$178,664,081.70	5.25
4.f. Manejo y control de plagas y vectores de enfermedades en las centrales hidroeléctricas y comunidades aledañas	3	\$137,191,751.01	0.47
Lineamiento Estratégico 5: Fortalecer la gestión social			
5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados	32	\$490,746,055.84	1.67
5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo	111	\$9,064,562,518.44	30.76
5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa	7	\$114,330,486.28	0.39
5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés	0	\$-	0.00
Lineamiento Estratégico 6: Optimizar la gestión del capital humano			
6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo	34	\$311,879,004.62	1.07
6.b. Fortalecer los subsistemas de recursos humanos	0	\$-	0.00
6.c. Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa	0	\$-	0.00

Objetivo Estratégico	Cant.	Monto Inversión (RD\$)	%
6.d. Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional	1	\$-	0.00
6.e. Fortalecer los programas de salud e higiene ocupacional	0	\$-	0.00
Lineamiento Estratégico 7: Operar con rentabilidad sostenible			
7.a. Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital	1	\$6,546,205.06	0.02
7.b. Disminuir los costos de generación de energía	77	\$1,836,828,669.14	6.23
7.c. Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa	16	\$-	0.00
7.d. Renegociar la venta de energía	1	\$14,838,064.78	0.05
Total	463	\$29,466,040,567.90	100%

Ejecución del primer semestre de los proyectos y /o actividades del Plan Operativo Anual 2024 (POA)

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2					
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar	RD\$92,877,004.06	88%	3%	3%	2%	1%	1%	98%	Dirección de Energía Renovable	
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$1,415,787.90	99%	1%	0%	0%	0%	0%	100%		
Movimiento tierra Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$124,043,484.12	0%	0%	0%	15%	5%	10%	30%		
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$606,155,854.92	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	RD\$20,592,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$21,770,808.80	90%	5%	4%	1%	0%	0%	100%		
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$221,760,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	RD\$6,652,800.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	RD\$21,618,812.69	90%	5%	4%	1%	0%	0%	100%		
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	RD\$155,232,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaica Sabaneta	RD\$4,656,960.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$21,769,087.22	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$138,600,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Supervisión Proyecto Solar Fotovoltaico Tierra Nueva	RD\$16,632,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$33,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$278,122,395.17	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Tierra Nueva	RD\$38,841,928.82	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$25,759,103.33	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$58,262,893.23	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Supervisión Ejecución Proyecto Eólico Brazo Derecho	RD\$6,991,547.19	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Sabaneta	RD\$74,265,532.56	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Yacahueque	RD\$25,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Proyecto Acumulación por Hidrobombeo Camú	RD\$15,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Proyecto Eficiencia Energética, Edificio SEDE EGEHID	RD\$3,500,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Consultoría para estudios y diseños Proyectos Solar Fotovoltaico Flotante Rincón	RD\$40,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Consultoría para estudios y diseños Proyectos Solar Fotovoltaico Flotante Sabana Yegua	RD\$40,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Elaborar Informes Financieros Confiables y Oportunos	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables.	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Dirección de Servicios Financier as	
Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		
Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar.	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		
Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		
Ejecución Presupuestaria 2024	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		
Administración de los Activos Fijos	\$ -	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%		
Organización y control de los almacenes.	\$ 18,475,000.00	5%	10%	13%	10%	10%	12%	60%	Dirección Logística	
Remozamiento y equipamiento del centro de distribución Quita Sueño.	\$ 12,200,000.00	0%	9%	0%	10%	10%	6%	35%		
Diseñar e implementar un programa de evaluación desempeño por acuerdos	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dirección de Gestión Humanas	
Desarrollar un programa con facilitadores Internos	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social	\$ -	0%	0%	0%	5%	3%	0%	8%		
Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)	\$ -	0%	0%	0%	10%	0%	0%	10%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Análisis de los Descriptivos de Puesto	\$ -	0%	0%	0%	2%	0%	0%	2%		
Reinducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)	\$ -	0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%		
Realizar encuesta de Clima Laboral	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción de edificio y ampliación de edificaciones en la sede central, oficinas y áreas multiusos más construcción edificio de parqueos.	\$ 100,000,000.00	0%	0%	0%	2%	3%	0%	5%		
Reconstrucción de aceras, contenes badenes y filtrantes en y alrededor de todas las instalaciones de egehid.	\$ 10,307,200.00	0%	0%	0%	1%	2%	2%	5%		
Solicitud de Asfalto de 270 Metros de calle que conecta las 6 de noviembre con la carretera Sanchez que da acceso a las Instalaciones de EGEHID Q.S sector doña monguita	\$ 9,000,000.00	0%	0%	0%	2%	2%	1%	5%		
Adecuación y remodelación de área de recepción/transportación	\$ 386,200.00	0%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura	
Proyectos varios instalaciones de Q.S	\$ 7,778,800.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Boulevard Frontal y paseo peatonal/ fachada instalaciones de EGEHID/ Quita Sueño	\$ 1,000,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Lavadero de vehículos livianos Q.S	\$ 1,200,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Arreglos y mantenimientos de las unidades A/A (aires acondicionados)- edificio de archivos EGEHID/ Quita Sueño.	\$ 150,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Mantenimiento y cambios de luminarias en el edificio de archivos EGEHID/ Quita sueño	\$ 170,000.00	0%	0%	5%	0%	0%	0%	5%		
Cambio de Imagen corporativa Central Sabana Yegua	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Sabaneta	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Monción	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Baiguaque	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de Imagen corporativa Central Tireito	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de imagen Central Jiguey	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de imagen Central Rio Blanco.	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de imagen Central Valdesia	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de imagen Central Rincón	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Cambio de imagen Central Hatillo.	\$ 2,640,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID	\$ -	2%	2%	0%	2%	2%	1%	9%	Seguridad Militar EGEHID	
Definir el presupuesto a ser utilizado en los Proyectos a desarrollar, para el año 2024	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Incluir en el Presupuesto nacional, los proyectos de la EGEHID para el año 2024, el presupuesto establecido y la fuente para obtener los fondos	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dirección Jurídica	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Retomar las Actividades Planificadas y no completadas o no ejecutadas durante el año 2023 y enlistar las actividades a desarrollarse en el 2024	\$ -	0%	0%	0%	3%	2%	2%	7%		
Manejar, revisar y actualizar el sistema de seguimiento de los casos litigiosos, con capacidad, celeridad, responsabilidad, legalidad y transparencia, para garantizar una gestión efectiva en los casos legales.	\$ -	0%	0%	0%	2%	2%	1%	5%		
Emitir Opiniones a solicitud de parte, a distintos departamentos, siempre basadas conforma al marco regulatorio y las leyes de la institución.	\$ -	0%	0%	0%	2%	2%	2%	6%		
Colaborar y monitorear en todo el proceso de Contratación de Compra	\$ -	0%	0%	0%	10%	10%	5%	25%		
Elaborar, despachar y monitorear los contratos y acuerdos en base a los procedimientos jurídicos y las regulaciones de la Empresa y la Contraloría desde su inicio hasta finalizar.	\$ -	0%	0%	0%	15%	10%	15%	40%		
Facilitar la comunicación y coordinación entre los departamentos y la dirección jurídica.	\$ -	0%	0%	0%	15%	15%	10%	40%		
Realizar levantamiento parcelario de Inmuebles para fines de adquisición para distintas centrales.	\$ -	0%	0%	0%	2%	1%	2%	5%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Mantener de forma accesible la información actualizada de las normas aplicables a cada área, facilitando retroalimentación y la consulta rápida y efectiva.	\$ -	0%	0%	0%	1%	1%	1%	3%		
Colaborar en procesos internos con aspectos legales en la Dirección de Recursos Humanos garantizando su lineamiento con las leyes y regularizaciones vigentes.	\$ -	0%	0%	0%	1%	2%	3%	6%		
Seguir Saneado los terrenos pertenecientes a la Egehid y transferir los bienes inmuebles.	\$ -	0%	0%	0%	2%	2%	1%	5%		
Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 17,267,651.34	30%	0%	0%	20%	20%	20%	90%		
Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos, DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 5,891,444.85	20%	0%	0%	0%	0%	0%	20%		
Construcción Cuartel Policial en DM Mata yaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 19,937,171.00	70%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	
Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel, C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 2,400,000.00	35%	35%	0%	0%	20%	0%	90%		
Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén, C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 7,948,661.40	25%	10%	15%	0%	0%	0%	50%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 3,429,603.03	20%	22%	2%	0%	22%	10%	76%		
Rehabilitación Cancha en Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$ 6,445,202.41	25%	0%	0%	20%	20%	20%	85%		
Construcción Edificaciones Varias en C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$ 6,319,736.62	10%	15%	10%	0%	0%	0%	35%		
Construcción Mercado Bohechío, Municipio Bohechío, Provincia San Juan	\$ 52,722,098.79	0%	0%	0%	0%	10%	15%	25%		
Play Baseball Pueblo Nuevo, DM El Rosario, Provincia San Juan	\$ 38,798,934.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Play Arroyo Cano, DM Arroyo Cano, Provincia San Juan	\$ 33,522,975.96	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Play Arroyo Cano, Municipio Bohechío, Provincia San Juan	\$ 29,535,152.43	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez, DM Amiama Gómez, provincia Azua. (Play Magueyal)	\$ 5,504,959.36	20%	0%	0%	0%	5%	0%	25%		
Construcción de Play de Béisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$ 13,946,360.82	10%	20%	33%	10%	2%	0%	75%		
Construcción Centro de Atención Primaria, municipio Magueyal, provincia Azua.	\$ 5,119,612.20	10%	10%	13%	0%	0%	0%	33%		
Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	\$ 6,764,457.86	81%	0%	0%	10%	5%	4%	100%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Construcción de parque en barrio El Blanco, municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$ 4,621,975.37	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Construcción Destacamento Policial, provincia Azua.	\$ 15,321,972.66	25%	10%	20%	0%	0%	10%	65%	
Construcción Verja Perimetral Cementerio, municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$ 5,663,094.60	40%	42%	0%	0%	3%	5%	90%	
Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.	\$ 5,897,424.87	45%	45%	0%	0%	10%	0%	100%	
Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama, municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$ 7,883,911.35	70%	0%	0%	10%	0%	0%	80%	
Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San José, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$ 21,188,003.94	40%	20%	0%	0%	0%	15%	75%	
Construcción de Destacamento Militar Miramar, provincia Pedernales.	\$ 5,865,340.95	40%	50%	8%	0%	0%	2%	100%	
Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	\$ 10,595,846.53	50%	23%	0%	0%	7%	5%	85%	
Proyecto solución Agua Potable Comunidades Vista Hermosa, La Plata y La Cuchilla, Villa Altagracia, San Cristóbal, R.D.	\$ 5,368,673.00	40%	22%	0%	0%	0%	0%	62%	
Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	\$ 9,640,758.27	40%	53%	0%	0%	0%	0%	93%	
Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$ 5,191,211.76	55%	10%	20%	0%	0%	0%	85%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén, C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$ 6,586,474.55	22%	20%	20%	0%	0%	1%	63%	
Unidad de Atención Primaria La Plena, provincia San Cristóbal.	\$ 14,038,530.39	30%	25%	0%	0%	0%	0%	55%	
Construcción Jardinería exterior, Boulevard Liceo Musical Pablo Claudio, San Cristobal	\$ 9,581,018.99	0%	0%	0%	3%	2%	0%	5%	
Construcción Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, municipio Cambita. Prov. San Cristóbal	\$ 39,228,665.99	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	
Construcción Multiuso Cambita	\$ 55,732,285.54	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	
Construcción Play La Lechería, Villa Altagracia	\$ 28,812,826.39	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Construcción 3 Canchas en Doña Ana, Prov. San Cristobal	\$ 32,662,654.02	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Construcción Cancha Deportiva Mata Gorda, municipio Bani, provincia Peravia. (Antigua Sabanita Caliente)	\$ 5,504,959.36	20%	20%	0%	0%	0%	10%	50%	
Construcción de Centro Comunal Rio Arriba, provincia Peravia.	\$ 5,225,596.04	10%	10%	0%	0%	0%	0%	20%	
Construcción Destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom.	\$ 24,068,848.87	20%	20%	0%	0%	0%	0%	40%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Construcción de Play de Béisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	\$ 18,429,148.04	20%	18%	0%	0%	10%	7%	55%	
Construcción Cuartel Policial Don Gregorio, Nizao, Provincia Peravia	\$ 11,298,515.41	0%	0%	0%	10%	5%	0%	15%	
Construcción Iglesia Nizao, Provincia Peravia	\$ 9,864,456.15	0%	0%	0%	0%	10%	0%	10%	
Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$ 16,031,992.23	20%	20%	25%	0%	11%	10%	86%	
Construcción de Comedor y Almacén en C.H. Rio Blanco, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$ 8,288,072.25	25%	20%	0%	0%	10%	28%	83%	
Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	\$ 4,522,235.32	45%	45%	0%	0%	0%	5%	95%	
Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	\$ 2,645,311.33	46%	40%	0%	0%	0%	4%	90%	
Construcción de Funeraria Jayaco, Bonaó, Monseñor Nouel (Antiguo Caribe-El Verde)	\$ 17,436,879.34	34%	20%	0%	0%	7%	7%	68%	
Construcción de Funeraria Sabana del Puerto, municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.	\$ 14,394,128.86	25%	25%	0%	0%	10%	10%	70%	
Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega	\$ 4,520,382.41	18%	15%	0%	3%	10%	0%	46%	
Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén, C.H. Constanza, municipio Constanza, provincia La Vega.	\$ 5,903,911.87	50%	45%	0%	0%	0%	3%	98%	
Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas,	\$ 11,792,991.00	50%	29%	0%	0%	0%	1%	80%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
municipio de Yuna, provincia La Vega.									
Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera, municipio de Constanza, Provincia La Vega	\$ 10,175,311.34	50%	25%	0%	0%	0%	20%	95%	
Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$ 15,665,888.00	25%	30%	0%	0%	5%	2%	62%	
Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias en la C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$ 8,000,000.00	45%	40%	0%	0%	5%	0%	90%	
Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$ 6,740,035.52	35%	30%	0%	0%	1%	0%	66%	
Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas, municipio de San José de Las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 15,622,510.40	19%	10%	0%	0%	6%	5%	40%	
Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 14,757,860.41	25%	25%	0%	0%	5%	5%	60%	
Terminación de Capilla de Fátima, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 5,311,316.41	35%	30%	0%	10%	5%	10%	90%	
Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$ 23,756,214.36	20%	20%	0%	5%	15%	10%	70%	
Construcción de Funeraria en Caimito, Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 16,178,054.23	15%	10%	0%	0%	15%	0%	40%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 9,947,577.61	0%	0%	0%	0%	18%	10%	28%		
Construcción de Mirador Recreativo en Contra embalse López-Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 4,109,438.55	15%	10%	0%	15%	15%	15%	70%		
Terminación de Cancha próxima al Contra embalse López Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 5,829,374.80	22%	10%	0%	0%	4%	4%	40%		
Cuartel López - Angostura, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$ 5,631,199.33	25%	10%	0%	0%	10%	10%	55%		
Construcción Play El Fundo, Municipio Villa Los Almacigos, Provincia Santiago Rodríguez	\$ 29,155,095.31	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	\$ 6,917,430.50	34%	30%	0%	0%	21%	5%	90%		
Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza, municipio Esperanza, provincia Valverde, R.D.	\$ 9,468,082.13	25%	25%	0%	0%	15%	10%	75%		
Construcción Play Baseball DM El Rosario, Prov. San Juan	\$ 39,094,964.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Reconstrucción Camino Vecinal Sección El Guineo- Las 3 Veredas, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal.	\$ 122,175,266.94	0%	0%	5%	10%	25%	10%	50%	Gerencias de Proyectos Especiales	
Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal	\$ 127,511,712.24	10%	10%	10%	10%	10%	15%	65%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Reconstrucción Camino Vecinal Los Cacaos- Santana, Sección Calderón-Santana, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal	\$ 125,497,731.11	5%	10%	10%	10%	10%	10%	55%	
Bacheo Y Recapeo Con Carpeta Asfáltica de 2'' Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigüey, Sección Los Mineros, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal	\$ 79,349,351.31	25%	25%	10%	10%	10%	18%	98%	
Limpieza y Rehabilitación del Canal Nizao - Najayo, (Etapa 1) 10km, Prov. San Cristóbal.	\$ 184,577,147.31	25%	25%	10%	10%	10%	18%	98%	
Asfaltado Carretera desde CH Monción hasta Presa Monción, (Tramo III desde Presa Monción hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II desde CH Monción Hasta Contraembalse.	\$ 155,312,422.71	25%	10%	15%	10%	10%	25%	95%	
Mantenimiento y Rehabilitación De 13.00 Kms de Caminos Circundantes a La Central Hidroeléctrica Rosa Julia La Cruz, Reparación y Dragado del Dique Boba	\$ 110,750,099.29	25%	10%	10%	15%	10%	25%	95%	
Reconstrucción de Caminos Adyacentes a La Presa De Monción D.M.	\$ 187,258,961.13	0%	10%	10%	10%	5%	5%	40%	
Mantenimiento y Rehabilitación de La Carretera de acceso a la Presa Palomino- Longitud 12.5 Km, Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	\$ 87,758,632.48	25%	10%	10%	25%	15%	15%	100%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Presupuesto para la Reeducación y Solución de montaña con riesgo de derrumbes y caídas de Rocas en Estaciones 15+640, 15+615 en zona de dren y escorrentía de La montaña, 10+430, camino acceso a Presa Palomino Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	\$ 89,253,901.52	25%	10%	10%	10%	10%	10%	75%	
Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación Camino La Canelilla-La Cole. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Sección las Coles, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal.	\$ 98,754,897.15	10%	10%	0%	15%	15%	0%	50%	
Mantenimiento correctivo y Rehabilitación caminos barrio Alto de los Ubaldo y San Francisco A Guazumal. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal	\$ 98,876.496.87	10%	10%	0%	10%	10%	5%	45%	
Terminación de los diques viejo y nuevo - Río Caña - Matayaya, Distrito Municipal Matayaya, Las Matas De Farfán, Provincia	\$ 110,734,547.76	25%	25%	10%	10%	15%	10%	95%	
Mantenimiento y Rehabilitación de caminos Baitoa-Tavera de la vía Guardarraya 9,6 Km, Municipio Baitoa, Prov. Santiago	\$ 241,191,458.00	10%	10%	0%	13%	10%	10%	53%	
Construcción de Muro de Gaviones y Limpieza de Alcantarilla en carretera Los Quemados, Blanco, Prov. Monseñor Nouel.	\$ 3,963,142.29	16%	16%	16%	16%	16%	16%	98%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Reconstrucción de Carretera Loma La Gallina-La Cabra, D.M. Tavera, Prov. la Vega	\$ 101,018,535.02	7%	7%	7%	7%	7%	7%	40%		
Reconstrucción de Carretera La Jina-El Morro, D.M. Tavera, Prov. La Vega	\$ 72,402,178.90	15%	15%	15%	15%	15%	15%	90%		
Reconstrucción de Carretera El Morro-El Desecho, D.M. Tavera, Prov. La Vega	\$ 74,000,062.60	16%	16%	16%	16%	16%	16%	95%		
Reconstrucción de Carretera (C. C. La Jagüita-Altos Del Aguacate) -Tavera Abajo, D.M. Tavera, Prov. la Vega	\$ 47,082,075.03	6%	6%	6%	6%	6%	6%	35%		
Reconstrucción Tramo Carretera Las Cruces-(Las Cruces-La Herradura)-Los Ranchos de Tavera (1.23 Km), La Herradura-Embalse Taveras (0.224 Km), Calle Interior La Herradura (0.315 Km), Tramo Carretera Las Cruces (0.352 Km), D.M. Tavera, Prov. la Vega	\$ 57,404,236.59	20%	20%	20%	15%	10%	15%	100%		
Mantenimiento Caminos Vecinales Municipio de Sabaneta, Prov. San Juan, Grupo 2, Longitud 23.02 Kms.	\$ 45,923,145.78	14%	14%	14%	14%	14%	14%	85%		
Rehabilitación Carretera La Cuesta - Loma de los Palos (4.537 Kms), Prov. Santiago, La Cuesta, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago	\$ 99,497,770.11	25%	25%	10%	15%	10%	5%	90%		
Reconstrucción Camino Rincón de Piedra-Carrizal, sajoma	\$ 89,079,779.16	4%	5%	5%	0%	0%	6%	20%		
Mantenimiento y Rehabilitación obras hidráulicas vía existente Las Barías Longitud 5 Km, Sección las Barías, Municipio Bani, Prov. Peravia	\$ 83,628,850.77	25%	10%	10%	0%	20%	10%	75%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Mantenimiento y Rehabilitación Caminos Circundantes a la C.H. Tavera Lateral Derecho- Longitud 4.5 Km , Jánico-Las Mesetas, Municipio Jánico, Prov. Santiago.	\$ 116,854,621.98	10%	10%	0%	10%	10%	10%	50%	
Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicomé, Provincia Valverde	\$ 14,735,874.62	25%	25%	20%	10%	10%	6%	96%	
Construcción Verja Perimetral Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde	\$ 30,599,534.30	20%	20%	0%	25%	25%	10%	100%	
Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación Caminos Comunidades Buena Vista, La Yagua, La Laguna, Bacheo Técnico del acceso principal a Valdesia desde Semana Santa a la Central, Obras hidráulicas vía existente Las Barias Circundantes Central hidroeléctrica Valdesia, Estribo Izquierdo Gavión puente principal acceso a la Central, Prov. Peravia	\$ 112,466,150.84	10%	10%	10%	10%	25%	10%	75%	
Construcción del Puente sobre el arroyo los Calimetes, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal.	\$ 242,684,995.74	15%	10%	0%	5%	10%	0%	40%	
Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación Camino Sección Majagual-Manomatuey, Municipio Cambita Garabitos, Circundantes Central hidroeléctrica Aguacate, Prov. San Cristóbal.	\$ 175,937,669.01	10%	0%	10%	0%	15%	10%	45%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación Caminos Sección Guazumal - El Firme, La Pangola-La Jicotea, y entrada hacia la escuela del sector la Toma. Circundantes Central hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal	\$ 204,322,198.64	25%	10%	10%	0%	15%	15%	75%	
Reconstrucción de Carretera La Jina-Loma de La Gallina, La Jina-Loma del Coco, D.M. Tavera, Prov. La Vega	\$ 73,767,637.10	20%	15%	10%	25%	10%	5%	85%	
Reconstrucción de Carretera La Jina-Conuco Viejo-El Jobo (1.88 Km), La Jina-Cementerio de Jina Hueca (0.864 Km), D.M. Tavera, Prov. La Vega	\$ 74,107,872.13	11%	11%	11%	11%	11%	11%	65%	
Rehabilitación Calles San Pedro, Municipio Sabana Iglesias	\$ 71,549,673.34	45%	0%	0%	20%	10%	15%	90%	
Rehabilitación Carretera El Rubio - La Celestina (7.05 Km)DM Rubio, San Jose de las Matas, Prov. Santiago	\$ 209,997,990.96	20%	5%	5%	0%	5%	0%	35%	
Construcción de Carretera D.M. El Rubio - Los Corocitos (14.9 Km), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago	\$ 430,998,003.96	10%	0%	0%	20%	0%	10%	40%	
Mantenimiento Caminos Vecinales Zona de la Sierra, Provincia Santiago.	\$ 101,545,793.43	11%	11%	11%	11%	11%	11%	66%	
Rehabilitación Carretera Aguas Calientes - Las Placetas DM Placetas, San Jose de las Matas, Prov. Santiago	\$ 234,269,350.80	0%	15%	0%	15%	0%	0%	30%	
Rehabilitación Varias Calles, Distrito Municipal Guayabal, Prov. Santiago, Republica Dominicana	\$ 93,097,865.23	0%	15%	10%	0%	25%	0%	50%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	AREA EJECUTORA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Rehabilitación Carretera La Auyama (1.83 Kms), El Naranjito (0.895 Kms), Callejón No.1 (0.774 Kms), D.M. La Cuesta, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago.	\$ 118,317,976.72	12%	12%	12%	12%	12%	12%	70%	
Reconstrucción y Asfaltado Calles Centro D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago.	\$ 94,524,609.11	5%	10%	10%	0%	0%	10%	35%	
Construcción Verja para protección Boulevard parque lineal Tenguerengue, Prov. San Juan	\$ 109,269,734.71	15%	25%	0%	10%	10%	15%	75%	
Construcción Calles de Pinalito, Municipio de Jánico, Prov. Santiago	\$ 226,909,687.00	10%	0%	0%	15%	10%	10%	45%	
Reconstrucción carretera cruce carrizal la piedra-La Guazuma, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	\$ 188,601,833.86	0%	15%	0%	0%	10%	10%	35%	
Preparación de calles para Asfaltado de los sectores la esperanza, monte adentro, amor y paz, INESPRES, El INDRHI y la unión, El Pozo, Los Corozos, Caminos Vera del Yuna, Municipio Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez.	\$ 441,303,331.93	8%	8%	8%	8%	8%	8%	48%	
Asfaltado de la calle salida de Puñal a la av. Hispanoamericana, calle Tuto García. Municipio Puñal.	\$ 124,498,204.90	10%	0%	0%	15%	0%	0%	25%	
Reconstrucción camino La Cuesta de Mela y Construcción alcantarilla de Cajón, D.M. Guayabal, Prov. Santiago, C.H. Tavera.	\$ 56,574,160.44	10%	0%	0%	15%	0%	0%	25%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Construcción Puente Cajón Sobre Rio Jamey, Señalización Mantenimiento y obras menores carretera Hato Damas-Jamey, Prov. San Cristóbal.	\$ 52,615,963.84	10%	0%	0%	0%	10%	0%	20%		
Carretera la sabaneta en sabana iglesias (6.986 km), central hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago	\$ 234,329,791.64	7%	7%	7%	7%	7%	7%	40%		
Construcción y asfaltado calles altas de la herradura (6.915 km), central hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago.	\$ 188,915,199.39	7%	7%	7%	7%	7%	7%	40%		
Construcción y asfaltado calles de las charcas (3.67 km), central hidroeléctrica Tavera-Bao, Prov. Santiago	\$ 124,758,699.58	0%	10%	0%	10%	10%	5%	35%		
Construcción Boulevard Hatillo (16.20 km), central hidroeléctrica Hatillo.	\$533,953,763,66	0%	0%	0%	10%	10%	0%	20%		
Reconstrucción carretera Puerta del Mulo (7.58 kms), Central Hidroeléctrica Monción, Municipio San Ignacio de Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez.	\$ 271,255,970.91	0%	10%	0%	0%	10%	10%	30%		
Reconstrucción carretera alto de la cana (11.50 kms), central hidroeléctrica Monción Municipio San Ignacio de Sabaneta.	\$ 335,479,112.29	0%	5%	0%	5%	5%	5%	20%		
Reconstrucción carretera arroyo seco C.H. Monción, sabaneta.	\$ 191,457,407.42	0%	5%	0%	5%	0%	10%	20%		
Construcción de 50 viviendas en centro poblado presa de los ríos Municipio de Guayubín.	\$ 135,005,220.50	0%	0%	10%	0%	0%	0%	10%		
Construcción carretera de Monción-	\$ 527,082,928.41	0%	10%	10%	0%	10%	10%	40%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
contraembalse de Mao, Long. 30km.										
Mantenimiento de 13 km camino de villa Palomino.	\$ 121,185,436.83	0%	0%	0%	10%	10%	0%	20%		
Diseño y construcción de muro de protección en el Municipio Arenoso Etapa 2	\$ 274,656,627.39	0%	0%	0%	10%	10%	0%	20%		
Reconstrucción camino Vecinal Vallejuelo-Batista (10.30 km) (ancho vía 6.00 m), Municipio Vallejuelo, Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.	\$ 326,701,058.74	0%	0%	10%	10%	10%	5%	35%		
Reconstrucción camino Vecinal Vallejuelo-Río arriba sur (4.65 km), Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.	\$ 178,811,312.45	0%	0%	15%	10%	10%	5%	40%		
Rehabilitación canal y sura en tramos discontinuos desde la E-0+000 a E-6+000 (primera etapa) y desde la E-6+000 a E-15+000 (segunda etapa) (15 km) C.H. los Toros.	\$ 481,422,835.14	0%	10%	0%	10%	0%	10%	30%		
Construcción y asfaltado calles barrio 5 de abril (2.56 km), Central Hidroeléctrica Valdesia, prov. San Cristóbal	\$ 58,425,842.58	10%	25%	0%	5%	5%	5%	50%		
Reconstrucción camino vecinal Capulín-Cañafistol y calles circundantes (6.8 km) Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.	\$ 185,788,369.18	0%	10%	10%	10%	10%	0%	40%		
Reconstrucción carretera sabana tuna-los derramaderos-los saladillos (6 kms), Central Hidroeléctrica Sabaneta, Municipio las matas de Farfán.	\$ 182,995,720.31	0%	10%	10%	10%	10%	0%	40%		
Mantenimiento vías de acceso circundantes a la central	\$ 130,166,583.74	13%	13%	13%	13%	13%	13%	80%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Hidroeléctrica Monción.									
Mantenimiento de vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctrica Valdesia.	\$ 130,914,915.48	13%	13%	13%	13%	13%	13%	75%	
Mantenimiento de vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Jiguey y Aguacate.	\$ 110,623,566.61	13%	13%	13%	13%	13%	13%	80%	
Mantenimiento de vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Hatillo y Rincón, prov. Monseñor Nouel.	\$ 92,682,210.79	0%	10%	15%	5%	5%	5%	40%	
Mantenimiento de vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Sabana Yegua y Sabaneta.	\$ 117,385,399.10	13%	13%	13%	13%	13%	13%	80%	
Mantenimiento de vías de acceso circundantes Centrales Hidroeléctricas Rio Blanco y Pinalito.	\$ 94,769,758.76	0%	10%	5%	10%	5%	10%	40%	
Reconstrucción obra de toma del Rio Yuna, Acueducto Bonaó.	\$ 94,909,608.43	0%	0%	10%	10%	0%	0%	20%	
Construcción Club Deportivo los Buitres (segunda etapa), Centra Hidroeléctrica Valdesia.	\$ 65,192,800.09	0%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	
Construcción de calle Municipio Juan de Herrera, Sabaneta.	\$ 249,451,400.34	0%	10%	10%	5%	0%	0%	25%	
Rehabilitación y Ampliación carretera Cambita Lote I	\$1,050,965,661.36	0%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	
Rehabilitación y Ampliación carretera Cambita los Cacaos Lote IV	\$ 974,984,560.02	0%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	
Rehabilitación y ampliación carretera Cambita los Cacaos Lote III	\$ 937,165,277.86	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	
Rehabilitación y Ampliación carretera	\$1,046,339,431.78	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Cambita los Cacaos Lote II										
Construcción de carretera Yerba Buena los Corales, Sajoma, Central Hidroeléctrica Tavera.	\$ 521,404,559.84	0%	10%	0%	0%	10%	0%	20%		
Asfaltado carretera acceso Presa Palomino C.H. Palomino.	\$ 245,929,501.48	0%	15%	0%	0%	0%	0%	15%		
Construcción solución vial desde antigua carretera Sánchez Pley Temístocles Mets hasta 6 de noviembre, ampliación puente sobre el Rio Nigua Lote I.	\$1,792,275,096.55	0%	0%	10%	0%	10%	0%	20%		
Construcción solución vial desde antigua carretera Sánchez Pley Temístocles Mets hasta 6 de noviembre, ampliación puente sobre el Rio Nigua Lote II	\$ 877,449,787.93	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%		
Construcción solución vial desde antigua carretera Sánchez Pley Temístocles Mets hasta 6 de noviembre, ampliación puente sobre el Rio Nigua Lote III.	\$ 510,375,168.84	0%	0%	10%	5%	5%	0%	20%		
Construcción solución vial desde antigua carretera Sánchez Pley Temístocles Mets hasta 6 de noviembre, ampliación puente sobre el Rio Nigua Lote IV.	\$ 935,726,220.93	0%	5%	0%	10%	5%	0%	20%		
Reconstrucción camino vecinal la Ceiba	\$ 141,888,794.82	0%	0%	0%	10%	5%	5%	20%		
Reconstrucción camino vecinal los Capaces y el sector el puente Rio Blanco.	\$ 91,948,974.97	0%	0%	5%	5%	5%	5%	20%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Reconstrucción camino vecinal los Botados.	\$ 144,116,846.04	0%	0%	0%	10%	10%	0%	20%		
Reconstrucción camino vecinal los Almendrales.	\$ 122,844,160.78	0%	10%	5%	5%	0%	0%	20%		
Reconstrucción de calles Gurabo y Clavijo (19.20 kms), Central Hidroeléctrica Monción.	\$ 576,909,666.18	0%	0%	5%	5%	5%	5%	20%		
Carretera Bao-la Galleta, la Hoya-la Virgen y la Hoya-el cuartel (6.98 km), Central Hidroeléctrica Lopez Angostura.	\$ 242,089,328.98	0%	0%	10%	10%	0%	0%	20%		
Cruce de los Quemados-Sabaneta.	\$ 550,263,808.14	0%	0%	10%	10%	0%	0%	20%		
CC (Cagüeyes - Juncalito) - Los Corrales - Damajagua Adentro - Las Carreras Abajo - Las Carreras	\$ 681,451,456.12	0%	15%	10%	5%	24%	10%	64%		
Las Placetas - Presa Los Limones	\$ 329,342,515.27	0%	0%	10%	25%	10%	5%	50%		
6- Las Placetas - Piedra Partida - Jamamú Abajo	\$ 766,740,939.26	0%	0%	10%	10%	20%	0%	40%		
La Guazuma - Mata grande	\$ 843,858,907.65	0%	0%	5%	5%	10%	0%	20%		
Carretera Santiago - La Cuesta - San José de las Matas (33 km)	\$1,488,036,568.02	14%	14%	14%	14%	14%	14%	85%		
Carretera Pinalito- Cr. Los Pilones- El Córban-El Papayo (Carretera Serrana Etapa 1) (12.2 km)	\$ 692,372,479.43	0%	0%	15%	0%	15%	0%	30%		
Carretera Sajoma - La Guázuma - Balneario Aguas Calientes	\$ 384,600,827.31	0%	0%	10%	15%	0%	0%	25%		
Carretera El Papayo- Bejucal - La Quebrada (Carretera Serrana Etapa 2) (6.36 km)	\$ 328,217,152.81	0%	0%	5%	5%	5%	5%	20%		
Tramo Alto del Aguacate - Cr. Alto Del Añil (Complemento Carretera Tavera - Jarabacoa)	\$ 410,608,495.18	0%	10%	15%	15%	10%	0%	50%		
Obras de Mejoría y Adecuación de los Balnearios.	\$ 142,397,680.59	0%	0%	1%	1%	2%	1%	5%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Auditoría de Gestión a la Gerencia de Seguridad Industrial de la EGEHID	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dirección de Auditoría Interna	
Auditoría de Gestión a la Dirección de Logística de la EGEHID	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Levantamiento de los Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna	\$ -	0%	0%	0%	30%	25%	30%	85%		
Matriz de Riesgos y Oportunidades	\$ -	0%	0%	0%	30%	30%	35%	95%		
Crear Matriz con las Leyes y Normas que rigen a la Empresa	\$ -	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%		
Validación de los servicios contratado durante el año.	\$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Arqueos de Cajas Chicas	\$ -	5%	10%	10%	15%	24%	10%	74%		
Actividades Regulares de Auditoría Financiera	\$ -	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%		
Auditoría Financiera a la Cuenta Construcciones en Proceso, Año 2023	\$ -	0%	0%	0%	10%	10%	20%	40%		
Auditoría Financiera a las Cuentas por Cobrar, Año 2023	\$ -	0%	0%	0%	20%	20%	20%	60%		
Auditoría Financiera al Area de Tesorería	\$ -	0%	0%	0%	20%	25%	25%	70%		
Acompañamiento en el Proceso de Inventarios Físicos de Activos Fijos y Materiales	\$ -	0%	0%	0%	20%	20%	20%	60%		
Auditoría a los Proyectos de Obras Adjudicadas en Proceso de Ejecución.	\$ -	10%	10%	24%	10%	10%	10%	74%		
Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	\$ -	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%	Contraloría	
Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	\$ -	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%		
Adquisición de los relee de protecciones para las centrales de Tavera, Lopez Angostura,		0%	0%	0%	0%	13%	0%	13%	Dirección de Mantenimiento	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024							
		T1			T2			TOTAL %	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA
Rincon, Hatillo, Lineas de Valdesia, Jiguey, Sabaneta y Sabana Yegua.									
Adquisición de rodete y repuestos de la turbina para la rehabilitación de la unidad 2 C.H. AGUACATE		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Aplicación de Pintura Sand-Blasting en Tubería, Central Contraembalse Monción		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Aplicación de Sistema Anticorrosivo y Pintura a las Ataguías de Aspiración de la Central Aguacate		0%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	
Cambio de las Protecciones de ambos generadores, transformador y línea C.H. LOS TOROS		0%	0%	5%	8%	0%	0%	13%	
Cambio de Reguladores de Velocidad ambas unidades M.C.H. ANIANA VARGAS		0%	0%	0%	0%	10%	0%	10%	
Cambio de Reguladores de Velocidad ambas unidades M.C.H. C.E. MONCION		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Cambio de Reguladores de Velocidad de turbinas 1 y 2 C.H. TAVERA		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Cambio de Reguladores de Velocidad de turbinas C.H. RIO BLANCO		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Cambio de Reguladores de Velocidad unidad 1 y 2 C.H. VALDESIA		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Compra de Sello Válvula Mariposa, Rodamiento y Sellos de Compuerta Radial, Mecanismos de Vástago Ascendente para Operación de las Compuertas y Rodamientos de		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024								
		T1			T2			TOTAL %		
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		AREA EJECUTORA	
Turbina C.H. SALTO DE CONSTANZA										
Compra, suministro e instalacion de 2 rodete. C.H. RIO BLANCO		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Instalación de sistema de enfriamiento del tipo APEMA cerrado, para los generadores C.H. AGUACATE		0%	0%	0%	0%	5%	0%	5%		
Diseño suministro e intalacion de PLC y HMI a ambas unidades. C.H. VALDESIA	\$ 20,728,358.69	0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%		
Diseño, Fabricación y Suministro de dos (2) Subestaciones Móviles con Transformador 10-14MVA GENERAL		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Diseño, suministro e instalacion de PLC y HMI C.H. DOMINGO RODRIGUEZ		0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%		
Diseño, suministro e Instalación de Sistema Excitación C.H. SABANETA		0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%		
Incorporación Registro Oscilografico de las Protecciones en el Sistema SCADA y Rehabilitación instrumentación sistema control de la central C.H. AGUACATE		0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%		
Instalación de planta de tratamiento de agua para los servicios de la central C.H. LOPEZ ANGOSTURA		0%	0%	0%	13%	2%	0%	15%		
Instalación de planta de tratamiento de agua para los servicios de la central C.H. RINCON		0%	0%	2%	13%	0%	0%	15%		
Instalación de planta de tratamiento de agua para los servicios de la central C.H. TAVERA		0%	0%	2%	13%	0%	0%	15%		
Instalación sistema hidráulico a compuerta desagüe de fondo presa C.H. JIMENOA		0%	0%	0%	5%	5%	0%	10%		

		% EJECUCION FISICA MENSUAL 2024						TOTAL %	AREA EJECUTORA
		T1			T2				
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Instalar una planta para tratar el agua, a los fines de poder usarla en las actividades del personal de la central C.H. VALDESIA		0%	0%	2%	13%	0%	0%	15%	
Rehabilitación de los Automatas de la Central C.H. LOS TOROS		0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%	
Suministro, Desmontaje y Montaje del puente grúa C.H. TAVERA		0%	0%	2%	13%	0%	0%	15%	
Sustitucion bloques de pruebas de las protecciones LOPEZ ANGOSTURA, LAS DAMAS, RINCON, SABANA YEGUA, SABANETA, TAVERA		0%	0%	0%	13%	0%	0%	13%	
Transformador de potencia, 69/12.4, 720 0kv/10-14 MVA CH. LAS DAMAS		0%	0%	5%	5%	0%	0%	10%	
Contratación de una compañía especialista para instalación de rodete, paletas, laberintos, cojinetes de unidad II CH JIGUEY		0%	5%	25%	0%	0%	0%	30%	
Comprar 5 juegos de sellos para inyectoras, 2 deflectores y 1 servomotor para deflector para mantenimiento mayor turbinas CH Pinalito		0%	5%	25%	0%	0%	0%	30%	
								37%	



Lic. María Cristina Gómez Montero
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyecto
