



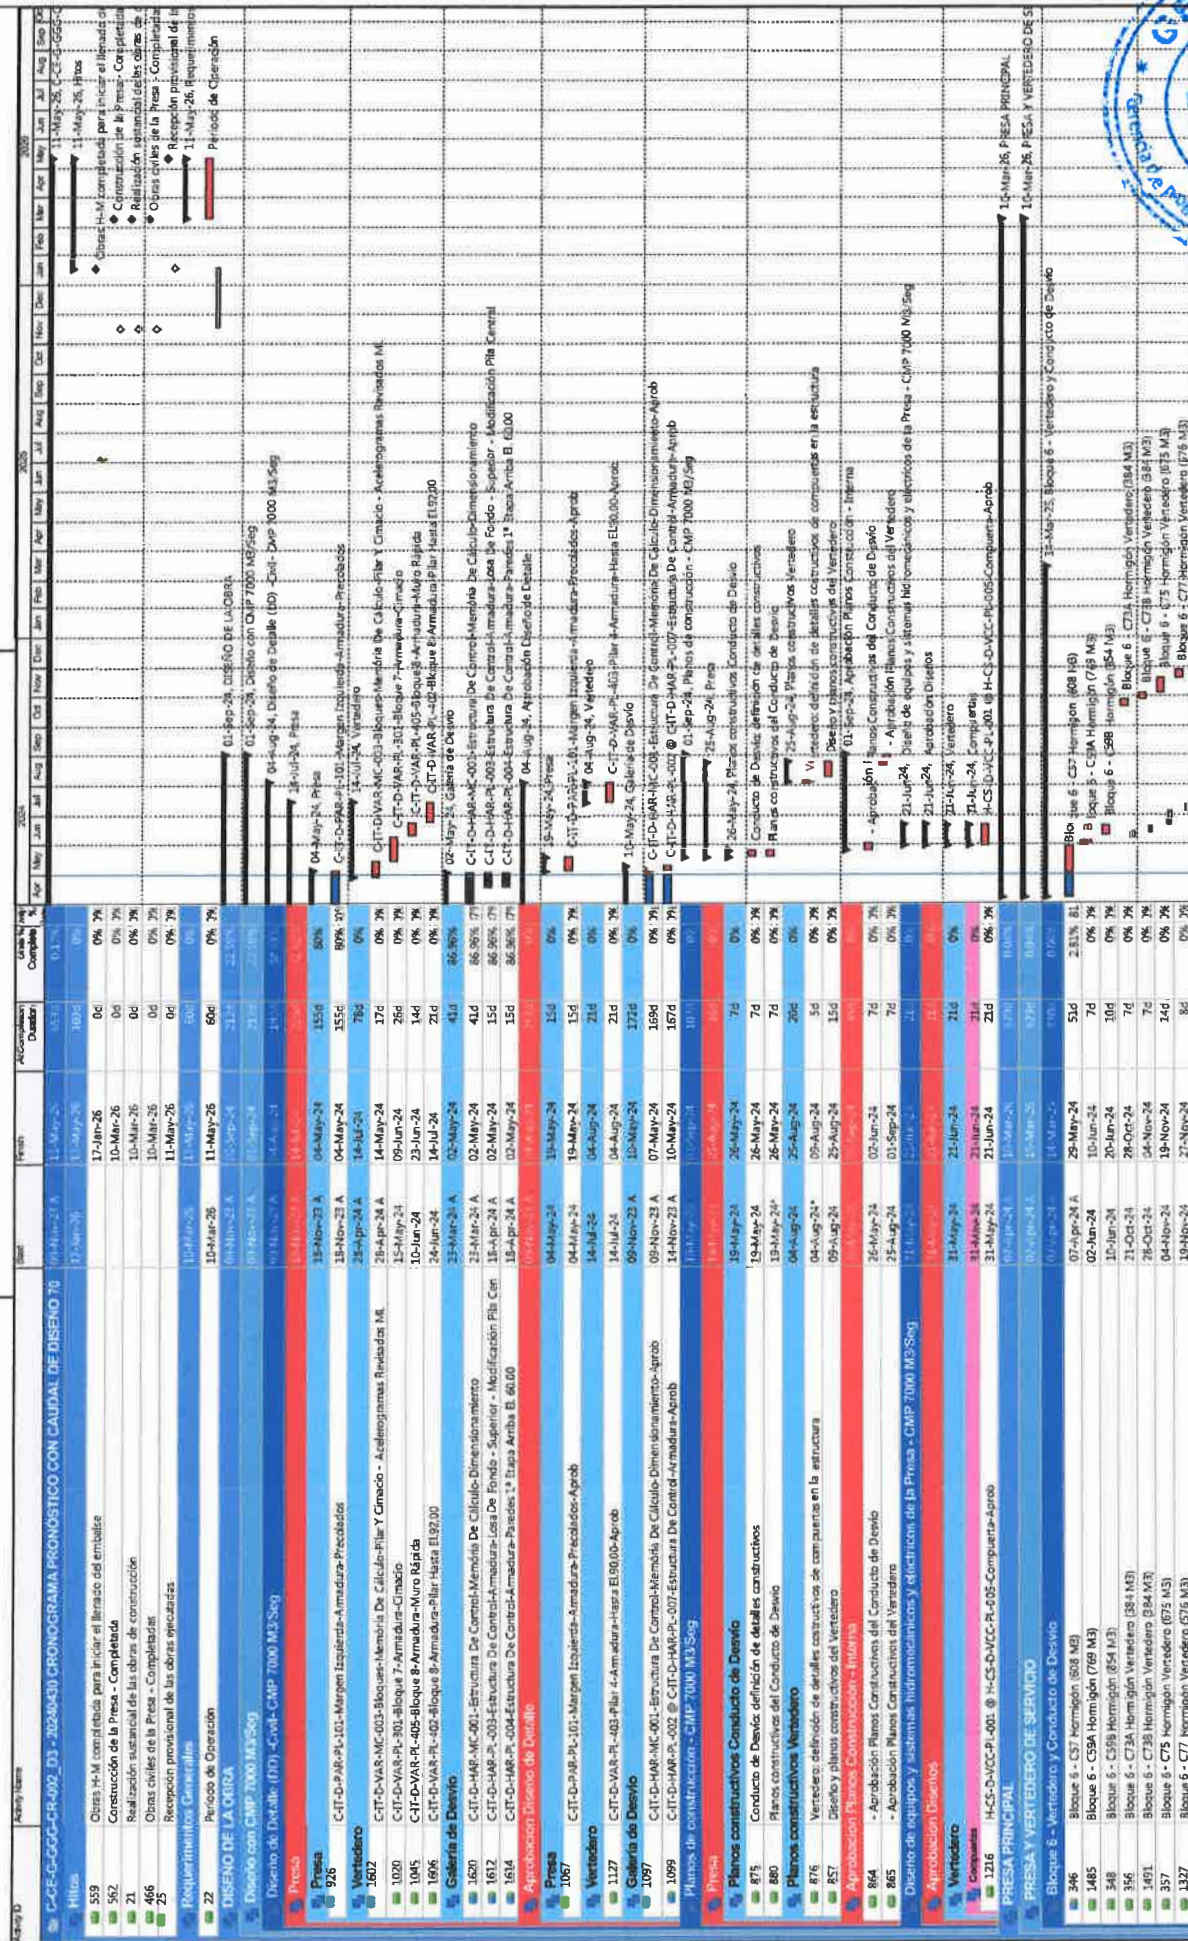

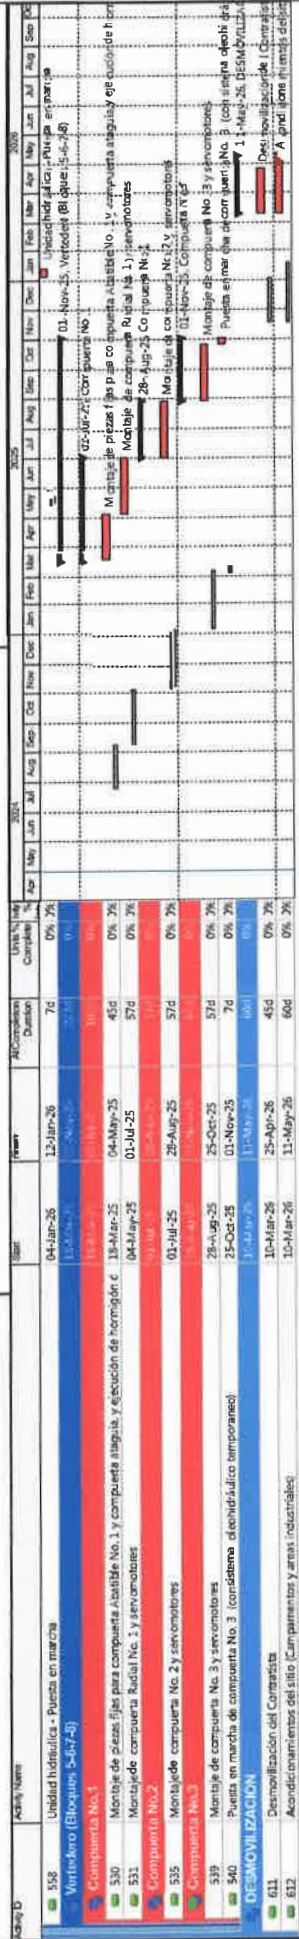

TASK filter: Critical


Remaining Level of Effort

Actual Work

Critical Remaining ...

Remaining Work

Milestone

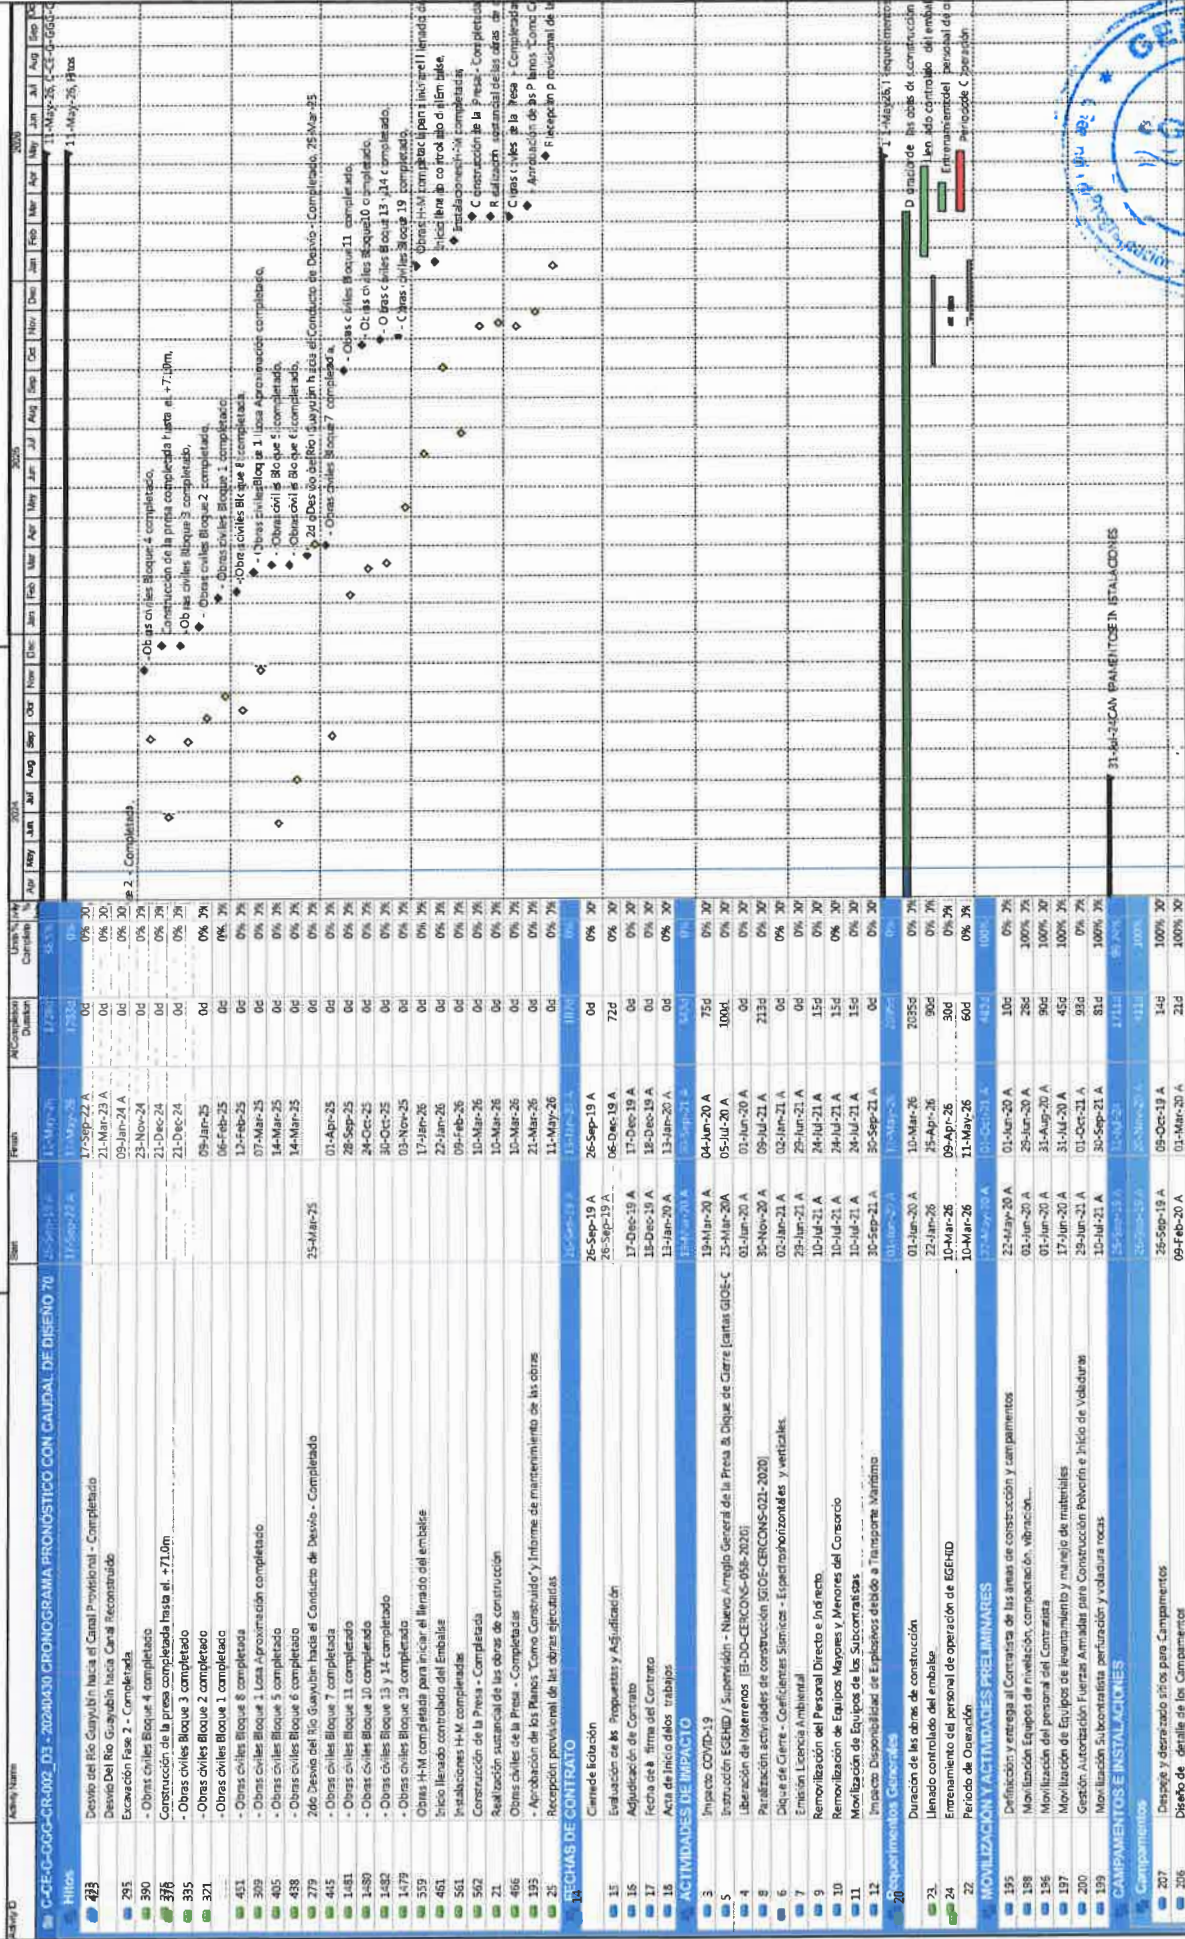

Activo	Actividad	Inicio	Fin	Avance	Unidad	Comentarios	2023	2024	2025	2026										
Activo	Actividad	Inicio	Fin	Avance	Unidad	Comentarios	Activo	Actividad	Inicio	Fin	Avance	Unidad	Comentarios	Activo	Actividad	Inicio	Fin	Avance	Unidad	Comentarios
212	Suministro y distribución de agua industrial y potable	09-Jun-20 A	20-Nov-20 A	150%	30															
211	Construcción Dispensario Médico incluyendo sala de primer auxilio	09-Jun-20 A	12-Nov-20 A	150%	30															
213	Sistema de Drenaje	11-Jun-20 A	20-Nov-20 A	160%	30															
209	Instalación Camperamento del Contratista (oficinas, corredores, cocina...)	11-Jun-20 A	08-Nov-20 A	140%	30															
210	Instalación Camperamento EGRHD y Superación (oficinas, comedores, cocina...)	07-Jul-20 A	07-Nov-20 A	127%	30															
214	Servicios de Telecomunicación por Emergencia y Zona de Trabajo	01-Jul-20 A	15-Oct-20 A	105%	30															
208	Pavimentación Camperamento y parques de estacionamiento	01-Oct-20 A	21-Oct-20 A	21%	30															
Viviendas y Vehículos																				
202	Alquiler y construcción de viviendas para personal del Contratista	13-Jan-20 A	30-Sep-20 A	75%	30															
203	Alquiler de 8 viviendas para la Supervisión	13-Jan-20 A	06-Jul-20 A	170%	30															
204	Suministro de 4 camiones 40W para el uso de la Supervisión	20-Jan-20 A	12-Mar-20 A	50%	30															
Plantas de Irrigación y clasificación agrícolas																				
225	Suministro y preparación para instalación de las plantas de riego y clasificación agrícolas	05-Jun-20 A	05-Ago-20 A	39%	30															
226	Emplazamiento e instalación de las plantas de riego y clasificación agrícolas	05-Jun-20 A	13-Sep-21 A	39%	30															
227	Áreas de almacenamiento agrícolas	29-Oct-21 A	29-Oct-22 A	41%	30															
Plantas industriales																				
229	Compra y entrega de la planta medidora, silos para cemento, equipo dosificación	20-Jun-20 A	30-Nov-20 A	30%	30															
230	Cimientos de hormigón por las plantas de agregados y homogeneizadores	15-Oct-20 A	05-Sep-21 A	31%	30															
231	Instalación planta mezcladora, silos para cemento, equipo dosificación	04-Aug-21 A	11-Sep-21 A	38%	30															
232	Calibración planta medidora de hormigón	12-Sep-21 A	18-Sep-21 A	7%	30															
233	Diseño, pruebas y aprobación medida de hormigón	19-Sep-21 A	19-Oct-21 A	30%	30															
Oficinas, talleres, depósitos temporales																				
215	Construcción / transporte / instalación de talleres, almacenes y laboratorios	01-Jun-20 A	28-Nov-21 A	530%	30															
216	Construcción de Oficinas mecánica y eléctrica	05-Jun-20 A	30-Sep-21 A	46%	30															
217	Construcción depósito de explosivos (CONTINUADO)	29-Jul-21 A	01-Jun-22 A	29%	30															
Suministro de energía eléctrica y generadores de emergencia																				
221	Suministro e instalación de subestaciones (incluyendo obras civiles)	01-Jun-20 A	31-Aug-20 A	90%	30															
220	Suministro de generadores de emergencia	09-Jun-20 A	16-Ago-24	138%	30															
222	Redes asumidas para el suministro de energía eléctrica por parte de EGRHD	02-Jul-24	02-Jul-24	0%	30															
223	Conexión de subestaciones a la red eléctrica	02-Jul-24	31-Jul-24	30%	30															
DISEÑO DE LA OBRA																				
27	Definición de camperamentos y áreas industriales	13-Jan-20 A	01-Feb-20 A	18%	30															
28	Ingeniería	13-Jan-20 A	16-Ago-24	1200%	30															
Diseño con 2000 M3 Seg - Superado																				
1271	Diseño con 2000 M3 Seg - Superado	04-Feb-20 A	08-Feb-20 A	7%	30															
Diseño con 7000 M3 Seg																				
1272	Revisión Diseño Electrónico CIMP 7000 M3 Seg	04-Feb-20 A	28-Feb-20 A	7%	30															
742	Revisión EGRHD-CERCONS	22-Feb-23 A	10-Mar-23 A	15%	30															
743	Modelo 3D Presa/Viaducto	22-Feb-23 A	10-Mar-23 A	0%	30															
Presas																				
1226	C-IT-D-GGL-ET-006-Tratamiento de los Taludes - Pruebas de Adherencia-Especificación Técnica	10-Mar-23 A	11-Mar-23 A	62%	30															
1227	C-IT-D-GGL-ET-007-Ensayos In-Situ para combinación del Macizo rocoso-Especificación Técnica	10-Mar-23 A	20-Mar-23 A	10%	30															
1228	C-IT-D-GGL-ET-008-Programa de Investigaciones Complementarias - Causas y cuencos amortiguados-ET	10-Mar-23 A	29-Mar-23 A	13%	30															
1229	C-IT-B-GGL-P-101-Arreglo General-Planta	10-Mar-23 A	31-Mar-23 A	21%	30															
1230	C-IT-B-GGL-P-103-Etapas de Construcción-Plantas	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1231	C-IT-B-GGL-P-104-Etapas de Construcción - Lagunas-Secciones	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1232	C-IT-B-GGL-P-105-Etapas de Construcción - Dimensionamiento Hidráulico	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1233	C-IT-B-GGL-P-106-Etapas de Construcción - Dimensionamiento Hidráulico	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1234	C-IT-B-GGL-P-107-Arreglo General-Plantas	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1235	C-IT-B-GGL-P-108-Pantalla de Impermeabilización-Planta, perfil, sección y detalle	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1236	C-IT-B-GGL-P-109-Pantalla de Impermeabilización-Planta, perfil, sección y detalle	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1237	C-IT-B-GGL-P-110-Intervención ubicación de los instrumentos-Planta y Sección	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1238	C-IT-B-GGL-P-111-Intervención ubicación de los instrumentos-Planta y Sección	10-Mar-23 A	05-Apr-23 A	26%	30															
1239	C-IT-B-GGL-ET-003-Diseño Pre-Ejecutor-Informe Técnico	10-Mar-23 A	13-Apr-23 A	5%	30															
1240	C-IT-D-PGT-P-103-Tratamientos de los Taludes al 84.00-94.00 - Margen Derecha	10-Mar-23 A	17-Apr-23 A	38%	30															
1241	C-IT-D-PGT-P-103-Tratamientos de los Taludes al 84.00-94.00 - Margen Derecha	10-Mar-23 A	17-Apr-23 A	38%	30															
1242	C-IT-D-PGT-P-103-Tratamiento de los Taludes al 84.00 hasta el 86.00 - Margen Izquierda	10-Mar-23 A	17-Apr-23 A	38%	30															
1243	C-IT-D-GGL-ET-006-Programa de Investigaciones Complementarias - Causa y cuencos amortiguados-ET	10-Mar-23 A	20-Apr-23 A	41%	30															




Actividad	Cant	Fecha	Unidad	Completado	2024												2025												Total	
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
C-T-D-GG-ET-001-Programa de Investigaciones Complementarias-Respuesta a carta HRB-CERCONS-01	1244	10-Mar-23 A		41d	100%																									
C-T-D-PG-PL-001-Extracción-Planta 1-3	1245	10-Mar-23 A		46d	100%																									
C-T-D-PG-PL-001-Extracción-Detalle y Secciones 2-3	1246	10-Mar-23 A		46d	100%																									
C-T-D-PG-PL-001-Extracción-Detalle y Secciones 3-3	1247	10-Mar-23 A		46d	100%																									
C-T-D-PG-PL-001-Perforación de Instrumentación-Especificación Técnica	1248	10-Mar-23 A		61d	100%																									
C-T-D-PG-PL-001-Tratamiento de los Taludes el 84.00-94.60 -Margen Derecha	1249	10-Mar-23 A		62d	100%																									
C-T-D-PG-PL-002-Tratamiento de los Taludes el 84.00-66.00 -Margen Derecha	1250	10-Mar-23 A		62d	100%																									
C-T-D-PG-PL-003-Tratamiento de los Taludes el 84.00 hasta el 86.00 -Margen Izquierda	1251	10-Mar-23 A		62d	100%																									
C-T-D-PG-PL-004-Tratamiento de los Taludes el 86.00 hasta el 86.00 -Margen Izquierda	1252	10-Mar-23 A		62d	100%																									
Verificado																														
C-T-B-VH-PL-101-Arreglo General-Planta y Secciones	1253	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-VH-PL-102-Arreglo General-Planta y Secciones	1254	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-VH-PL-103-Equipos Hidromecánicos Computas Clapeta y Enrocadera -Hoja de datos	1255	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-VH-PL-104-Equipos Hidromecánicos Computas Clapeta y Enrocadera -Hoja de datos	1256	10-Mar-23 A		26d	100%																									
Soledad																														
C-T-B-FH-PL-101-Arreglo General -Planta y Secciones	1267	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-102-Arreglo General -Planta y Secciones	1268	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-103-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1269	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-104-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1270	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-105-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1271	10-Mar-23 A		26d	100%																									
Galería de Diseño																														
C-T-B-FH-PL-106-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1272	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-107-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1273	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-108-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1274	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-109-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1275	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-110-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1276	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-111-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1277	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-112-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1278	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-113-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1279	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-114-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1280	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-115-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1281	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-116-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1282	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-117-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1283	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-118-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1284	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-119-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1285	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-120-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1286	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-121-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1287	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-122-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1288	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-123-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1289	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-124-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1290	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-125-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1291	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-126-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1292	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-127-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1293	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-128-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1294	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-129-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1295	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-130-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1296	10-Mar-23 A		26d	100%																									
C-T-B-FH-PL-131-Equipos Hidromecánicos Computas Vagón Buld-Hoja de datos	1297	10-Mar-23 A		26d	100%																									


 Remaining Level of Effort
 Actual Work
 Critical Remaining



 Actual Level of Effort
 Remaining Work
 Milestone


TASK filter: All Activities


Page 5 of 21

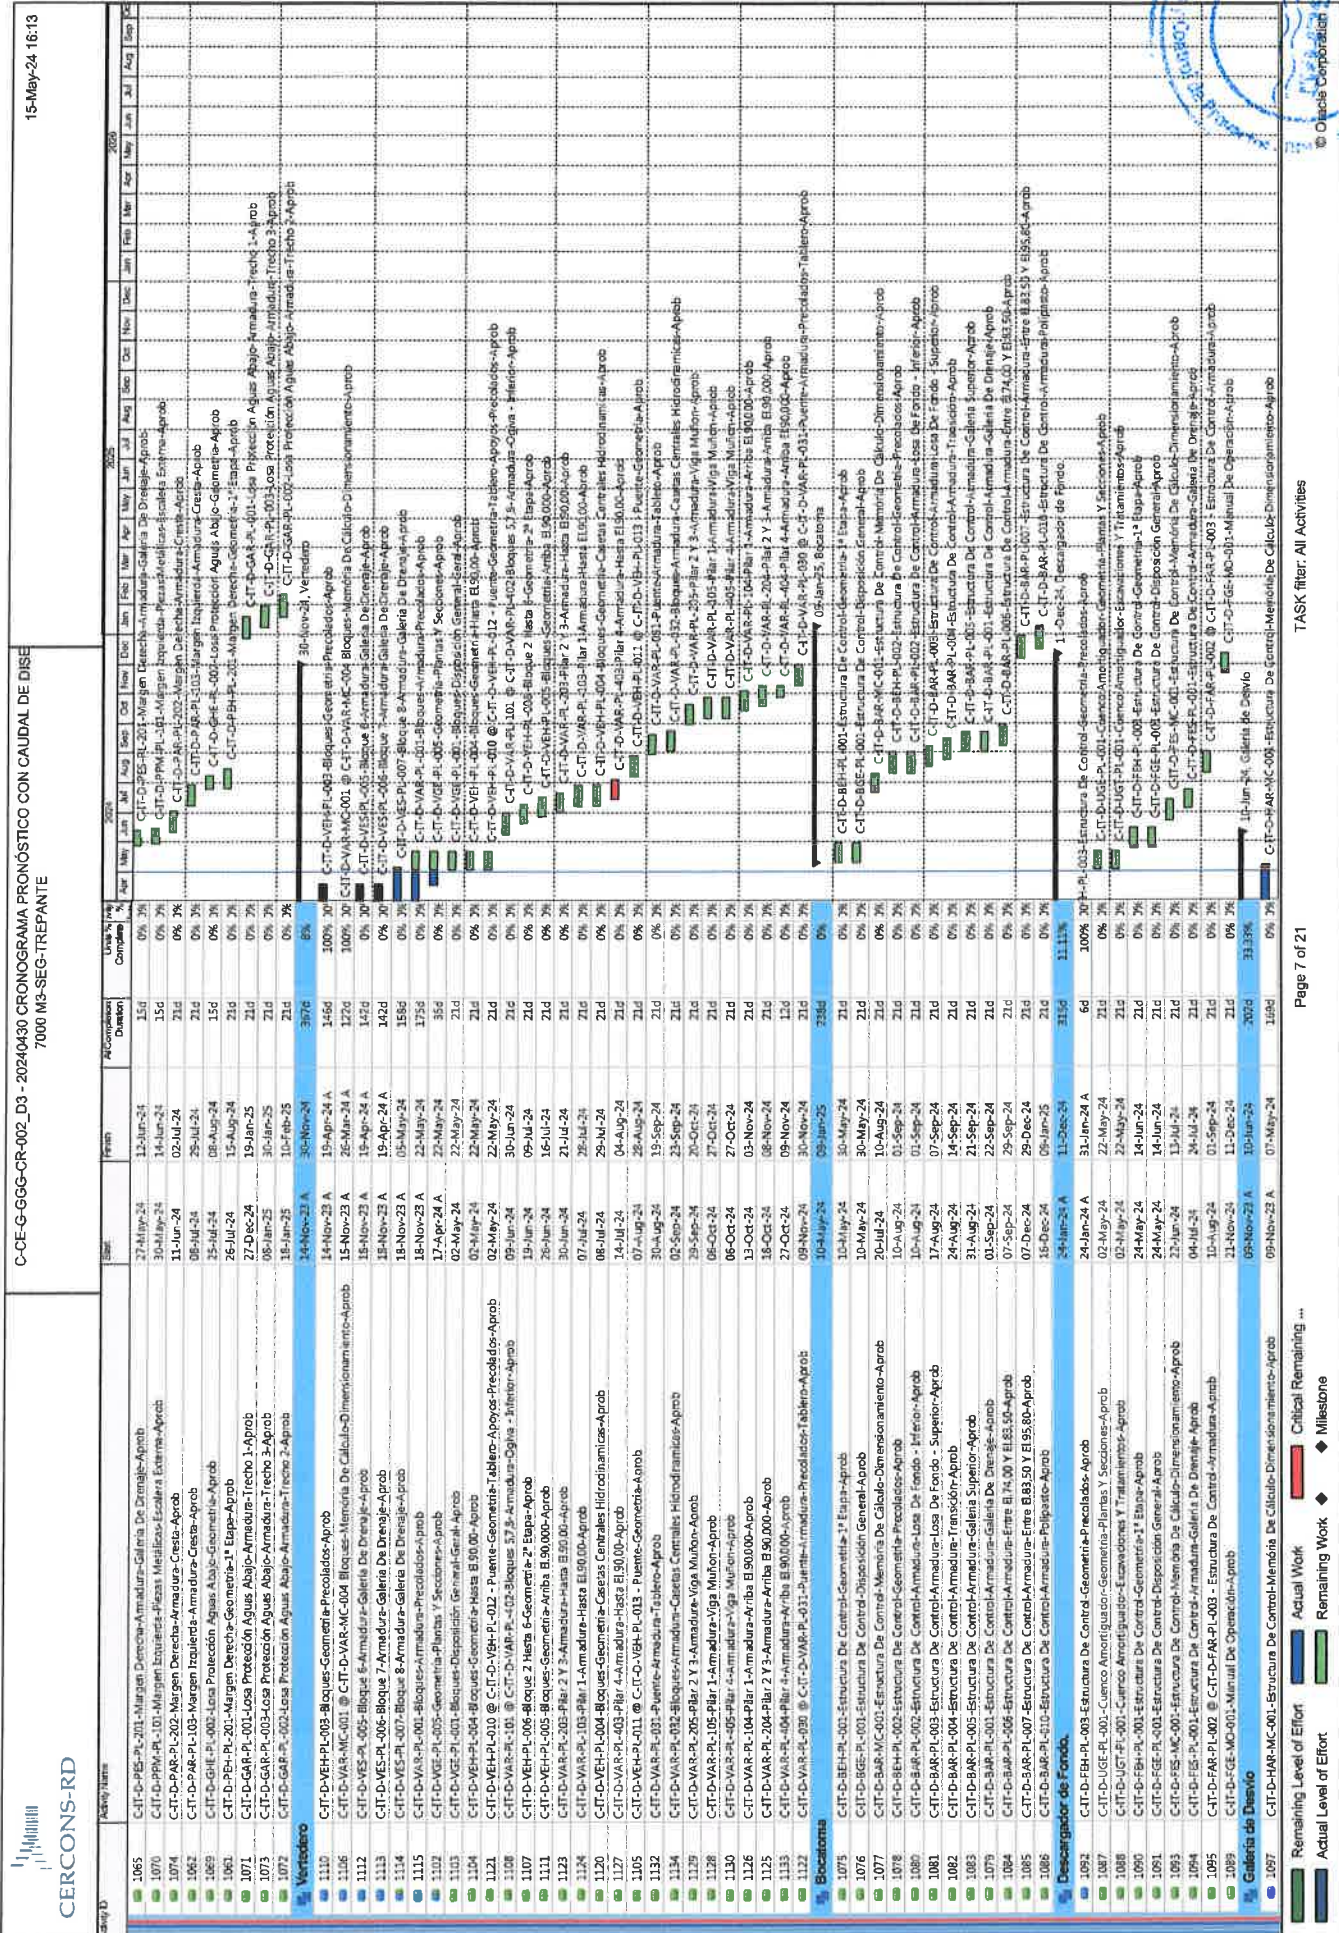


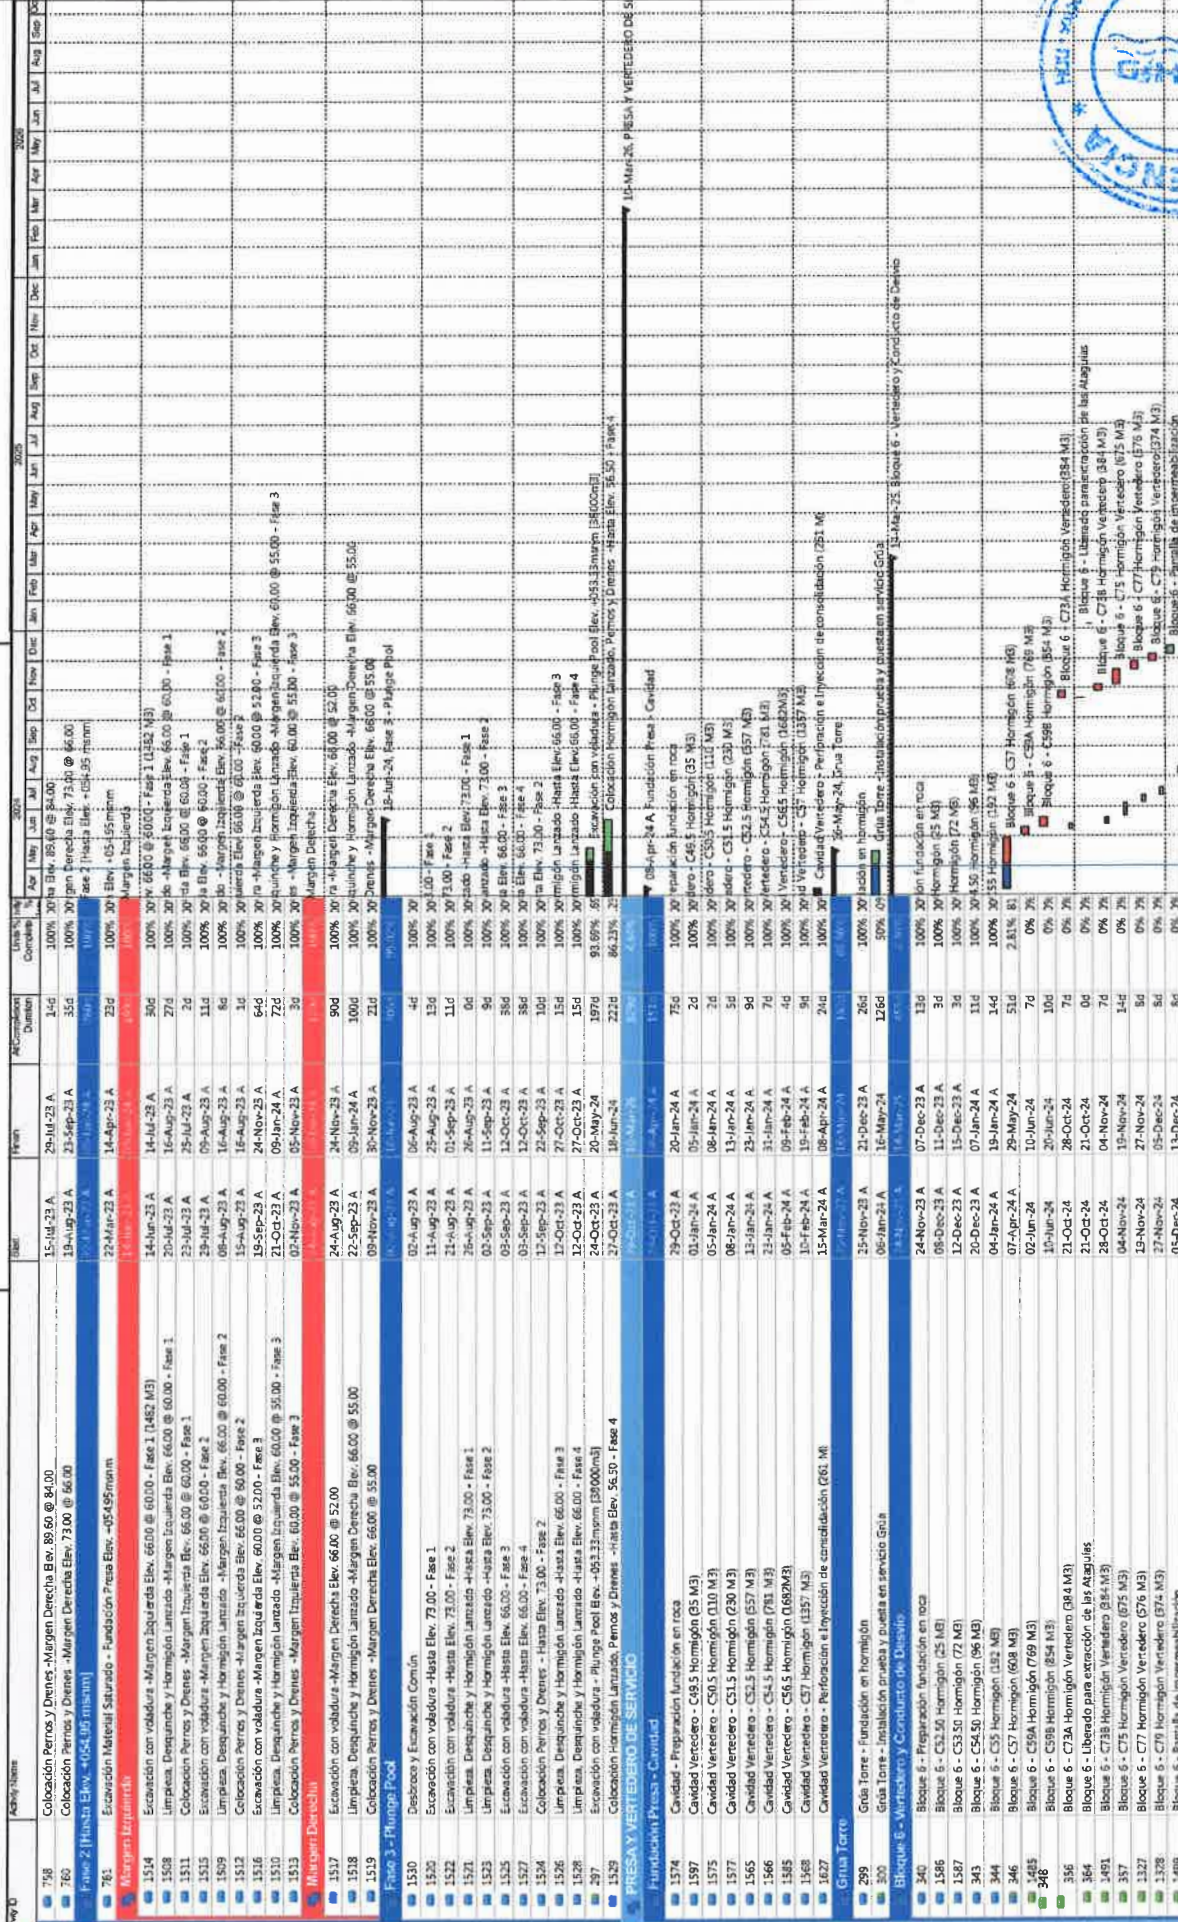

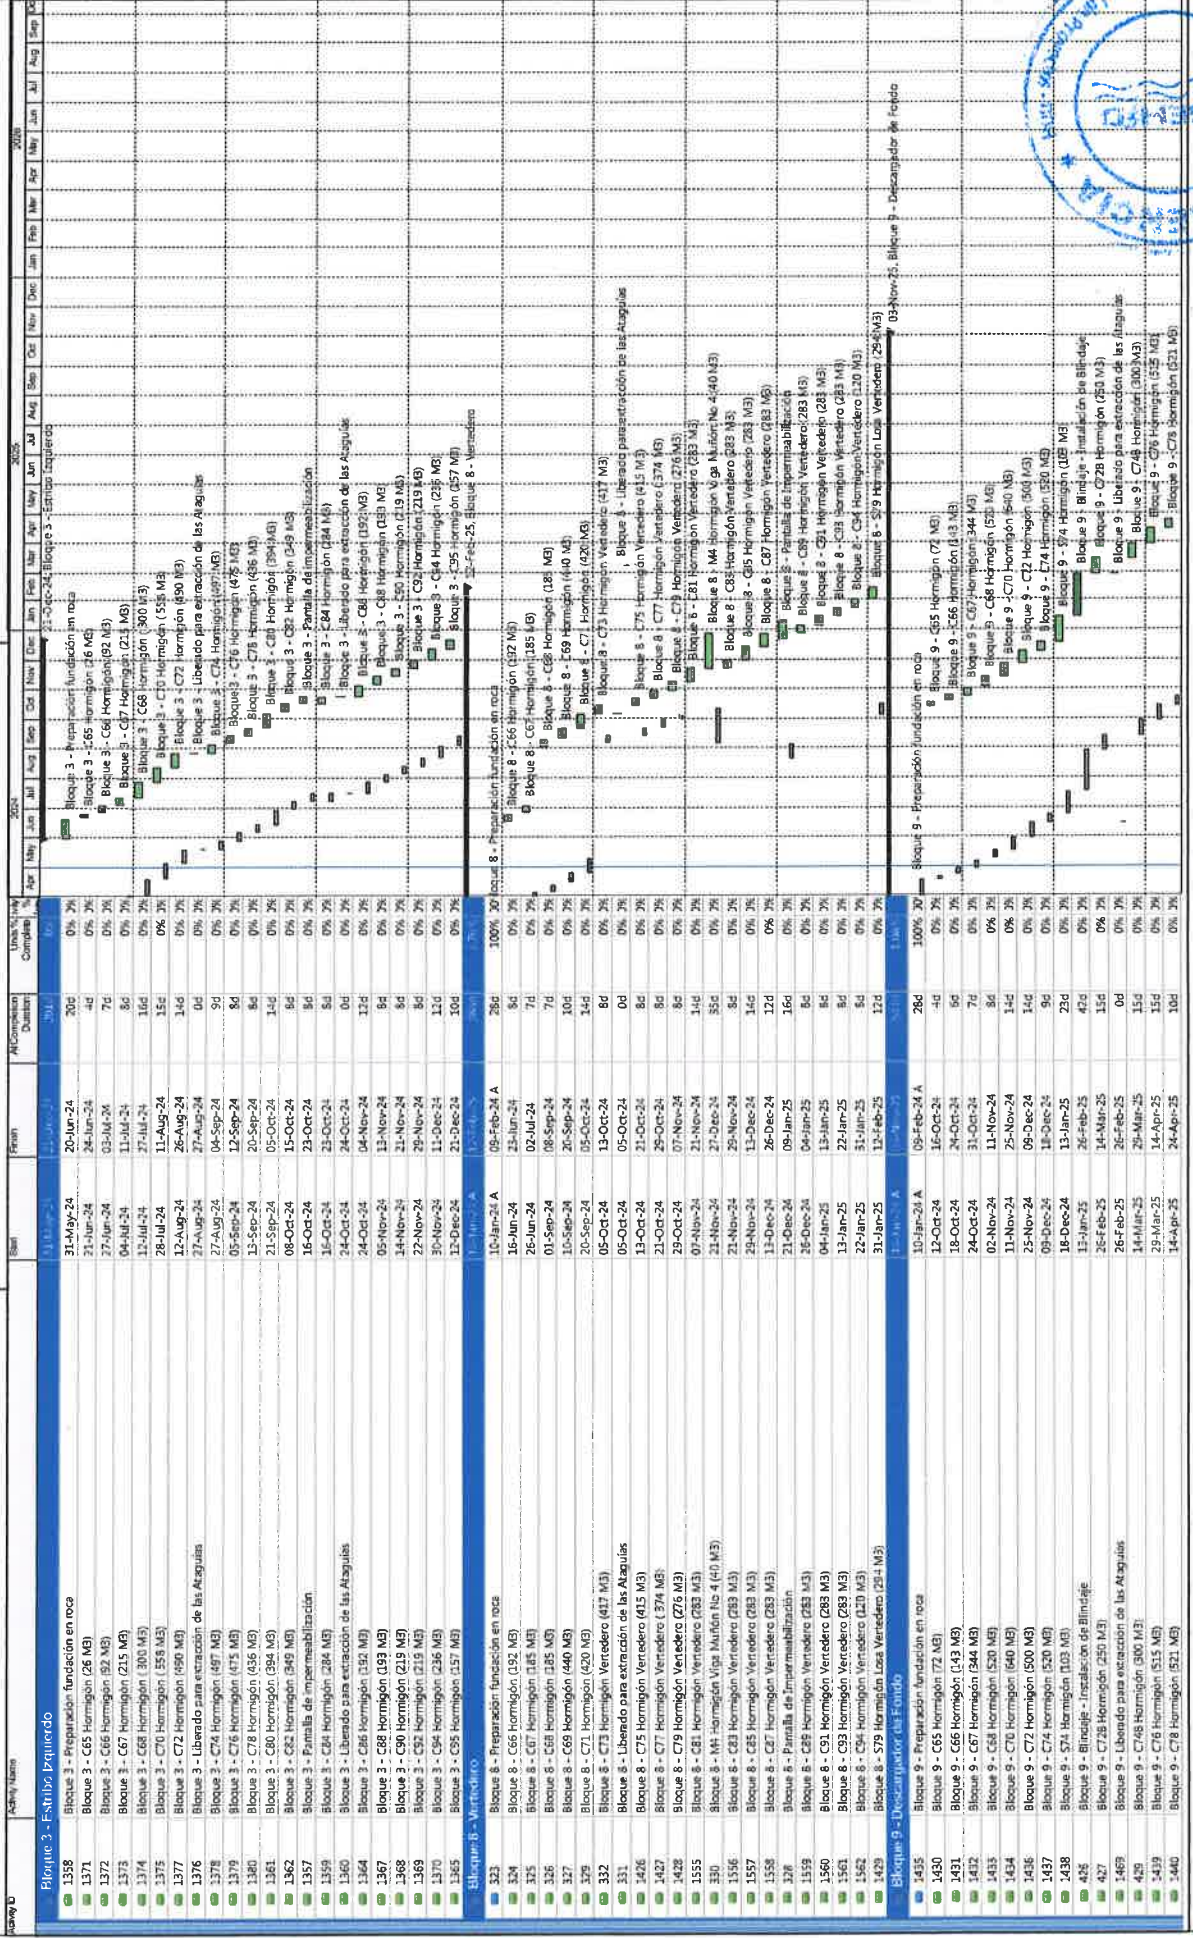

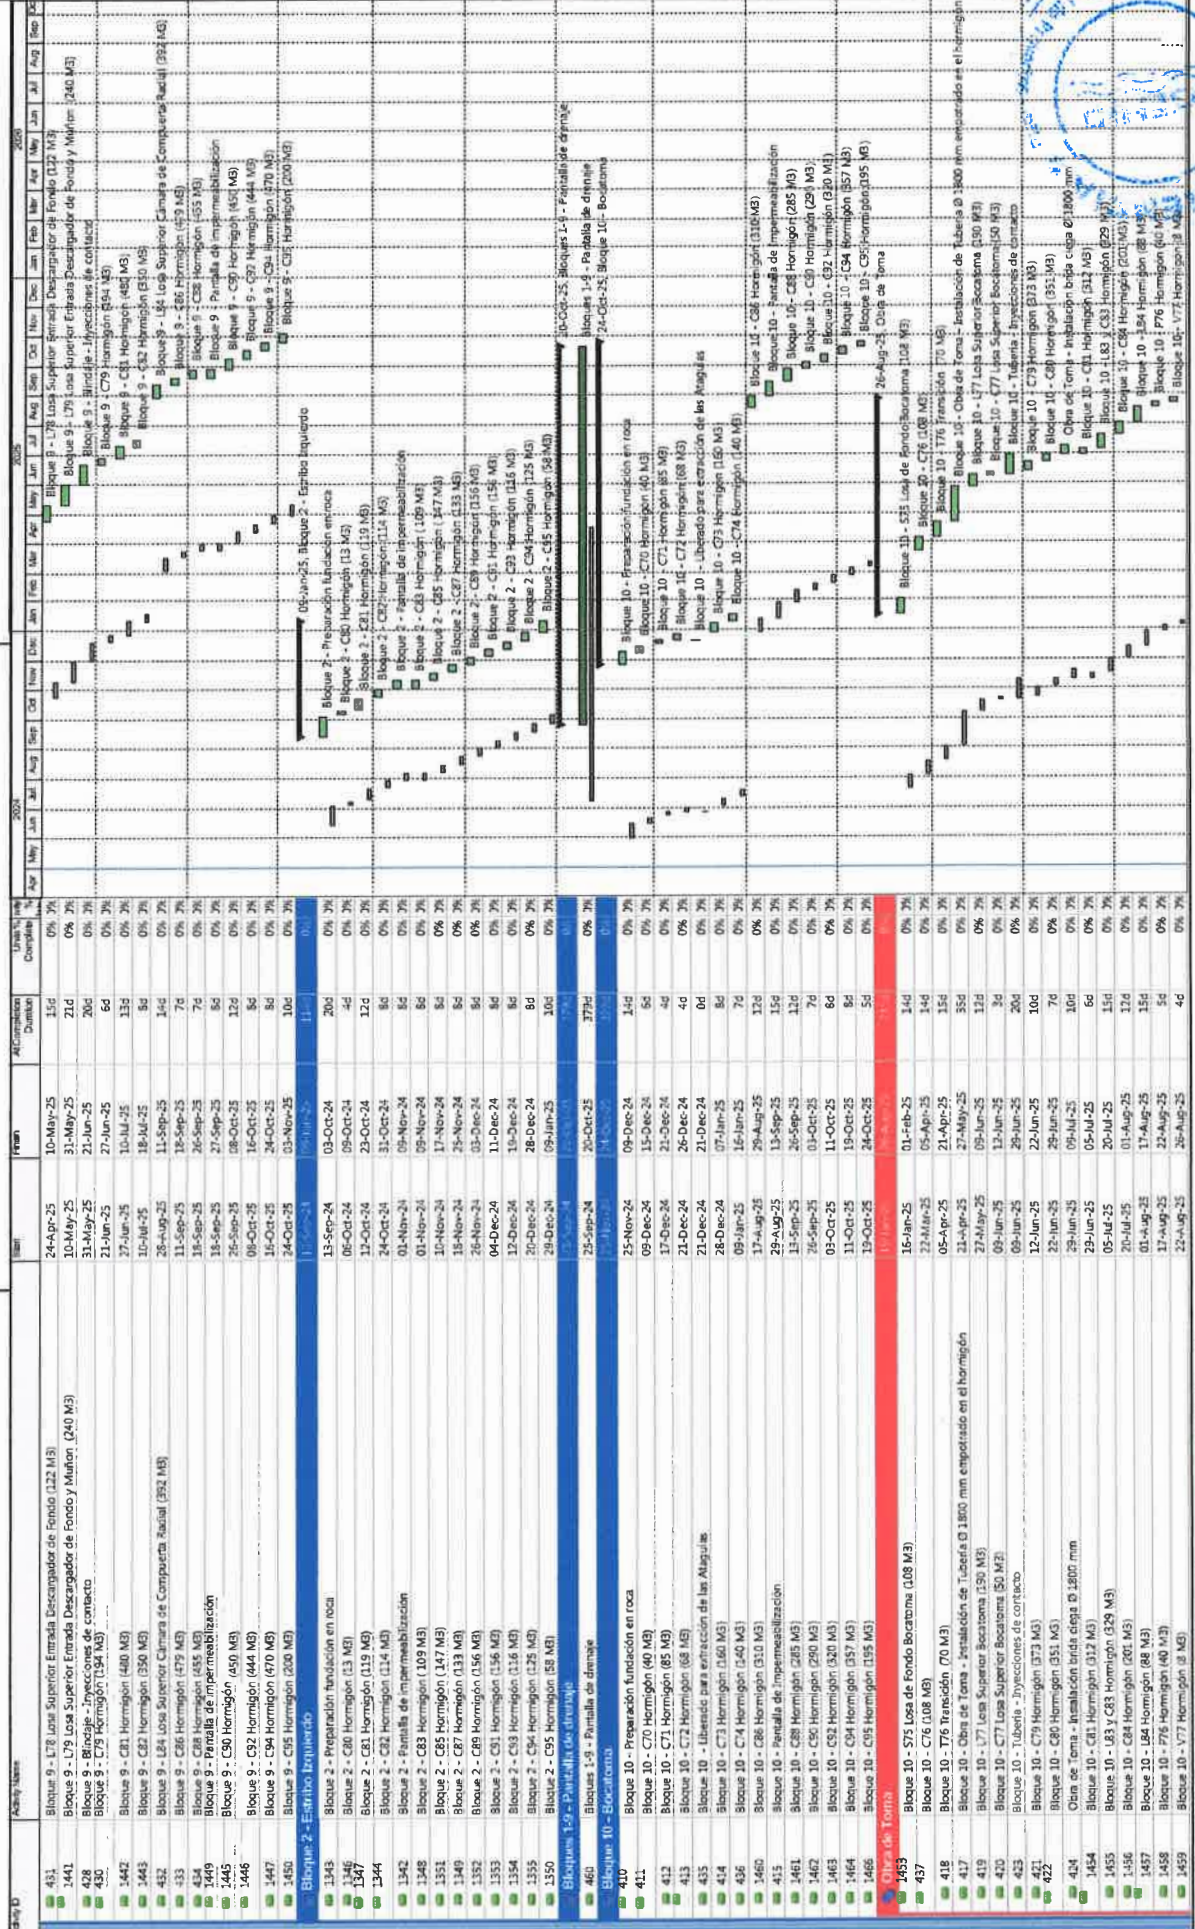

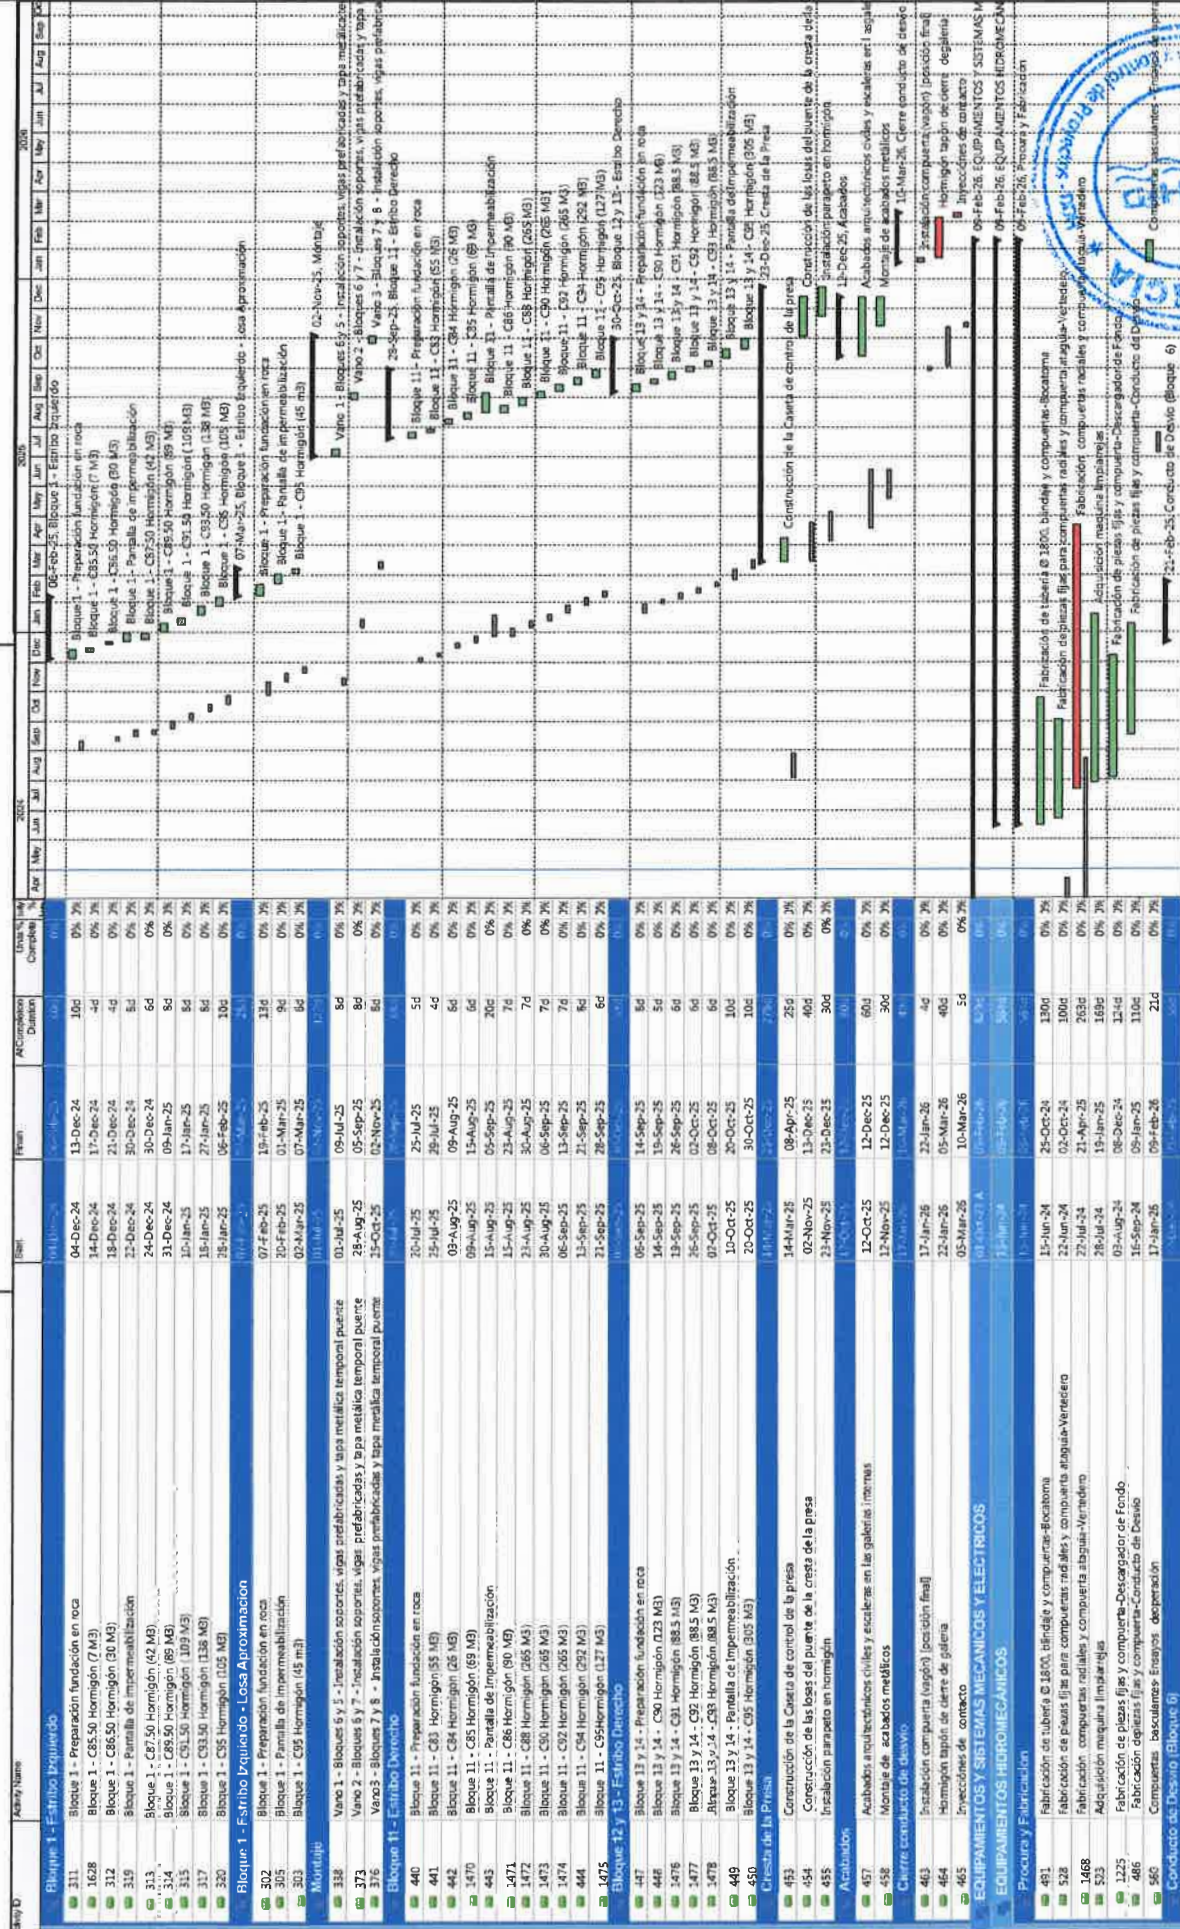

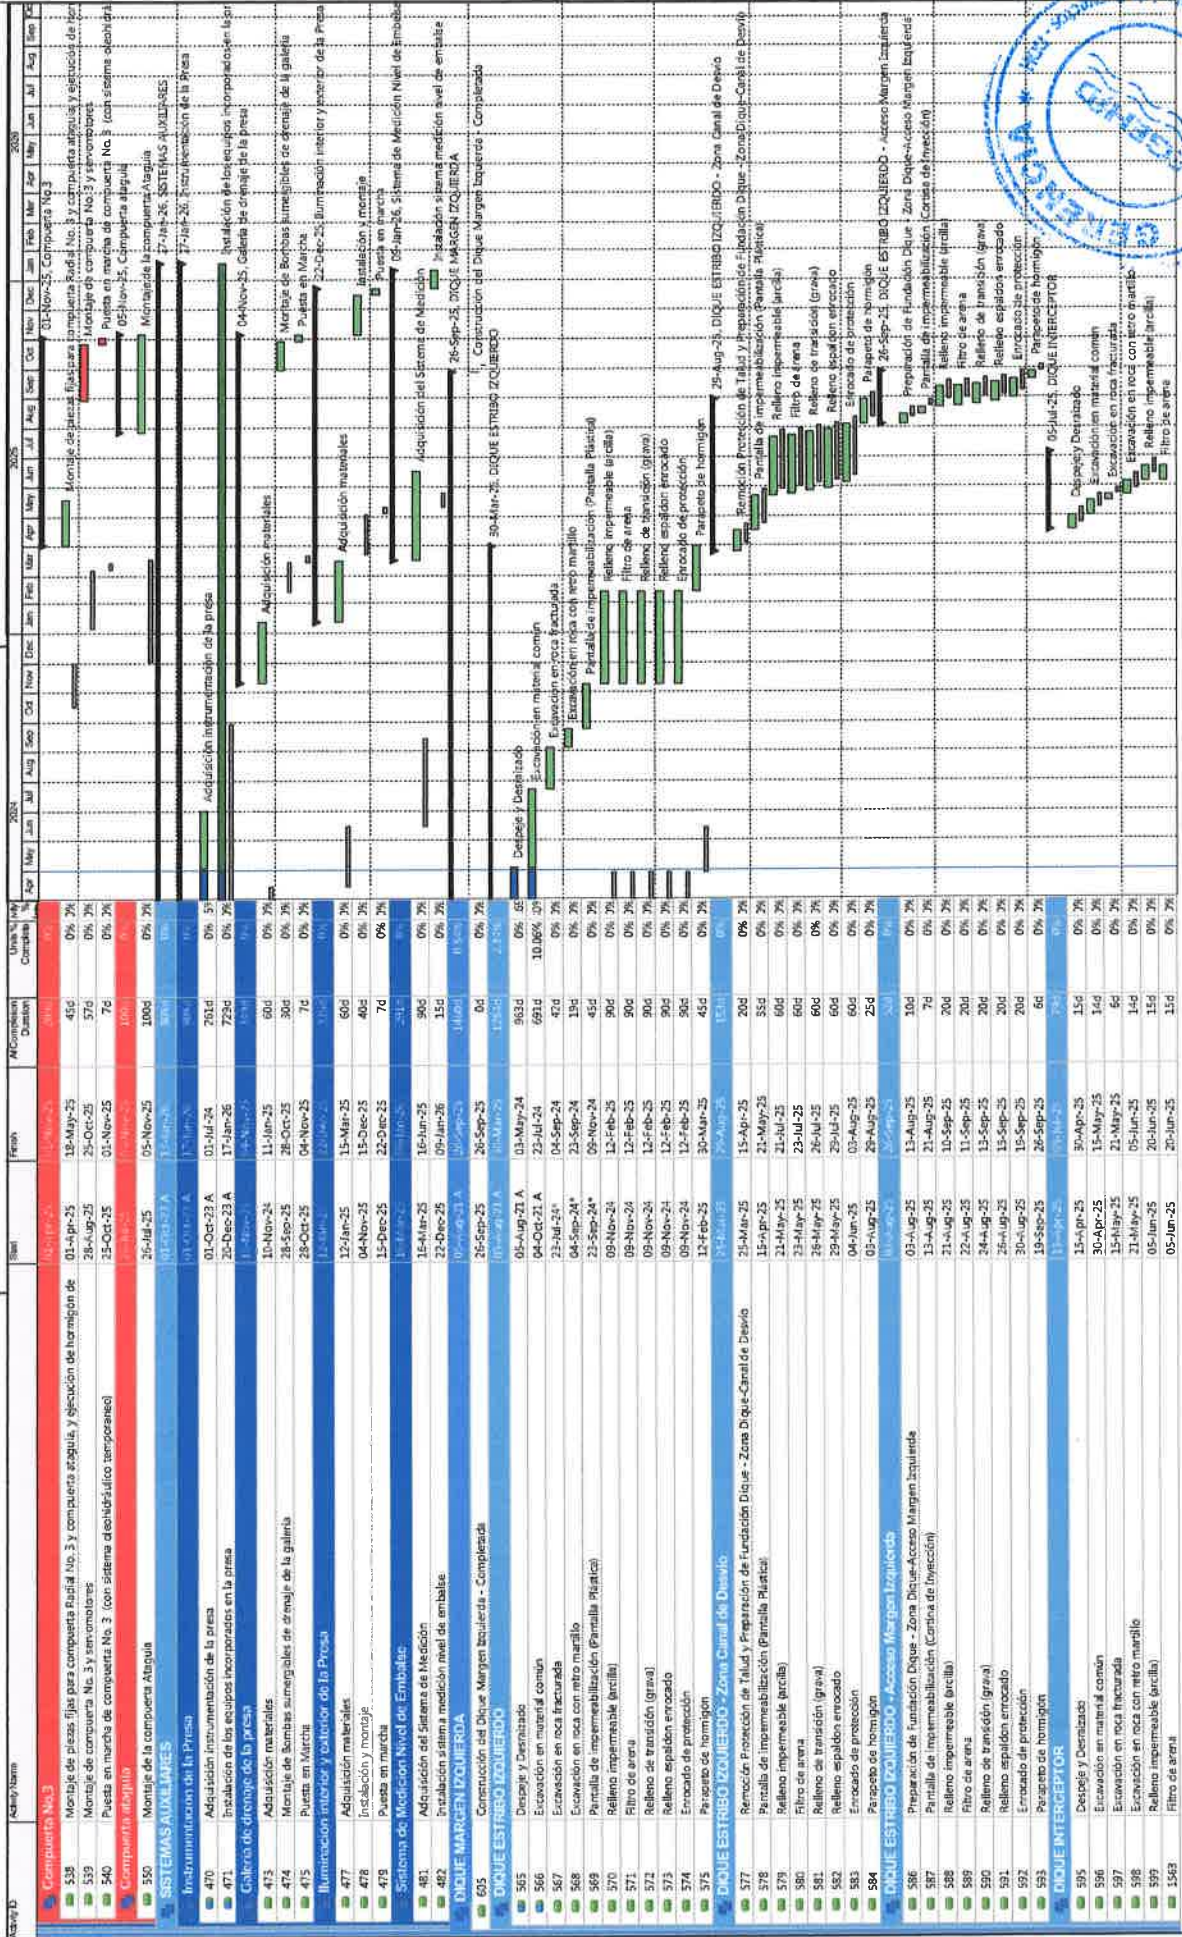

C-CG-GGG-CR-002_D3 - 20240430 CRONOGRAMA PRONOSTICO CON CAUDAL DE DISE
7000 M3-SEG-TREPANTE

CERCONS-RD

