



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

13.0 CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA LAS VEREDAS, C.H. PALOMINO..	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

13.0 CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA LAS VEREDAS, C.H.
PALOMINO






Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$24,369,420.03
Monto del avance (20%)	RD\$4,873,884.00
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	INGENIERO ORIOLY MEJIA & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista esta trabajando en la colocacion de material de relleno y base.

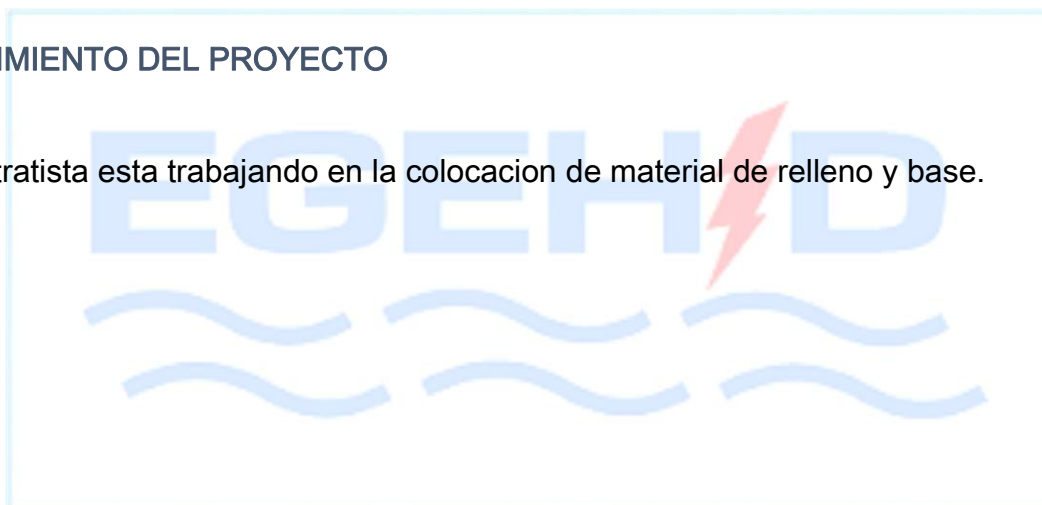



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

