Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CENTRO COMUNAL LA ALTAGRACIA**	**70 días**	**mié 11/01/23**	**sáb 01/04/23**
2		REINICIO DE TRABAJOS LUEGO DE PAGO DE 3ERA	32 días	mié 11/01/23	jue 16/02/23
3		INICIO DE TRABAJOS	1 día	mié 11/01/23	mié 11/01/23
4		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**1 día**	**jue 09/02/23**	**jue 09/02/23**
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO UNA BOCA	1 día	jue 09/02/23	jue 09/02/23
6		**VERJA PERIMETRAL**	**4 días**	**lun 13/02/23**	**jue 16/02/23**
7		MALLA CICLONICA DE 6", PALOMETAS Y 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23
8		**COCINA**	**2 días**	**jue 12/01/23**	**vie 13/01/23**
9		TOPE	1 día	vie 13/01/23	vie 13/01/23
10		COCINA	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23
11		**MURO DE GAVION**	**27 días**	**jue 12/01/23**	**sáb 11/02/23**
12		DEMOLICION DE MURO DE BLOCK 6"	3 días	jue 12/01/23	sáb 14/01/23
13		DEMOLICION DE COLUMNA A MANO	3 días	jue 12/01/23	sáb 14/01/23
14		BOTE DE ESCOMBRO F.E.=1.:	4 días	vie 20/01/23	mar 24/01/23
15		EXCAVACION DE TIERRA	4 días	lun 16/01/23	jue 19/01/23
16		REGADO DE TIERRA NEGRA	2 días	lun 06/02/23	mar 07/02/23
17		GAVIONES H = 1.00 M	10 días	mié 25/01/23	sáb 04/02/23
18		FRAGUACHE	3 días	lun 06/02/23	mié 08/02/23
19		PANETE LISO	4 días	mié 08/02/23	sáb 11/02/23
20		LLORADEROS 3"	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23
21		MALLA GEOTEXTIL	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23
22		**ESPERA CUBICACION 04 Y ESPERA DE PAGO**	**15 días**	**vie 17/02/23**	**lun 06/03/23**
23		ESPERA DE CUBICACION 04 Y ESPERA DE PAGO	15 días	vie 17/02/23	lun 06/03/23
24		**REINICIO DE TRABAJO LUEGO DE PAGO DE CUBICACION 04**	**23 días**	**mar 07/03/23**	**sáb 01/04/23**
25		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**4 días**	**mar 07/03/23**	**vie 10/03/23**
26		CAMARA DE INSPECCION	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
27		TRAMPA DE GRASA	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
28		CISTERNA	1 día	mié 08/03/23	mié 08/03/23
29		BOMBA MOTOR FRANKLIN DE 1HP	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
30		TANQUE HIDRONEUMATICO DE 120GLS	1 día	mié 08/03/23	mié 08/03/23
31		CASETA BOMBA	1 día	mar 07/03/23	mar 07/03/23
32		CAMARA SEPTICA	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23
33		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**6 días**	**mar 07/03/23**	**lun 13/03/23**
34		LUCES DE EXTERIOR CON CELDA FOTOVOLTAICA, TUBERIA EMT, INCL. POSTE C/	2 días	mar 07/03/23	mié 08/03/23
35		CONEXIÓN A CDEEE	2 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23
36		**PINTURA**	**7 días**	**vie 17/03/23**	**vie 24/03/23**
37		PINTURA ACRILICA INTERIOR	3 días	vie 17/03/23	lun 20/03/23
38		PINTURA EXTERIOR	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23
39		**VERJA PERIMETRAL**	**10 días**	**mar 07/03/23**	**vie 17/03/23**
40		<MALLA CICLONICA DE 6", PALOMETAS Y 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUASTarea nueva>	4 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23
41		PUERTAS CORREDISAS EN MALLA CICLONICA 3.00 x 2.10m	1 día	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23
42		PUERTA PEATONAL EN MALLA CICLONICA	1 día	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23
43		PINTURA EN VERJA PERIMETR	1 día	vie 17/03/23	vie 17/03/23
44		**VARIOS**	**17 días**	**mar 14/03/23**	**sáb 01/04/23**
45		ACERA PERIMETRAL	3 días	mar 14/03/23	jue 16/03/23
46		RAMPA Y PASARELA CON HORMIGON	3 días	vie 17/03/23	lun 20/03/23
47		GRAVA SUMINISTRO Y COLOCACION	3 días	mié 29/03/23	vie 31/03/23
48		EXCAVACION EN AREA EXTERIOR	5 días	vie 17/03/23	jue 23/03/23
49		BOTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	vie 24/03/23	sáb 25/03/23
50		RELLENO COMPACTADO EN AREA EXTERIOR	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23
51		TARJA EN BRONCE	1 día	sáb 25/03/23	sáb 25/03/23
52		LIMPIEZA FINAL	1 día	sáb 01/04/23	sáb 01/04/23

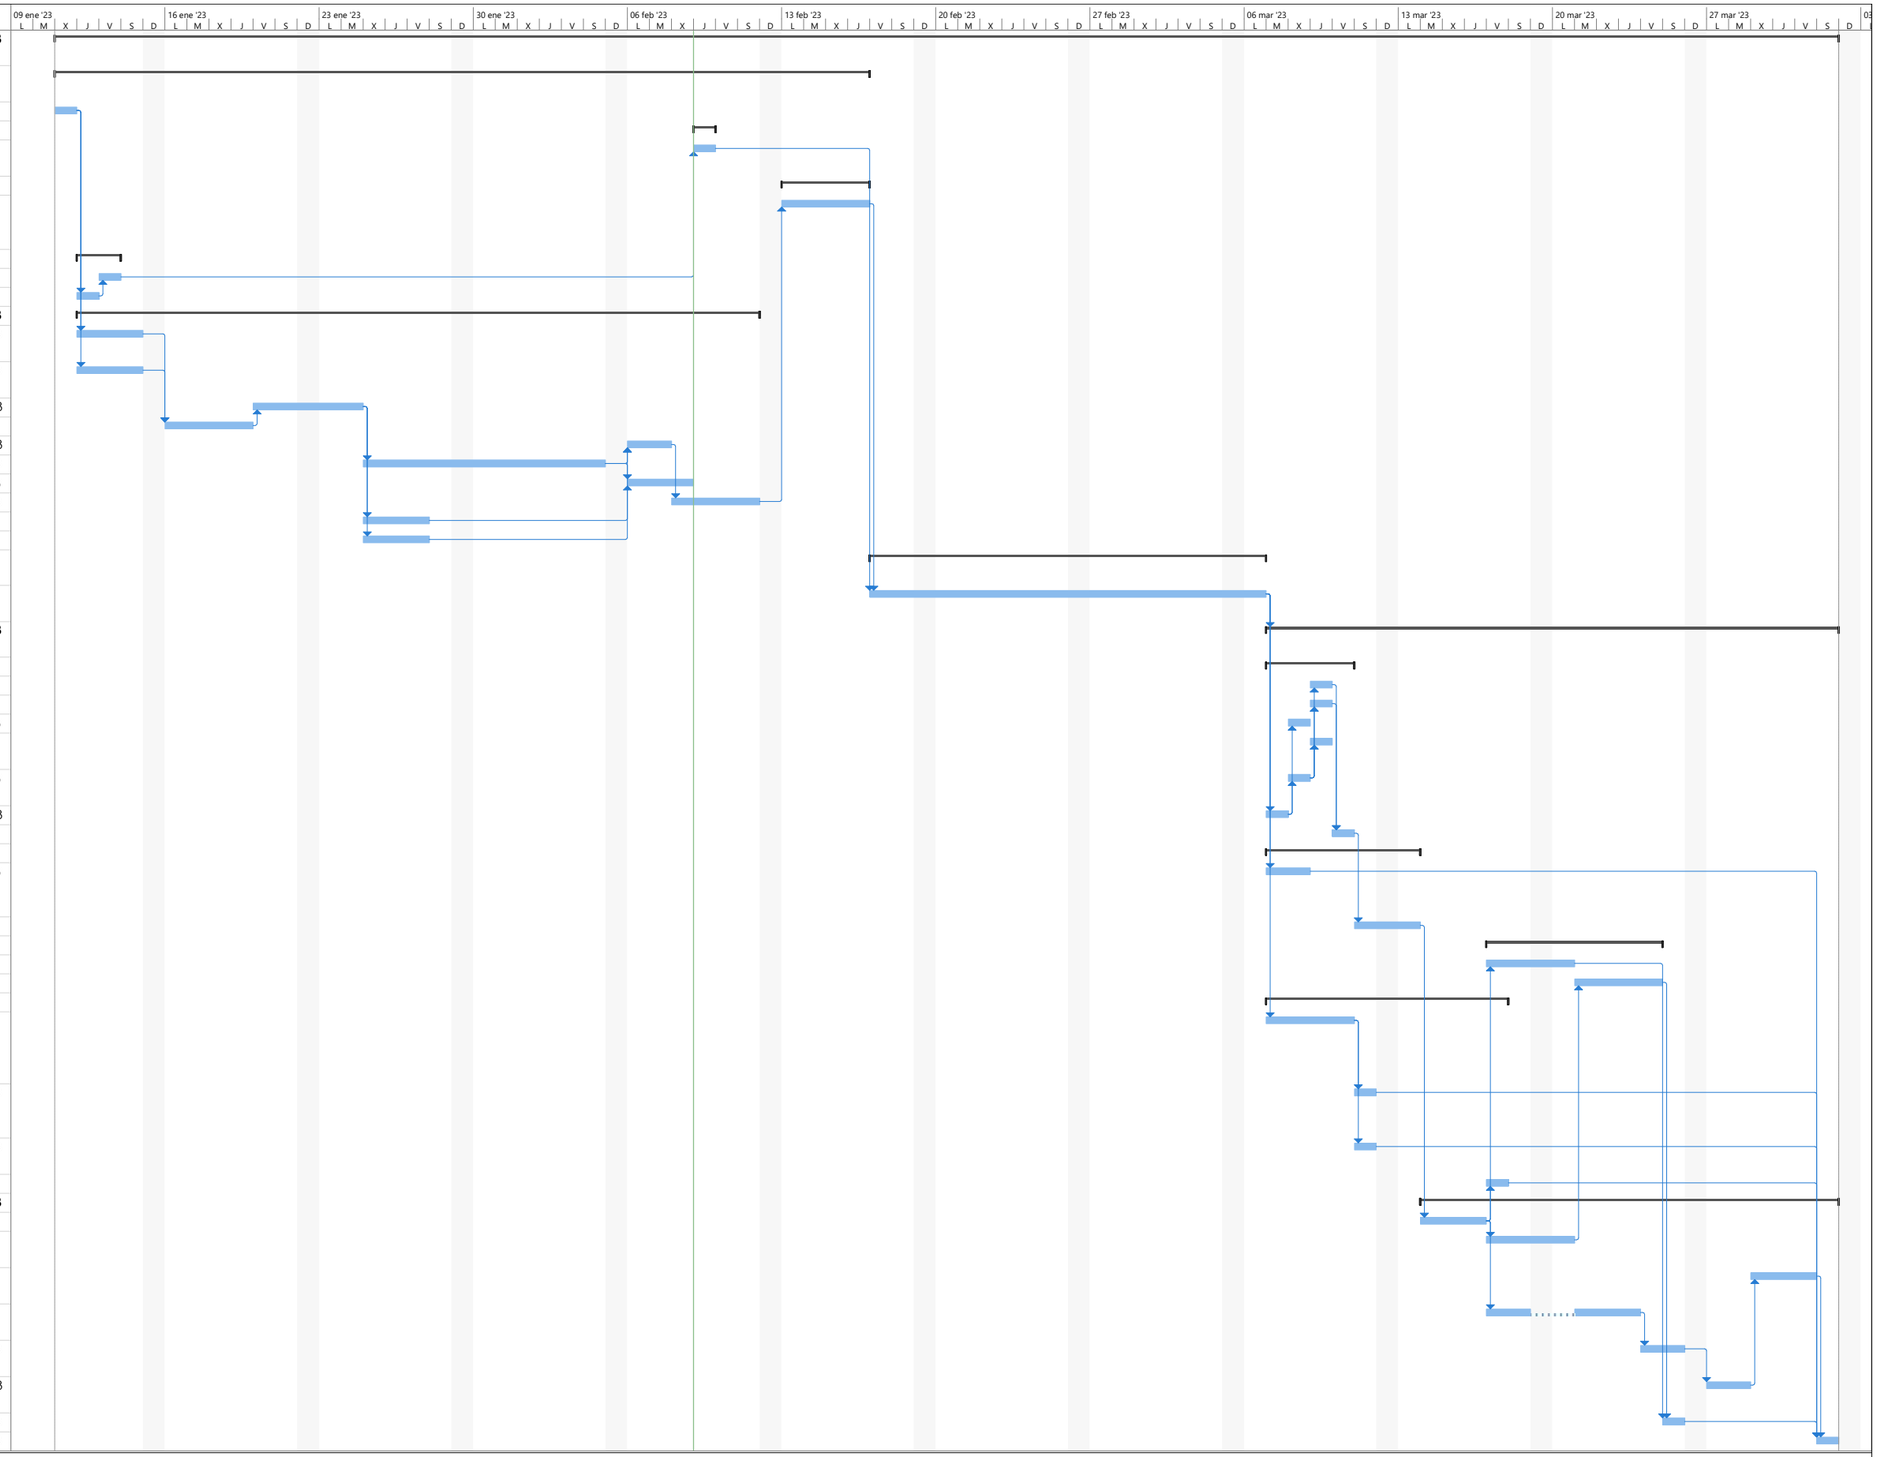

Proyecto: CRONOGRAMA CENT
Fecha: jue 09/02/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
