Cronograma de trabajo EGEHID

Id	Nombre de tarea	Notas	Número1	Duración	Comienzo	Fin
1	**EGEHID Construcción Salón Comunal Los Capacitos, D.M. Buena Vista, Jarabacoa, a.**		**0**	**124 días**	**mar 9/11/21**	**vie 29/4/22**
2						
3	**TRABAJOS PRELIMINARES**		**0**	**7 días**	**mar 9/11/21**	**mié 17/11/21**
4	Limpieza y preparación de terreno	pa	1	2 días	mar 9/11/21	mié 10/11/21
5	Replanteo	pa	1	3 días	jue 11/11/21	lun 15/11/21
6	Caseta de materiales (3m * 3m)	pa	1	2 días	mar 16/11/21	mié 17/11/21
7	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		**0**	**12 día**	**jue 18/11/21**	**vie 3/12/21**
8	Excavación Zapata de muro	m3	25.23	4 días	jue 18/11/21	mar 23/11/21
9	Excavación de Columnas	m3	9.75	3 días	mié 24/11/21	vie 26/11/21
10	Relleno de Reposición	m3	6.3	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21
11	Relleno Compactado	m3	21.81	4 días	lun 29/11/21	jue 2/12/21
12	Bote de Material	m3	11.42	2 días	jue 25/11/21	vie 26/11/21
13	**HORMIGON ARMADO EN:**		**0**	**39 día**	**lun 29/11/21**	**jue 20/1/22**
14	Zapata de Muros 0.45x0.25m 30 3/8 y estribos de 3/8 a 0.20 m	m3	9.65	3 días	lun 29/11/21	mié 1/12/21
15	Zapata de Columnas (1.00x 1.0Ó)m, con acero 601/2" y est. 3/8" a 0.25 m	m3	3.82	3 días	mar 30/11/21	jue 2/12/21
16	Columnas 0,30m * 0,30m 601/2" y est. 3/8" a 0.25 m 210kg/cm2	m3	4.73	14 días	vie 3/12/21	mié 22/12/21
17	Viga en 0.15m * 0,20m 401/2" y est. 3/8" a 0.20 m 210kg/cm2	m3	1.88	2 días	mar 30/11/21	mié 1/12/21
18	Dinteles (0.30*0.40)m, (0.20*0.20)m, con acero 2 Ø 3/8" y est. 3/8" a 0.25 m	m3	0.88	2 días	lun 20/12/21	vie 7/1/22
19	Viga Debajo Losa 0,30m * 0,40m con acero 601/2" y est. 3/8" a 0.20 m 210kg/cm2	m3	2.88	2 días	mié 29/12/21	jue 30/12/21
20	Losa Plana h=0,12 03/8" a 0.25 m AD	m3	18.5	4 días	lun 17/1/22	jue 20/1/22
21	**MUROS DE BLOQUES**		**0**	**25 día**	**jue 2/12/21**	**mié 5/1/22**
22	Block de 6" B.N.P. con bastones @0.40m	m2	57.13	10 día	jue 2/12/21	mié 15/12/21
23	Block de 6 ' S.N.P. con bastones @0.40m	m2	128.53	20 día	jue 9/12/21	mié 5/1/22
24	**TERMINACION DE SUPERFICIES**		**0**	**17 día**	**vie 21/1/22**	**lun 14/2/22**
25	Pañete Muro, viga y Columnas en Interior	m2	262.3	8 días	mié 26/1/22	vie 4/2/22
26	Pañete Muro, viga y Columnas en Exterior	m2	167.1	6 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22
27	Pañete en Techo	m2	145	5 días	vie 28/1/22	jue 3/2/22
28	Cantos general	mi	756.82	5 días	lun 7/2/22	vie 11/2/22
29	Fraguache	m2	289.25	3 días	vie 21/1/22	mar 25/1/22
30	**TERMINACION DE TECHO**		**0**	**11 día**	**vie 21/1/22**	**vie 4/2/22**
31	Fino de Techo Plano	m2	148.65	4 días	mié 26/1/22	lun 31/1/22
32	Impermiabilización Mantenimiento Asfáltico 3,5mm con Pintura Termorreductora	m2	154.6	4 días	mar 1/2/22	vie 4/2/22
33	Desagüe de Techo de 3"	Und.	7	2 días	mié 26/1/22	jue 27/1/22
34	Antepecho	mi	52.3	3 días	vie 21/1/22	mar 25/1/22
35	Zabaletas	mi	39.5	2 días	mar 1/2/22	mié 2/2/22
36	**PORTAJES**		**0**	**6 días**	**vie 18/2/22**	**vie 25/2/22**
37	Puertas Principales en Pino Tratado	m2	5.25	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22
38	Puerta Apanelada Ever Door Color Blanca	m2	13.55	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22
39	Ventana Salomónica AA de Aluminio, Man	P2	440.7	3 días	mié 23/2/22	vie 25/2/22
40	Hierro en Ventana	P2	515.25	3 días	vie 18/2/22	mar 22/2/22
41	**PINTURA**		**0**	**11 día**	**lun 7/2/22**	**lun 21/2/22**
42	Pintura en Techo	m2	164.5	4 días	lun 7/2/22	jue 10/2/22
43	Pintura Semigloss en Interior	m2	147.45	4 días	lun 14/2/22	jue 17/2/22
44	Pintura Acrílica Muros, vigas y Comunas	m2	192.45	5 días	mar 15/2/22	lun 21/2/22
45	**INSTALACIONES SANITARIAS**		**0**	**23 día**	**mar 25/1/22**	**jue 24/2/22**
46	Suministro e Instalación de Inodoros Blancos Sencillo con Tapa	UD	2	2 días	jue 27/1/22	vie 28/1/22
47	Suministro e Instalación de Lavamanos grandes Blanco, Incrustado.	UD	2	2 días	lun 31/1/22	mar 1/2/22
48	Suministro e Instalación de Fregadero una Bocas	UD	1	1 día	mié 2/2/22	mié 2/2/22
49	Puertas en PVC En Baño	M2	10.11	3 días	mar 8/2/22	jue 10/2/22
50	Camara de Inspección 0.80m*0.80m	UD	2	4 días	jue 27/1/22	mar 1/2/22
51	Trampa de Grasa 1.30m*1.10m'1.20m	UD	1	4 días	lun 21/2/22	jue 24/2/22
52	Cámara Séptica 3.45m*1.40m	UD	1	5 días	lun 14/2/22	vie 18/2/22
53	Cisterna 1.80x2.98x1.90m	UD	1	8 días	mié 2/2/22	vie 11/2/22
54	Bomba Motor franklin para cisterna de 1 HP	UD	1	1 día	mar 15/2/22	mar 15/2/22
55	Tanque Hidroneumatico de 120 gis	PA	1	1 día	mié 16/2/22	mié 16/2/22
56	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1 70m x 2.00m	UD	1	6 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22
57	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gis	UD	1	3 días	jue 27/1/22	lun 31/1/22
58	Filtrante de 12" Encarnizado en 10" Aprox. 200' de Profundidad	UD	1	3 días	mié 2/2/22	vie 4/2/22
59	Desagüe de Piso de 2"	UD	2	2 días	mié 2/2/22	jue 3/2/22
60	Tuberías y Piezas PVC	PA	1	4 días	jue 27/1/22	mar 1/2/22
61	Ventilación de 3	UD	2	1 día	mar 8/2/22	mar 8/2/22
62	Tuberías de Arrastres	PA	2	2 días	mié 2/2/22	jue 3/2/22
63	Acometida de Agua Potable Tubería pvc de presión 1"	PA	1	2 días	mar 25/1/22	mié 26/1/22
64	Mano de Obra de la Plomería	PA	1	5 días	jue 3/2/22	mié 9/2/22
65	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**0**	**7 días**	**jue 6/1/22**	**vie 14/1/22**
66	Salidas Cenitales	Und.	22	7 días	jue 6/1/22	vie 14/1/22
67	Salidas para Teléfonos	Und.	1	3 días	jue 6/1/22	lun 10/1/22
68	Salidas para Central de Sistema de Sónido	Und.	2	1 día	jue 6/1/22	jue 6/1/22
69	Interruptores Doble	Und.	8	6 días	jue 6/1/22	jue 13/1/22
70	Globo	Und.	16	2 días	mié 12/1/22	jue 13/1/22
71	Tomacorriente 110	Und.	18	6 días	jue 6/1/22	jue 13/1/22
72	Luces de Exterior con Celda Fotovoltaica, Tuberior EMT, Ind. Poste 2"	Und.	2	2 días	mié 12/1/22	jue 13/1/22
73	Tuberías y Piezas Especiales	Und.	1	4 días	jue 6/1/22	mar 11/1/22
74	Paneles de Distribución 4 a 8 Circuitos	Und.	1	2 días	jue 6/1/22	vie 7/1/22
75	Conexión a CDEEE	Pa -	1	4 días	jue 6/1/22	mar 11/1/22

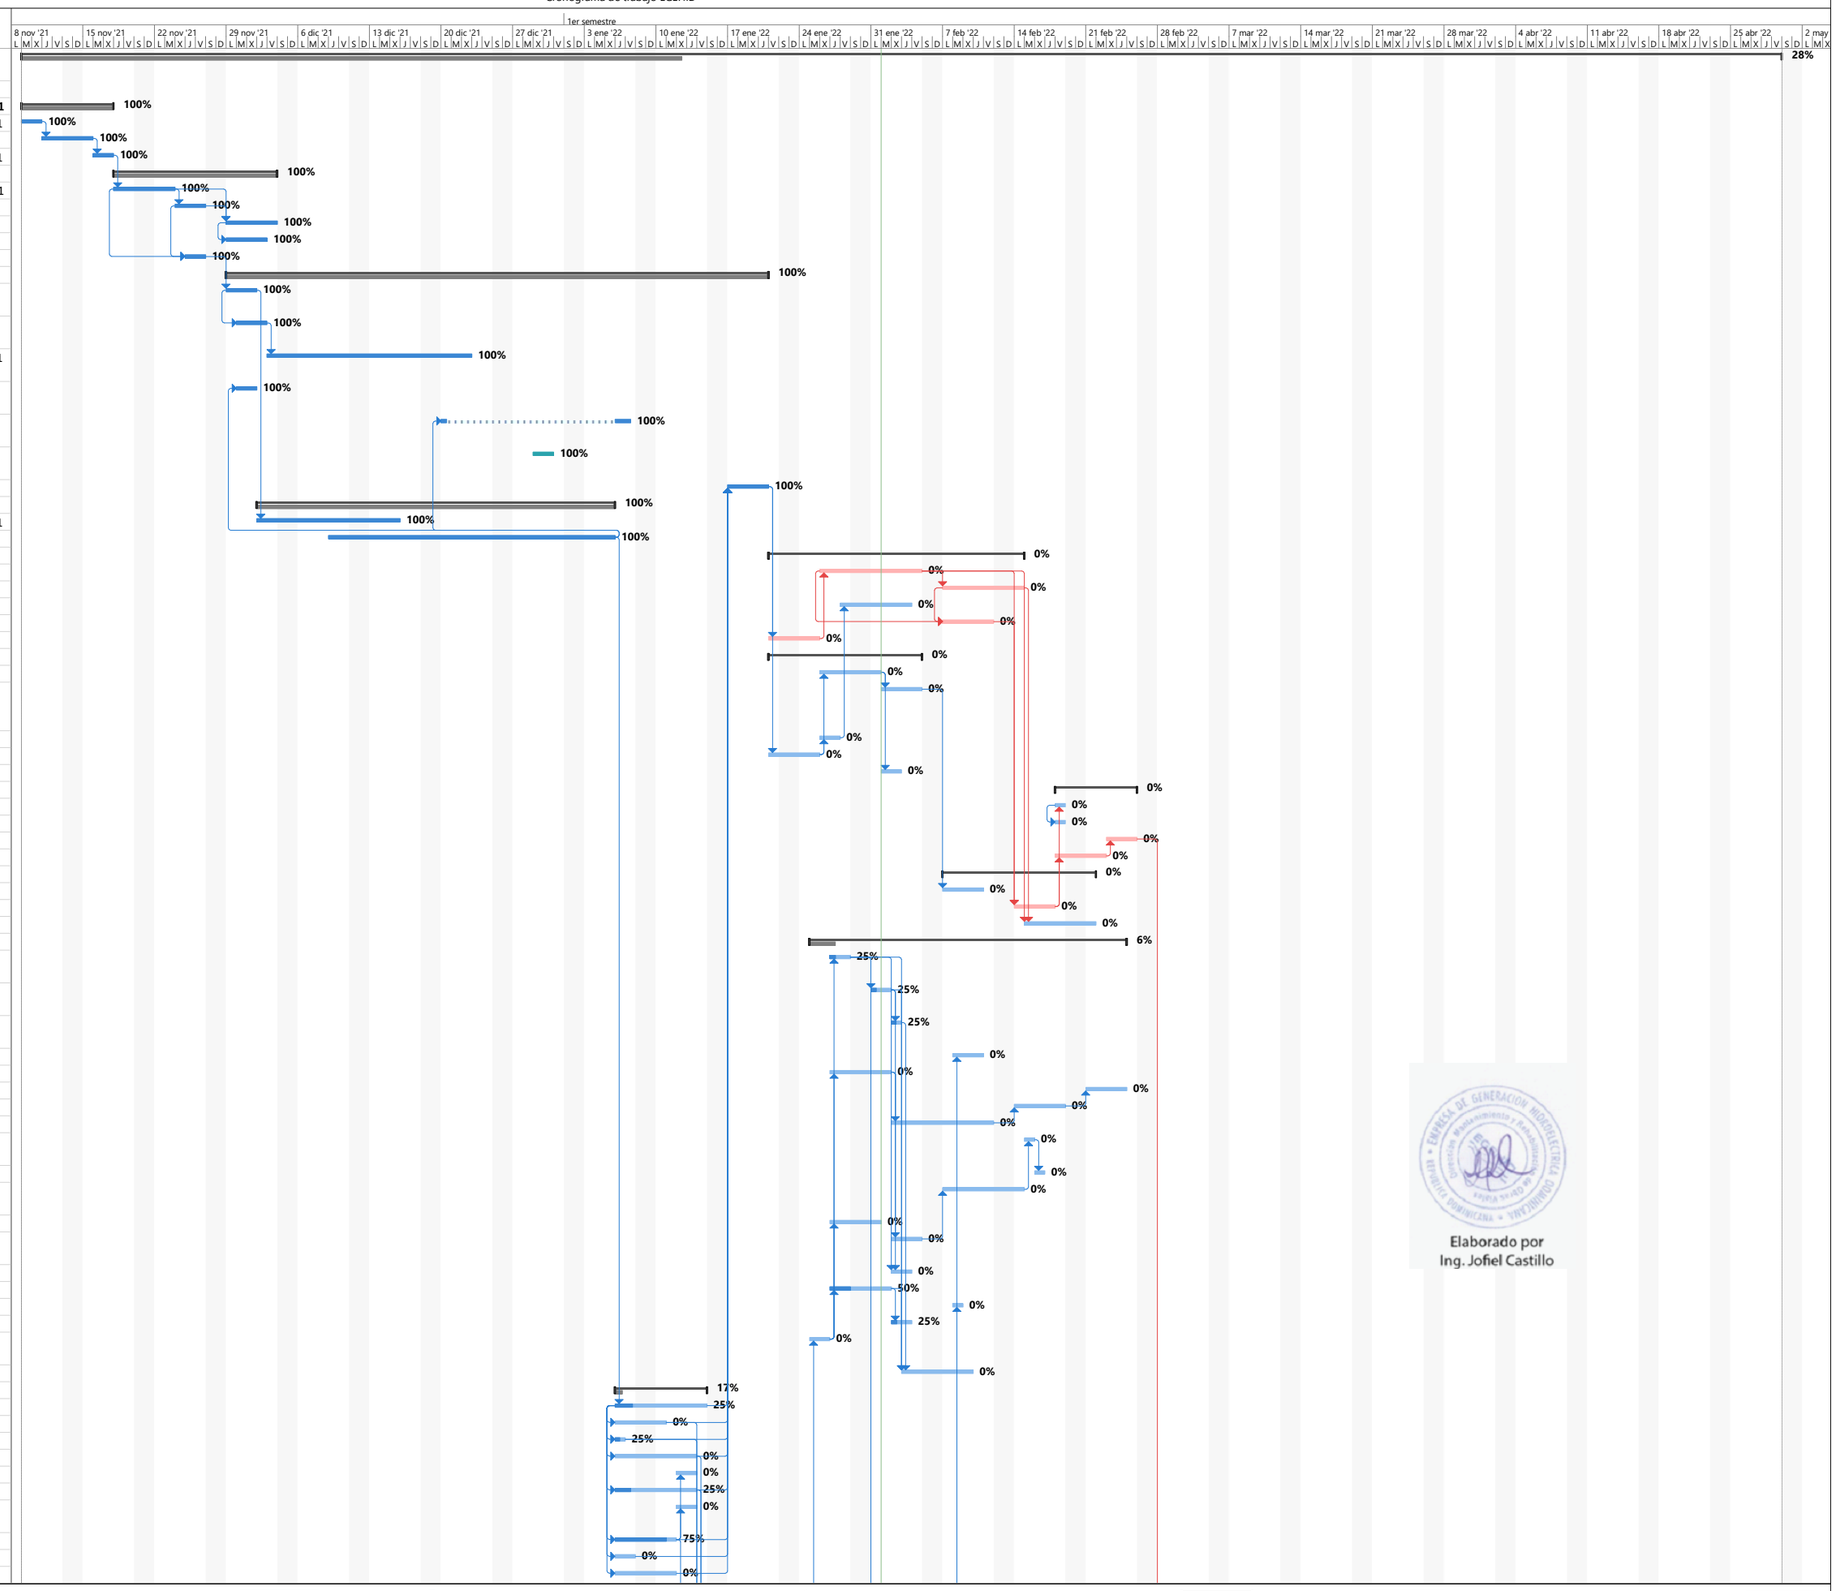

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

Cronograma de trabajo EGEHID

Id	Nombre de tarea	Notas	Número1	Duración	Comienzo	Fin
76	Abanicos de Techo	Und.	4	2 días	mié 12/1/22	jue 13/1/22
77	**PISOS Y CERAMICAS**		**0**	**17 día**	**vie 14/1/22**	**lun 7/2/22**
78	Torta de Hormigón con Malla Electrosoldadas 2.3x2.3 hormigón 210 kg/cm2	m2	14.5	7 días	vie 14/1/22	lun 24/1/22
79	Piso de Cerámica Importada 0.50x0.50m	m2	141.5	8 días	mar 25/1/22	jue 3/2/22
80	Cerámica Importada en Pared de Baños 0.20x0.30m	m2	34.1	6 días	lun 31/1/22	lun 7/2/22
81	Zócalos	mi	62.4	6 días	mar 25/1/22	mar 1/2/22
82	**Verja Perimetral**		**0**	**61 día**	**lun 10/1/22**	**lun 4/4/22**
83	Replanteo	pa	1	3 días	lun 10/1/22	mié 12/1/22
84	Excavación Zapata de Muros y Columnas	m3	25	4 días	lun 10/1/22	jue 13/1/22
85	Relleno de Reposición	m3	10.5	3 días	lun 10/1/22	mié 12/1/22
86	Bote de Material de Excavación	m3	17.5	5 días	lun 10/1/22	vie 14/1/22
87	Hormigón Armado en Zapata de Muros 0.45x0.20m, con acero 3 de 3/8”. est. de 3/8" a 0.25m	m3	6.95	9 días	jue 13/1/22	mar 25/1/22
88	Hormigón Armado en Zapata Columnas C1 0.60x0.60m. con acero 6 de 1/2", est. de 1/2"	m3	2.15	8 días	mié 26/1/22	vie 4/2/22
89	Hormigón Armado en Zapata Columnas C2 0.80x0.80m. con acero 7 de 1/2". est. de 1/2"	m3	0.75	8 días	mié 26/1/22	vie 4/2/22
90	Hormigón Armado en Columnas C1 0.15x0.20m con acero 4 de 1/2". est. de 3/8" a 0.25m	m3	5.32	8 días	lun 7/2/22	mié 16/2/22
91	Hormigón Armado en Columnas C2 0.20x0.20m, con acero 4 de 1/2" a 0.20m, est. de 3/8" a 0.25m	m3	2.36	8 días	lun 7/2/22	mié 16/2/22
92	Muros de Bloques de 6"	m2	72.5	5 días	mié 26/1/22	mar 1/2/22
93	Pañete de Muros y Columnas	m2	143.8	4 días	vie 4/2/22	mié 9/2/22
94	Fraguache	m2	3.25	2 días	mié 2/2/22	jue 3/2/22
95	Cantos	mi	172.82	4 días	jue 10/2/22	mar 15/2/22
96	Pintura Acriica	m2	143.8	10 día	jue 24/3/22	mié 6/4/22
97	Malla Ciclónica de 6*', palometas y 3 lineas de alambres de púas	mi	86.41	7 días	jue 7/4/22	vie 15/4/22
98	Puerta Corrediza en Malla Ciclónica 3.00x2.10m	mi	3	4 días	mié 16/3/22	lun 21/3/22
99	Puerta Peatonal en Malla Ciclónica 1.20x2.10m	mi	1	4 días	mié 16/3/22	lun 21/3/22
100	**VARIOS**		**0**	**77 día**	**jue 13/1/22**	**vie 29/4/22**
101	Acera Perimetral 180 kg/cm2	m2	62.07	12 día	lun 28/2/22	mar 15/3/22
102	Rampa y Pasarela de Hormigón con Malla 2.3x2.3 hormigón 210 kg/cm2	m2	15	6 días	mié 16/3/22	mié 23/3/22
103	Construcción Jardinería Revestida y Plantas Ornamentales	Und.	4	3 días	mié 16/3/22	vie 18/3/22
104	Suministro y Colocación Lámparas Dos Luces LED con Póster Metal 30’	Und.	2	2 días	lun 18/4/22	mar 19/4/22
105	Grava Sumnistro y Colocación	m2	5	3 días	lun 21/3/22	mié 23/3/22
106	Grama	m2	25	5 días	jue 24/3/22	mié 30/3/22
107	Plantas Ornamentales	Pa	1	5 días	jue 24/3/22	mié 30/3/22
108	Relleno Compactado en Area Exterior	m3	85	8 días	jue 13/1/22	lun 24/1/22
109	Acera Calle	m2	20	5 días	lun 28/2/22	vie 4/3/22
110	Letrero de identificación 10’x20’	ud	1	2 días	mié 20/4/22	jue 21/4/22
111	Tarja en Bronce	ud	1	2 días	vie 22/4/22	lun 25/4/22
112	Limpieza Final	pa	1	4 días	mar 26/4/22	vie 29/4/22

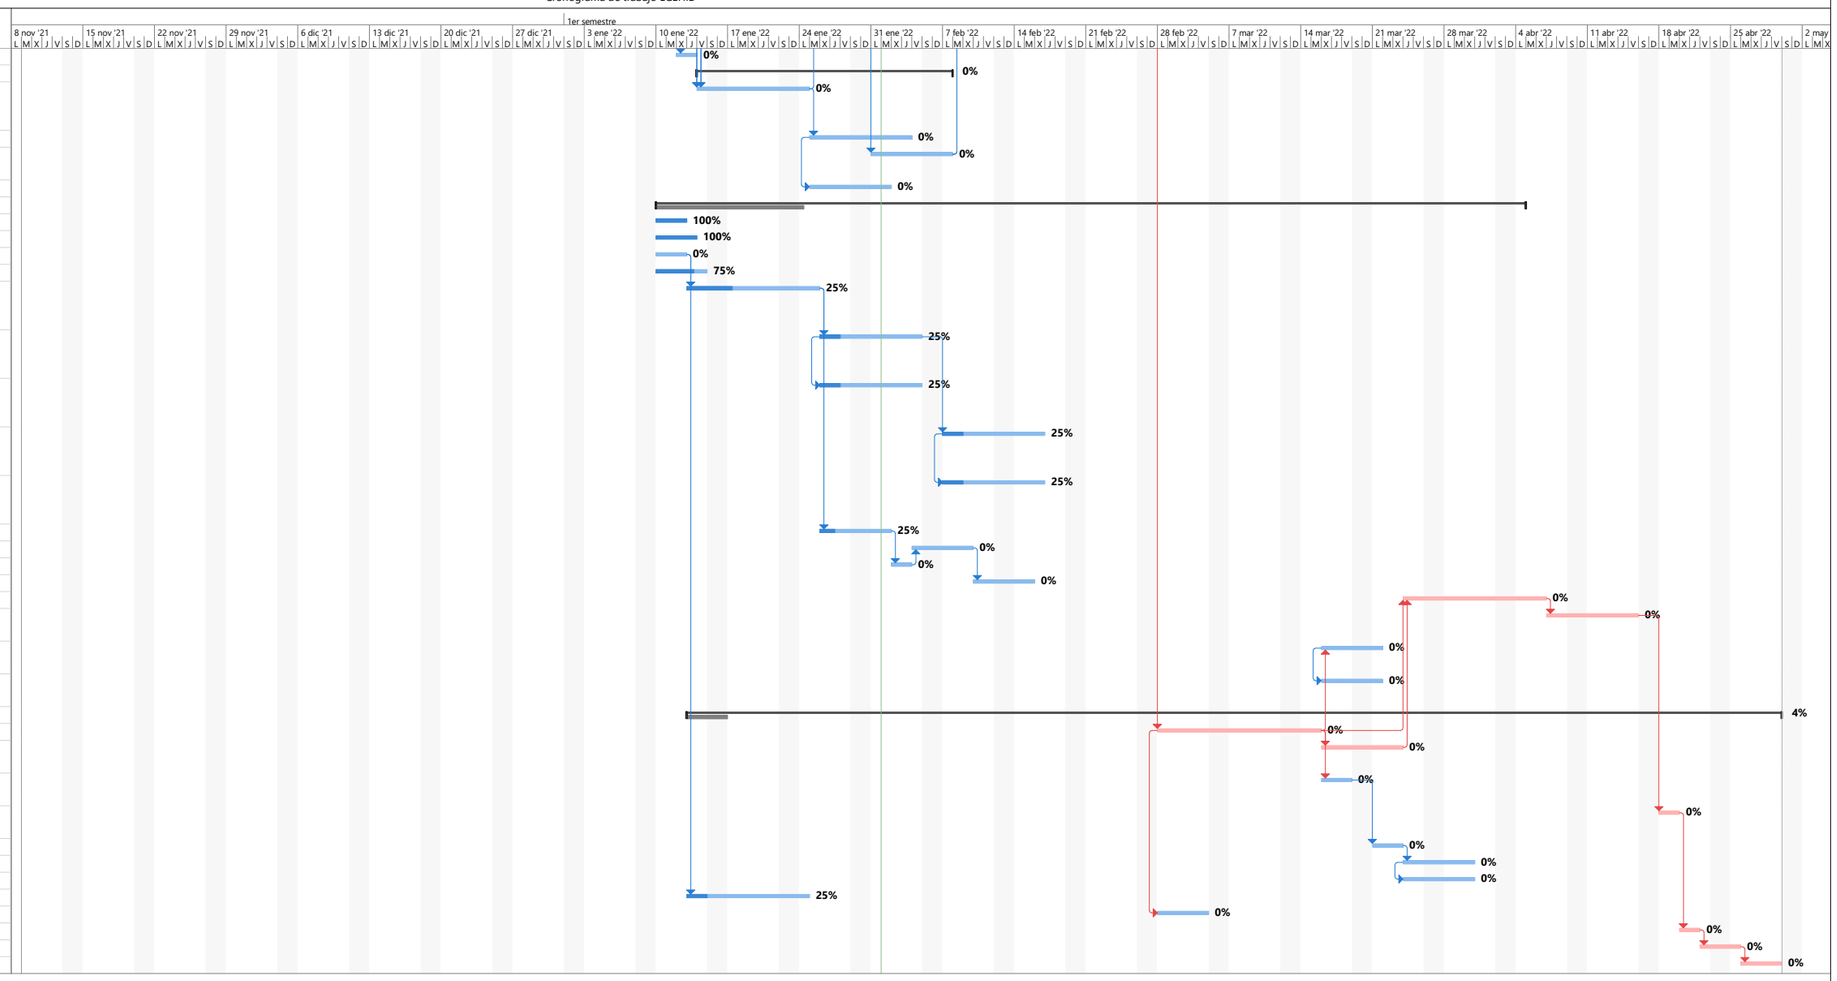

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite
