ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names
1		**CUARTEL POLICIAL**	**78 days**	**Mon 4/13/20**	**Wed 7/29/20**		
2		**PRIMER NIVEL**	**43 days**	**Mon 4/13/20**	**Wed 6/10/20**		
3		**PARTIDAS GENERALES**	**4 days**	**Mon 4/13/20**	**Thu 4/16/20**		
4		Limpieza y Replanteo, incluye charrancha	2 days	Mon 4/13/20	Tue 4/14/20		
5		Caseta de Materiales	2 days	Wed 4/15/20	Thu 4/16/20	4	
6		**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**15 days**	**Fri 4/17/20**	**Thu 5/7/20**		
7		Demolición de Estructuras de Hormigón	2 days	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20	5	
8		Demolición de Muros de	3 days	Tue 4/21/20	Thu 4/23/20	7	
9		Excavación en Material C	2 days	Fri 4/24/20	Mon 4/27/20	8	
10		Excavacion Zapata de Mu	2 days	Tue 4/28/20	Wed 4/29/20	9	
11		Excavacion Zapata de Columnas C1 Y C2	2 days	Tue 4/28/20	Wed 4/29/20	9	
12		Relleno de Reposición	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	19	
13		Relleno Compactado en Interior de Edificación	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	27	
14		Bote de Materialde Excavación y	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20	11	
15		**HORMIGON ARMADO EN**	**32 days**	**Mon 4/13/20**	**Tue 5/26/20**		
16		Zapata para Muros de Bloques "6, 210kg/cm2	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/5/20	10	
17		Zapata para Muros de Bloques "4, 210kg/cm3	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/5/20	10	
18		Zapata para Columnas C1, 1,00M*1,00M	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/5/20	11	
19		Zapata para Columnas C2, 0,80M*0,80M	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/5/20	11	
20		Columnas de Amarre 0.15mx0.20m,	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20	17	
21		Columnas Circulares de 1	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20	18	
22		Vigas de Amarre 0.15mx0.20m a nivel de piso hormigón,	4 days	Tue 5/12/20	Fri 5/15/20	20	
23		Vigas de Amarre 0.15mx0.20m a nivel de	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20	19	
24		Vigas 0.20mx0.30m a nivel de techo,	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20	19	
25		Viga 0,10*0,20 210kg/cm2 Nivel de	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20	19	
26		Dinteles (0.15m x 0.20m)2@3/8+3@1/2 @3/8 A 0,20	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	19	
27		Dintel Puerta Frontal	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	19	
28		Refuerzo Plano0,14*,30m	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20	25	
29		Losa de Techo e=0.14m, 210kg/cm2	4 days	Tue 5/12/20	Fri 5/15/20	25	
30		**MUROS DE BLOQUES**	**1 day**	**Mon 4/13/20**	**Mon 4/13/20**		
31		Bloques Horm. 6", Ø1/2" @ 0.40m BNP	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	22	
32		Bloques Horm. 6", Ø1/2" @ 0.80m SNP	7 days	Mon 5/18/20	Tue 5/26/20	29	
33		Bloques Horm. 4", Ø1/2" @ 0.40m BNP	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	22	
34		Bloques Horm. 4", Ø1/2" @ 0.80m SNP	4 days	Mon 5/18/20	Thu 5/21/20	29	
35		**TERMINACION DE SUPER**	**7 days**	**Mon 5/18/20**	**Tue 5/26/20**		
36		Pañete en Muros Interiore	5 days	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20	33	
37		Pañete en Muros Exterior	2 days	Wed 5/20/20	Thu 5/21/20	33	
38		Pañete en Losa de Techo	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
39		Fraguache sobre superfic	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	33	
40		Cantos en general	3 days	Fri 5/22/20	Tue 5/26/20	37	
41		Estrias o alto relieve	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	37	
42		Gotero Ranurado	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	37	
43		**VENTANAS**	**6 days**	**Wed 5/27/20**	**Wed 6/3/20**		
44		Ventanas Corredizas de Aluminio y Crystal	4 days	Wed 5/27/20	Mon 6/1/20	40	
45		Rejas en Ventana	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	44	
46		**PUERTAS**	**5 days**	**Wed 5/27/20**	**Tue 6/2/20**		
47		Puerta en Aluminio y Cris	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	40	
48		Puerta Polimetal (0.80m y 0.70m x 2.10m) en	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	40	
49		Puerta de Hierro 0,90m*2	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	40	
50		Rejas Hierro en cárceles	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20	40	
51		Gabinete de Piso en Pinc	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	55	
52		Gabinete de Pared en Pino Tratado	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	36	
53		Tope de Granito Natural en Cocina	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	51	
54		**TERMINACION DE PISOS**	**7 days**	**Tue 5/26/20**	**Wed 6/3/20**		
55		Piso en Porcelanato Importado 0,50m*0,50m, incluye torta de 10 cms	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
56		Zócalos de piso	3 days	Mon 6/1/20	Wed 6/3/20	55	
57		Acera Violinada en perimetro edificio	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	42	
58		**REVESTIMIENTO EN PARE**	**2 days**	**Wed 5/27/20**	**Thu 5/28/20**		
59		Cerámicas Importadas en pared de baños	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20	63	
60		Cerámicas Importadas en	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	36	
61		**INSTALACIONES SANIAT**	**36 days**	**Mon 4/13/20**	**Mon 6/1/20**		
62		Inodoros sencillos blanco con tapa	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	81	
63		Lavamanos Pedestal blanco 50x47	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	81	
64		Fregadero de acero inoxidable sencillo	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	82	
65		Ducha	1 day	Tue 4/21/20	Tue 4/21/20	83	
66		Mezcladora para lavamar	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	81	
67		Llave de chorro en jardin	1 day	Mon 4/13/20	Mon 4/13/20		
68		Set Accesorios para baño	1 day	Mon 4/13/20	Mon 4/13/20		
69		Desagües de Piso en Ø2"	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	55	
70		Desagües de techo Ø4" F	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29	
71		Trampa de grasa (1,10m x 0,.90m)	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
72		Registro sanitario (0.70m x 0.70m x 0.70m)	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
73		Cámara Séptica 3.40x3,4	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
74		Cisterna 1.80x2.98x1.90m,	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	77	
75		Bomba Motor franklin para cisterna de 1 HP	1 day	Thu 5/21/20	Thu 5/21/20	77	
76		Tanque Hidroneumatico de 120 gls	1 day	Thu 5/21/20	Thu 5/21/20	77	

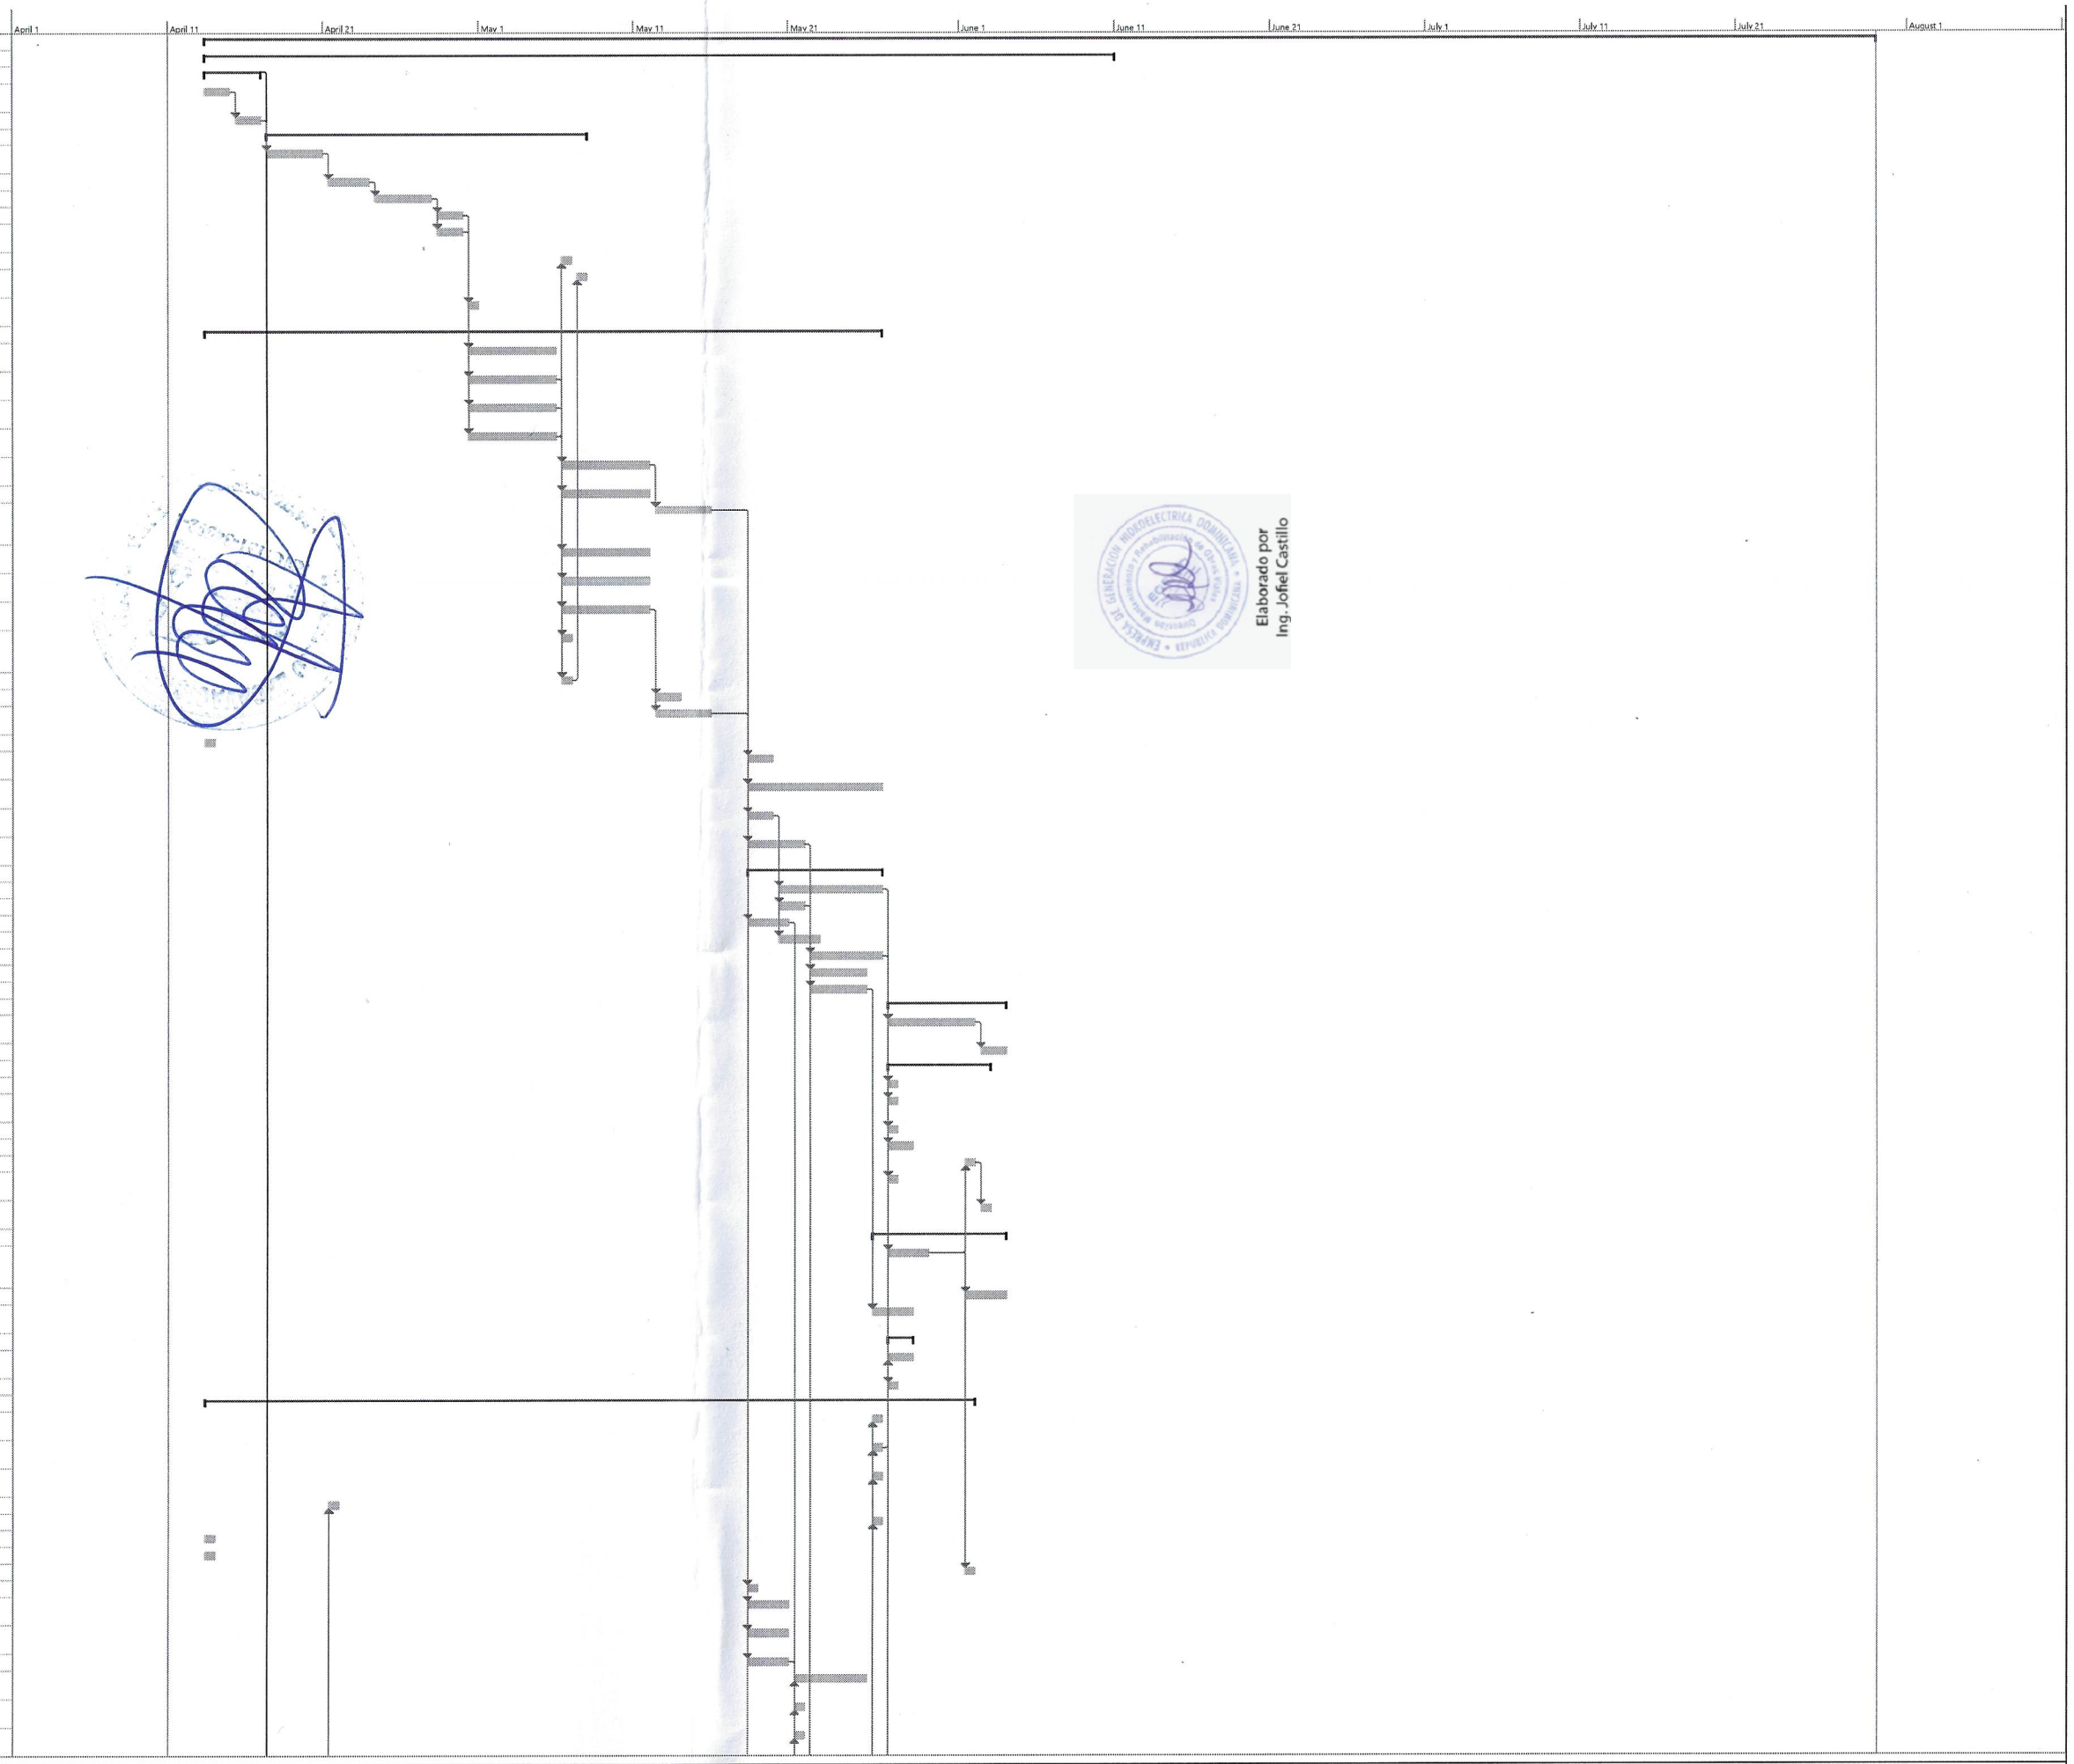

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: CUARTEL POLICIAL
Fecha: Wed 3/11/20

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecesor	Resource Names
77		Cepilla bomba cisterna 1.5cm x 1.70m x 2.00m	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
78		Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	2 days	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	84	
79		Filtrante de 10" Ecomnitz	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	73	
80		Ventilación de 3" PVC	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29	
81		Salida Drenaje lavamanos (PVC SCH-26 Ø2")	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	34	
82		Salida Drenaje fregadero (PVC SCH-26 Ø2")	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	34	
83		Salida Drenaje ducha (PVC SCH-26 Ø2")	2 days	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20	3	
84		Base para Tinaco	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29	
85		**INSTALACIONES ELECTR**	**18 days**	**Thu 5/21/20**	**Mon 6/1/20**		
86		Salidas de luces centrales	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	38	
87		Salidas para tomacorrien	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
88		Salidas para tomacorrien	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
89		Salidas interruptores sim	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
90		Salidas interruptores dob	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
91		Salidas para teléfonos	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
92		Salidas para TV	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
93		Salida para red de data y	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	36	
94		Registro eléctrico	3 days	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	38	
95		Lampara tipo scooter en	1 day	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	90	
96		Lampara de techo en exte	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86	
97		Lampara de pared en int	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86	
98		Lampara de pared en exterior 20W	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86	
99		Caja de Breakers 16 circ	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	94	
100		Acometida desde transformador hasta	2 days	Fri 5/29/20	Mon 6/1/20	99	
101		Suministro e instalación aparatos x0€ de pared	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	86	
102		**PINTURA**	**12 days**	**Tue 5/26/20**	**Wed 6/10/20**		
103		Pintura Base Blanca	4 days	Mon 6/1/20	Thu 6/4/20	93	
104		Semigloss en muros inter	1 day	Fri 6/5/20	Fri 6/5/20	103	
105		Acrílica en muros exterior	4 days	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	103	
106		Economica en Techo	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	86	
107		Pintura mantenimiento en Interio caseles	4 days	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	103	
108		**SEGUNDO NIVEL**	**22 days**	**Mon 5/18/20**	**Tue 6/16/20**		
109		**HORMIGON ARMADO EN**	**11 days**	**Mon 5/18/20**	**Mon 6/1/20**		
110		Columnas de Amarre 0.15mx0.20m	4 days	Mon 5/18/20	Thu 5/21/20	29	
111		Vigas 0.15mx0.20m a nivel de techo,	4 days	Fri 5/22/20	Wed 5/27/20	110	
112		Dinteles (0.15m x 0.20m)	1 day	Thu 5/28/20	Thu 5/28/20	111	
113		Losa de Techo e=0.12m, 210kg/cm2	3 days	Thu 5/28/20	Mon 6/1/20	111	
114		**MUROS DE BLOQUES**	**3 days**	**Tue 6/2/20**	**Thu 6/4/20**		
115		Bloques Hcrm. 6", 0.20/8" @ 0.80m SNP	3 days	Tue 6/2/20	Thu 6/4/20	113	
116		Bloques Hcrm. 4", 0.20/8" @ 0.80m SNP	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	113	
117		**TERMINACION DE TECHOS**	**2 days**	**Tue 6/2/20**	**Mon 6/8/20**		
118		Friso de techo plano	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	113	
119		Zabalata en techo	1 day	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	118	
120		Anhpecho Terminado muro bloques 6"	1 day	Thu 6/4/20	Thu 6/4/20	119	
121		Impermeabilizante Manto Asfaltico Granular	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	120	
122		**TERMINACION DE SUPER**	**7 days**	**Tue 6/2/20**	**Wed 6/10/20**		
123		Pañete en Muros Interior	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	115	
124		Pañete en Muros Exterior	2 days	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	115	
125		Pañete en Losa de Techo	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	113	
126		Fraguache sobre superfic	2 days	Thu 6/4/20	Fri 6/5/20	125	
127		Cantos en general	2 days	Tue 6/9/20	Wed 6/10/20	123	
128		**VENTANAS**	**2 days**	**Thu 6/11/20**	**Fri 6/12/20**		
129		Ventanas Corredizas de Aluminio y Cristal	2 days	Thu 6/11/20	Fri 6/12/20	127	
130		**PUERTAS**	**1 day**	**Thu 6/11/20**	**Thu 6/11/20**		
131		Puerta PVC (0.80m x 1.85m) en Baños	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	127	
132		Puerta Pollmetal (0.90m x 2.10m) en Baños	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	127	
133		**TERMINACION DE PISOS**	**4 days**	**Mon 6/8/20**	**Thu 6/11/20**		
134		Piso en Porcelanato importado 0.50m*0.50m	2 days	Mon 6/8/20	Tue 6/9/20	126	
135		Zocalos de piso	2 days	Wed 6/10/20	Thu 6/11/20	134	
136		**REVESTIMIENTO EN PARED**	**1 day**	**Mon 6/8/20**	**Mon 6/8/20**		
137		Cerramicas en pared de b	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	126	
138		Cerramicas en Piletа Duch	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	126	
139		**INSTALACIONES SANIAT**	**19 days**	**Mon 5/18/20**	**Thu 6/11/20**		
140		Inodoros sanicllos blanco con tapa	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151	
141		Lavamanos Pedestal blanco 50x4"	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151	
142		Orinal	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151	
143		Ducha	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151	
144		Mezcladora para lavamar	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	151	
145		Set Accesorios para baño	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	144	
146		Desagues de Piso en Ø2	1 day	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	134	
147		Desagues de lavbo Ø4"	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	113	
148		Tarrapa de grasa (1.10m x 0.90m)	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
149		Registro sanitario (0.70m x 0.70m)	3 days	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	29	
150		Ventilación de 3" PVC	1 day	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	29	
151		Sellda Drenaje lavamanos (PVC SCH-26 Ø2")	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
152		Salida Drenaje ducha	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
153		**INSTALACIONES ELECTR**	**14 days**	**Thu 5/21/20**	**Tue 6/9/20**		
154		Salidas de luces centrale	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	113	
155		Salidas para tomacorrien	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
156		Salidas para tomacorrien	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
157		Salidas interruptores sim	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
158		Salidas para teléfonos	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
159		Salidas para TV	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
160		Salida para red de data y	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	123	
161		Registro eléctrico	2 days	Thu 5/21/20	Fri 5/22/20	38	

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names
162		Lampara de pared en exterior 20w	1 day	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	154	
163		Caja de Breakers 16 circu	2 days	Mon 5/25/20	Tue 5/26/20	161	
164		Acometida desde transformador hasta	2 days	Mon 5/25/20	Tue 5/26/20	161	
165		Suministro e instalación abanicos KDK de pared	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20	161	
166		**PINTURA**	**9 days**	**Thu 6/4/20**	**Tue 6/16/20**		
167		Pintura Base Blanca	3 days	Thu 6/4/20	Mon 6/8/20	116	
168		Semigloss en muros inter	3 days	Tue 6/9/20	Thu 6/11/20	167	
169		Acrilica en muros exterior	3 days	Fri 6/12/20	Tue 6/16/20	168	
170		Economica en Techo	2 days	Thu 6/4/20	Fri 6/5/20	125	
171		**VERJA EN BLOCK L=230,00**	**37 days**	**Wed 5/27/2(**	**Thu 7/16/20**		
172		**TRABAJOS PRELIMINARE**	**1 day**	**Wed 5/27/2(**	**Wed 5/27/2(**		
173		Limpieza y Replanteo	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/2C	164	
174		**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**11 days**	**Thu 5/28/20**	**Thu 6/11/20**		
175		Excavación Zapata en Mu	3 days	Thu 5/28/20	Mon 6/1/20	173	
176		Excavación Zapata de Cc	3 days	Thu 5/28/20	Mon 6/1/20	173	
177		Relleno de Reposición	2 days	Mon 6/8/20	Tue 6/9/20	181	
178		Bote de Material de Exca	2 days	Wed 6/10/20	Thu 6/11/20	177	
179		**HORMIGON ARMADO EN**	**12 days**	**Tue 6/2/20**	**Wed 6/17/2(**		
180		Zapata de Muros 0,45m*,	4 days	Tue 6/2/20	Fri 6/5/20	175	
181		Zapata de Columnas C1 0,80m*0,80m*0,25	4 days	Tue 6/2/20	Fri 6/5/20	176	
182		Columnas 0,20m*0,20m, 210kg/cm2	4 days	Mon 6/8/20	Thu 6/11/20	181	
183		Viga 0,20m*0,20m 210kg	4 days	Fri 6/12/20	Wed 6/17/2C	182	
184		**MUROS DE BLOQUES**	**14 days**	**Mon 6/8/20**	**Thu 6/25/20**		
185		Block de 6" BNP	3 days	Mon 6/8/20	Wed 6/10/2C	180	
186		Block de 6" SNP Violinad	6 days	Thu 6/18/20	Thu 6/25/20	183	
187		**TERMINACION DE SUPER**	**7 days**	**Fri 6/26/20**	**Mon 7/6/20**		
188		Pañete amaestrado en Muros, vigas y columnas	7 days	Fri 6/26/20	Mon 7/6/20	186	
189		Cantos general	7 days	Fri 6/26/20	Mon 7/6/20	186	
190		**PINTURA**	**7 days**	**Wed 7/8/20**	**Thu 7/16/20**		
191		Pintura Acrilica en Muros, Vigas y	7 days	Wed 7/8/20	Thu 7/16/20	193	
192		**PUERTAS Y MALLAS**	**6 days**	**Tue 7/7/20**	**Tue 7/14/20**		
193		Puertas corredizas en tubos y mallas	1 day	Tue 7/7/20	Tue 7/7/20	189	
194		Alambre tipo Trinchera en Verja Perimetral	5 days	Wed 7/8/20	Tue 7/14/20	193	
195		Malla Ciclonica	5 days	Tue 7/7/20	Mon 7/13/2C	189	
196		**MISCELANEOS**	**38 days**	**Tue 6/2/20**	**Thu 7/23/20**		
197		Acera Calle	4 days	Tue 7/14/20	Fri 7/17/20	195	
198		Parqueos y Area General con Malla Electrosoldadas	4 days	Mon 7/20/20	Thu 7/23/20	197	
199		Jardinera	3 days	Mon 7/20/20	Wed 7/22/2C	197	
200		Asta de banderas	1 day	Mon 7/20/20	Mon 7/20/2C	197	
201		Salida para GLP	4 days	Mon 7/20/20	Thu 7/23/20	197	
202		Suministro e instalación de letrero en bronce	1 day	Mon 7/20/20	Mon 7/20/20	197	
203		Tarja en bronce	1 day	Mon 7/20/20	Mon 7/20/2C	197	
204		Escudo	1 day	Mon 7/20/20	Mon 7/20/2C	197	
205		Barras de Hierro 2"x4" en fachada de edificio	2 days	Tue 7/14/20	Wed 7/15/20	195	
206		Relleno Compactado Bajo A	2 days	Mon 7/20/20	Tue 7/21/20	197	
207		Reparación de Contenes	2 days	Mon 7/20/20	Tue 7/21/20	197	
208		Plancha metálica en Pared	2 days	Fri 6/26/20	Mon 6/29/2C	186	
209		Viga de Apoyo Escalera	3 days	Thu 6/4/20	Mon 6/8/20	210	
210		Rampa de Escalera	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	113	
211		Hormigón Simple en Escalo	2 days	Thu 6/4/20	Fri 6/5/20	210	
212		Pañete	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	185	
213		Cantos	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	185	
214		Escalones en Porcelanato	1 day	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	211	
215		Mesanine Completo en Caoba y Granito Natural	8 days	Mon 6/8/20	Wed 6/17/20	211	
216		Baranda en Escalera en Ca	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	214	
217		Cubre falta metálico en piso	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	214	
218		Desagüe de 2" en muro verja perimetral	1 day	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	185	
219		Grava en exterior	2 days	Wed 7/22/20	Thu 7/23/20	206	
220		Letrero en Cintra	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20	215	
221		Perrillas y Capitel en Colum	1 day	Wed 7/22/20	Wed 7/22/2C	206	
222		Rampa para Minusválidos	1 day	Wed 7/22/20	Wed 7/22/2C	206	
223		Pata de chivo en puertas	1 day	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20	132	
224		Estantaria en Pino Tratado	1 day	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	191	
225		Limpieza Final	1 day	Thu 7/23/20	Thu 7/23/20	222	
226		**BACHEO TECNICO**	**12 days**	**Tue 7/14/20**	**Wed 7/29/2(**		
227		Elaboración	2 days	Tue 7/14/20	Wed 7/15/2C	195	
228		Aplicación en bacheo	2 days	Tue 7/28/20	Wed 7/29/2C	231	
229		Transporte a 20kms	2 days	Thu 7/16/20	Fri 7/17/20	227	
230		Manejo de Ac-30	2 days	Thu 7/16/20	Fri 7/17/20	227	
231		Riego de adherencia	2 days	Fri 7/24/20	Mon 7/27/2C	233	
232		Corte con Sierra en lateral de asfalto	2 days	Mon 7/20/20	Tue 7/21/20	229	
233		Suministro, Colocacion y transporte Material de Base	2 days	Wed 7/22/20	Thu 7/23/20	232	
234		Excavación área de Bacheo	2 days	Thu 7/16/20	Fri 7/17/20	227	
235		Bote de material producto de excavación	2 days	Mon 7/20/20	Tue 7/21/20	234	
236		Personal de apoyo para mantenimiento transito (Bandera 5 pers)	2 days	Mon 7/20/20	Tue 7/21/20	234	
237							

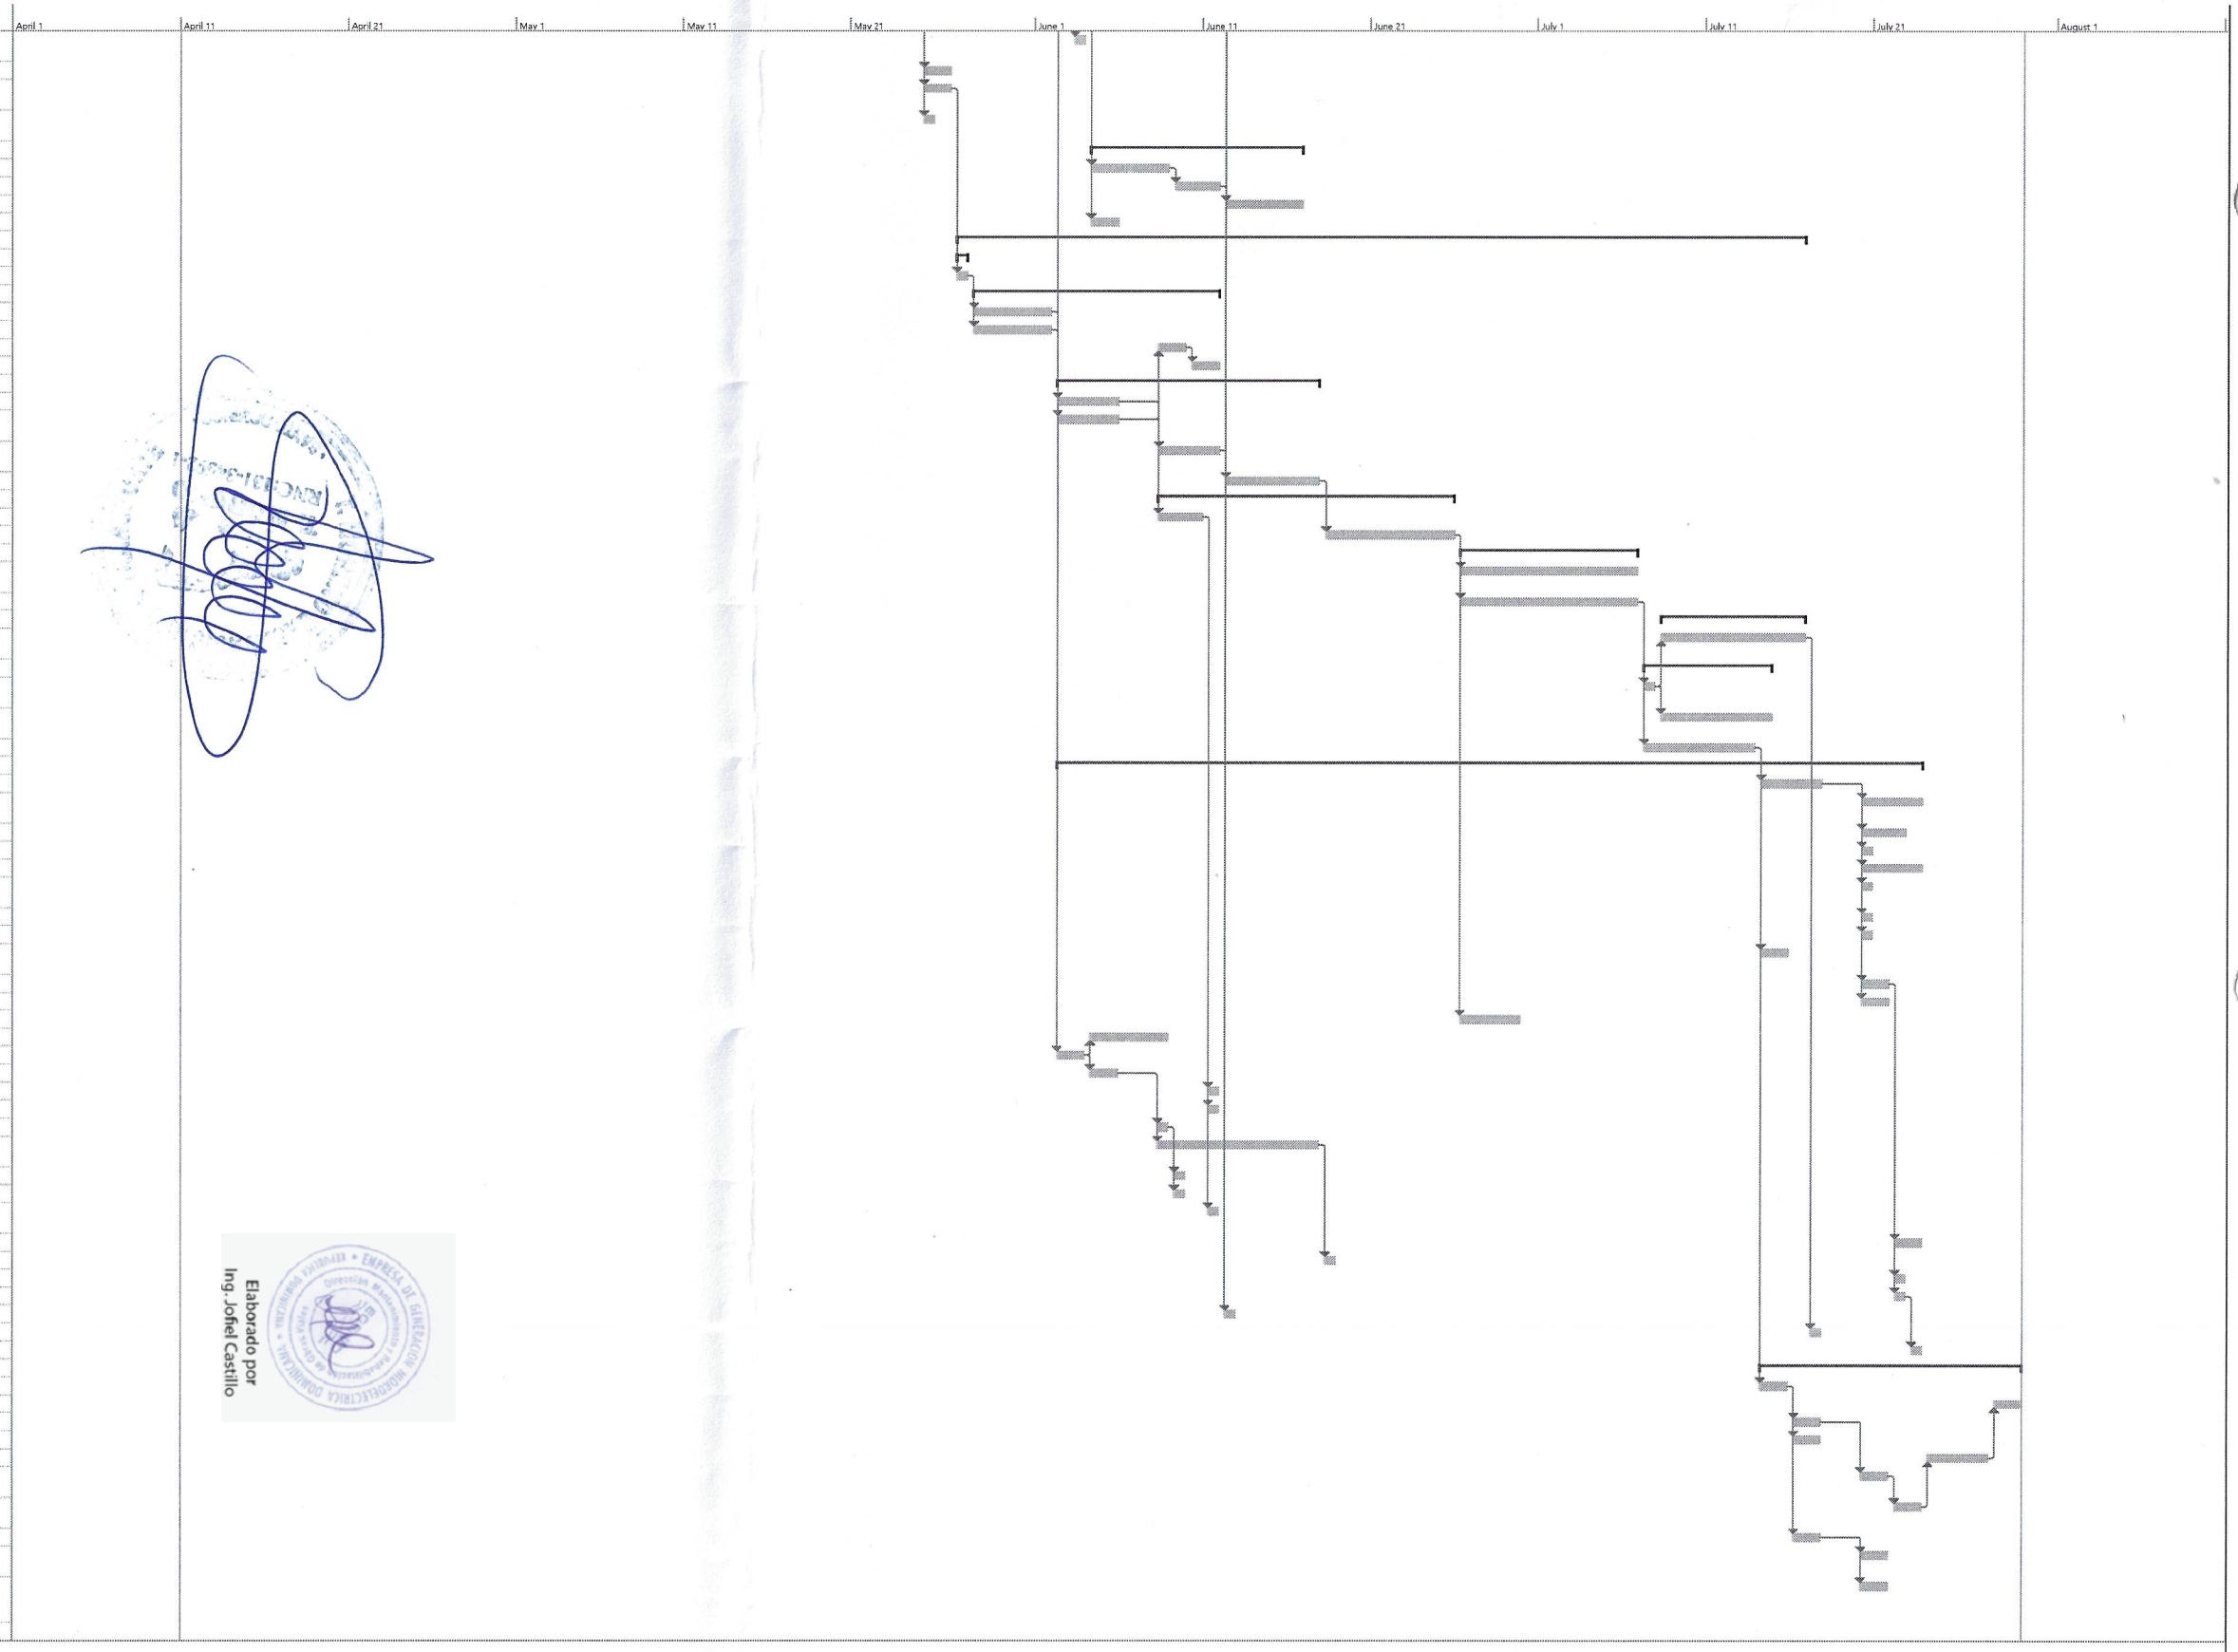

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: CUARTEL POLICIAL
Fecha: Wed 3/11/20

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Progreso, Progreso manual
