Id	Nombre de tarea	CANT	UNID	Duración	Comienzo
1	**PROYECTO: REABILITACION DE EDIF VARIAS EN LA CH ROSA JULIA (BOBA) MARIA TRINIDAD SANCHEZ.**	**0**		**173 días**	**lun 15/11/21**
2	INICIO	0		0 días	lun 15/11/21
3	**CONSTRUCCION ALMACEN**	**0**		**88 días**	**lun 15/11/21**
4	**Partidas Generales:**	**0**		**9 días**	**lun 15/11/21**
5	Caseta de Materiales	1	p.a	3 días	lun 15/11/21
6	Ingeniería y Replanteo	1	p.a	6 días	jue 18/11/21
7					
8	**Movimiento de Tierra:**	**0**		**7 días**	**vie 26/11/21**
9	Remocion de Capa Vegetal con equipo	96.57	m3n	3 días	vie 26/11/21
10	Excavación Zapata de Muros y Columnas	15.41	m3n	1 día	mié 1/12/21
11	Relleno de Reposición	4.06	m3s	1 día	jue 2/12/21
12	Relleno con suministro y transporte	4.06	m3s	1 día	vie 3/12/21
13	Bote	8.76	m3E	1 día	lun 6/12/21
14					
15	**Hormigón Armado en:**	**0**		**11 días**	**jue 2/12/21**
16	Zapata de Muros de 6 (0.60*0.25)m 303/8 acero 3/8 a 0.15 m	12.71	m3	5 días	jue 2/12/21
17	Zapata de Columnas (0.60*0.60) e= 0.25 acero 1/2 a 0.15 m	1.94	m3	1 día	jue 9/12/21
18	Columnas de Amarre (0.20 x 0.20)m 601/2 acero 3/8 a 0.20 m	0.74	m3	1 día	vie 10/12/21
19	Columnas Estructurales(0.30 x 0.30)m 801/2 acero 3/8 a 0.20 m	3.31	m3	2 días	lun 13/12/21
20	Vigas de Amarre a nivel de piso (intermedia y final) (0.15*0.20)m cor	2.77	m3	2 días	mié 15/12/21
21					
22	**Muros de Bloques:**	**0**		**13 días**	**vie 10/12/21**
23	Blockes de 6 B.N.P con 0 3/8 a 0.40m	13.52	m2	2 días	vie 10/12/21
24	Blockes de 6S.N.P con 0 3/8 a 0.40m	93.22	m2	7 días	mar 14/12/21
25	Blockes calados en area de ventanas	21.12	m2	4 días	jue 23/12/21
26					
27	**Terminación de Superficie:**	**0**		**8 días**	**vie 17/12/21**
28	Pañete Total en vigas y columnas	76.24	m2	3 días	vie 17/12/21
29	Cantos General	161.3	m	3 días	mié 22/12/21
30	Fraguache	161.3	m2	2 días	lun 27/12/21
31					
32	**Puertas:**	**0**		**5 días**	**jue 30/12/21**
33	Suministro y colocación Puerta Enrollable de (3.00 x 4.00)m	12	m2	3 días	jue 30/12/21
34	Suministro y colocación Puerta de Emegencia de (2.1 O x 1.00)m	1	u	2 días	mar 4/1/22
35					
36	**Pisos:**	**0**		**1 día**	**mié 29/12/21**
37	Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla electrosoldada w 2.3 x 2.3 15cm x 15cm,e=0.15m	7.45	m2	1 día	mié 29/12/21
38					
39	**Pintura:**	**0**		**7 días**	**mié 29/12/21**
40	Pintura General de base en vigas y columnas	76.24	m2	3 días	mié 29/12/21
41	Pintura Acrílica en vigas y columnas	91.73	m2	4 días	lun 3/1/22
42					
43	**Esctructura Metálica:**	**0**		**11 días**	**mar 11/1/22**
44	**Placas de Anclajes de Columnas y Tijerillas:**	**0**		**11 días**	**mar 11/1/22**
45	Placa de (300 X 300 X 4.763)mm en anclaje columnas al muro	162.85	Libra	4 días	mar 11/1/22
46	Placti de (270'x 200 x 4.763) en columnas y correas	94.75	Libra	2 días	lun 17/1/22
47	Placa Central de (300 X 300 X 4.763)en union entre perfiles	157.92	Libras	3 días	mié 19/1/22
48	Tornillo entre perfiles 03/8x3	80	u	1 día	lun 24/1/22
49	Tornillo Hilti en placa empotrada al muro 5/8x7	28	u	1 día	mar 25/1/22
50					
51	**Pichones de Columnas Metálicas:**	**0**		**3 días**	**jue 6/1/22**
52	Pichones de Columna Metalica W6 X 12 X1/2	1004.55	Libras	3 días	jue 6/1/22
53					
54	**Techo Metálico:**	**0**		**25 días**	**mié 26/1/22**
55	Perfiles Metalica W6 X 12 X 1 /2 transversal	4274.48	libras	8 días	mié 26/1/22
56	Correa Tipo C 6 x 8.2 x 30 (3/16) perimetral	537.19	libras	3 días	lun 7/2/22

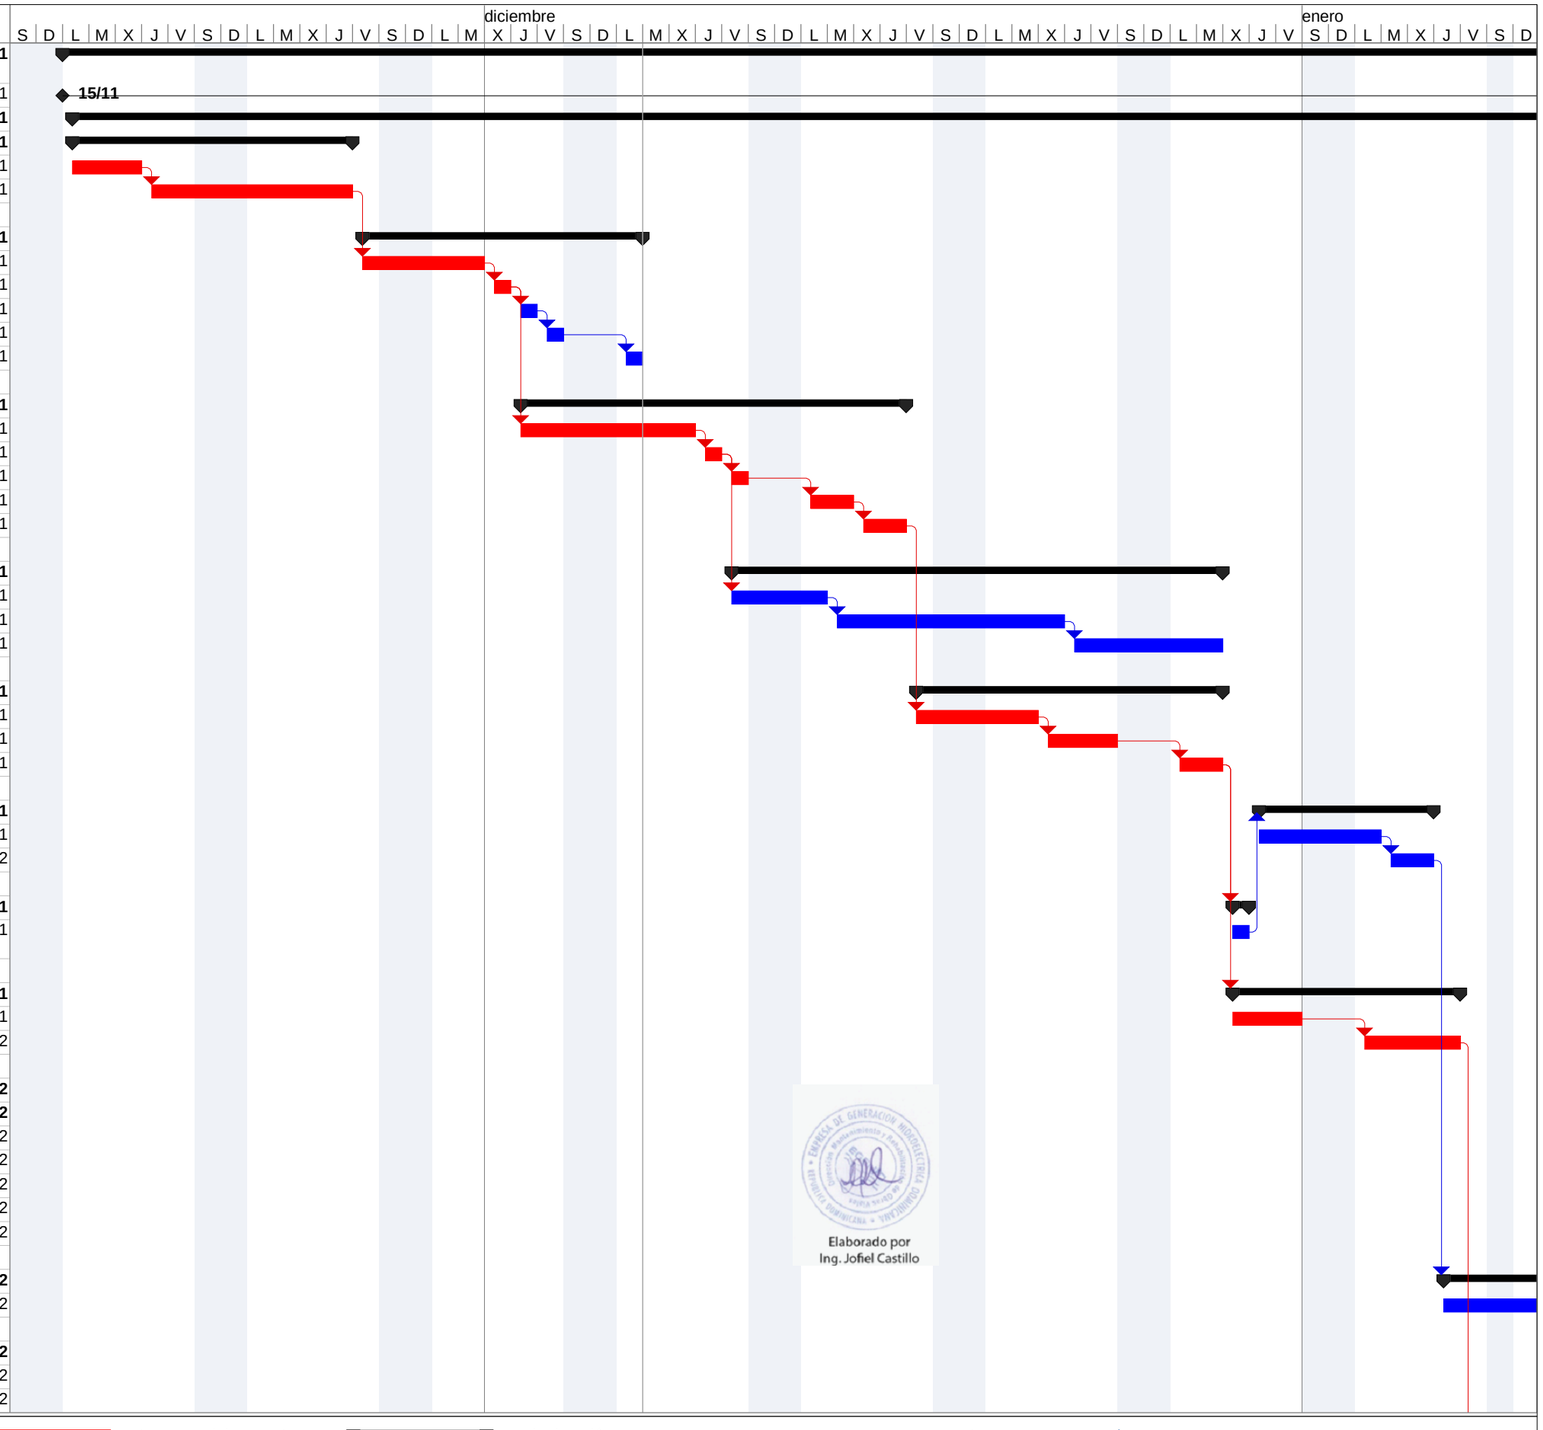

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

Id	Nombre de tarea	CANT	UNID	Duración	Comienzo
57	Correa Tipo e 6 x 8.2 x 30 (3/16) longitudinal	2674.78	libras	6 días	jue 10/2/22
58	Tensores de 3/4	72.8	mi	1 día	vie 18/2/22
59	Suministro e Instalación Aluzinc Calibre 26 Acanalado (área útil 39 p	81.28	m2	4 días	lun 21/2/22
60	Tornillos de Fijación (Studs)	7434	uds	3 días	vie 25/2/22
61					
62	**Suministro y Colocacion de Sistema Electrice Interior:**	**0**		**6 días**	**mié 2/3/22**
63	Salida de Luces de Techo	6	u	3 días	mié 2/3/22
64	Interruptores Sencillos	6	u	3 días	lun 7/3/22
65					
66	**Pintura Interior, Exterior v General:**	**0**		**5 días**	**jue 10/3/22**
67	Pintura Exposica de terminación en Estructura Metálica	142.15	m2	5 días	jue 10/3/22
68					
69	**Instalación Sanitaria:**	**0**		**3 días**	**lun 21/2/22**
70	Suministro y Colocación de tubería de 04PVC- SDR-26 'y piezas	26.6	m	3 días	lun 21/2/22
71					
72	**Miscelaneos:**	**0**		**8 días**	**jue 24/2/22**
73	Hormigón Armado (Industrial fc=210 kg/cm2) con malla electrosolda(	42.37	m3	4 días	jue 24/2/22
74	Señalización Horizontal con pintura termoplastica	50	m	3 días	mié 2/3/22
75	Limpieza Final y Bote	1	pa	1 día	lun 7/3/22
76					
77	**GARITA CON BAÑO**	**0**		**28 días**	**vie 7/1/22**
78	**Partidas Generales:**	**0**		**1 día**	**vie 7/1/22**
79	Replanteo	1	pa	1 día	vie 7/1/22
80					
81	**Movimiento de Tierra:**	**0**		**3 días**	**lun 10/1/22**
82	Excavación Zapata de Muros y Columnas	6.3	m3n	2 días	lun 10/1/22
83	Relleno de Reposicion	5.01	m3C	1 día	mié 12/1/22
84					
85	**Horrnloón Armado en:**	**0**		**7 días**	**jue 13/1/22**
86	Zapata de Muros de 6(0.45*0.20) 30 3/8 acero 3/8 a 0.15 m	1.93	m3	2 días	jue 13/1/22
87	Viga de amarre (0.15*0.20)m con 401/2 y 3/8 a 0.20 m	0.64	m3	1 día	lun 17/1/22
88	Dinteles ·(0.15*0.20)m con 401/2 y 3/8 a 0.20 m	0.13	m3	1 día	mar 18/1/22
89	Losa 0 3/8 a 0.20m en A/D, incluye vuelo	2.54	m3	3 días	mié 19/1/22
90					
91	**Muros de Bloques:**	**0**		**4 días**	**mar 18/1/22**
92	Blockes de 6 B.N.P	8.56	m2	1 día	mar 18/1/22
93	Blockes de 6 S.N.P	51.72	m2	3 días	mié 19/1/22
94					
95	**Terminación de Suoerficie:**	**0**		**5 días**	**lun 24/1/22**
96	Pañete Total en muros.vigas.dinteles	103.44	m2	2 días	lun 24/1/22
97	Pañete de Techo	16.34	m2	1 día	mié 26/1/22
98	Cantos General	34.4	m	1 día	jue 27/1/22
99	Fraguache	29.06	m2	1 día	vie 28/1/22
100					
101	**Terminación de Techo:**	**0**		**5 días**	**lun 31/1/22**
102	Fino de Techo Plano	15.15	m2	1 día	lun 31/1/22
103	Antepecho	3.24	m2	1 día	mar 1/2/22
104	Za baleta	15	m	1 día	mié 2/2/22
105	Suministro y colocación de Impermabilizante con tela de poliester y p	19.74	m2	1 día	jue 3/2/22
106	Desague de Techo de 3	2	ud	1 día	vie 4/2/22
107					
108	**Puertas y Ventanas:**	**0**		**3 días**	**jue 10/2/22**
109	Suministro y colocación de Puerta de polimetal,incluye llavin	3	uds	1 día	jue 10/2/22
110	Ventana Salomonica de Aluminio AA	42.18	p2	2 días	vie 11/2/22
111					
112	**Pintura:**	**0**		**5 días**	**jue 3/2/22**
113	Pintura Economica en Techo	16.34	m2	1 día	jue 3/2/22

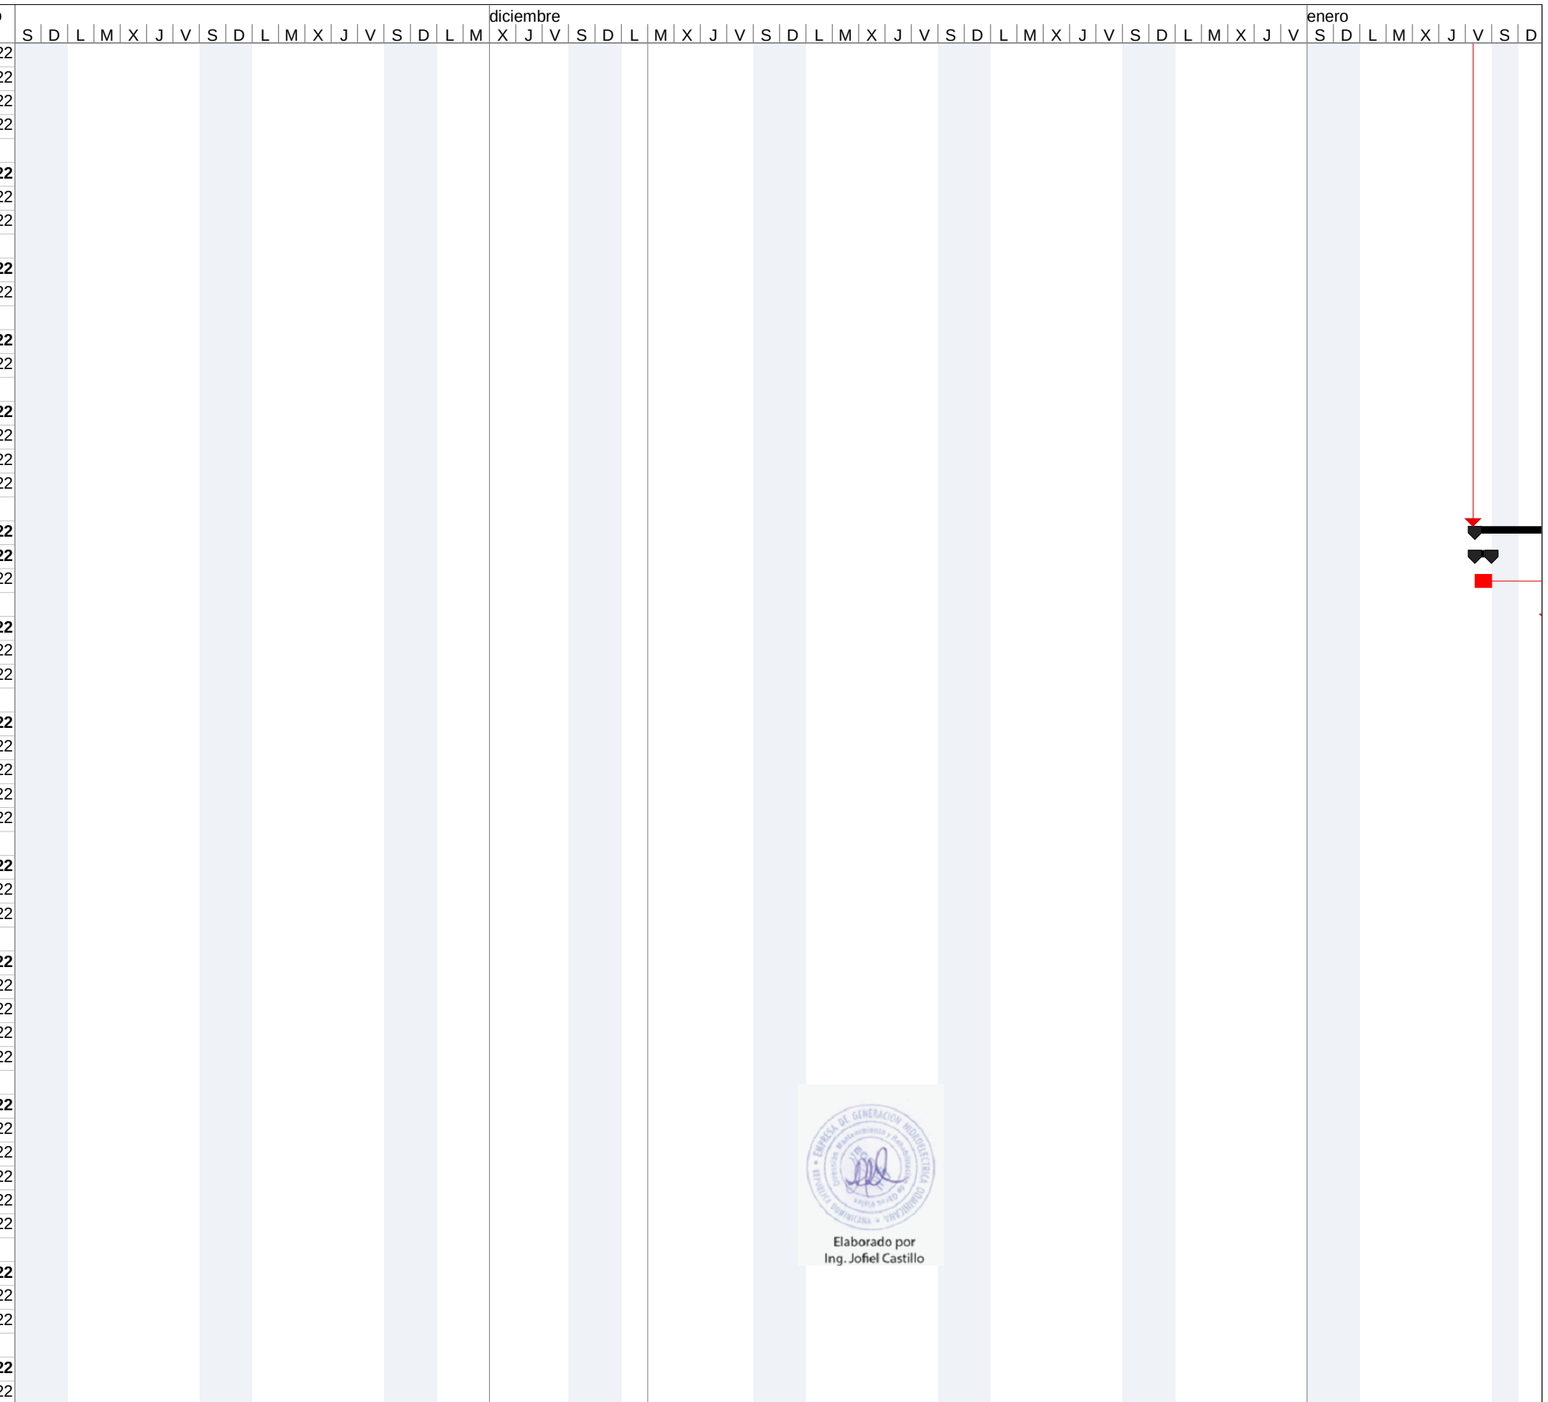

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

Id	Nombre de tarea	CANT	UNID	Duración	Comienzo
114	Pintura General de base en muros	103.44	m2	2 días	vie 4/2/22
115	Pintura Acrílica en Paredes Exteriores	51.72	m2	1 día	mar 8/2/22
116	Pintura Semi Gloss en Paredes Interiores	51.72	m2	1 día	mié 9/2/22
117					
118	**Instalaciones Sanitarias:**	**0**		**12 días**	**vie 28/1/22**
119	Inodoro mediano Blancos e/Tapa	1	u	1 día	vie 28/1/22
120	Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora	1	u	1 día	lun 31/1/22
121	Desague de Piso	1	u	0.5 días	mar 1/2/22
122	Ventilación de 3	1	u	0.5 días	mar 1/2/22
123	Instalación de Agua Potable,inc Bomba	1	u	1 día	mié 2/2/22
124	Registro	1	u	2 días	jue 3/2/22
125	Suministro e Instalac de Tinaco 165 gis	1	u	1 día	lun 7/2/22
126	Cámara Septica	1	u	3 días	mar 8/2/22
127	Filtrante de 18 pies a mano, incluye conexion	0	u	2 días	vie 11/2/22
128					
129	**Instalaciones Electricas:**	**0**		**4 días**	**lun 31/1/22**
130	Luces Cenitales	8	uds	1 día	lun 31/1/22
131	Interruptores Doble	2	uds	1 día	mar 1/2/22
132	Interruptor Sencillo	1	ud	0.5 días	mié 2/2/22
133	Tomacorriente Doble	3	uds	0.5 días	mié 2/2/22
134	Panel de Distribucion de 2 a 4 Circuitos	1	Ud	0.5 días	jue 3/2/22
135	Interconexión a linea principal	1	Ud	0.5 días	jue 3/2/22
136					
137	**Pisos y Ceramicas:**	**0**		**2.5 días**	**lun 31/1/22**
138	Piso de Ceramica Española	14	m2	1 día	lun 31/1/22
139	Revestimiento de Ceramica en Paredes	12.83	m2	1 día	mar 1/2/22
140	Zocalos	20.9	m	0.5 días	mié 2/2/22
141					
142	**Limpieza Final:**	**0**		**1 día**	**mar 15/2/22**
143	Limpieza final	1	pa	1 día	mar 15/2/22
144					
145	**CONSTRUCCION DE ENCACHE EN TALUD Y MURO GAVIONES PARA PROTECCION TALUD**	**0**		**53 días**	**mié 16/2/22**
146	**Trabajos Preliminares:**	**0**		**2 días**	**jue 17/2/22**
147	Replanteo	1	pa	1 día	jue 17/2/22
148	Caseta de materiales	1	pa	1 día	vie 18/2/22
149					
150	**Movimiento de Tierra**	**0**		**3 días**	**mié 16/2/22**
151	Limpieza y desyerbo en talud	60	m2	1 día	mié 16/2/22
152	Excavación para gaviones a mano	60	m3n	1 día	jue 17/2/22
153	Perfilado de Talud para encache	80	m2	1 día	vie 18/2/22
154					
155	**Relleno:**	**0**		**4 días**	**mié 23/2/22**
156	Relleno detrás del Gavion con maquilo (incluye suministro, compacta	48	m3c	4 días	mié 23/2/22
157					
158	**Acarreo Adicional Material de Excavacion**	**0**		**2 días**	**lun 21/2/22**
159	Bote de material a mano	81.6	m3c	2 días	lun 21/2/22
160					
161	**Obras Complementarias**	**0**		**49 días**	**lun 21/2/22**
162	Encache en Talud (Altura de 11.SOm)	446.6	m2	14 días	lun 21/2/22
163	Encache en Cunetas en zanjas de coronacion	46.2	m2	3 días	vie 11/3/22
164	Hormigon simple en fondo de cunetas de coronacion encachadas	1.54	m3	1 día	mié 16/3/22
165	Construccion muro de Gaviones Tipo cajones con revestimiento de alta resistencia, (incluye suministro y transporte de piedra a 5 km	100	m3	22 días	jue 17/3/22
166	Hormigon Simple en Gaviones	8	m3	1 día	lun 18/4/22
167	Pañete de Muro de Gaviones, e=0.03m	80	m2	2 días	mar 19/4/22
168	Suministro y colocación de Geotextil en gaviones previa colocación de relleno compactado	80	m2	2 días	jue 21/4/22

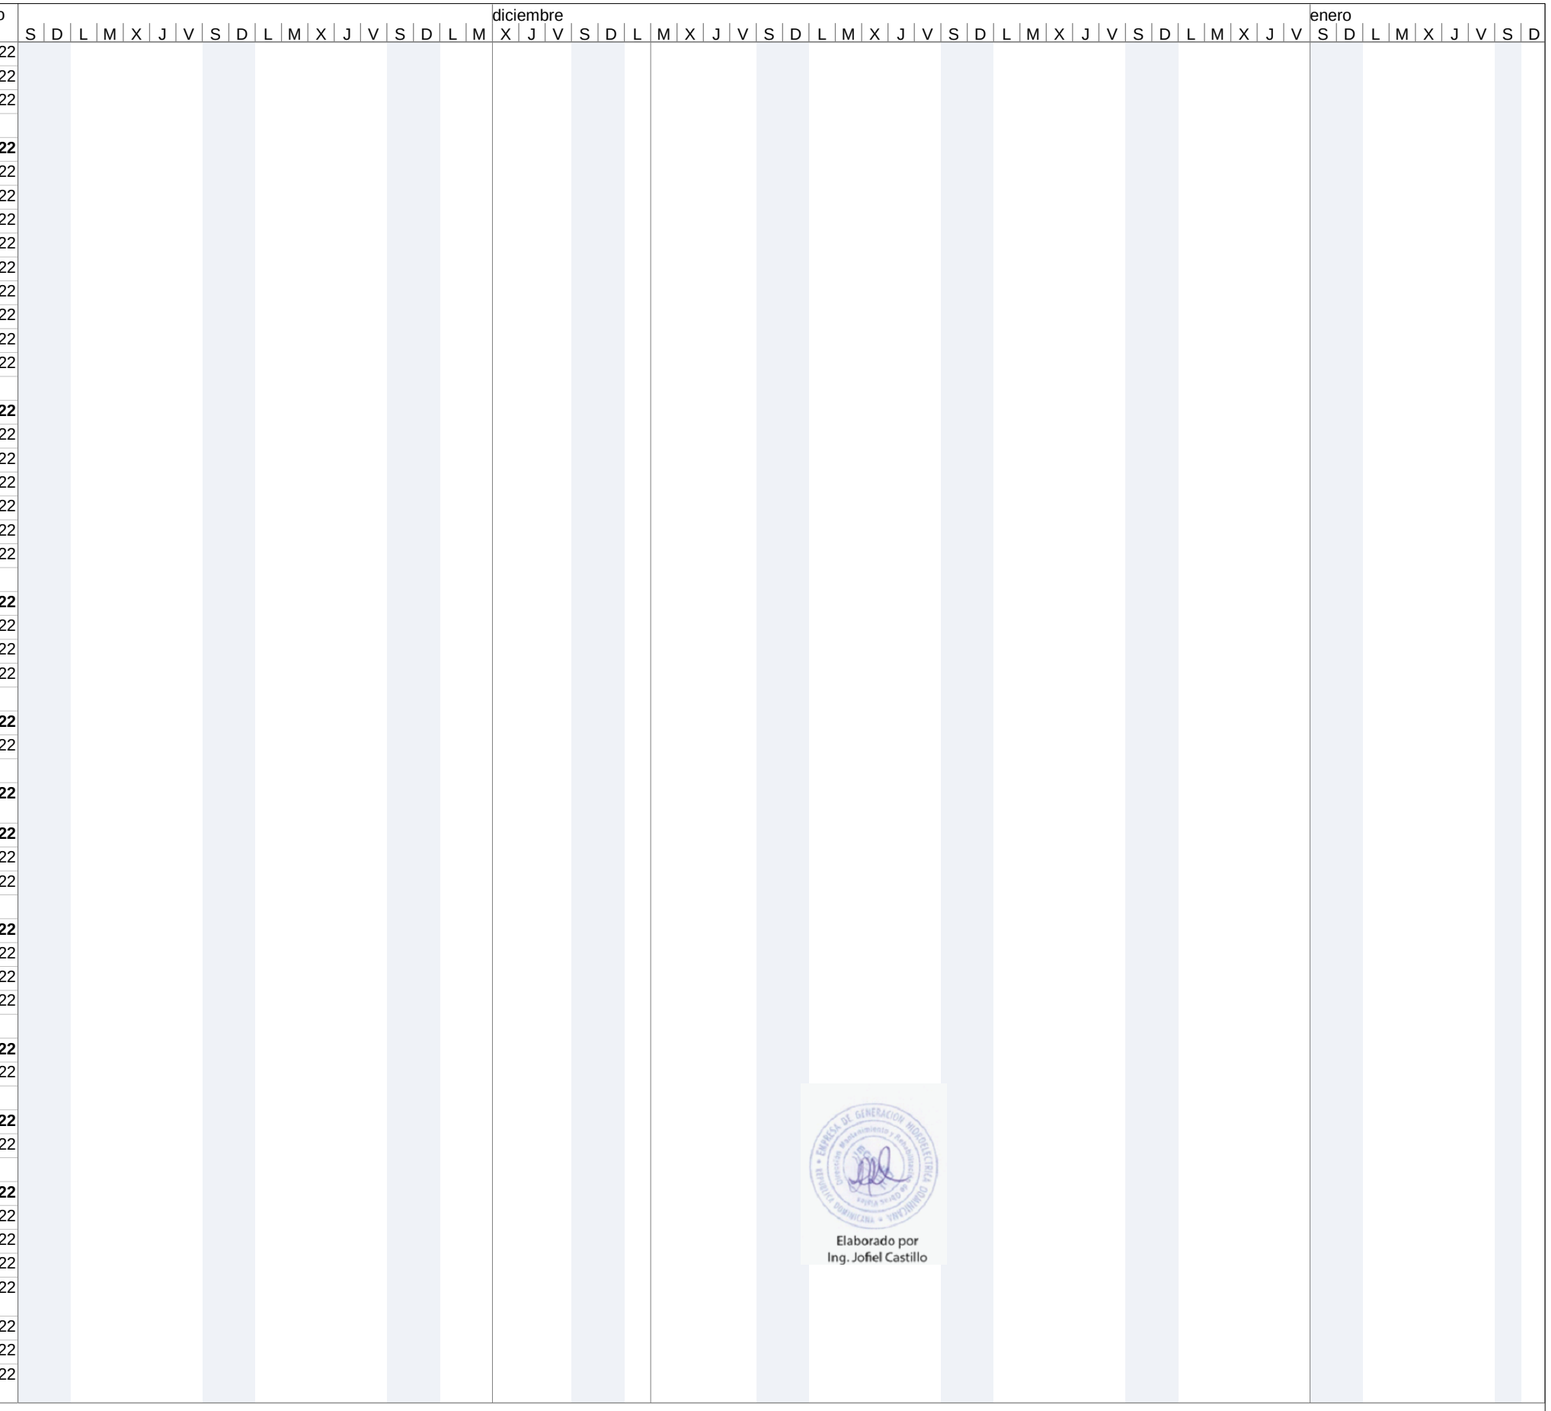

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

Id	Nombre de tarea	CANT	UNID	Duración	Comienzo
169	Disipador de energía en encache	25	m2	3 días	lun 25/4/22
170	Lloraderos en muro gaviones con tubo 02PVC, SDR-26, separado a 1.00m	40	u	1 día	jue 28/4/22
171	**Miscelaneos**	**0**		**1 día**	**vie 29/4/22**
172	Limpieza _Final y Bote	0	pa	1 día	vie 29/4/22
173					
174	**REHABILITACION AREA BUSTO ROSA JULIA DE LA CRUZ**	**0**		**7.5 días**	**lun 2/5/22**
175	**Trabajos Generales:**	**0**		**7.5 días**	**lun 2/5/22**
176	Remoción Ceramica existente.incluye bote	6.49	m2	0.5 días	lun 2/5/22
177	Revestimiento de Area con Porcelanato para exterior	6.49	m2	0.5 días	lun 2/5/22
178	Pintura en Area de Base	5.64	m2	0.5 días	mar 3/5/22
179					
180	**CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURAS**	**0**		**7.5 días**	**lun 2/5/22**
181	**Trabaios Generales**	**0**		**7.5 días**	**lun 2/5/22**
182	Limpiza del Area y Replanteo	1	pa	1 día	lun 2/5/22
183	Excavacion General Zapata	3.09	m3n	0.5 días	mar 3/5/22
184	H.A Zapata de Muros de Bloques de 6(0.45*0.20) 30 3/8 acerc	1.93	m3	0.5 días	mar 3/5/22
185	Blockes de 6S.N.P	18.14	m2	1 día	mié 4/5/22
186	Vigas de Amarre a nivel de piso (intermedia y final) (0.15*0.20	0.44	m3	1 día	jue 5/5/22
187	Columnas de Amarre (0.15 x 0.20)m 401/2 acero 3/8 a 0.20 m	0.18	m3	0.5 días	vie 6/5/22
188	Pañete Total en Muro.vigas y columnas	40.98	m2	1 día	vie 6/5/22
189	Cantos General	29.28	m	0.5 días	lun 9/5/22
190	Piso de Hormigón simple	12.25	m2	0.5 días	mar 10/5/22
191	Limpieza Final	1	pa	1 día	mar 10/5/22
192					
193					
194	**REHABILITACION AREA DE BAÑO EN CASA DE MAQUINAS**	**0**		**10 días**	**mié 11/5/22**
195	**Trabajos Generales**	**0**		**10 días**	**mié 11/5/22**
196	Remoción Ceramica existente.incluye bote	23.01	m2	1 día	mié 11/5/22
197	Desinstalación de Puerta	1	pa	0.5 días	jue 12/5/22
198	Desinstalación de Aparatos Sanitarios	2	u	1 día	vie 13/5/22
199	Revestimiento de Ceramica en Paredes	23.01	m2	2 días	lun 16/5/22
200	Pintura en Area de Base	9.44	m2	1 día	mié 18/5/22
201	Piso de Ceramica de superior calidad	4.13	m2	1 día	jue 19/5/22
202	Inodoro mediano Blancos e/Tapa	1	u	0.5 días	vie 20/5/22
203	Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora	1	u	0.5 días	vie 20/5/22
204	Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín	1	u	0.5 días	lun 23/5/22
205	Suministro y Colocación de Juego de accesorios para baño	1	pa	0.5 días	lun 23/5/22
206	Suministro y Colocación de espejo	1	pa	0.5 días	mar 24/5/22
207	Limpieza Final	1	pa	1 día	mar 24/5/22
208					
209	**REHABILITACION AREA DE COCINA EN CASA DE MAQUINAS**	**0**		**11 días**	**mié 25/5/22**
210	**Trabajos Generales**	**0**		**11 días**	**mié 25/5/22**
211	Limpieza General con desgrasante	1	pa	1 día	mié 25/5/22
212	Remoción piso existente.incluye bote	10.44	m2	2 días	jue 26/5/22
213	Desinstalación de Puerta	1	pa	1 día	lun 30/5/22
214	Revestimiento de Ceramica de Pared en area de cocina	1.95	m2	1 día	mar 31/5/22
215	Pintura General interior en area de cocina	28.95	m2	1 día	mié 1/6/22
216	Piso de éeramica de superior calidad	8	m2	1 día	jue 2/6/22
217	Zocalos de Ceramica	7.47	m	1 día	vie 3/6/22
218	Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín	1	u	1 día	lun 6/6/22
219	Suministro e instalación de gavinete de piso en caoba en casa de ma	3.25	m	0.5 días	mar 7/6/22
220	Suministro e instalación de gavinete de pared en caoba en casa de r	2.05	m	0.5 días	mié 8/6/22
221	Limpieza Final	1	pa	1 día	mié 8/6/22
222					
223	**REABILITACION GENERAL CASA DE OPERADORES**	**0**		**7.5 días**	**lun 6/6/22**
224	**Trabaios Generales**	**0**		**7.5 días**	**lun 6/6/22**

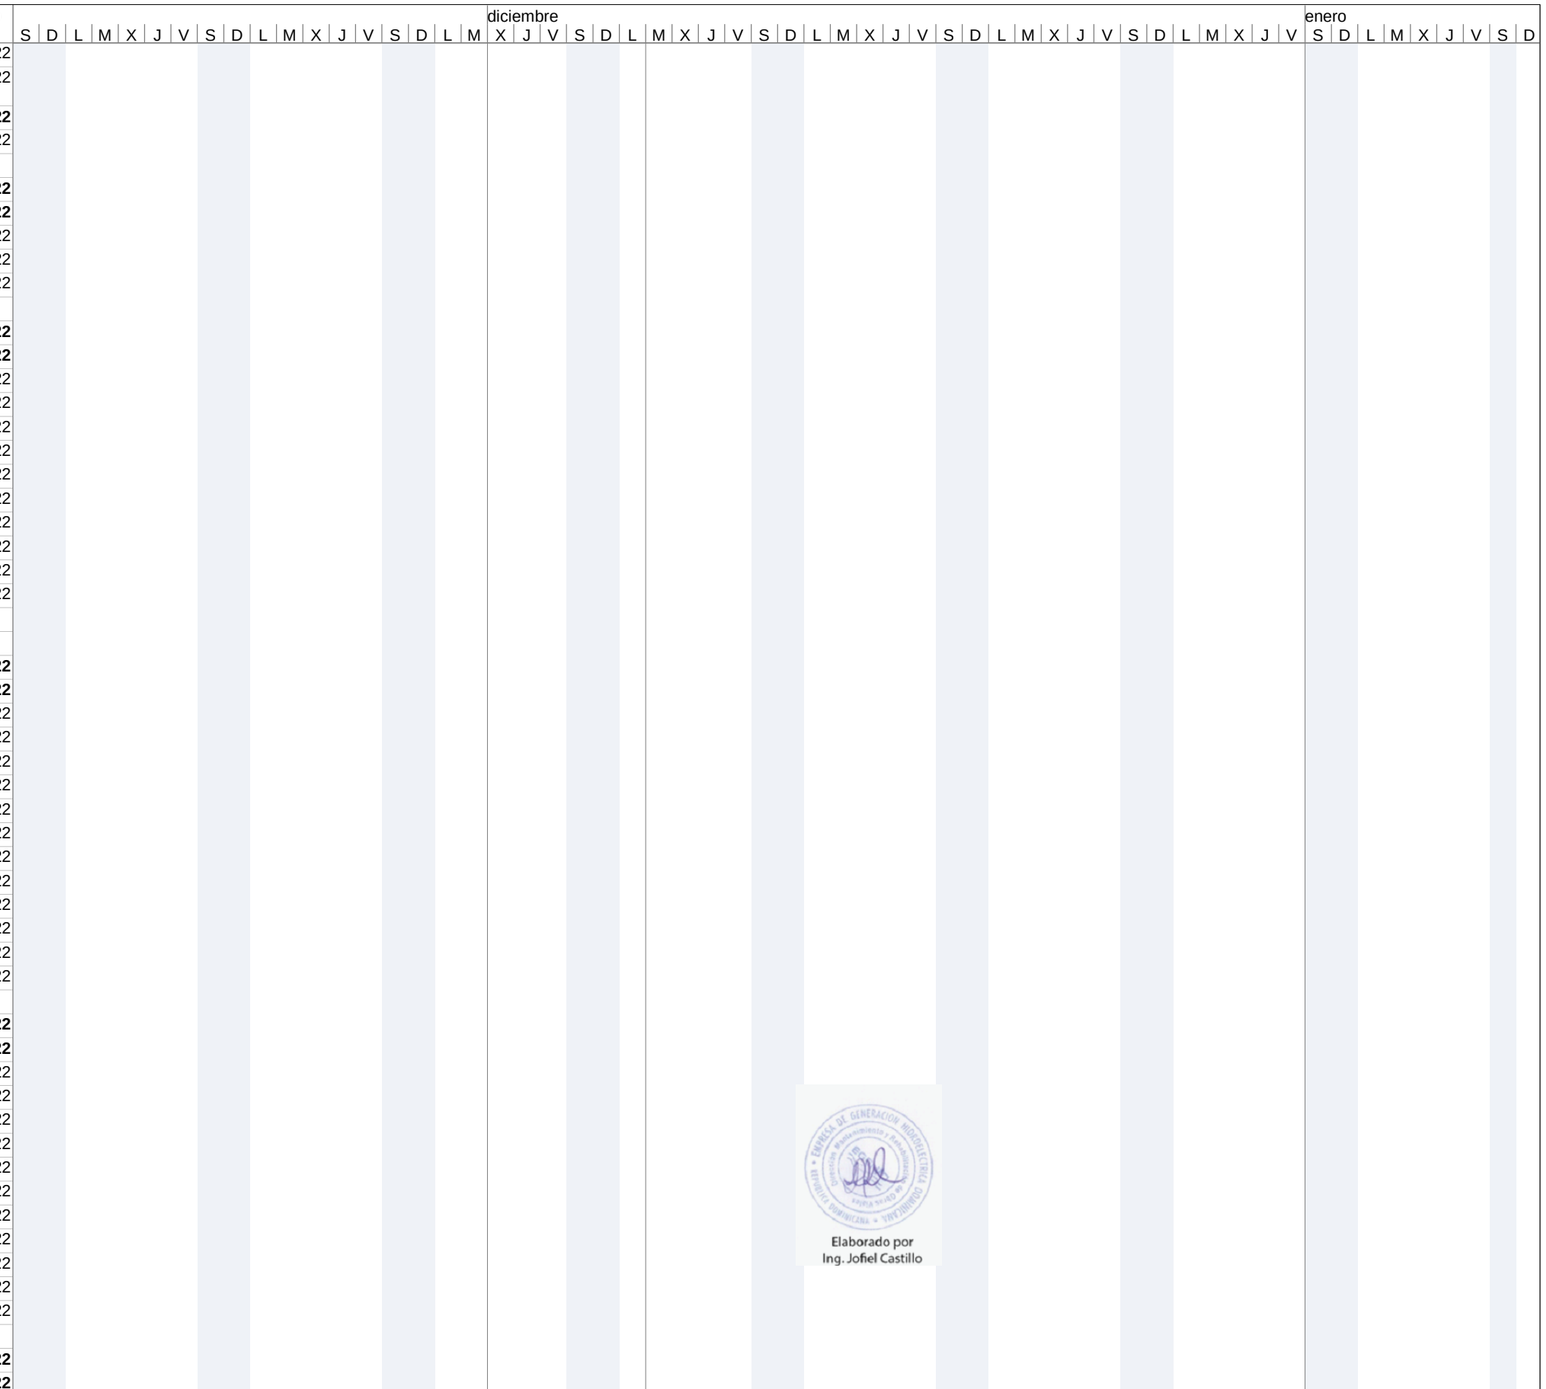

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

Id	Nombre de tarea	CANT	UNID	Duración	Comienzo
225	Limpieza General con desgrasante	1	pa	1 día	lun 6/6/22
226	Remoción piso existente,incluye bote	147.77	m2	3 días	mar 7/6/22
227	Remoción de ceramica de revestimiento ene baños.incluye bote	24.64	m2	1 día	vie 10/6/22
228	Desinstalación de Puerta	1	pa	0.5 días	lun 13/6/22
229	Desinstalación de Aparatos Sanitarios	4	u	1 día	mar 14/6/22
230	Revestimiento de Ceramica de Pared en baños	24.64	m2	1 día	mié 15/6/22
231	Pintura General interior Semigloss	218.97	m2	3 días	jue 16/6/22
232	Pintura General exterior acrílica	128.44	m2	3 días	mar 21/6/22
233	Piso de Ceramica de superior calidad	147.77	m2	3 días	vie 24/6/22
234	Zocalos de Ceramica	118.8	m	1 día	mié 29/6/22
235	. Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavín	1	u	0.5 días	jue 30/6/22
236	Rehabilitación General de gavinetes de piso y pared de cocina en ca	1	pa	1 día	jue 30/6/22
237	Suministro y colocación de Impermabilizante con tela de poliester y p	176.32	m	3 días	vie 1/7/22
238	Inodoro mediano Blancos e/Tapa	2	u	1 día	mié 6/7/22
239	Lavamano pequeño Blanco Incluye Mezcladora	2	u	1 día	jue 7/7/22
240	Suministro y Colocación de Juego de accesorios para baño	2	u	0.5 días	vie 8/7/22
241	Suministro y Colocación de espejo	1	pa	0.5 días	lun 11/7/22
242	Techo Metálico en area de lavado	1	pa	0.5 días	lun 11/7/22
243	Bote de material a mano	24.01	m3e	1 día	mar 12/7/22
244	Limpieza Final	1	pa	1 día	mié 13/7/22
245					
246	**EXPLANACION PARA CONSTRUCCION HELIPUERTO**	**0**		**10 días**	**mar 7/6/22**
247	**Trabajos Generales**	**0**		**10 días**	**mar 7/6/22**
248	Nivelacion de terreno	225	m2	3 días	mar 7/6/22
249	Hormigón Armado (Industrial fc-21 O kg/cm2) con malla electrosoldada w 2.3 x 2.3 10cm x 10cm ranurado con aditivo en area (15 x 15)m ,e=0.15m	33.75	m3	3 días	vie 10/6/22
250	Señalización Horizontal con pintura termoplastica, incluyendo manga	1	pa	2 días	mié 15/6/22
251	Limpieza inicial y final (incluye bote de material)	1	pa	2 días	vie 17/6/22
252	FINAL	0		0 días	vie 8/7/22

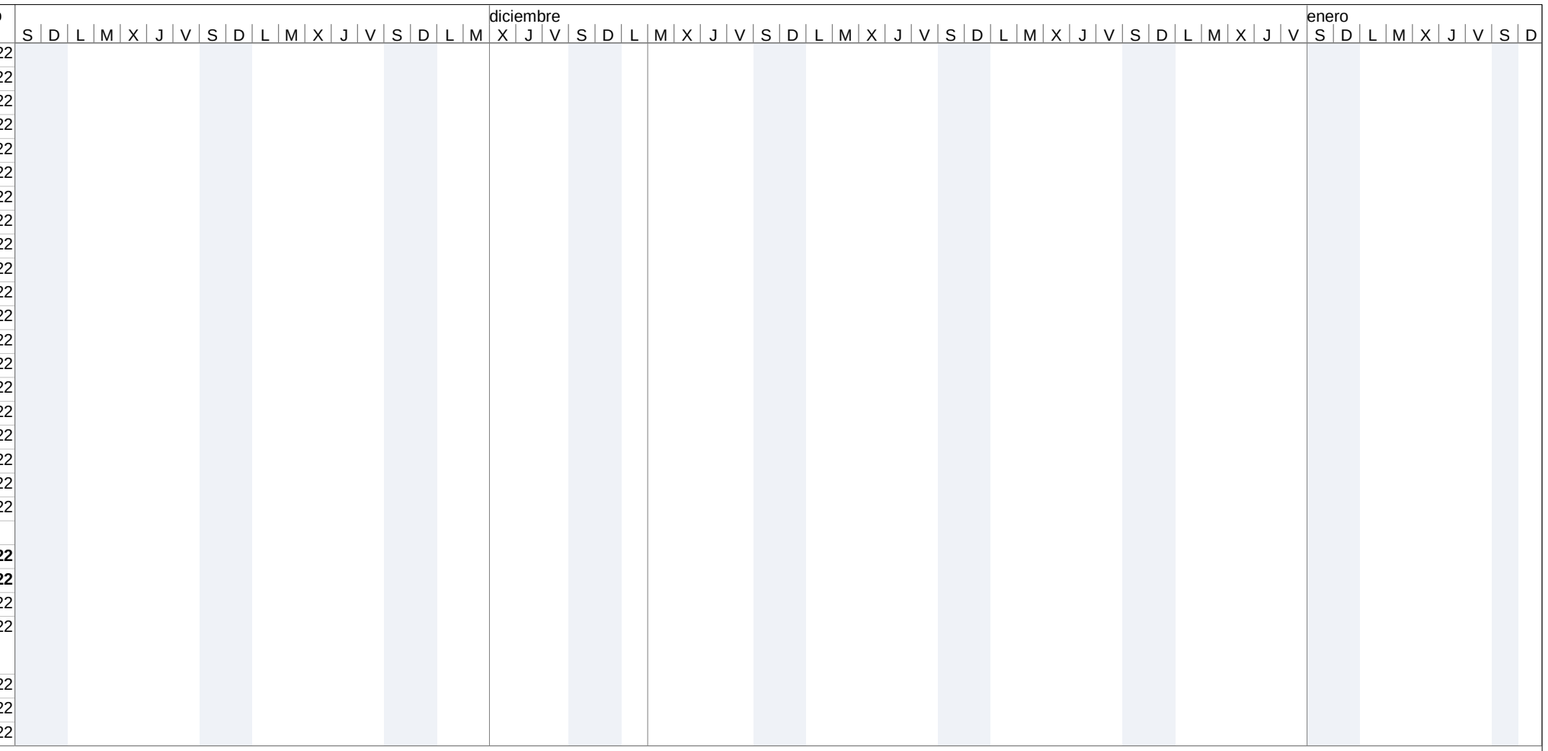

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

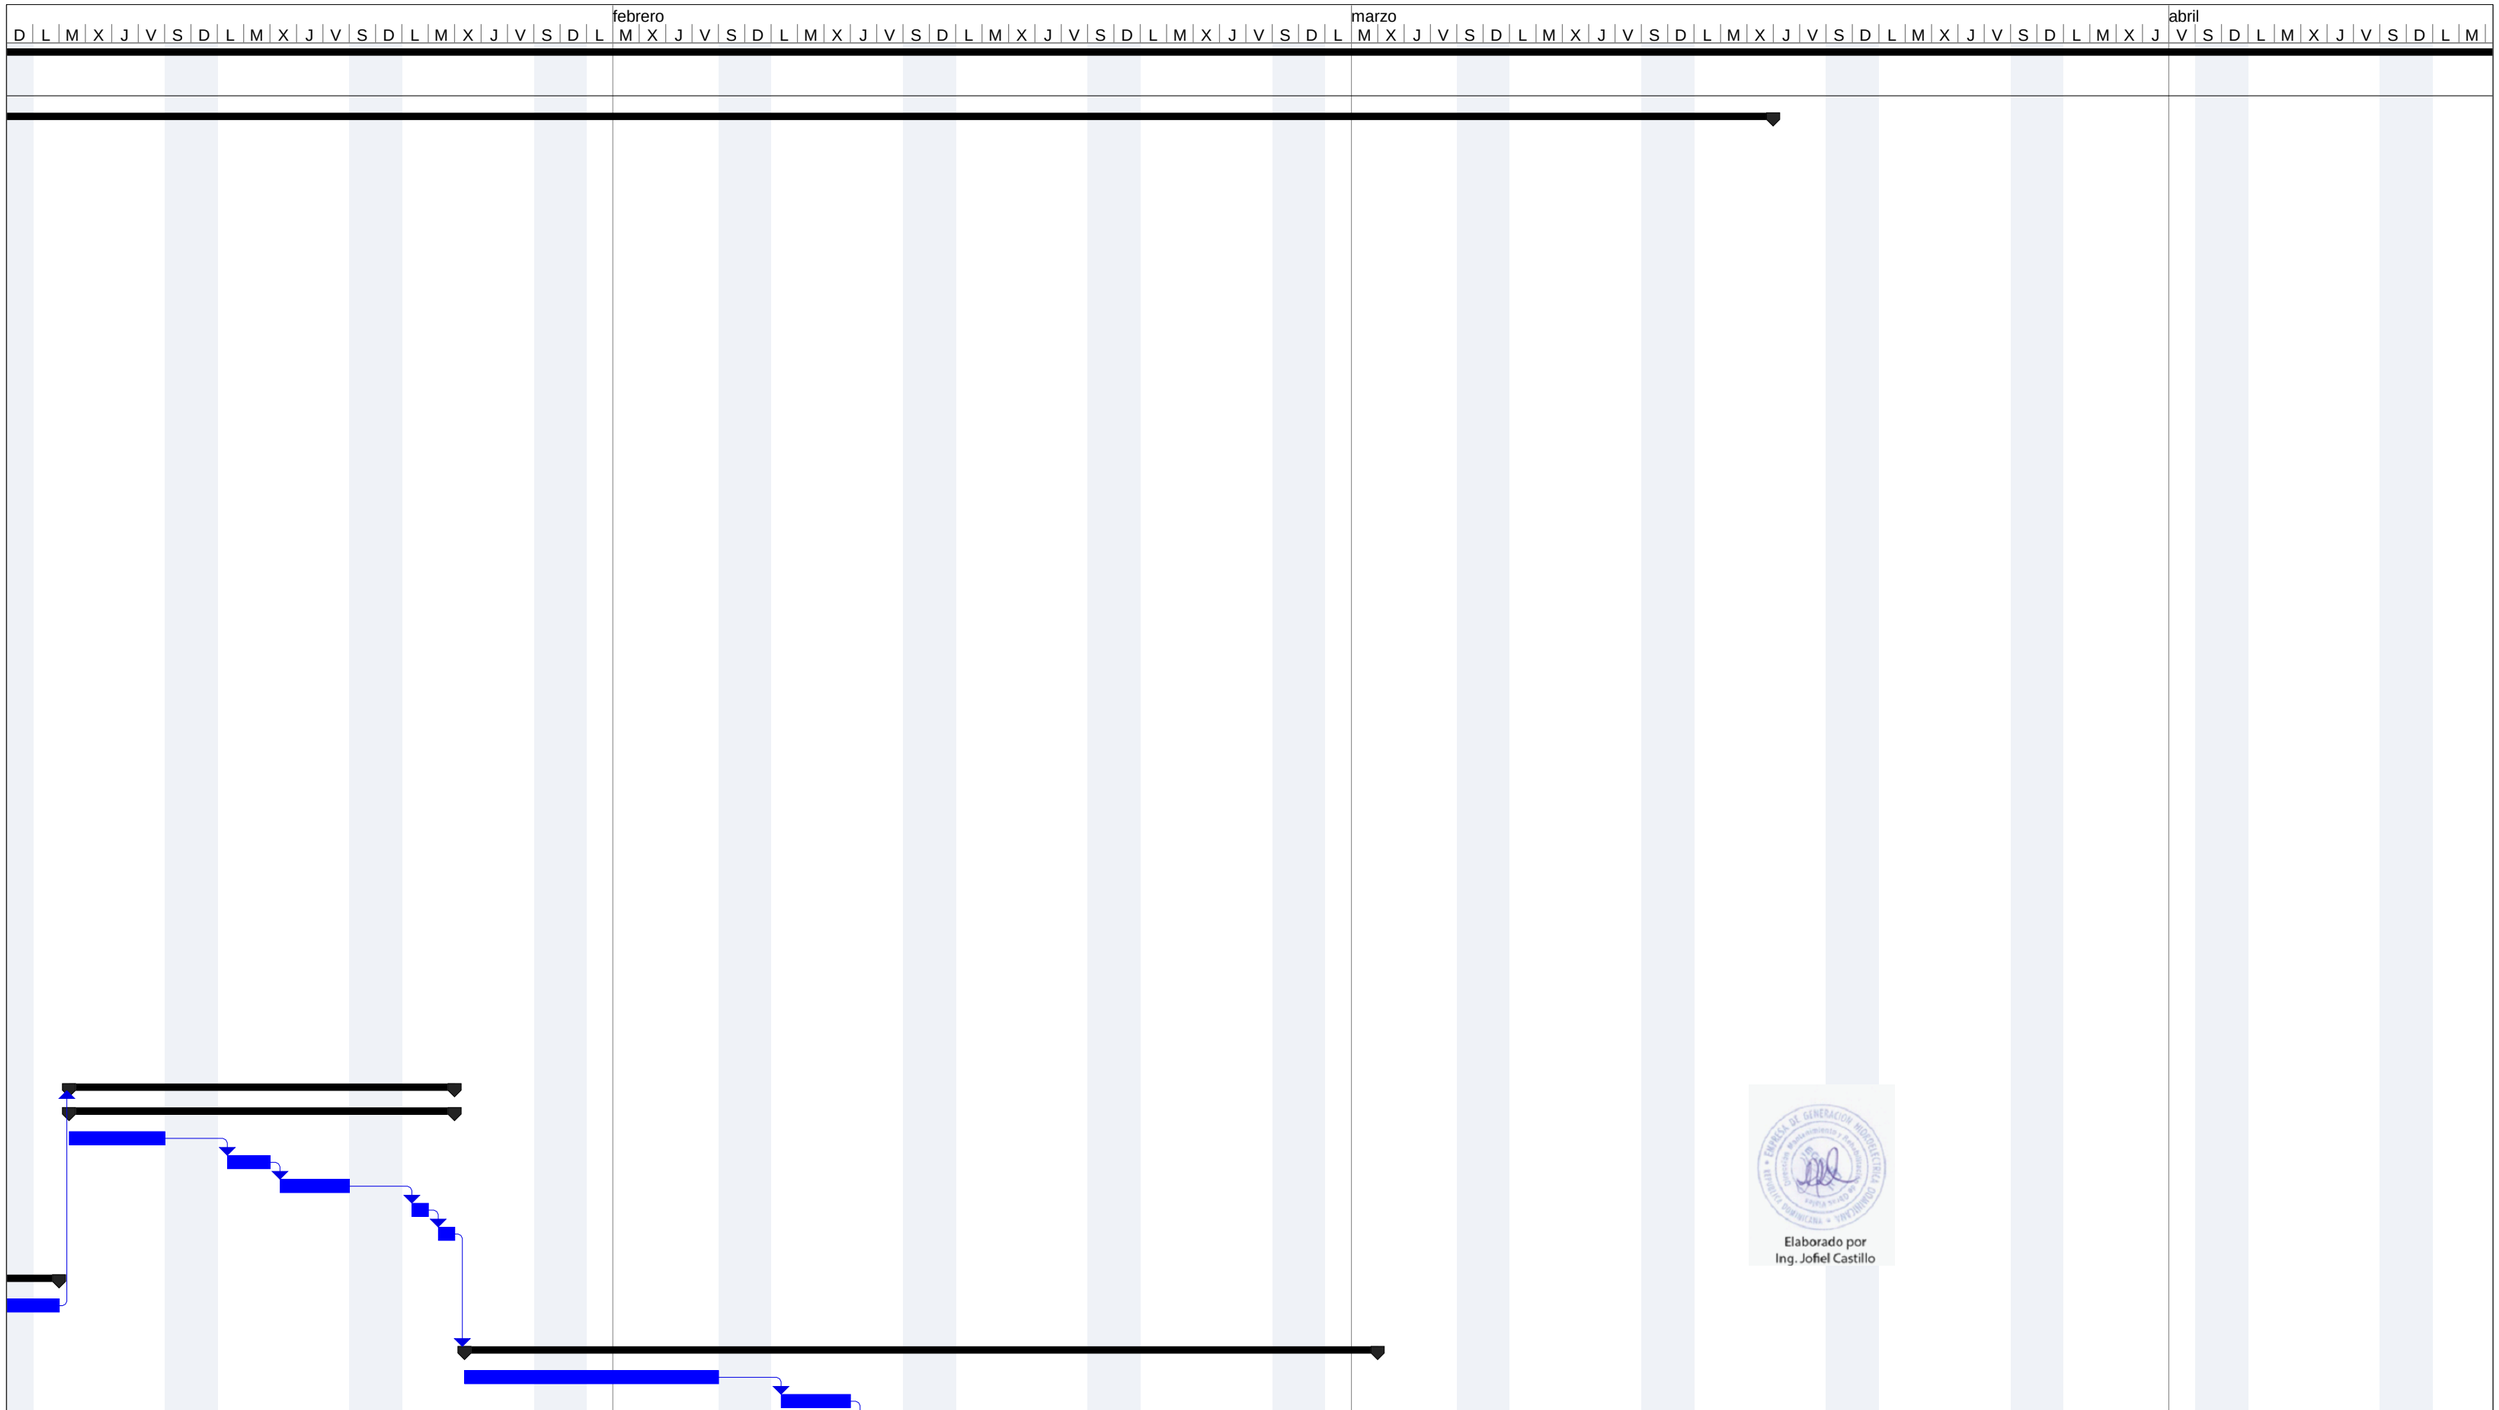

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

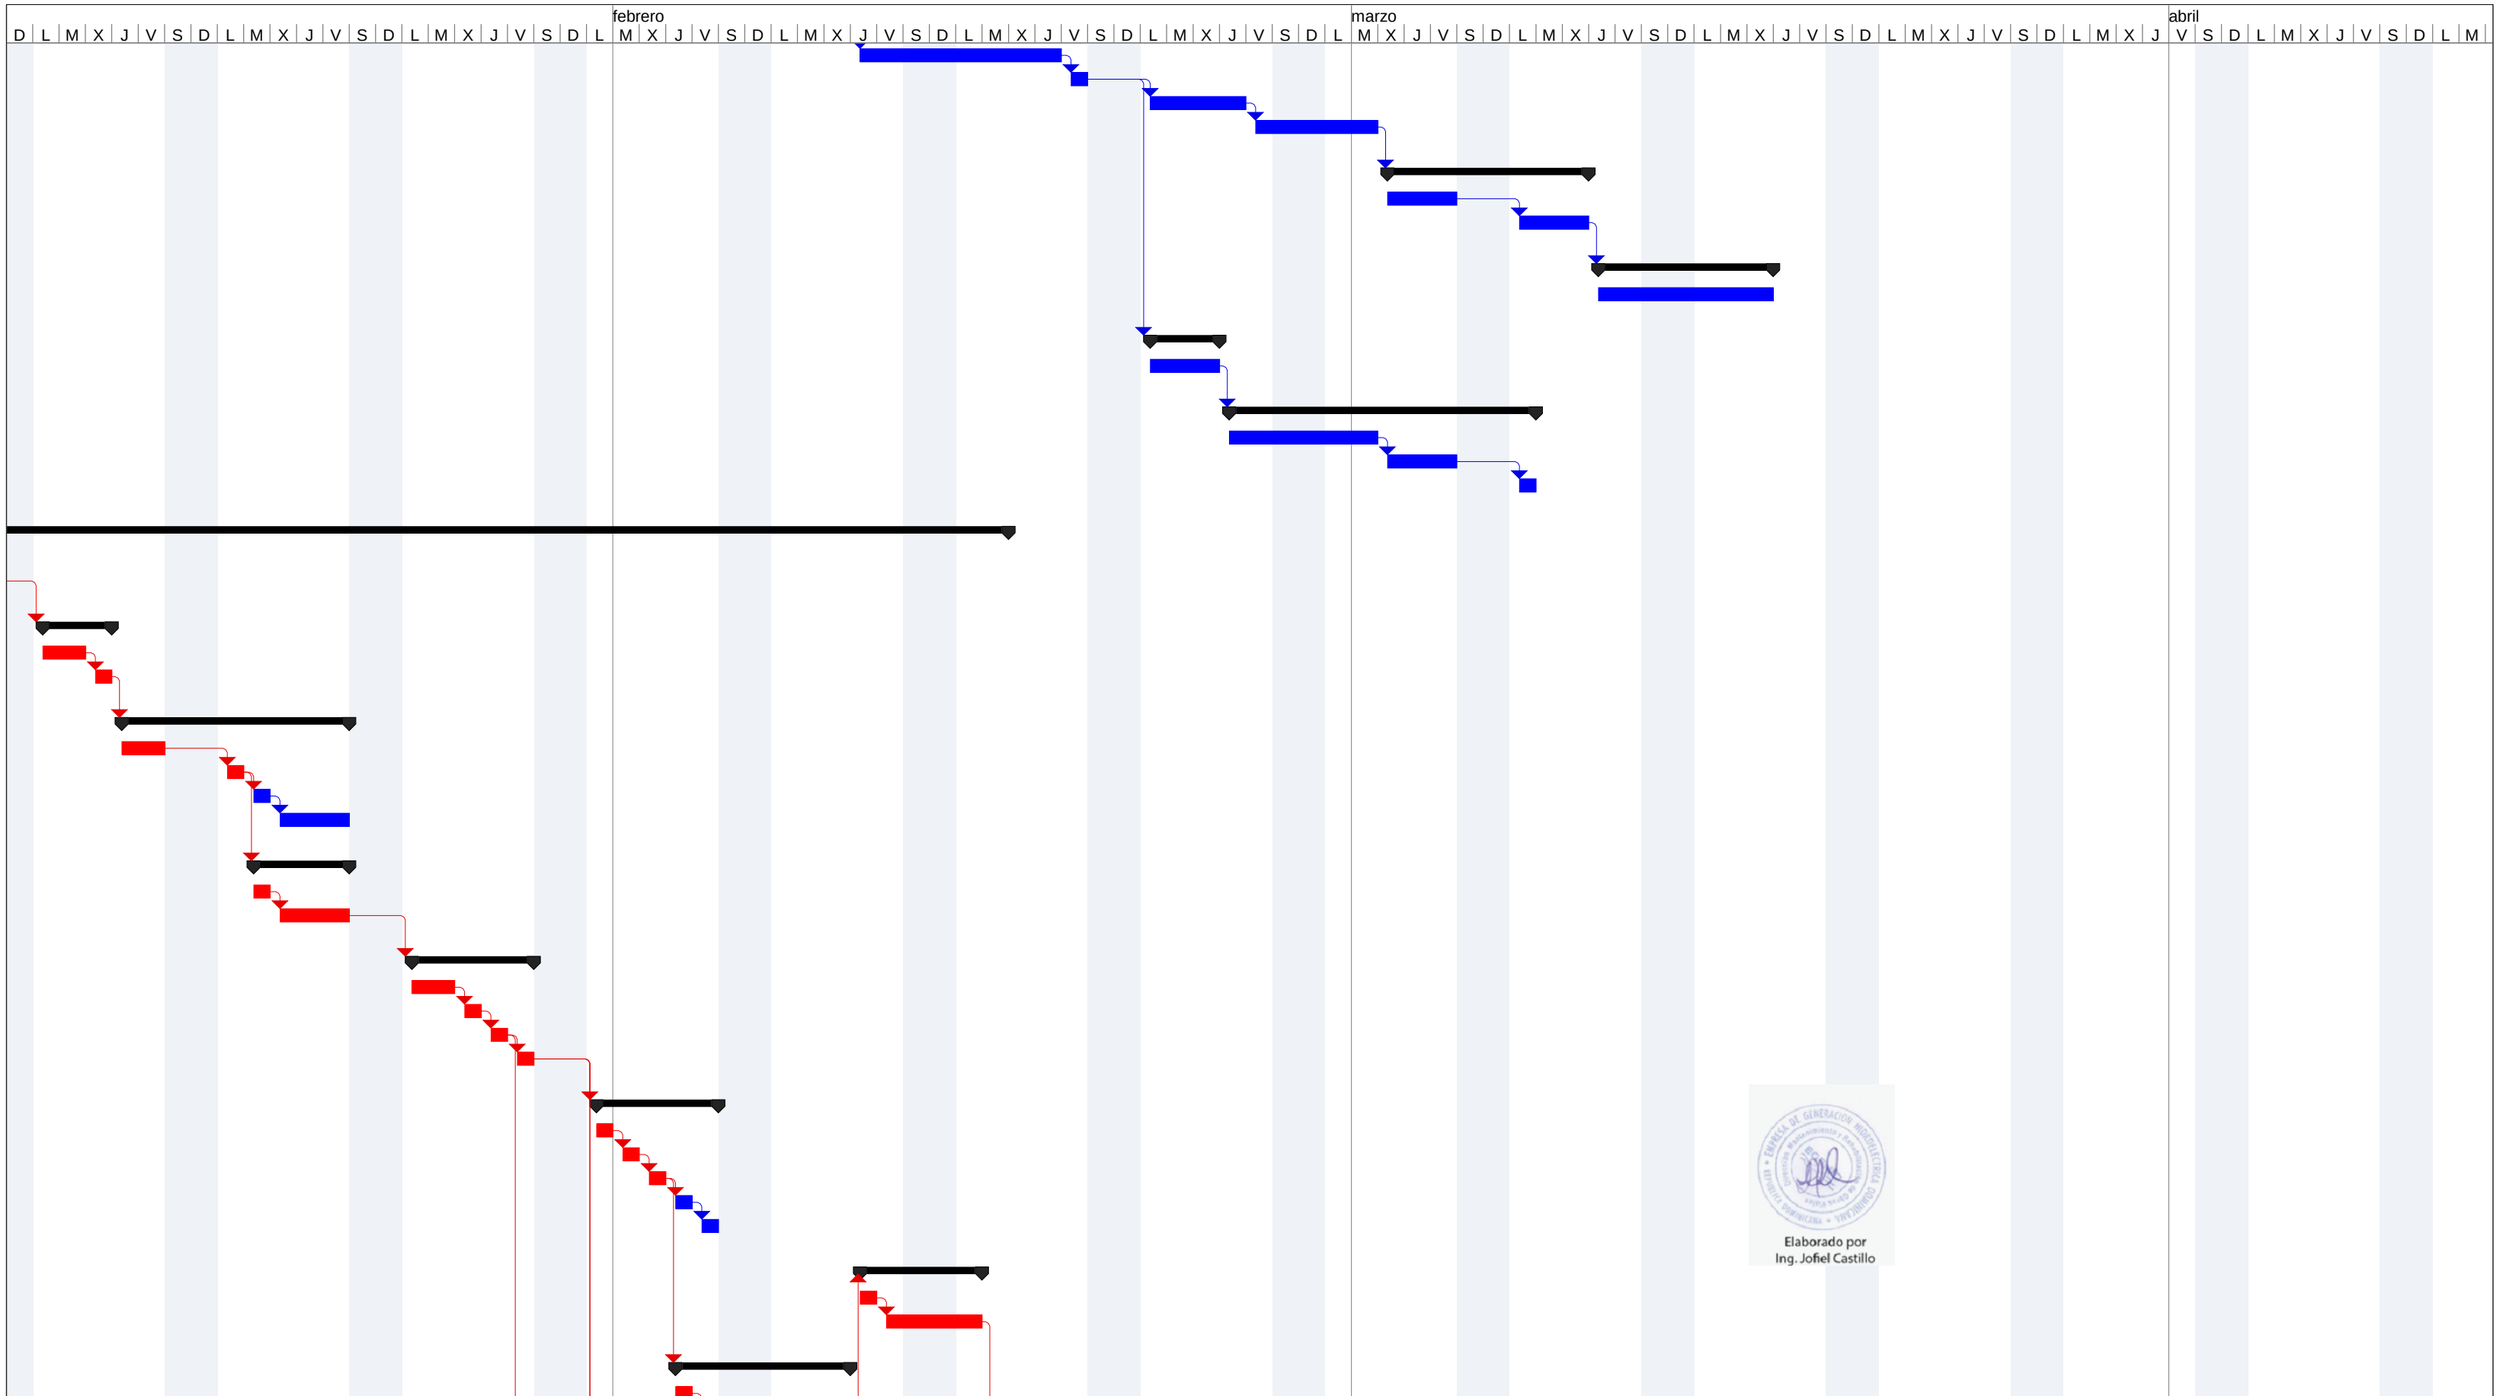

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

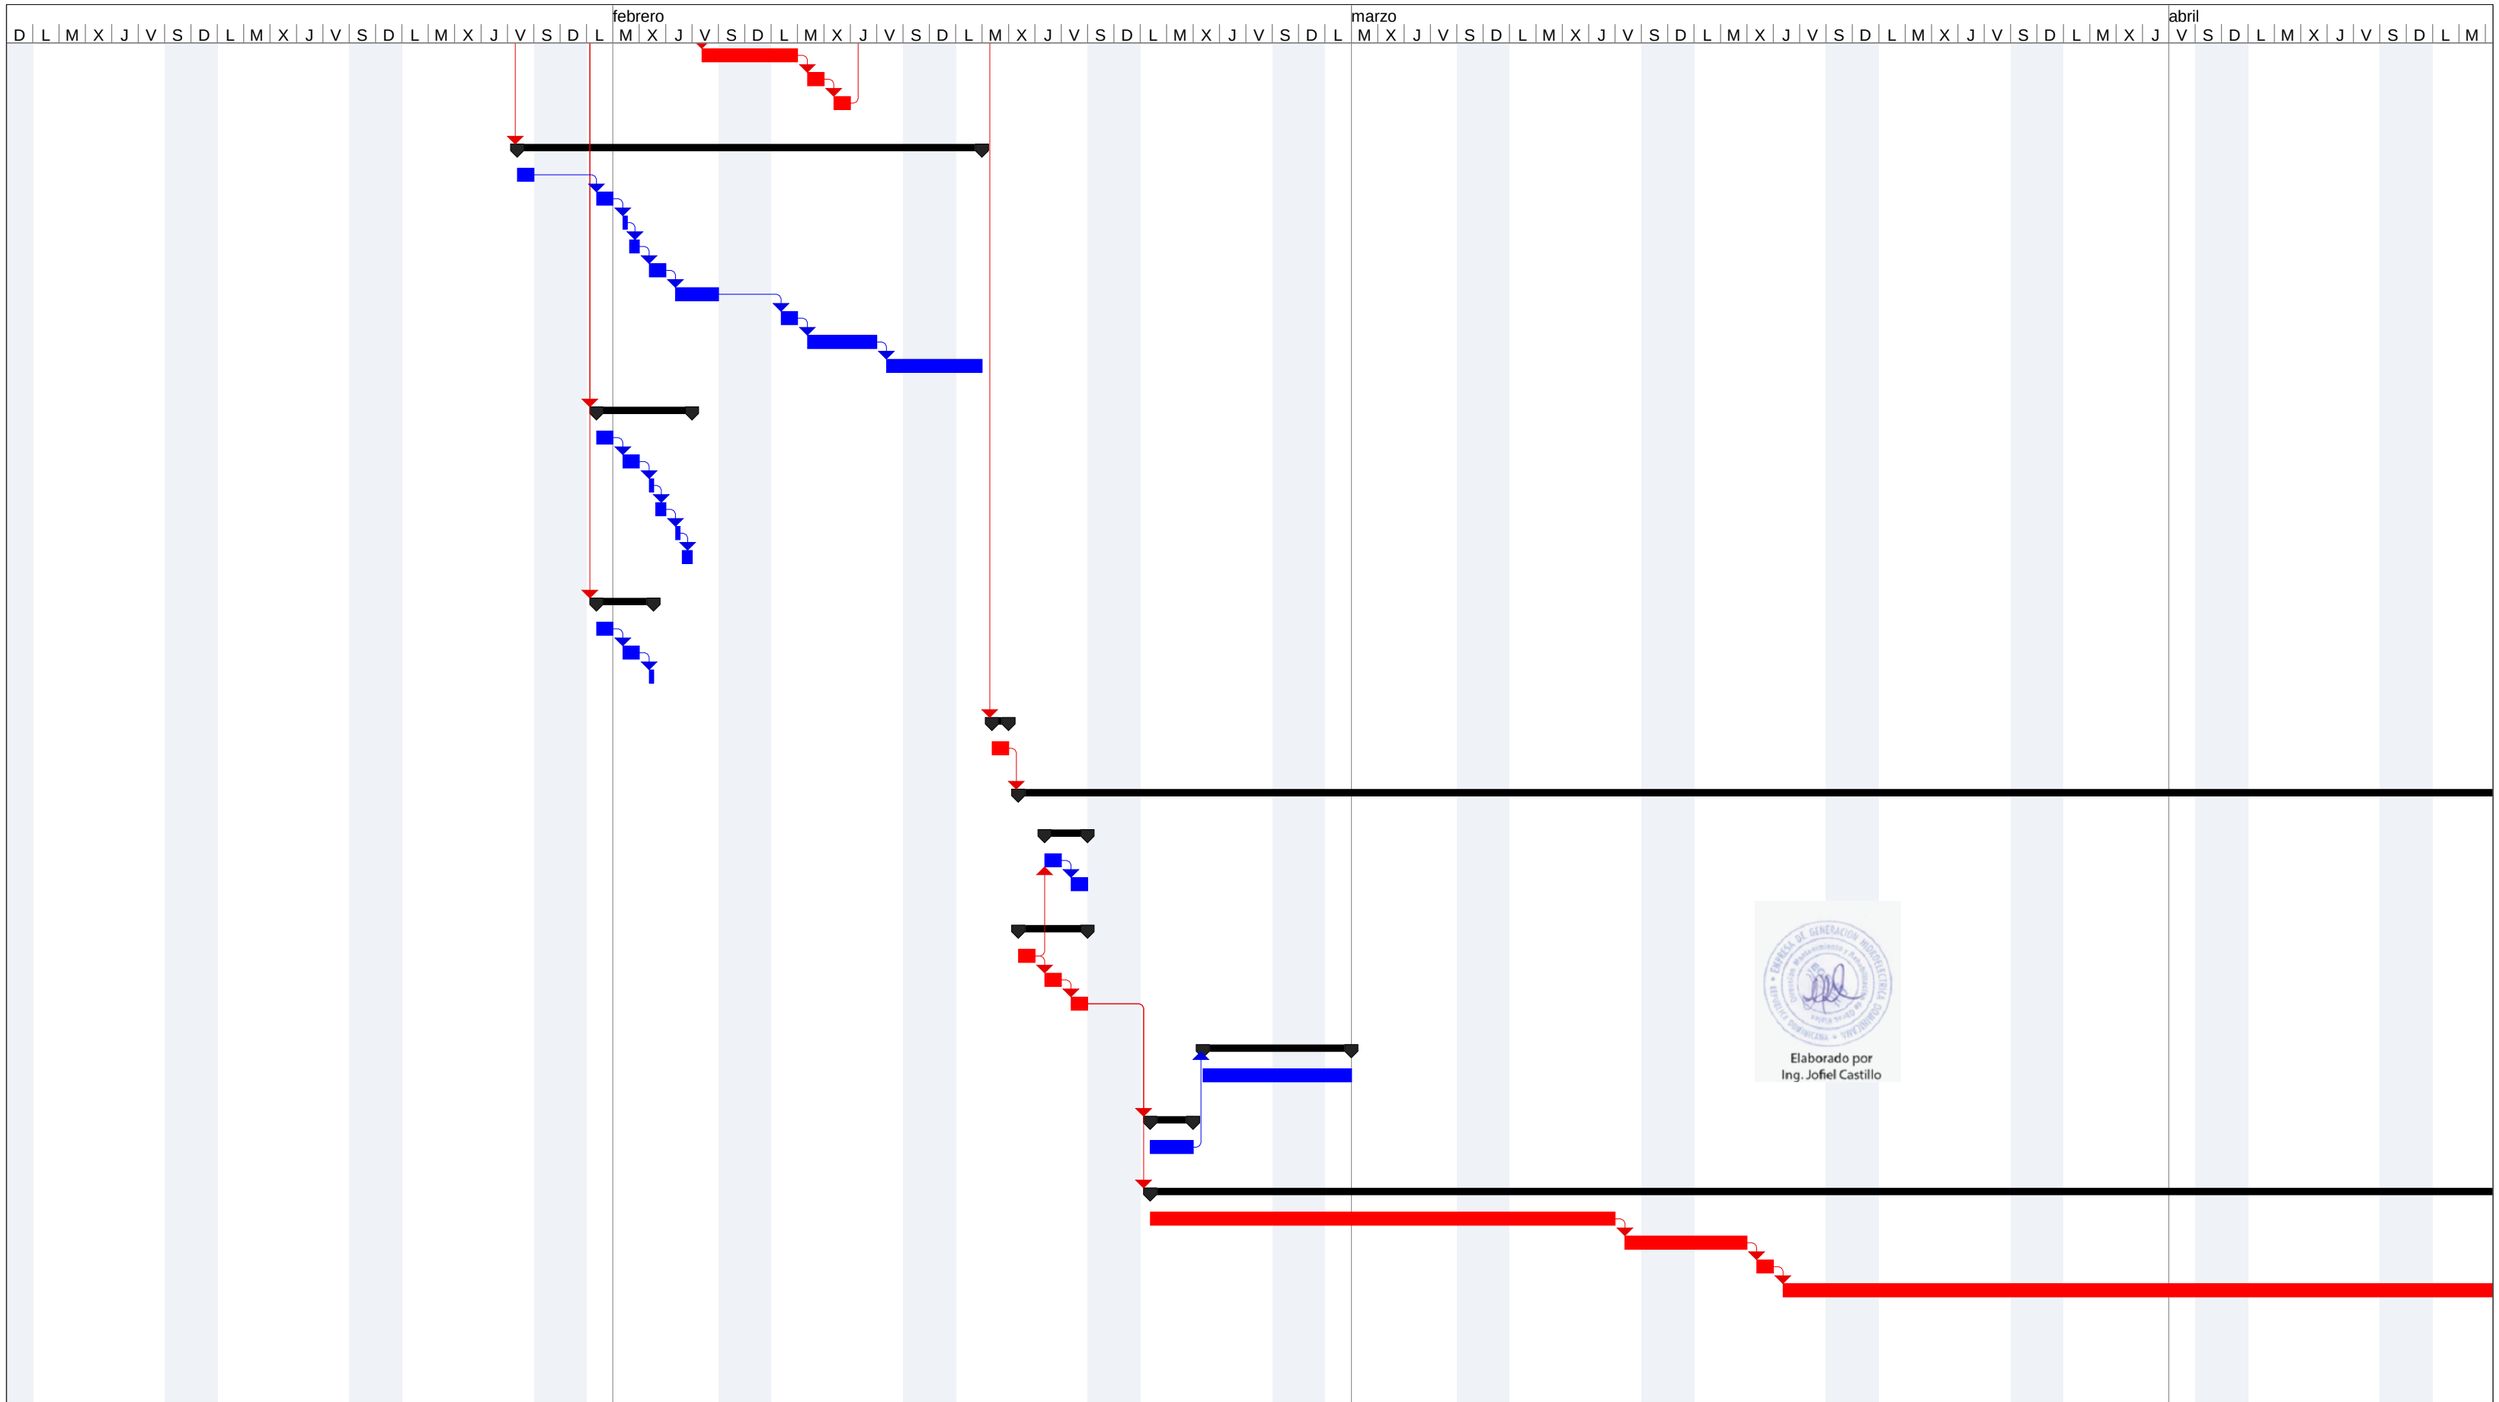

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

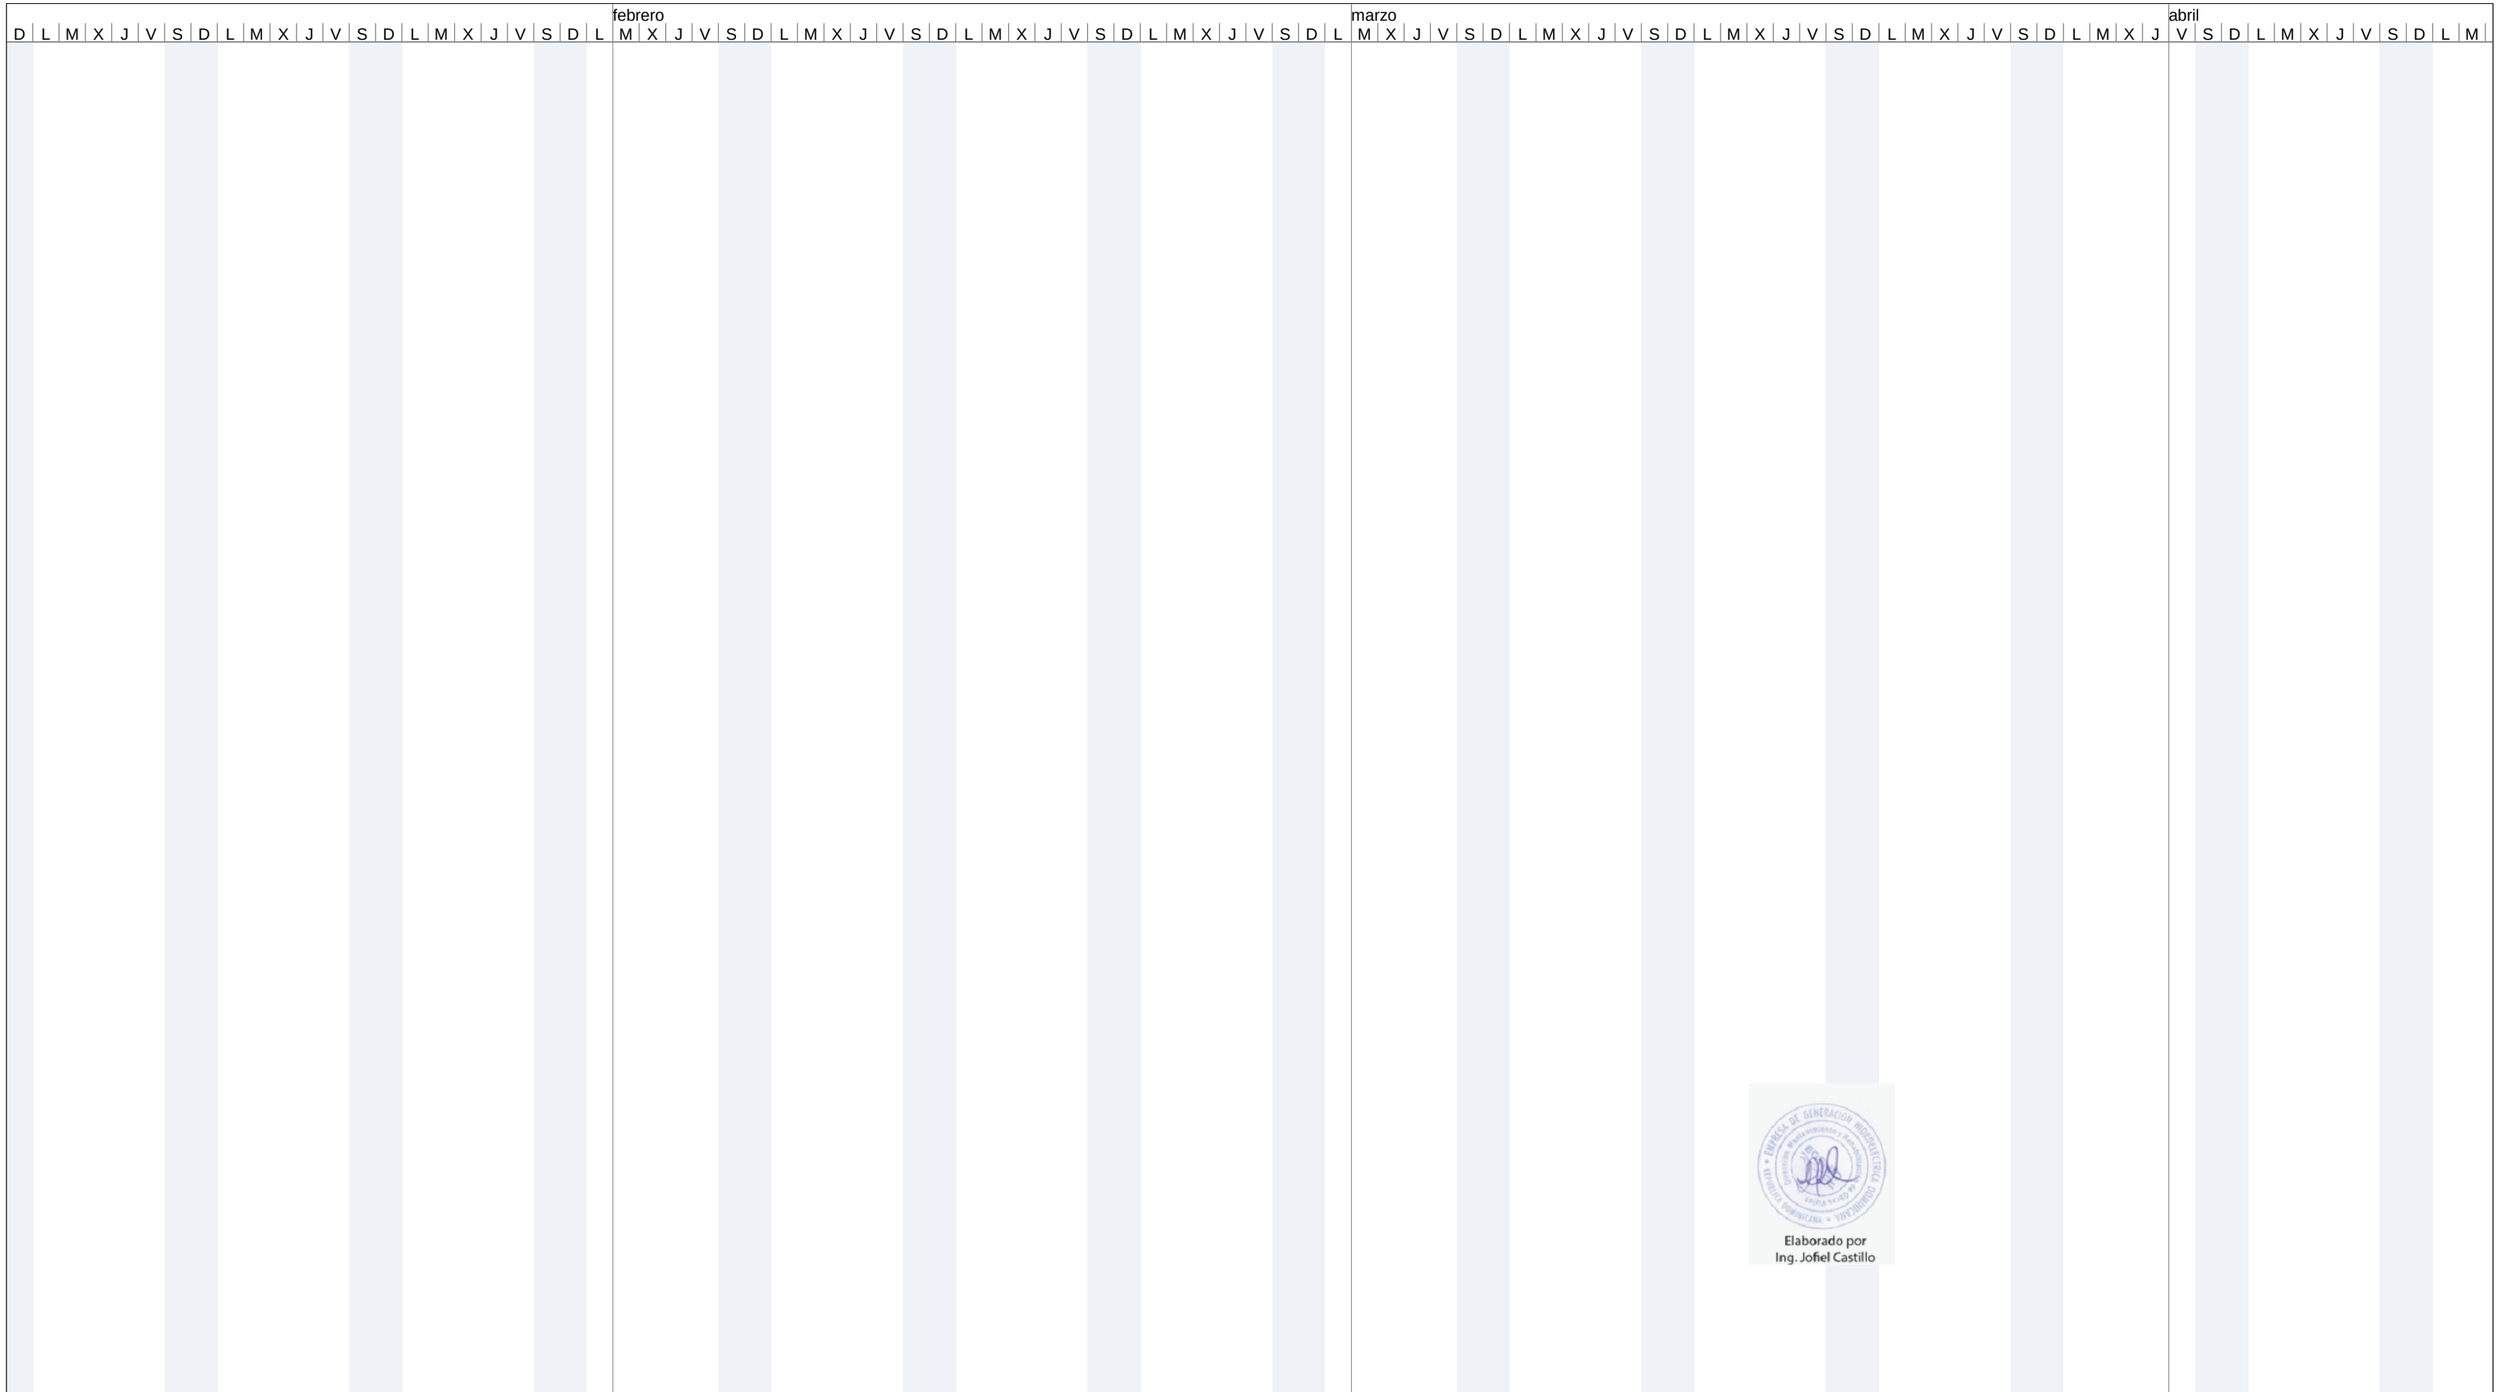

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

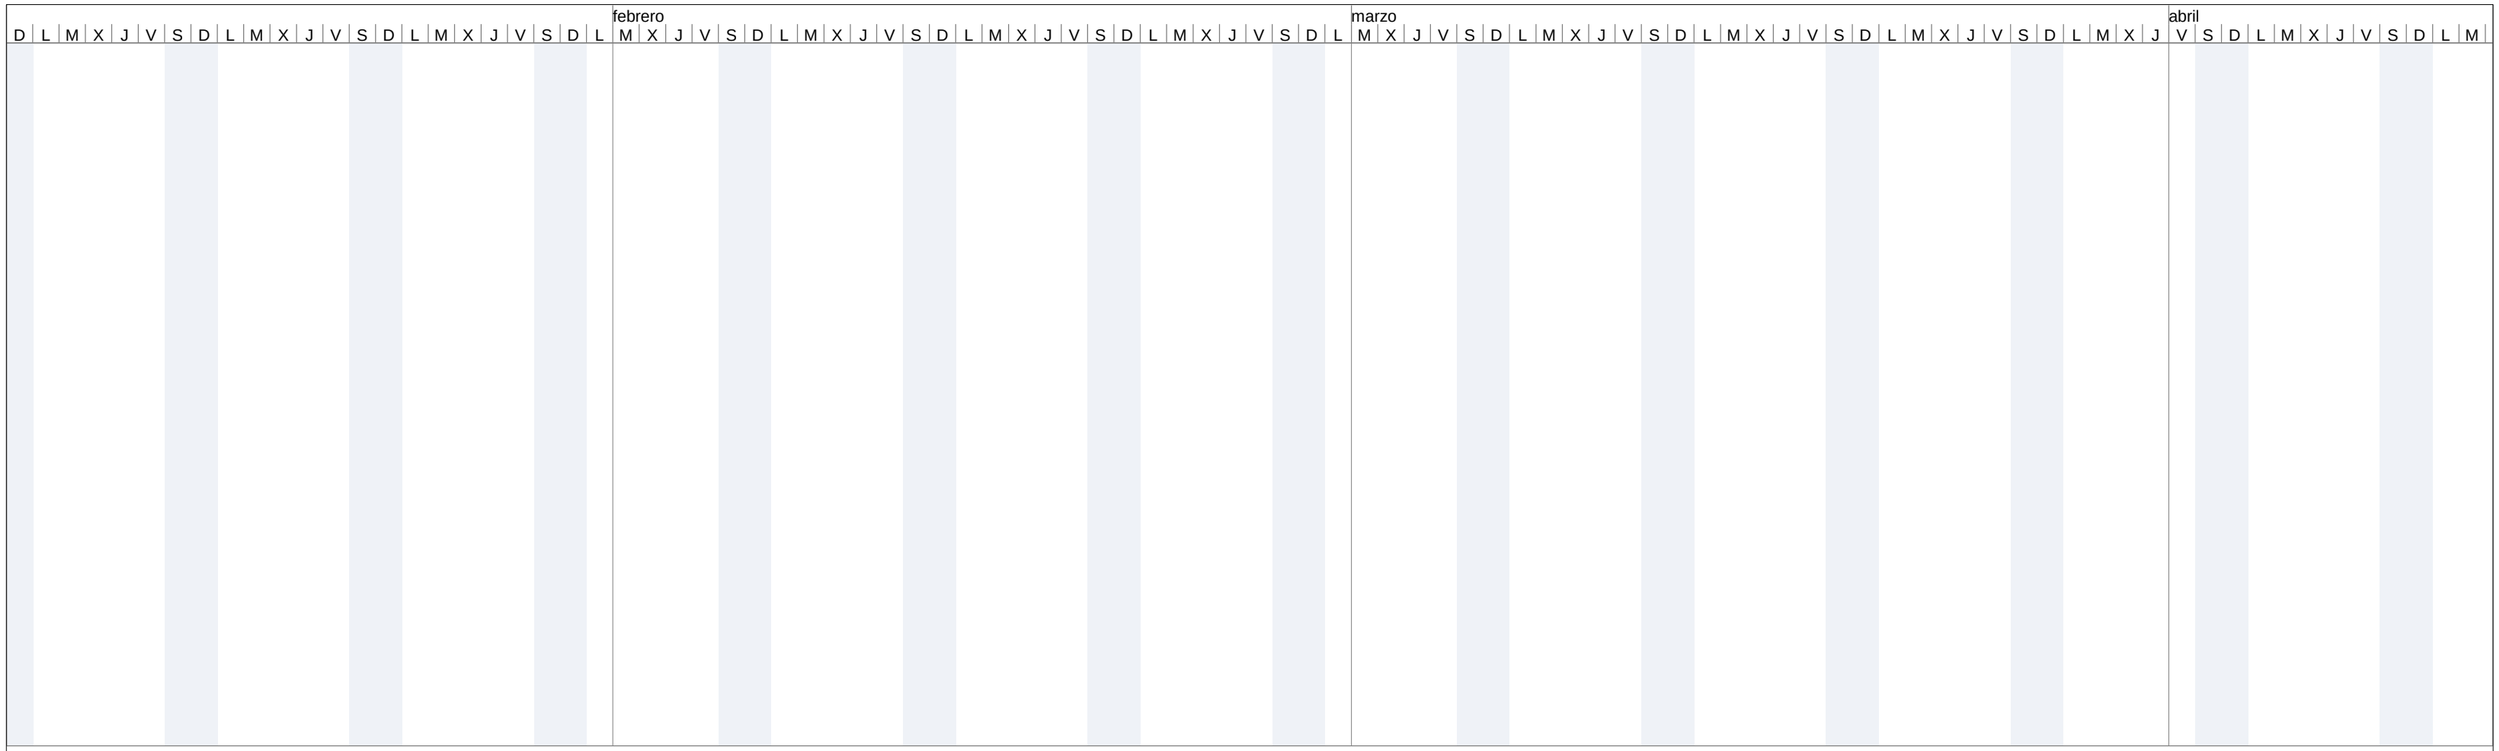

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

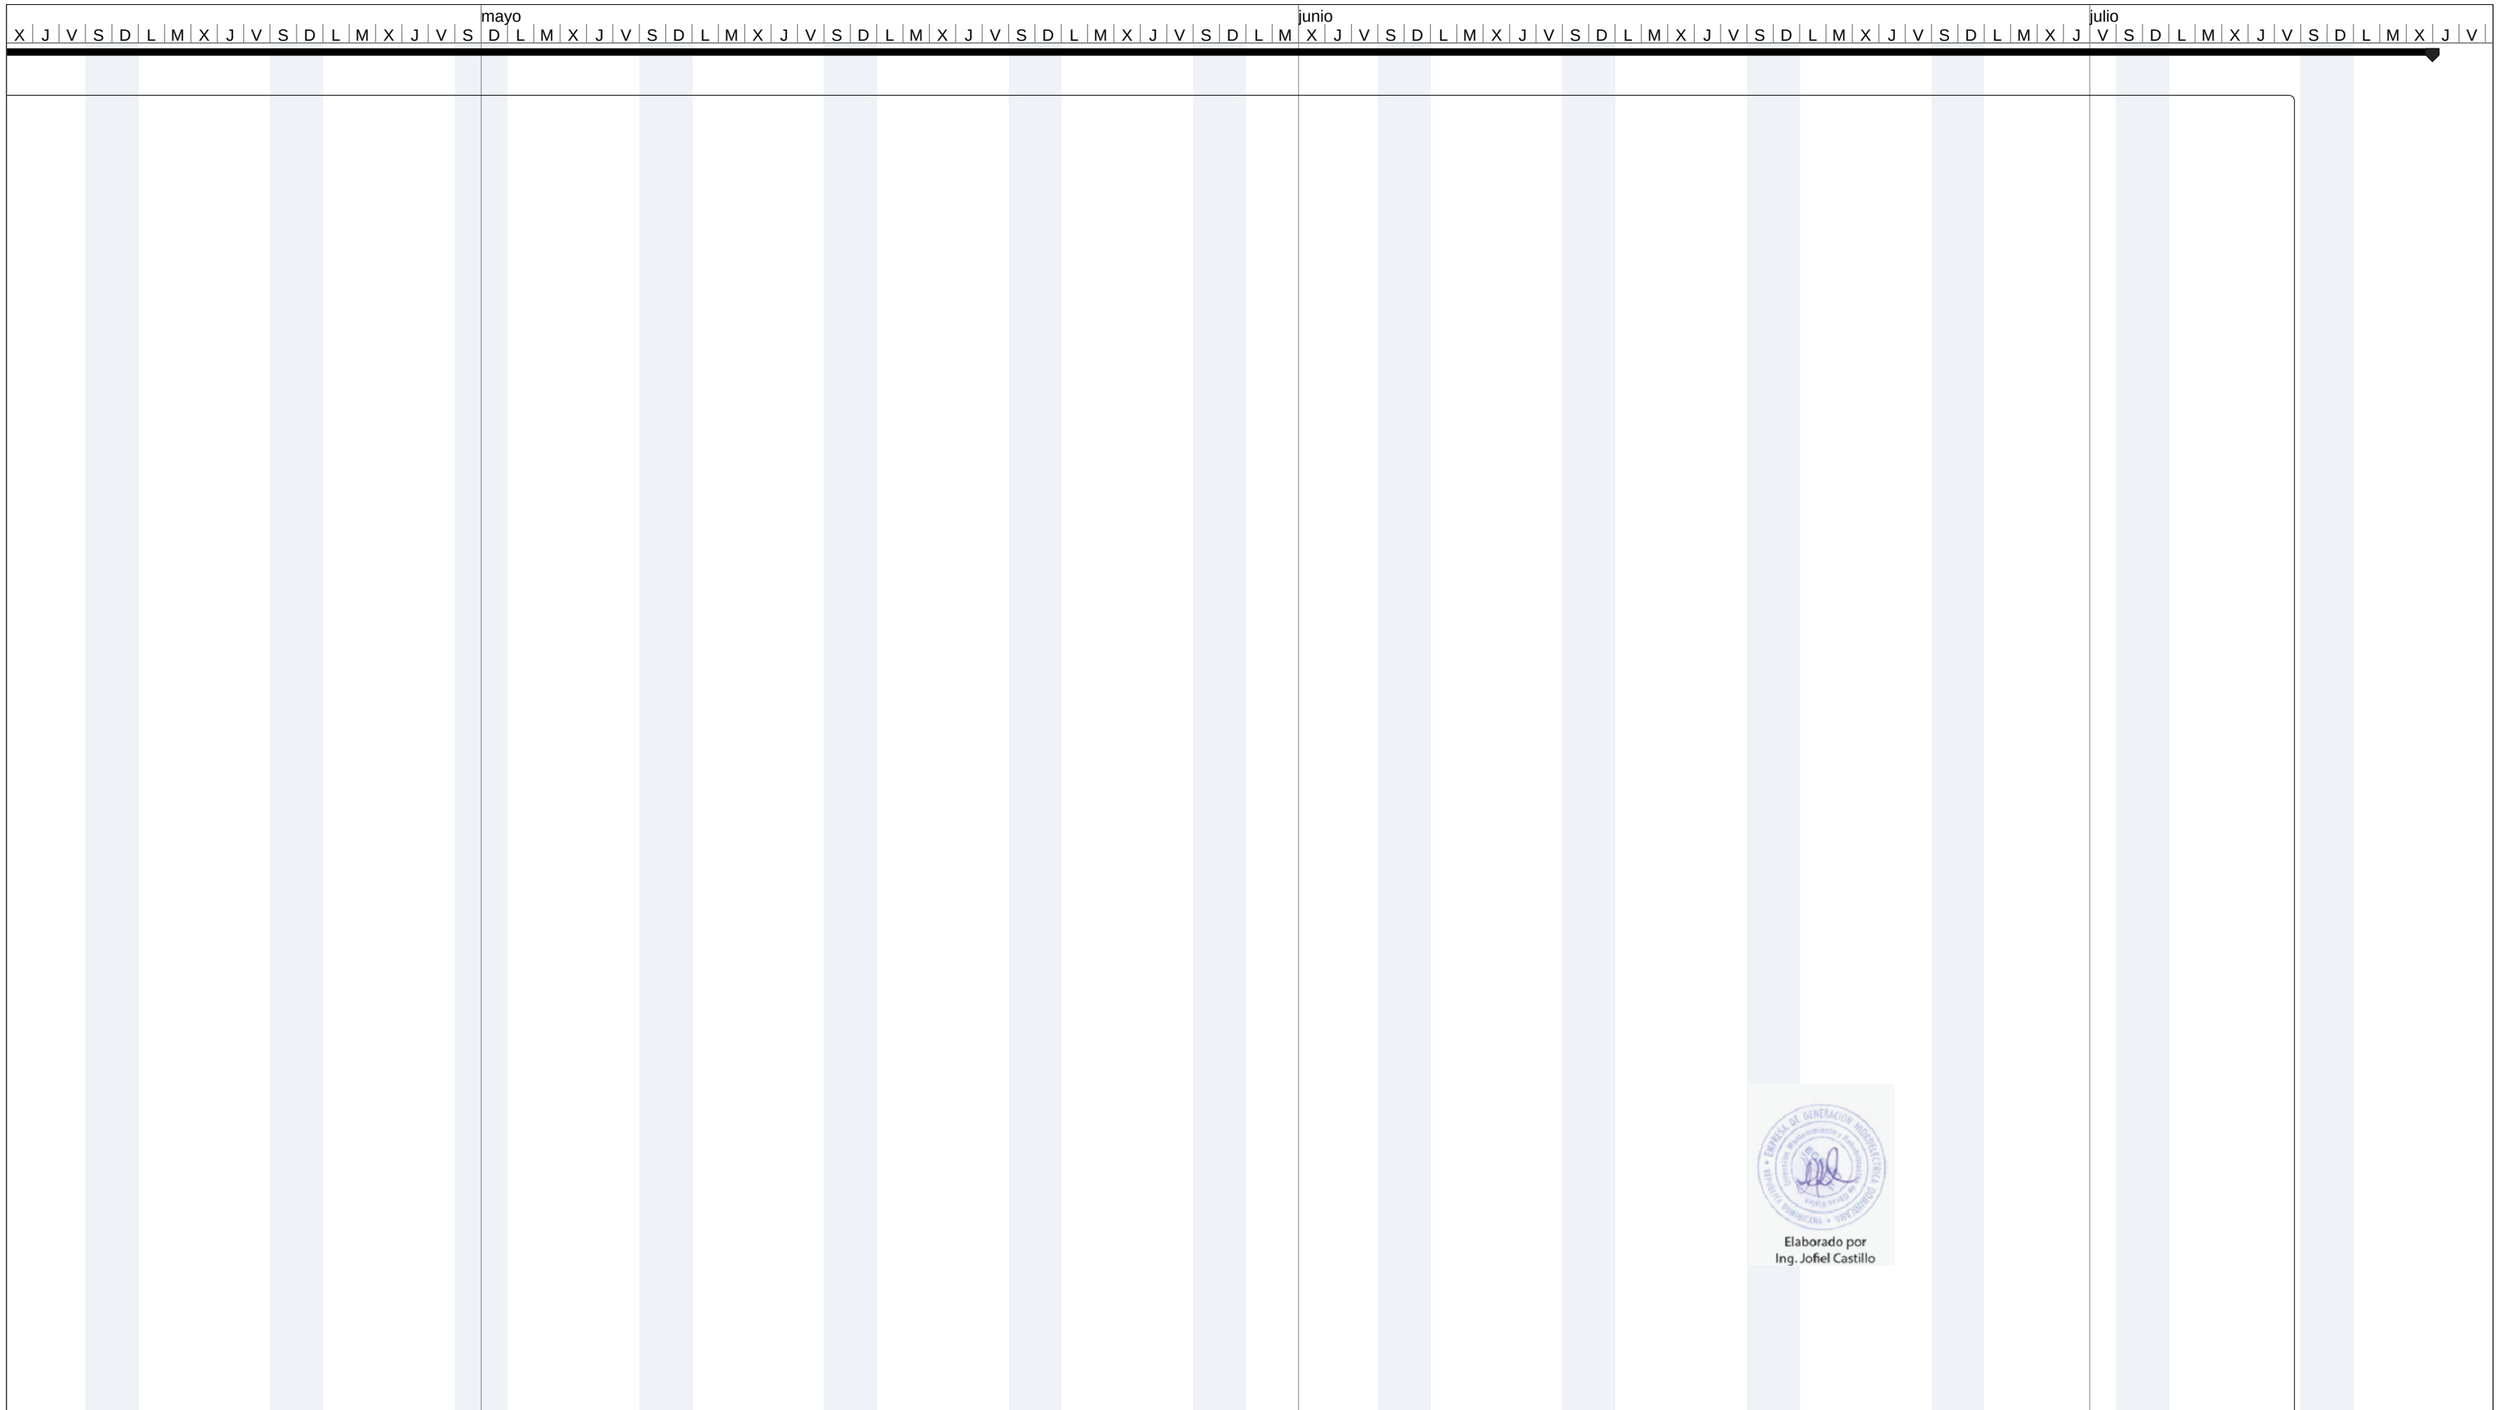

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido	◇	Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual	◆	Hito externo	
Hito	◆	Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual	◆	Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	⇩
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual	◇	solo fin			

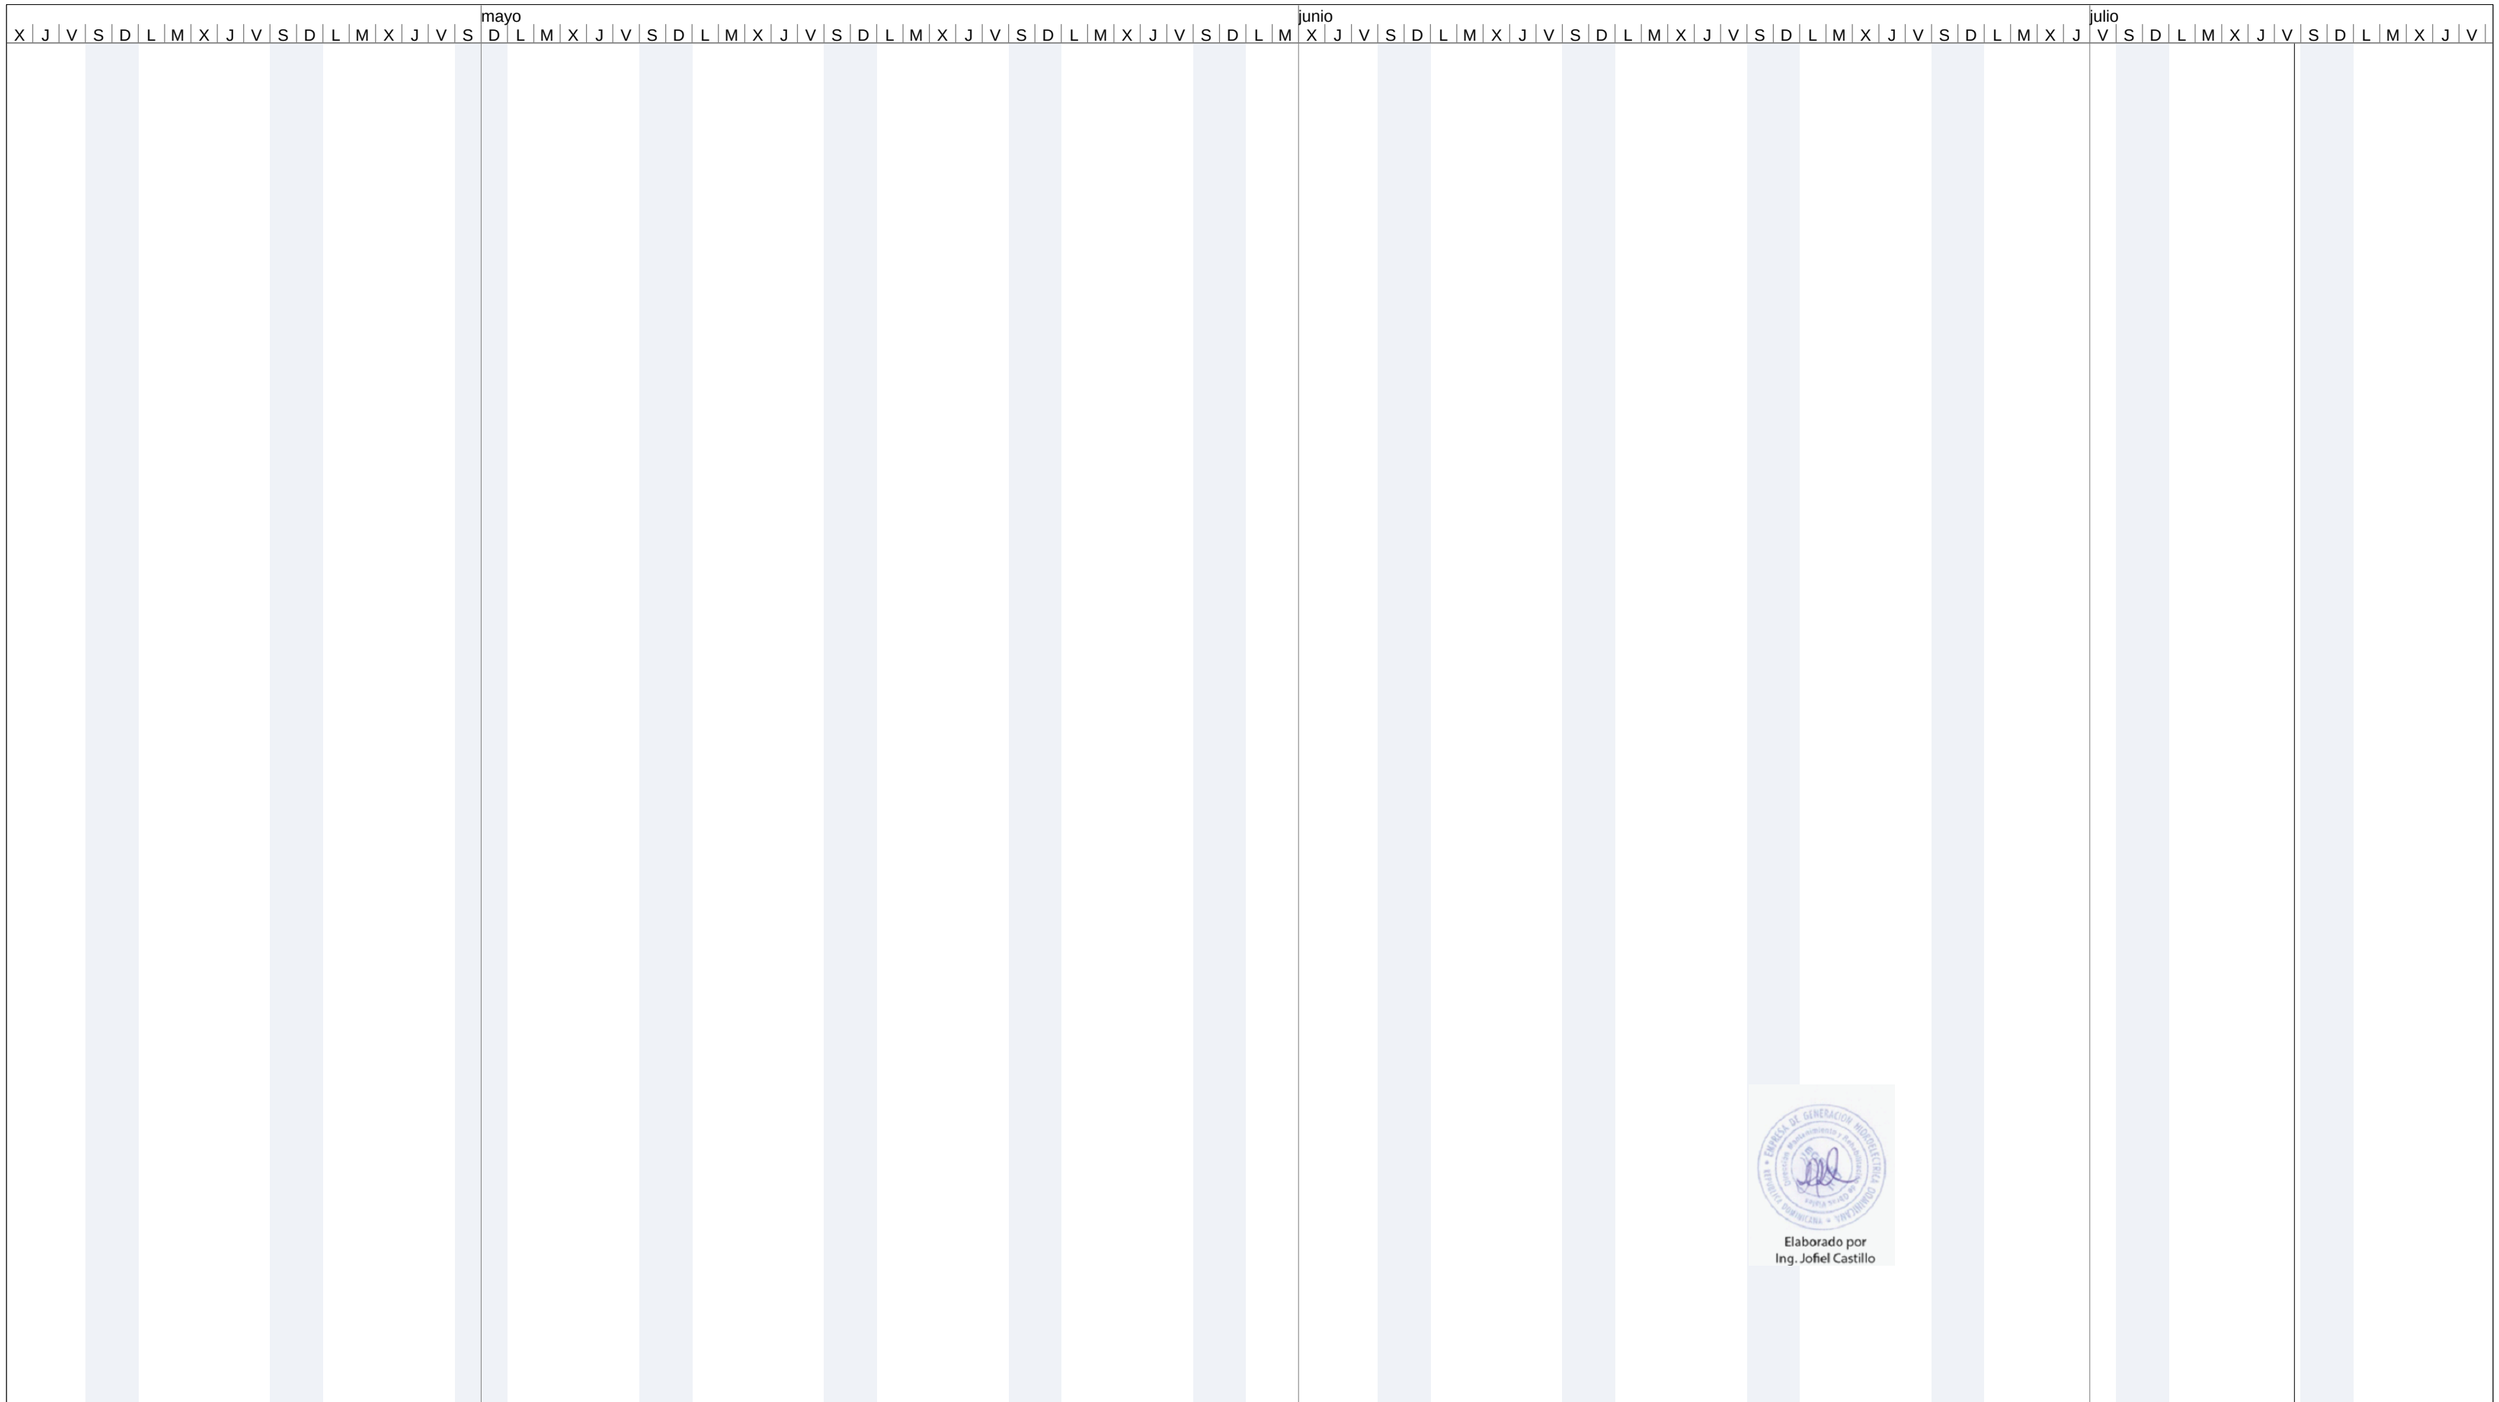

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido	◇	Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual	◆	Hito externo	
Hito	◆	Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual	◆	Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	⇩
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual	◇	solo fin			

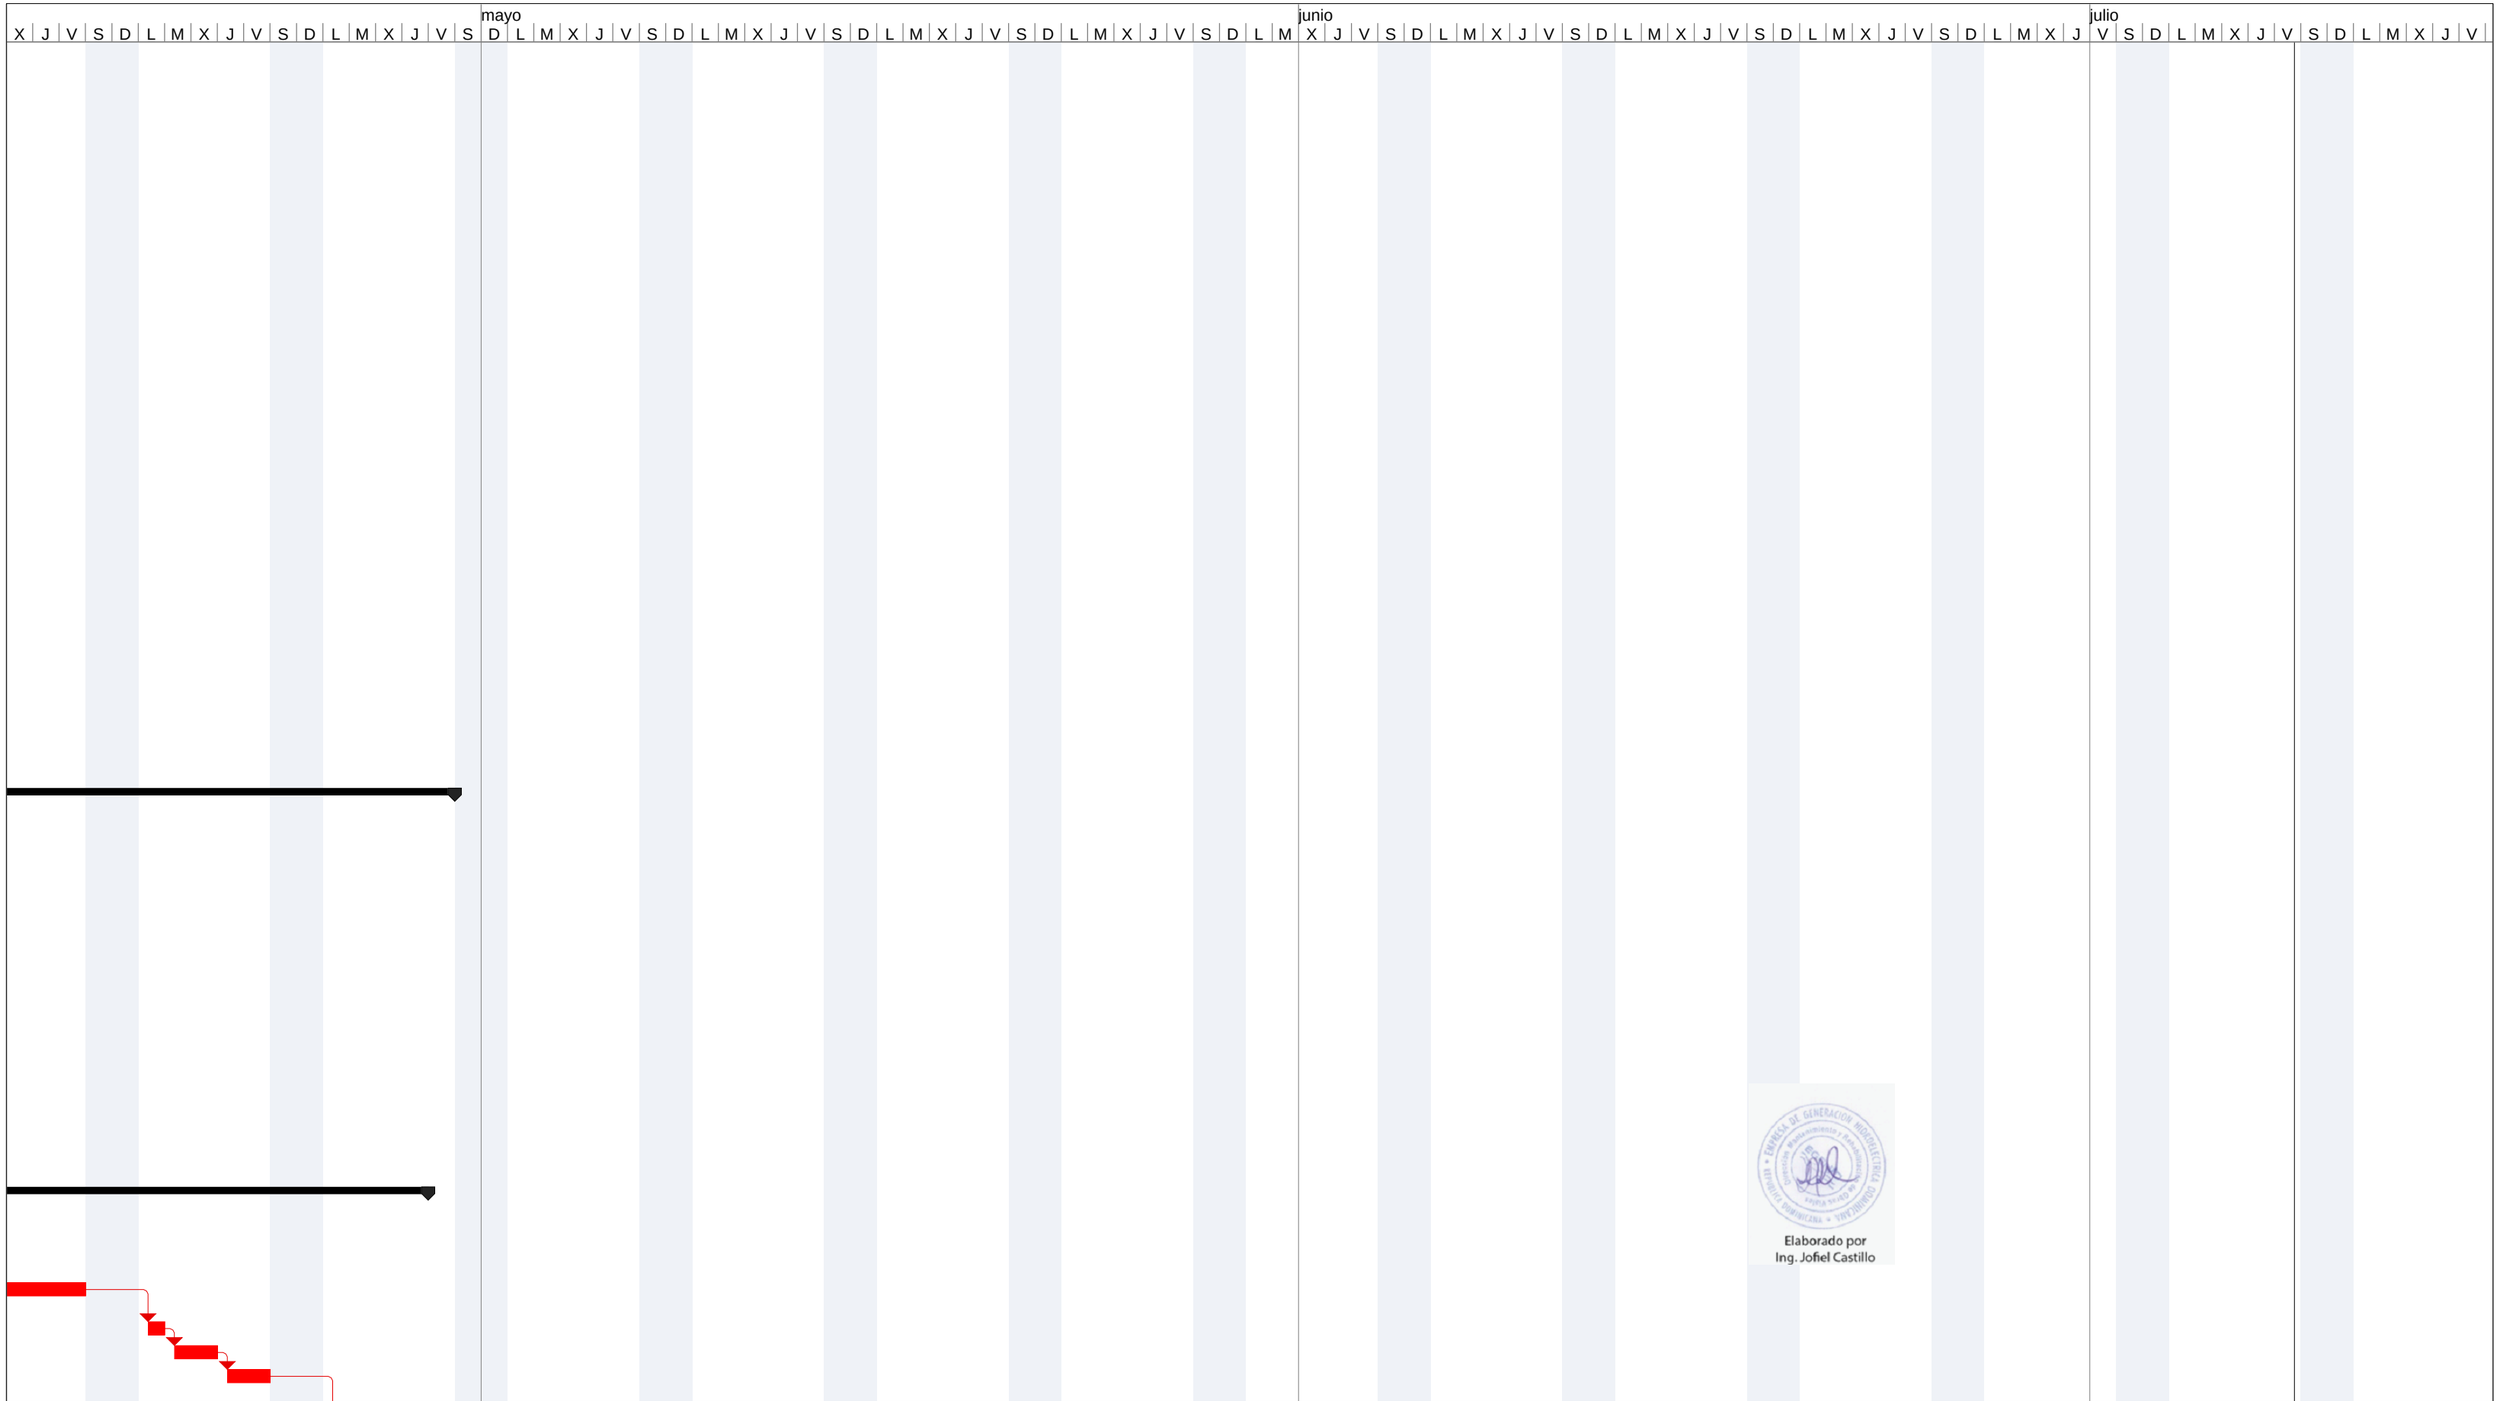

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

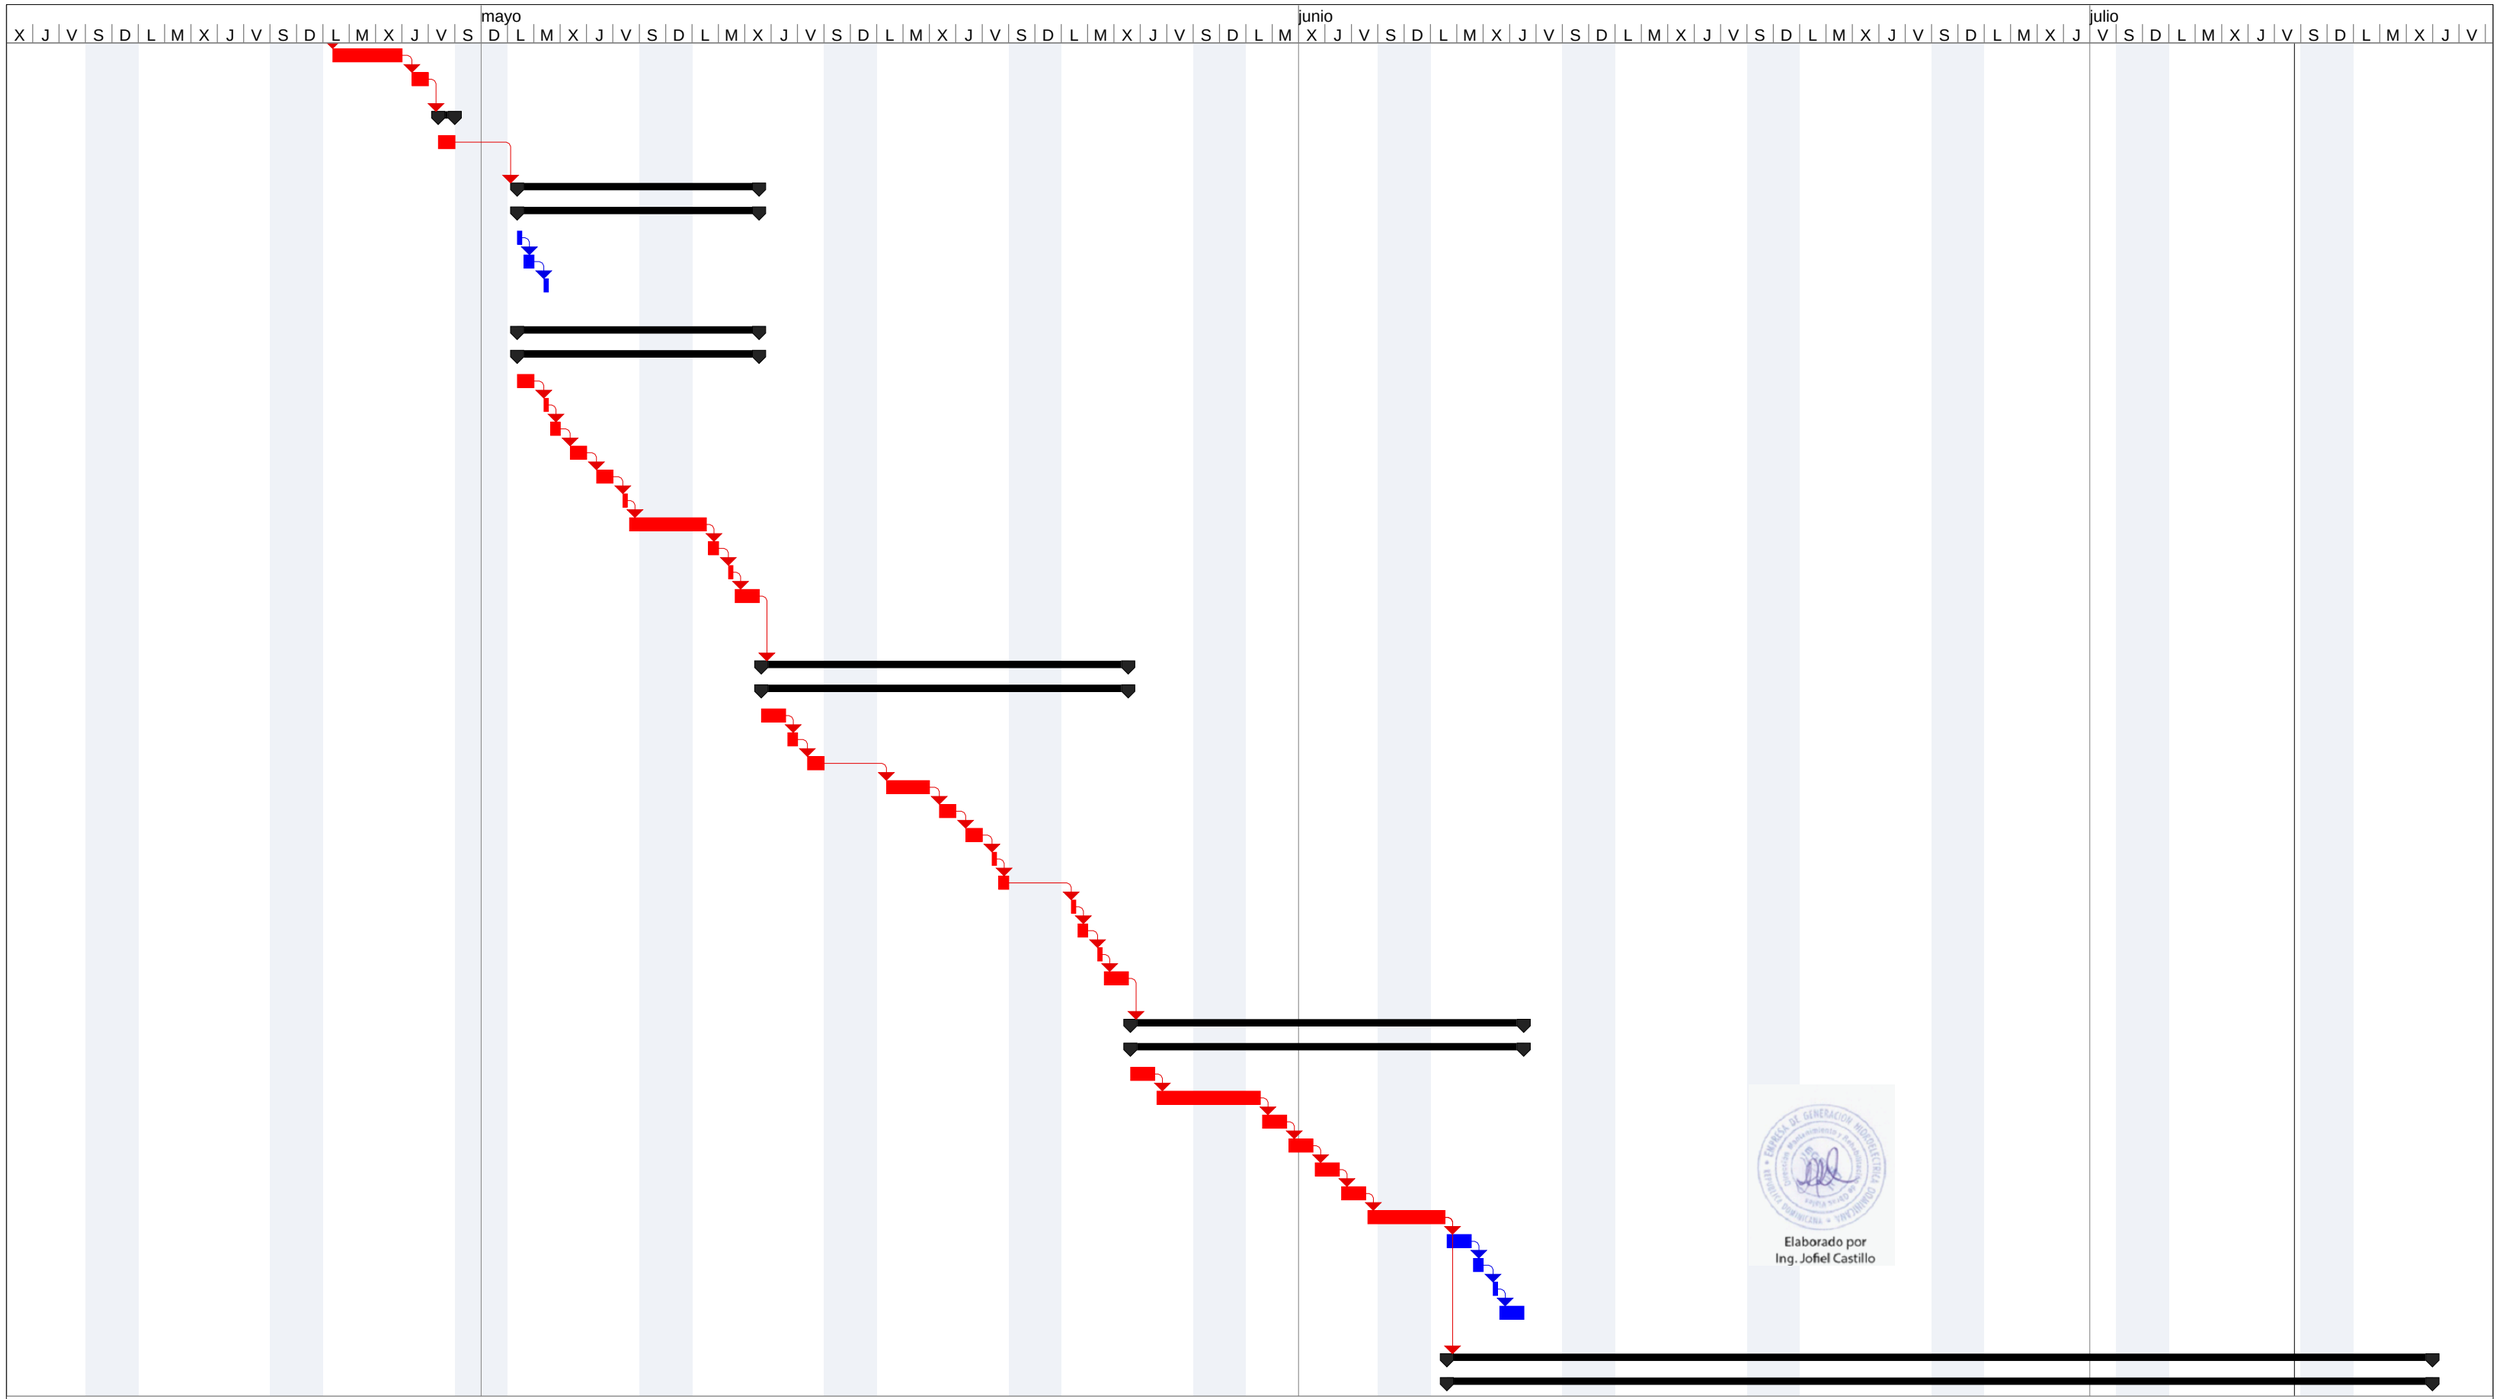

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

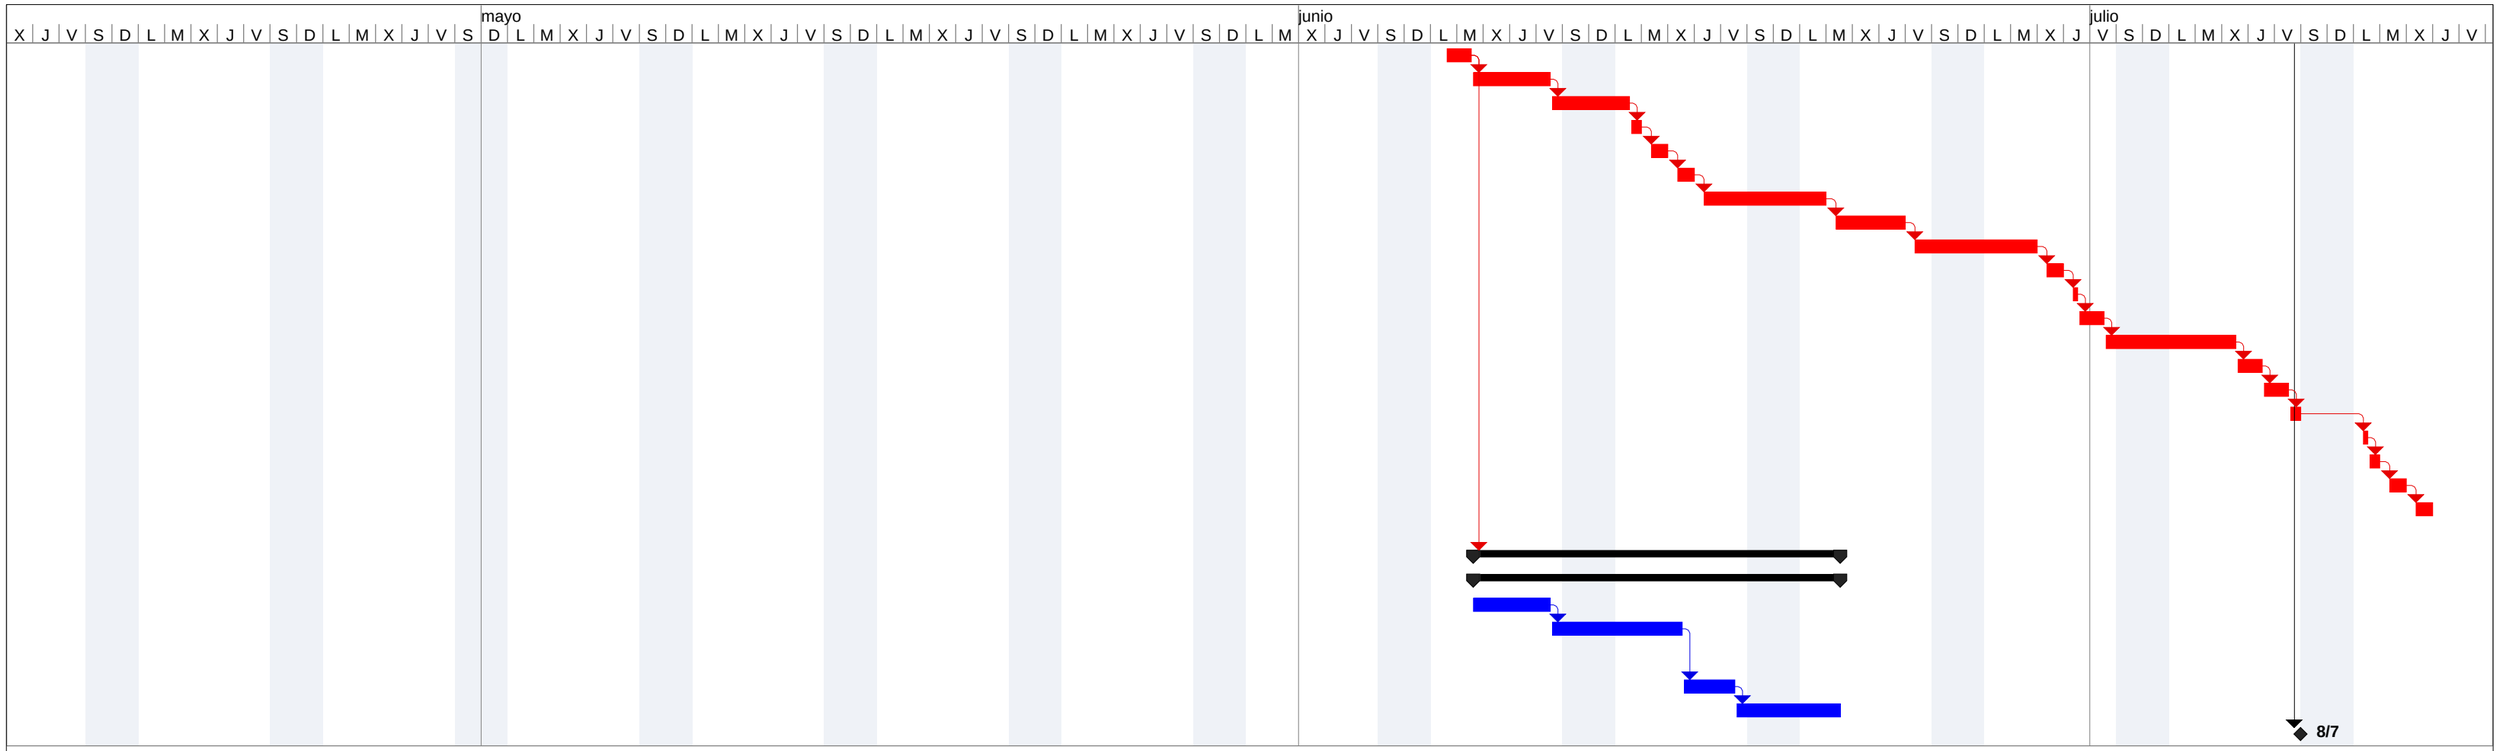

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: CHROSA JULIA
Fecha: mar 7/12/21

Tarea		Tarea crítica resumida		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	
Tarea crítica		Hito resumido		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Hito externo	
Hito		Progreso resumido		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso	
Resumen		División		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Tarea resumida		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			
