

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	8																											
						J	V	S	D	13 ago '18				20 ago '18				27 ago '18				3 sep '18				10 sep '18				17 sep '18			
1	PROYECTO EGEHID 15 CASAS	38 días	vie 10/8/18	sáb 22/9/18																													
2	TERMINACION DE TECHO (CASA 6,7,8)	6 días	vie 10/8/18	jue 16/8/18																													
3	Techo de Zinc Acanalado Calibre 34	6 días	vie 10/8/18	jue 16/8/18																													
4	TERMINACION DE PISO (CASA 6,7,8)	10 días	vie 17/8/18	mar 28/8/18																													
5	Pisos en HormigOn Armado Con Malla Electrosoldada	4 días	vie 17/8/18	mar 21/8/18	3																												
6	Pisos en Ceramica en Banos	2 días	mié 22/8/18	jue 23/8/18	5																												
7	Revestimiento en Banos (H= 1.60mts)	4 días	vie 24/8/18	mar 28/8/18	6																												
8	INSTALACIONES SAN ITARIAS 100% (CASA 6,7,8)	4 días	mié 29/8/18	sáb 1/9/18																													
9	Instalacion Sanitarias	4 días	mié 29/8/18	sáb 1/9/18	7																												
10	TERMINACION DE COCINA (CASA 6,7,8)	3 días	lun 3/9/18	mié 5/9/18																													
11	Suministro e InstalaciOn de Tope en Marmolite	3 días	lun 3/9/18	mié 5/9/18	9																												
12	Base para Meseta de Cocina en HormigOn Simple (H= 10.00 cm)	3 días	lun 3/9/18	mié 5/9/18	9																												
13	Gabinets de piso en pino tratado. Incluye Tramerias y Tiradores.	3 días	lun 3/9/18	mié 5/9/18	9																												
14	INSTALACIONES ELECTRICAS 100% (CASA 6,7,8)	4 días	jue 6/9/18	lun 10/9/18																													





Proyecto: ING Maria Dolores 1

Fecha: jue 6/9/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 1


[illegible]


Proyecto: ING Maria Dolores 1 Fecha: jue 6/9/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

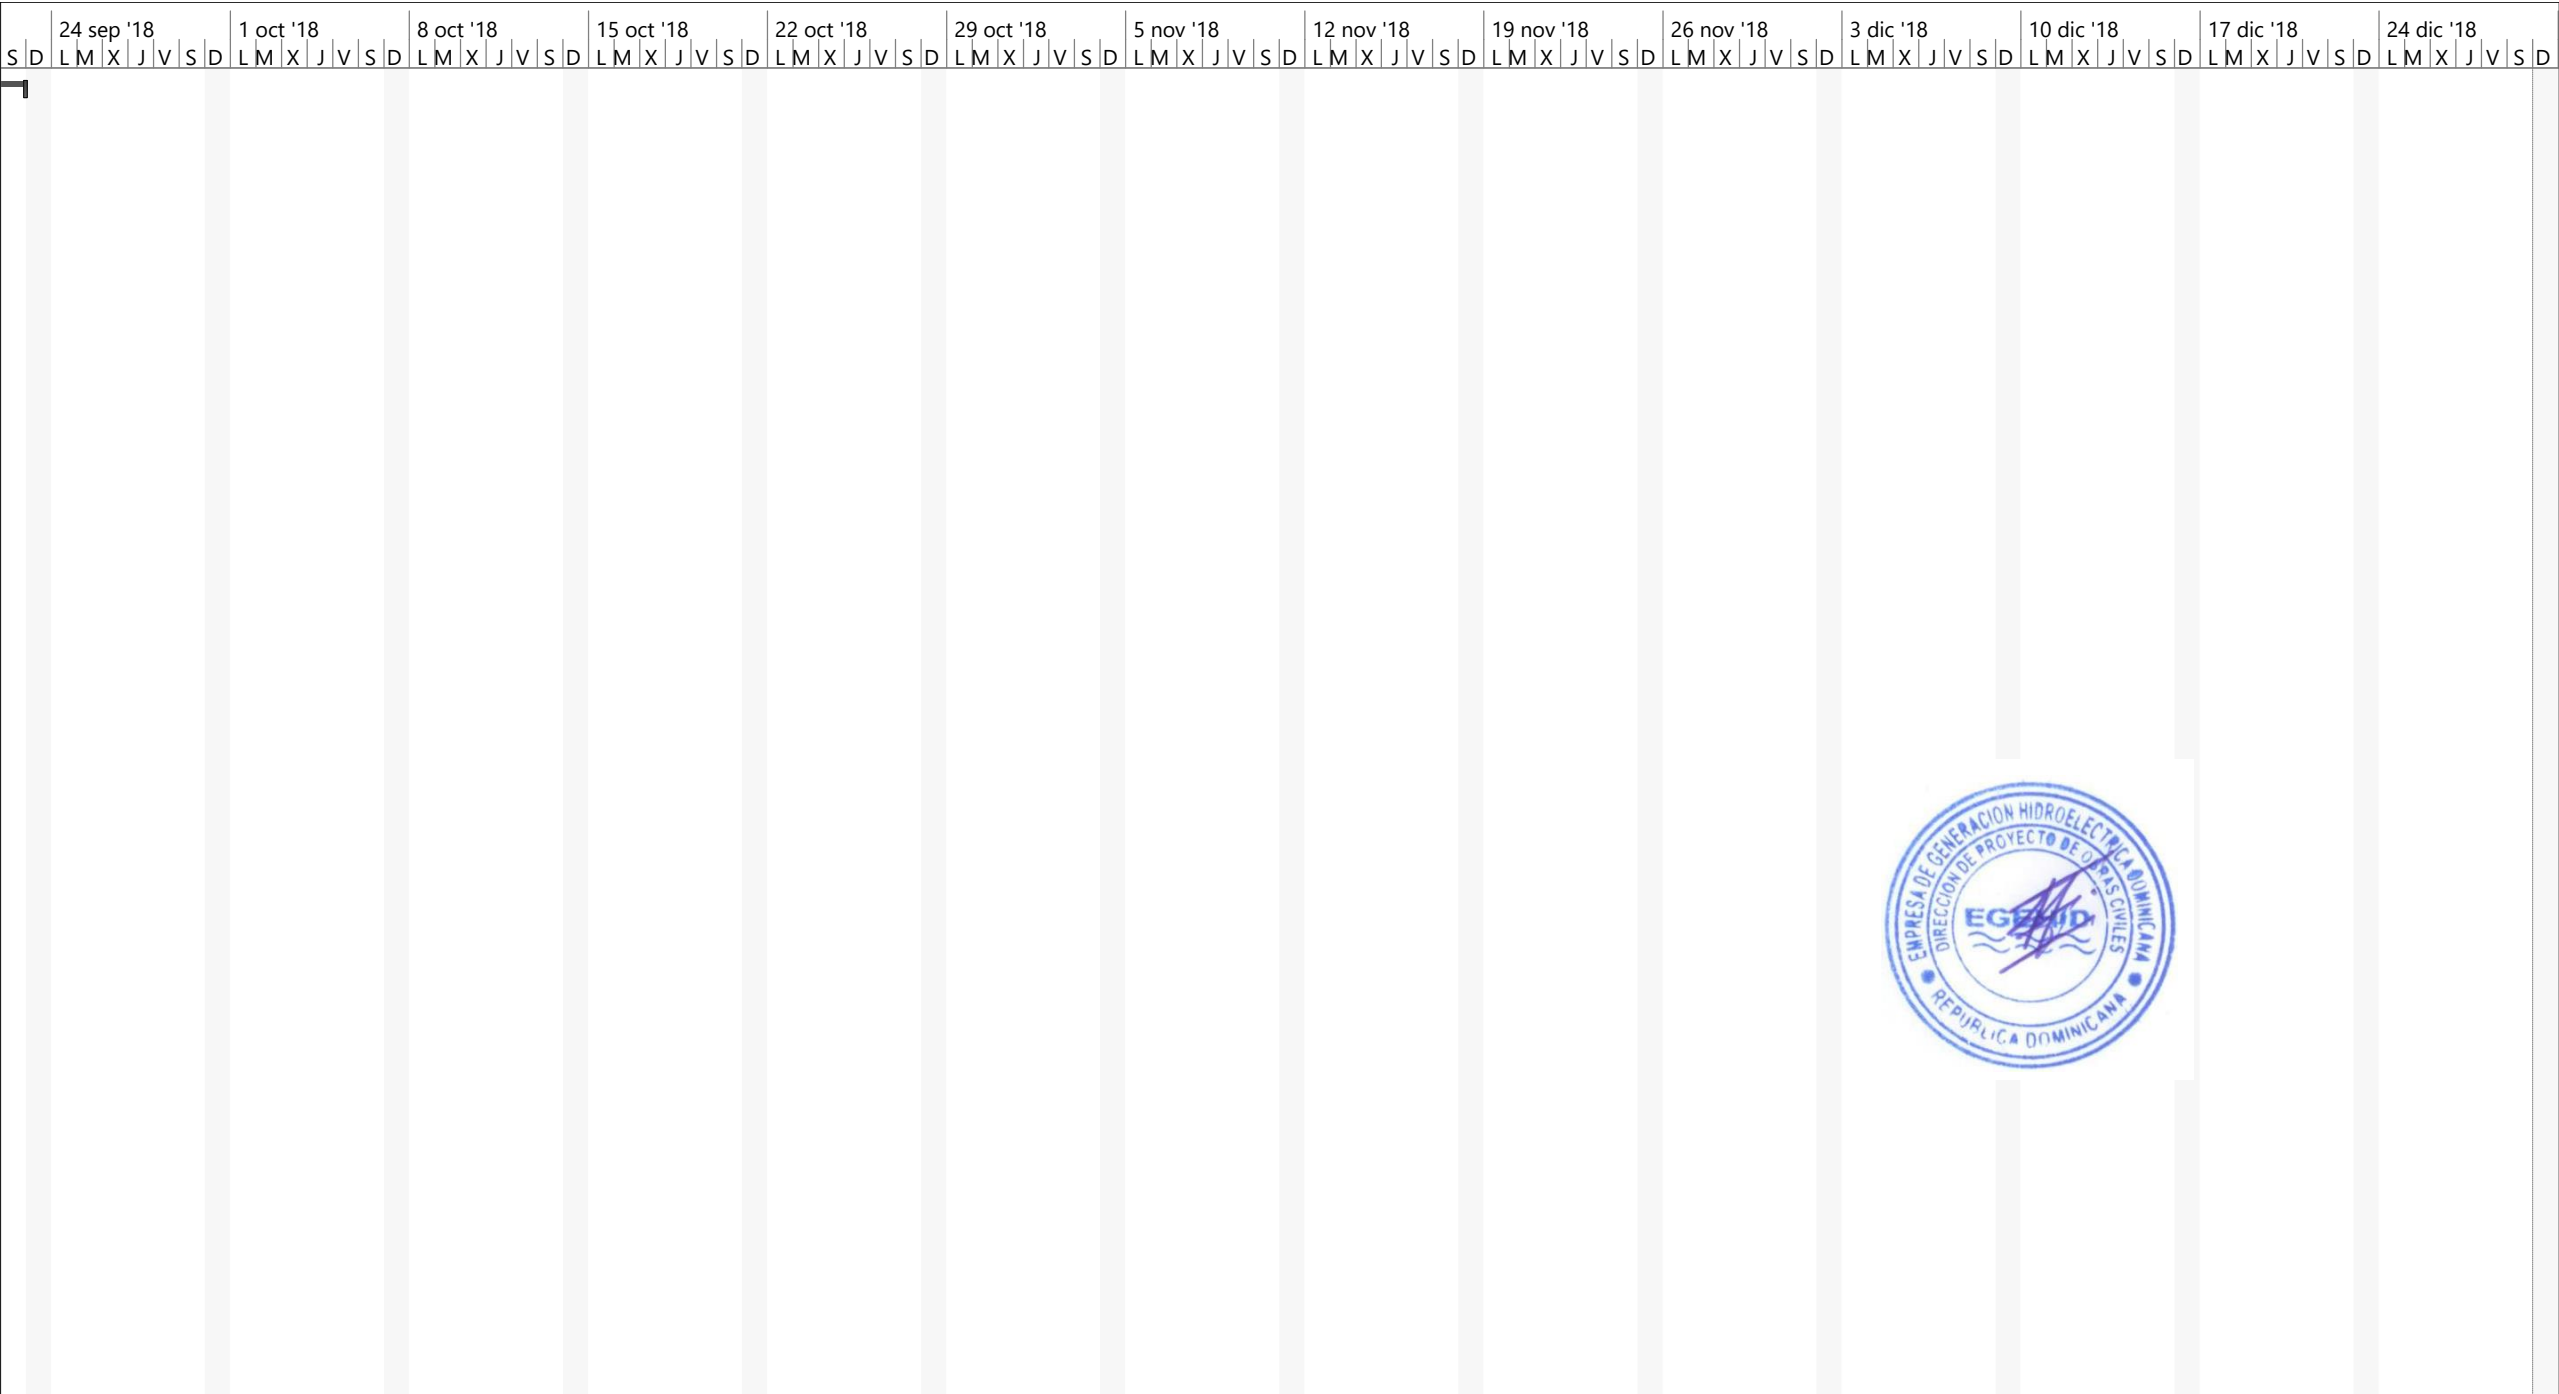


Proyecto: ING Maria Dolores 1
Fecha: jue 6/9/18


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

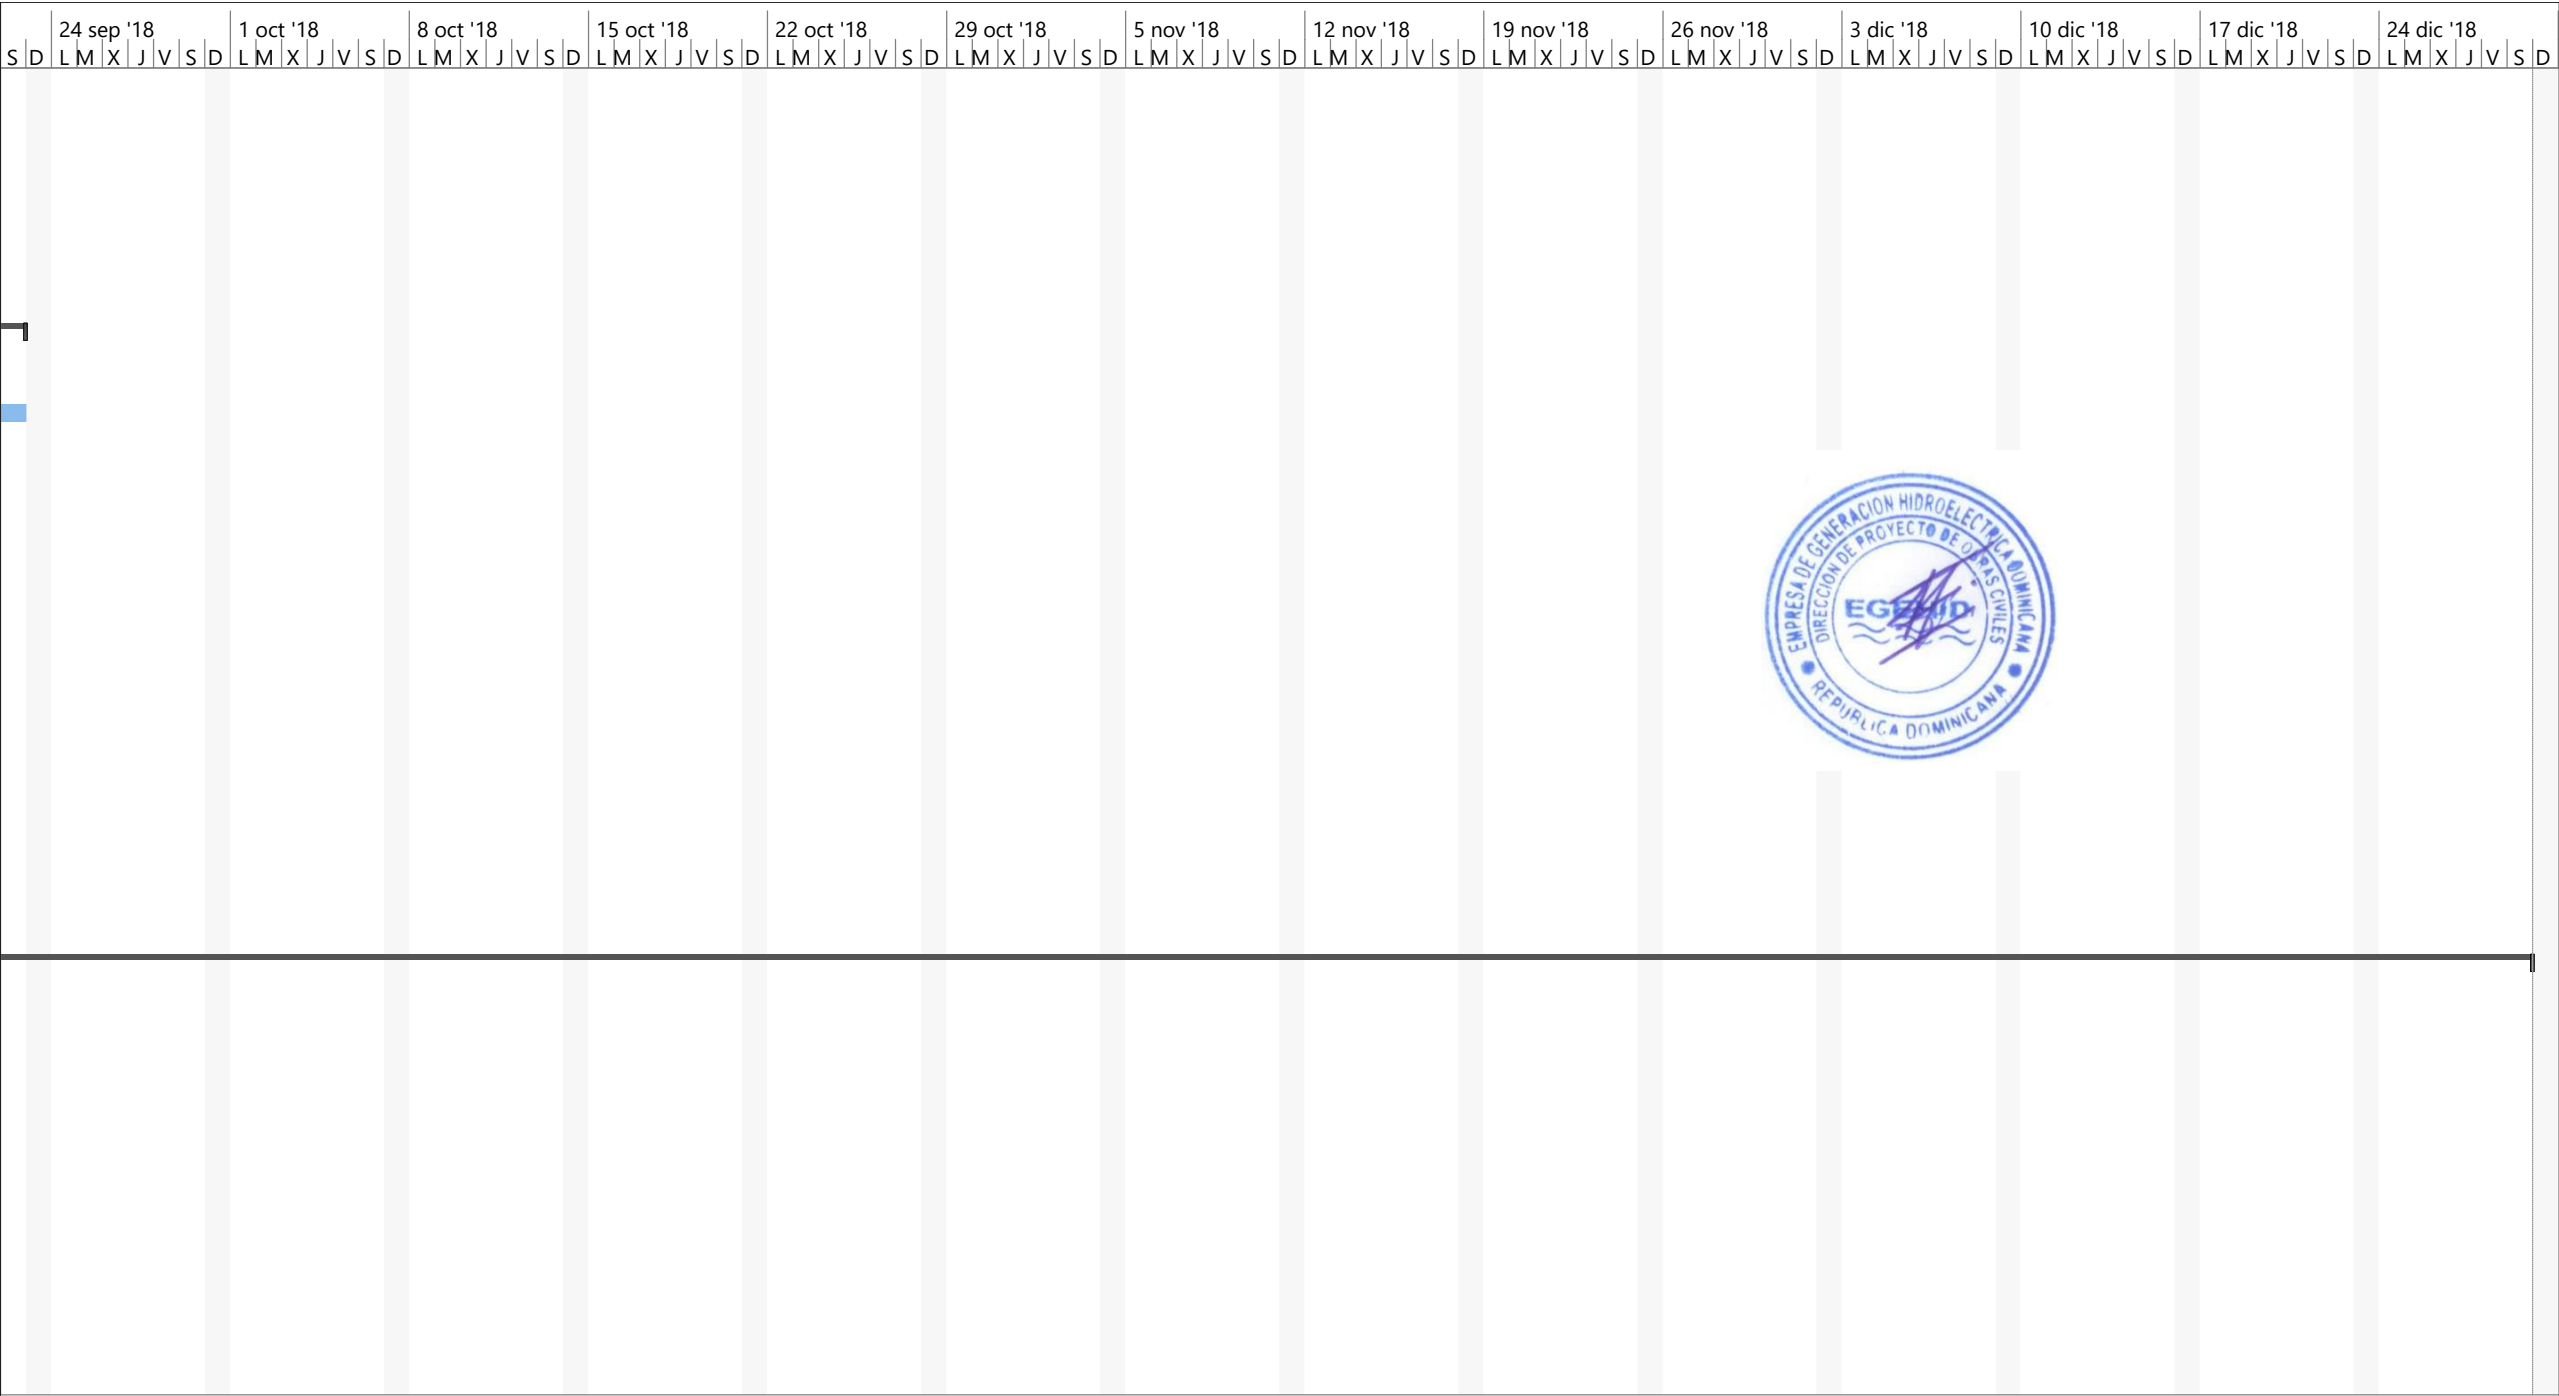

Proyecto: ING Maria Dolores 1 Fecha: jue 6/9/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

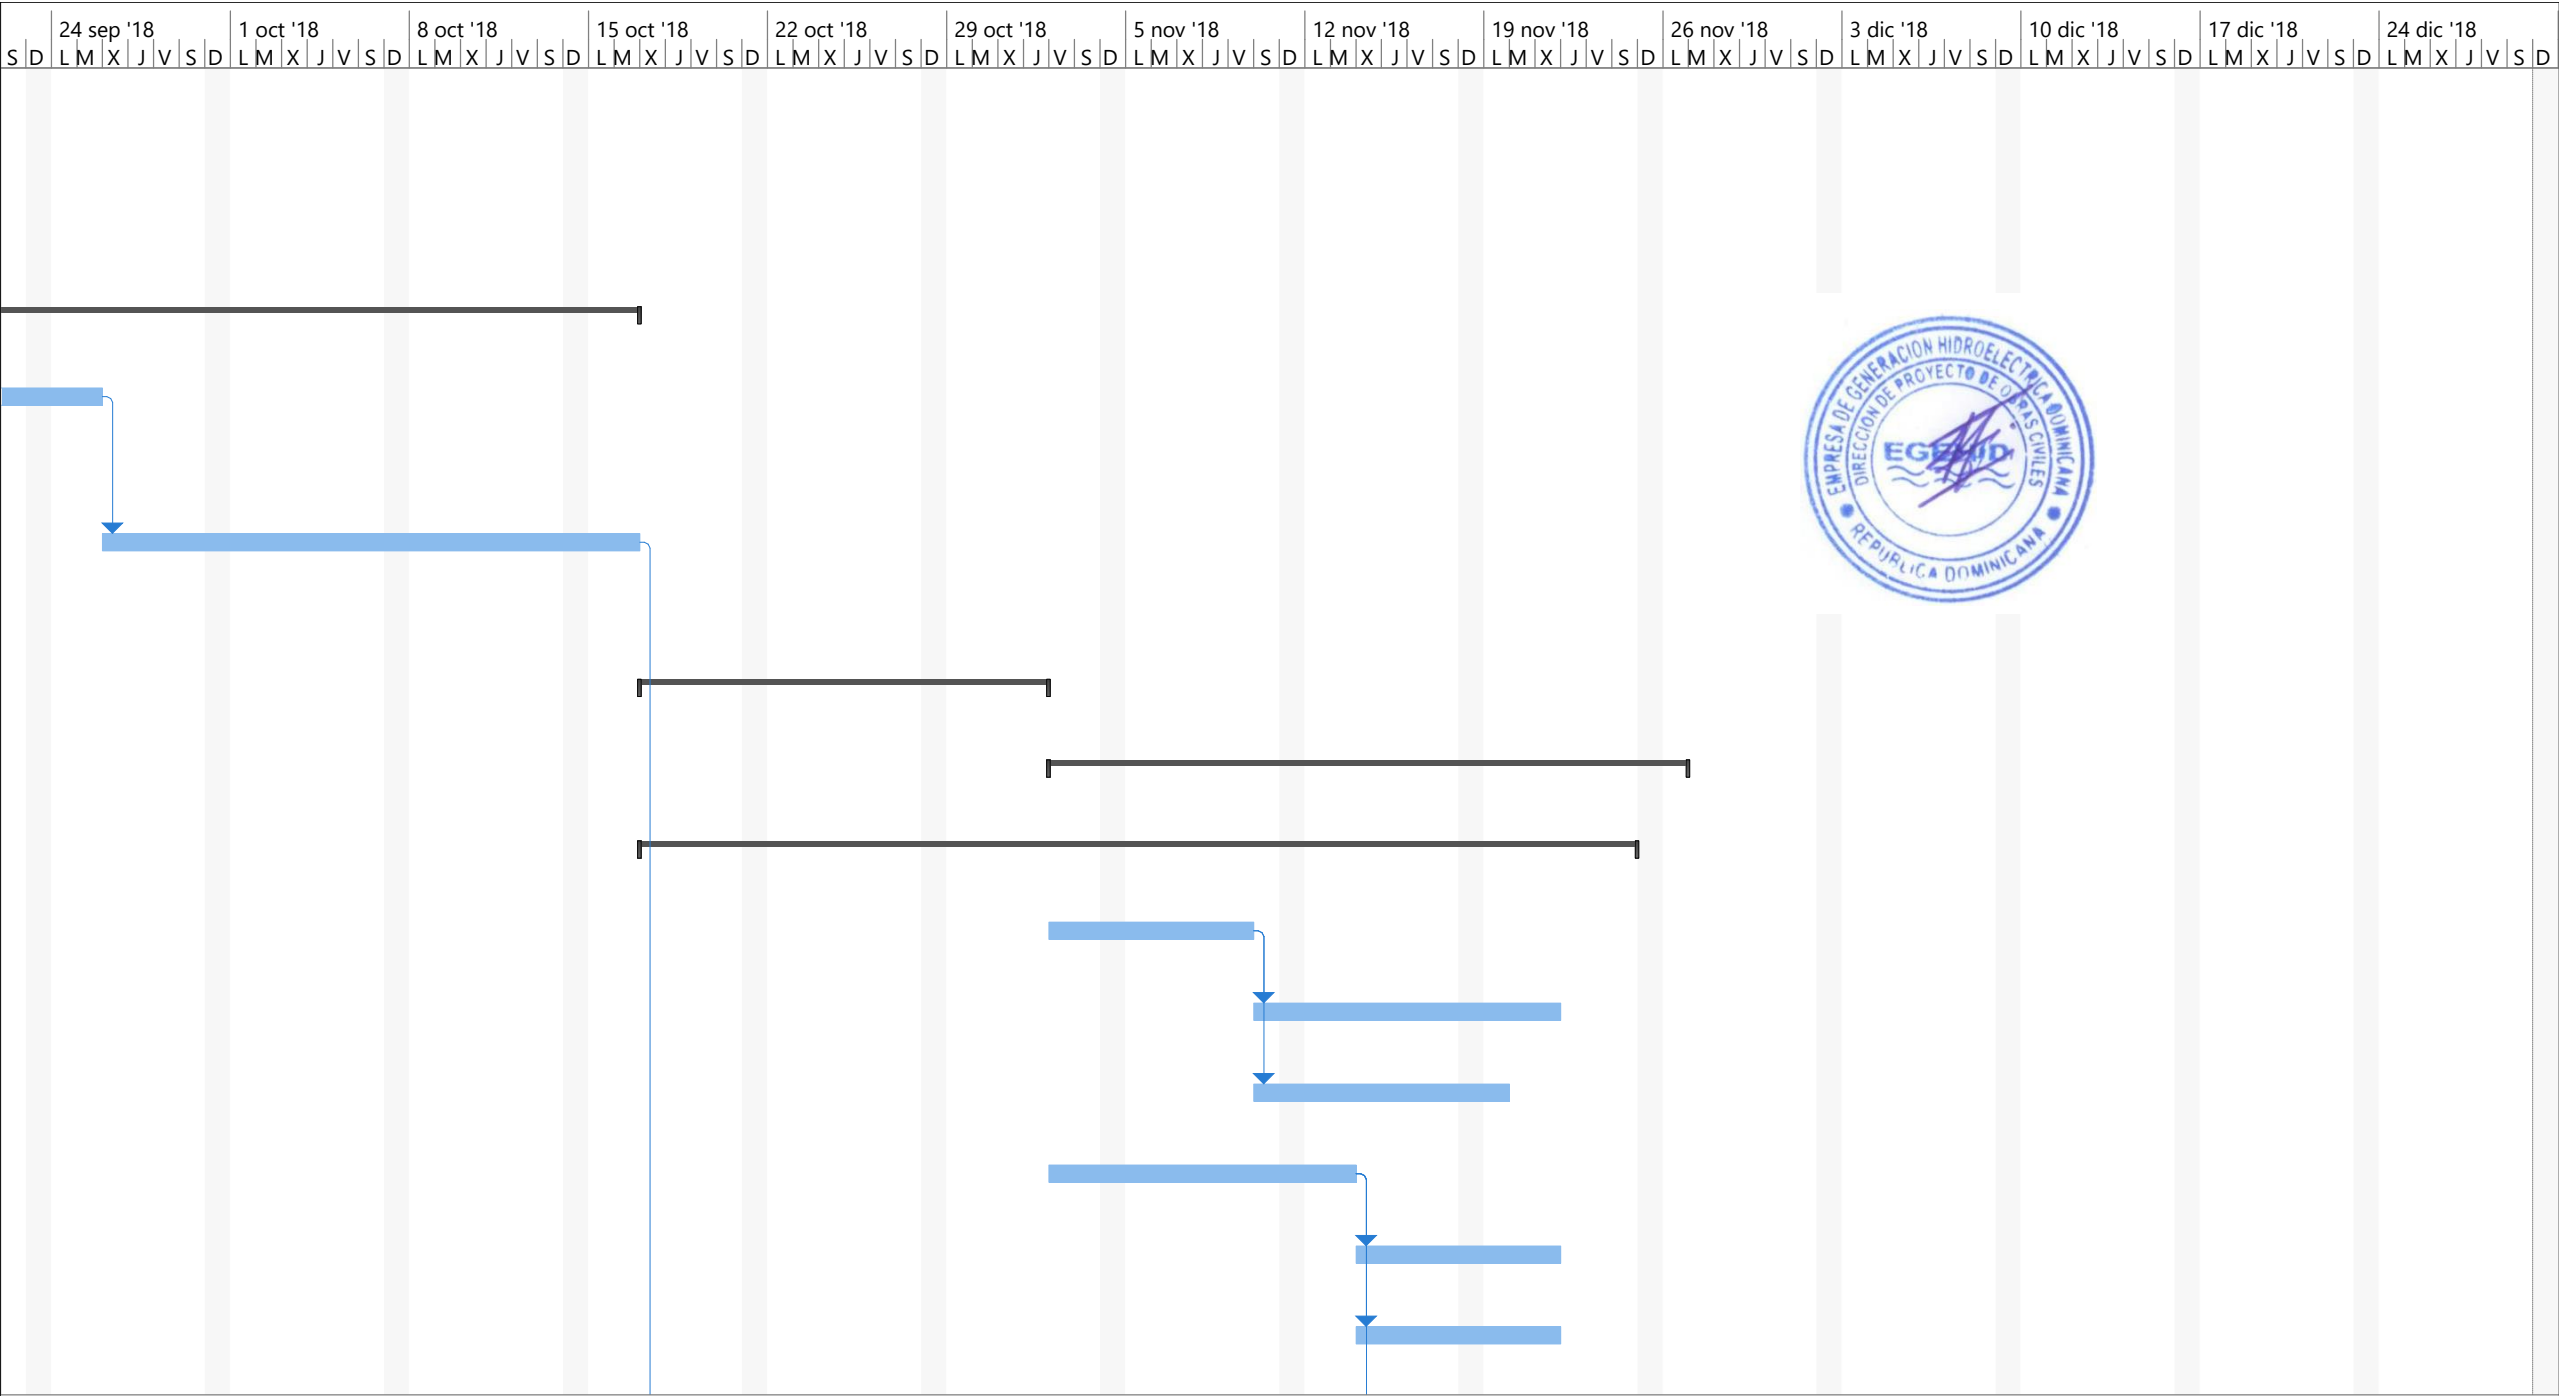

Proyecto: ING Maria Dolores 1 Fecha: jue 6/9/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

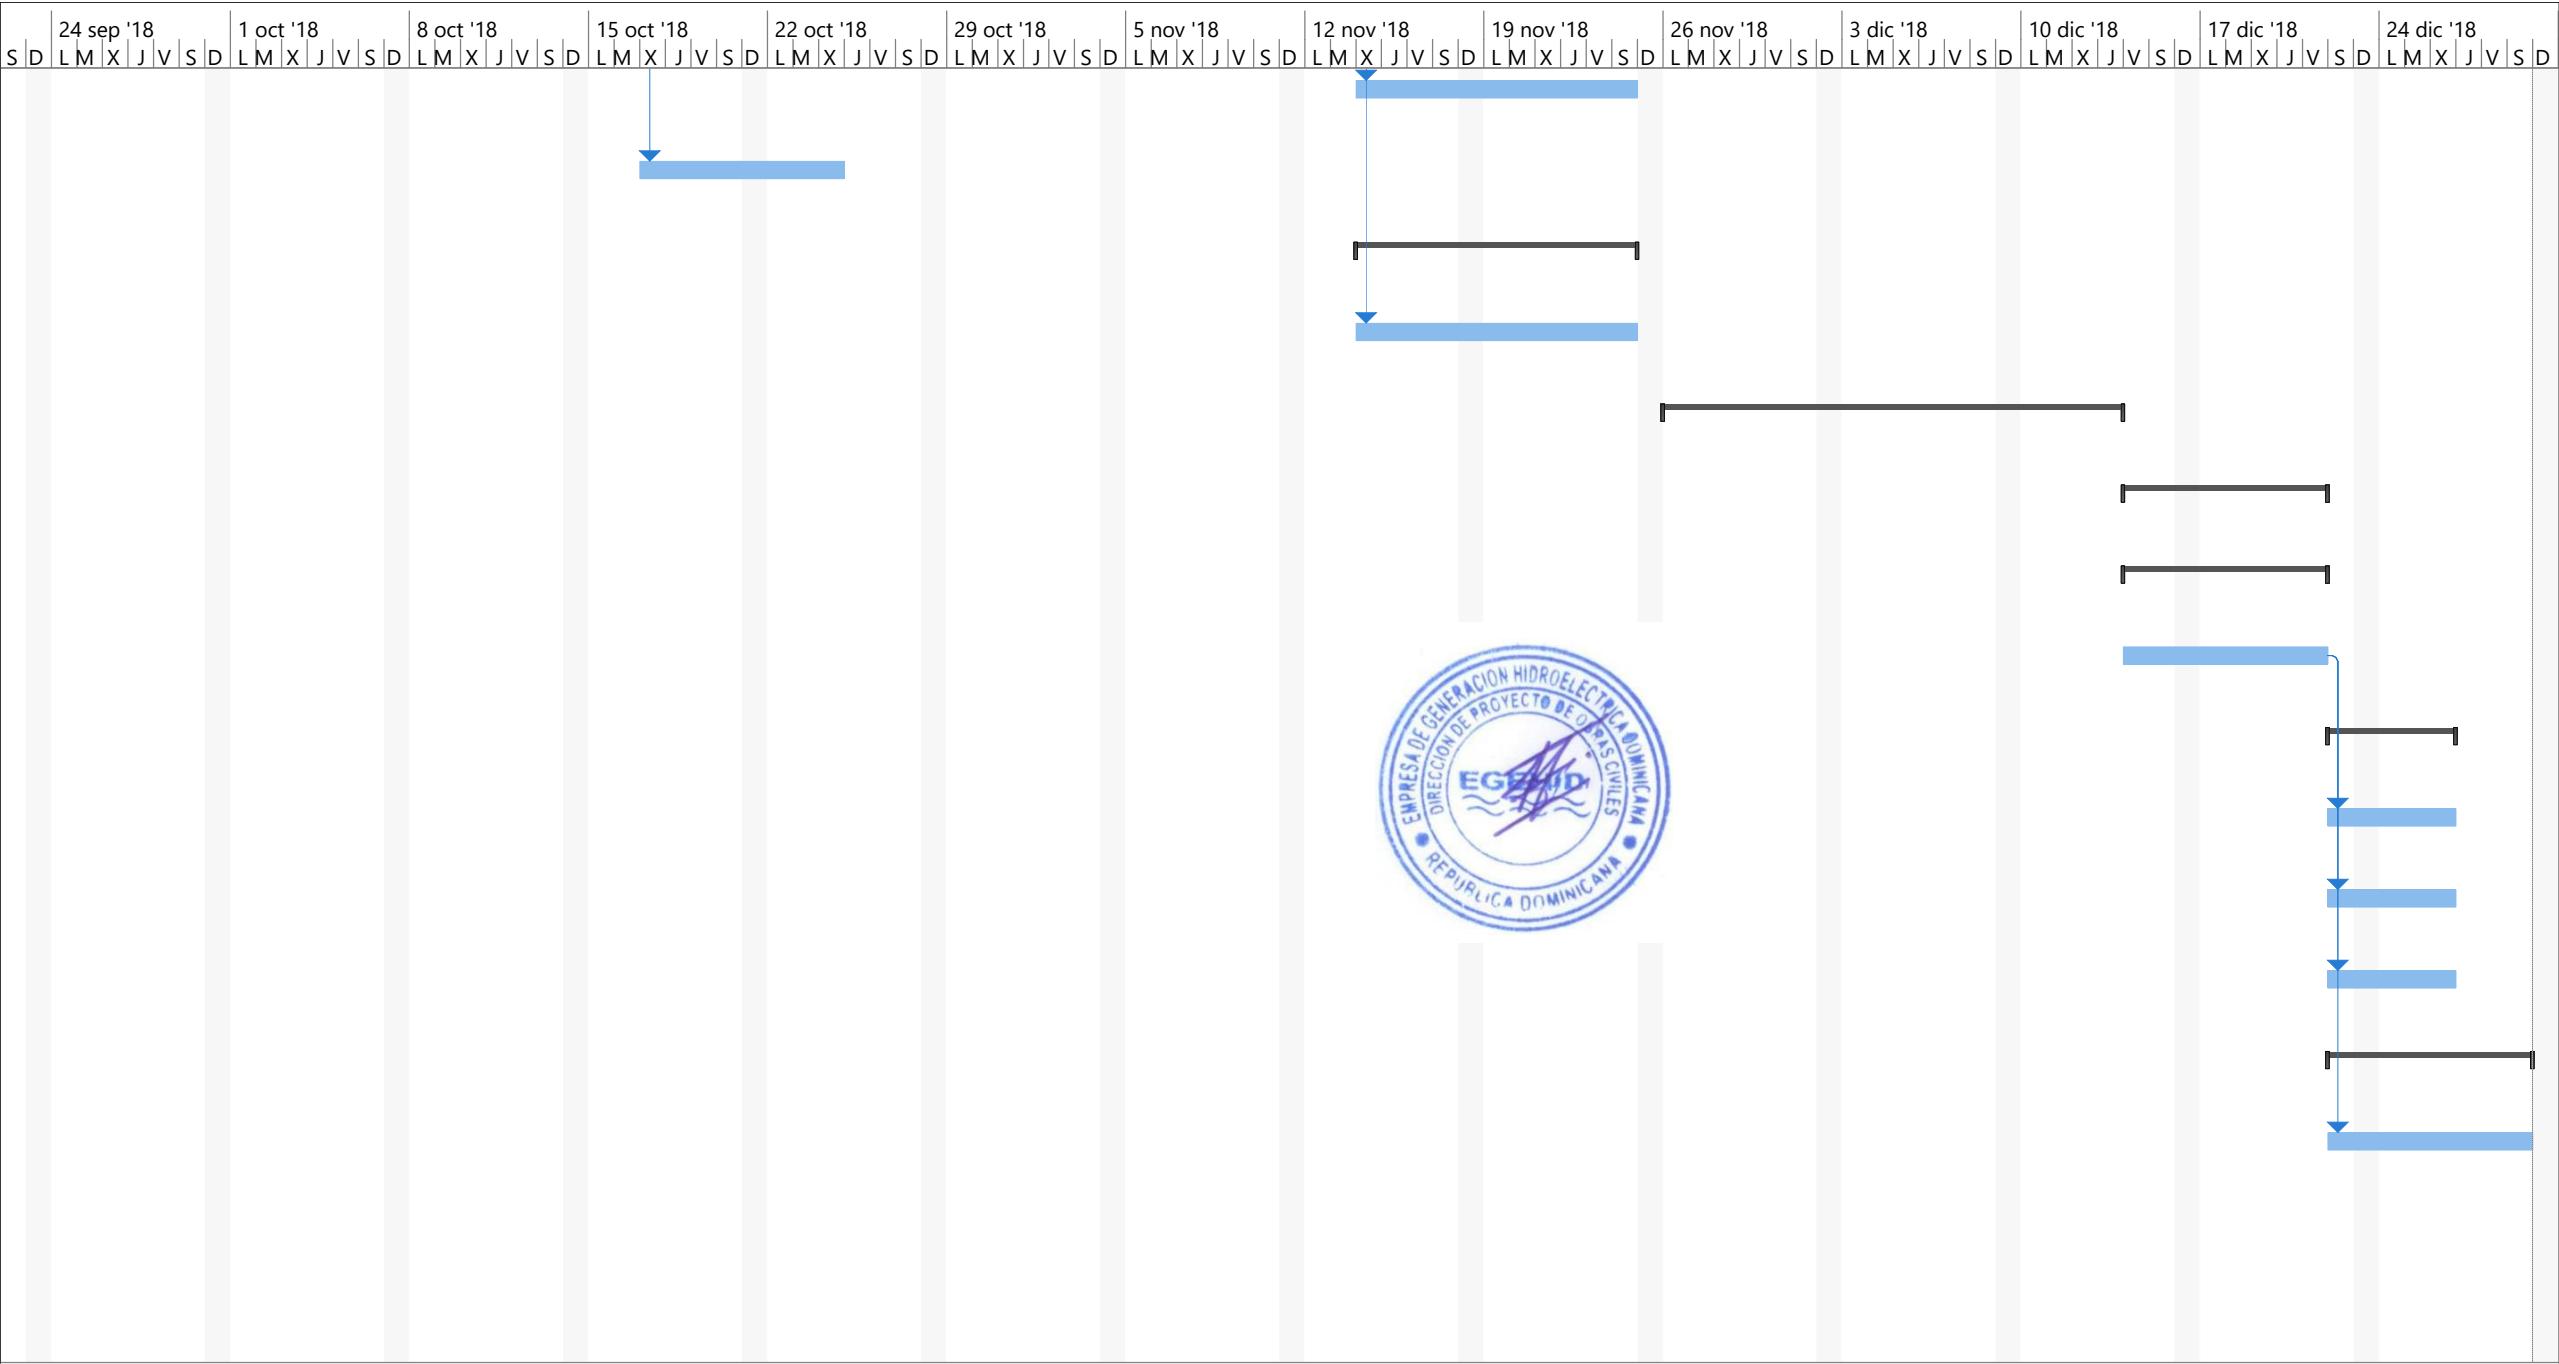

Proyecto: ING Maria Dolores 1
Fecha: jue 6/9/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Página 8
