





Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	

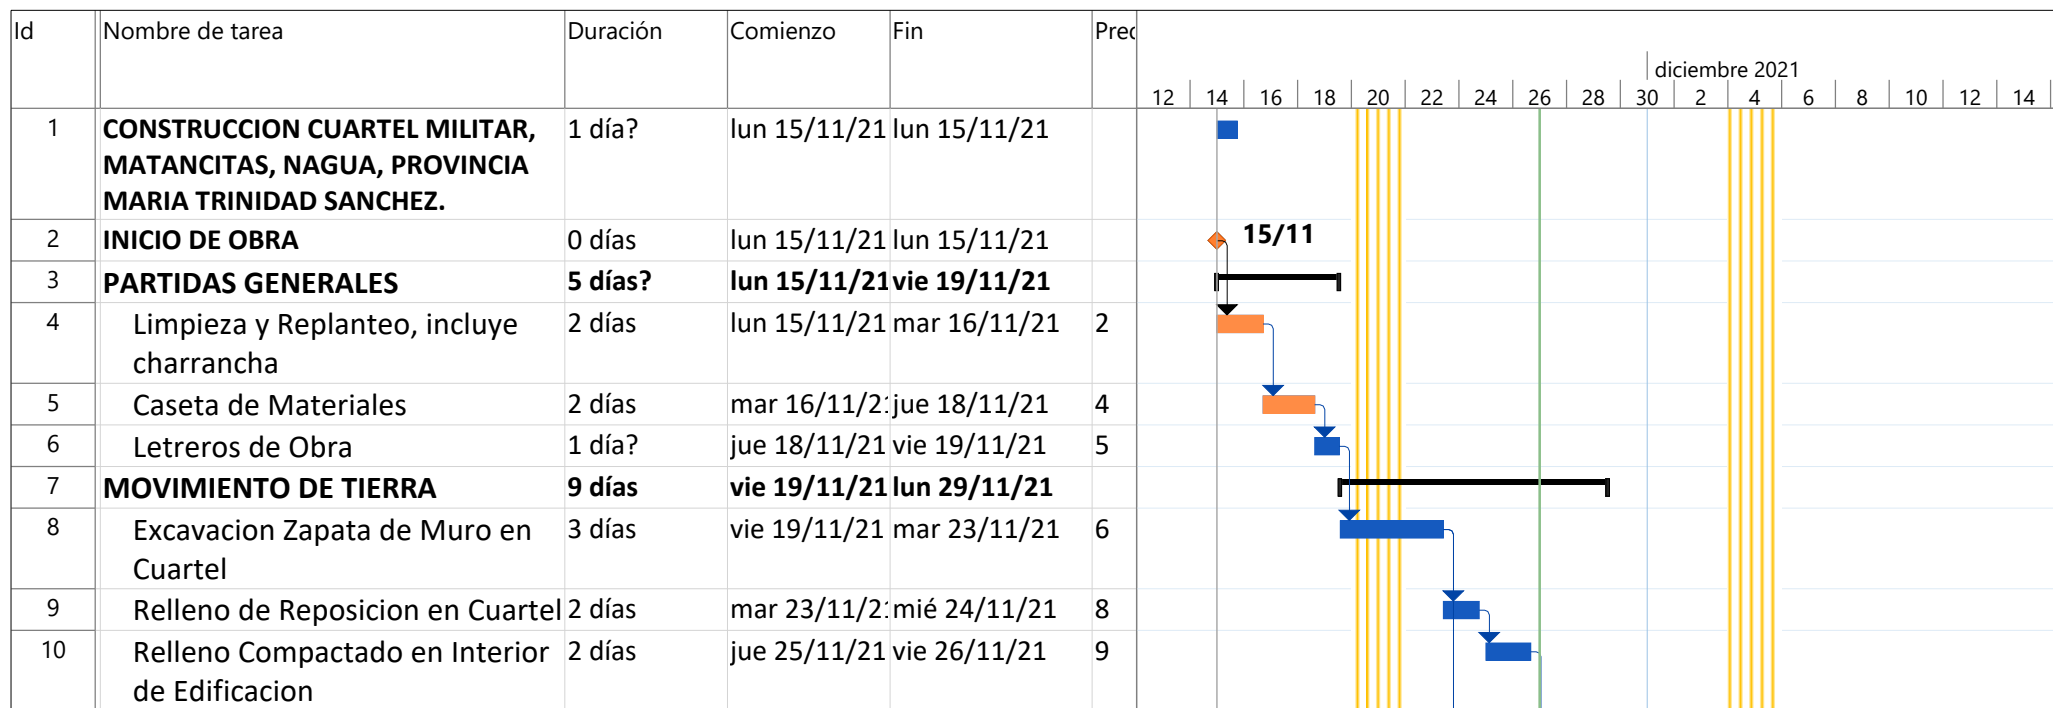

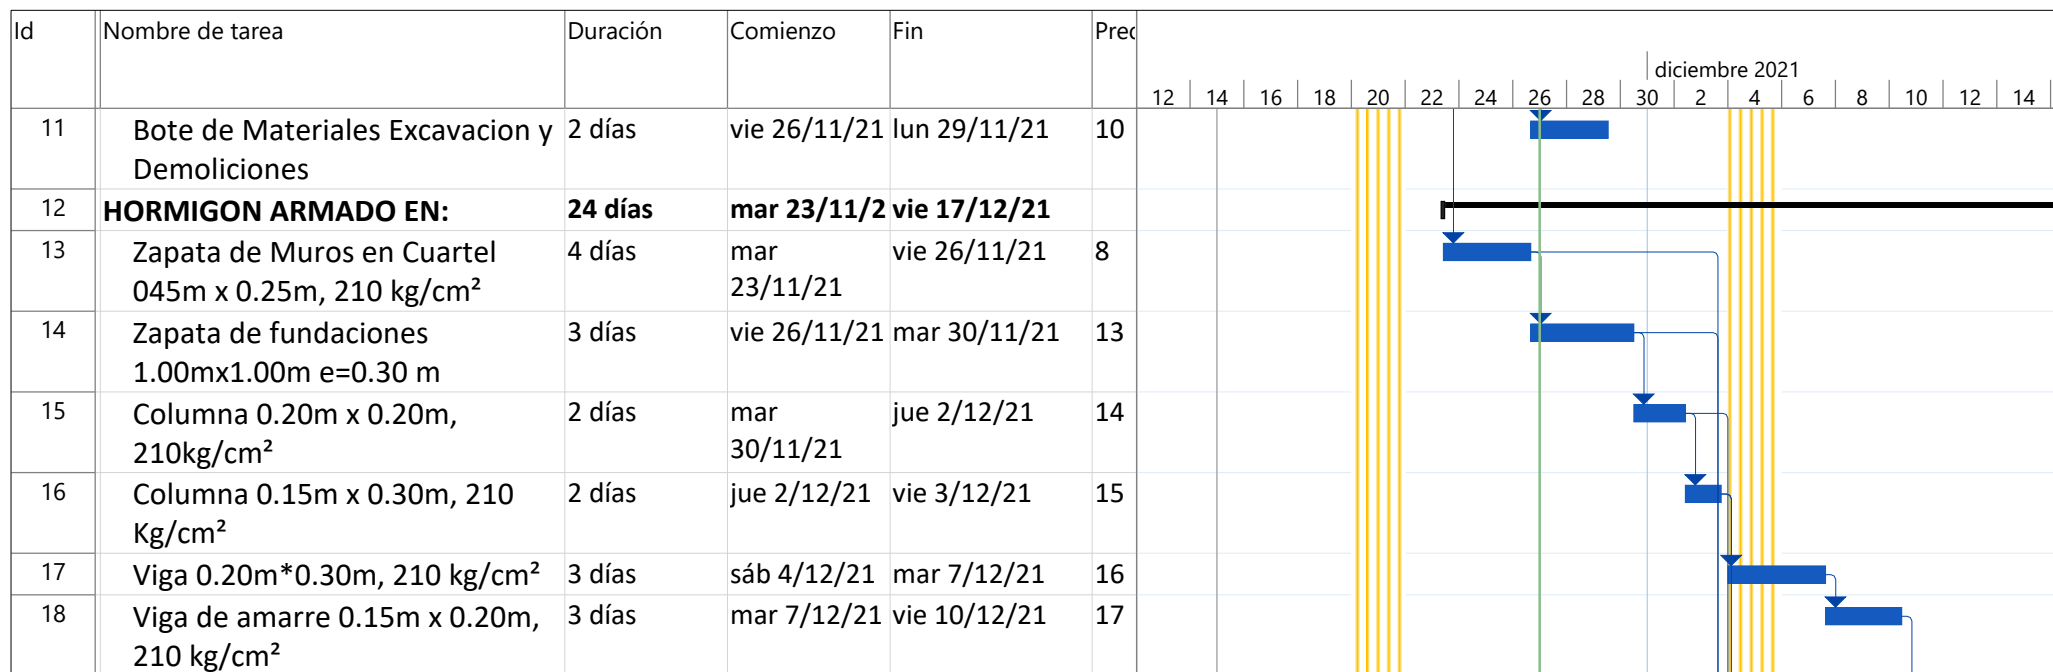

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedentes	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	Dinteles 0.15m x 0.20m, 210 kg/cm²	2 días	vie 10/12/21	lun 13/12/21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14
29	TERMINACION DE TECHO	6 días?	vie 17/12/21	jue 23/12/21																		
30	Fino de techo plano	3 días	vie 17/12/21	mar 21/12/21	20																	
31	Antepecho Terminado muro bloques 6", h=0,60m	3 días	vie 17/12/21	mar 21/12/21	20																	
32	Zabaleta en techo	2 días	mar 21/12/21	mié 22/12/21	31																	
33	Impermeabilizante Manto Asfáltico Granular 3mm, con Pintura Termoreductora.	3 días	mar 21/12/21	jue 23/12/21	30																	
34	Desague en Techo de 3"	1 día?	mar 21/12/21	mié 22/12/21	31																	
35	PUERTAS Y VENTANAS	19 días	jue 30/12/21	sáb 22/1/22																		
36	Ventana Salomonica de Aluminio AA	5 días	jue 30/12/21	vie 7/1/22	27																	
37	Puerta Polimetal (0.80m 7 0.70m x 2.10m) en Banos	3 días	vie 7/1/22	lun 10/1/22	36																	
38	Puerta en Closet Tipo Libro	3 días	mar 11/1/22	jue 13/1/22	37																	

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precio	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
39	Gabinete de piso en pino Tratado	3 días	jue 13/1/22	lun 17/1/22	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
49	Fregadero Dos Bocas de Ainox, incl. Sum y col	1 día?	mar 4/1/22	mié 5/1/22	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
60	Construccion de cisterna	15 días	sáb 5/2/22	lun 21/2/22	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedente	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
73	Piso en porcelanato importado 0,40m*0,40m, incluye torta de 10cms con malla 0,10m*0,10m*,2,3	3 días	mar 18/1/22	jue 20/1/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
83	Movimiento de tierra	6 días	jue 24/3/22	mié 30/3/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
95	Block de 6* SNP	4 días	mar 5/4/22	sáb 9/4/22	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedente	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
106	MISCELANEOS	24 días	vie 15/4/22	mar 10/5/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




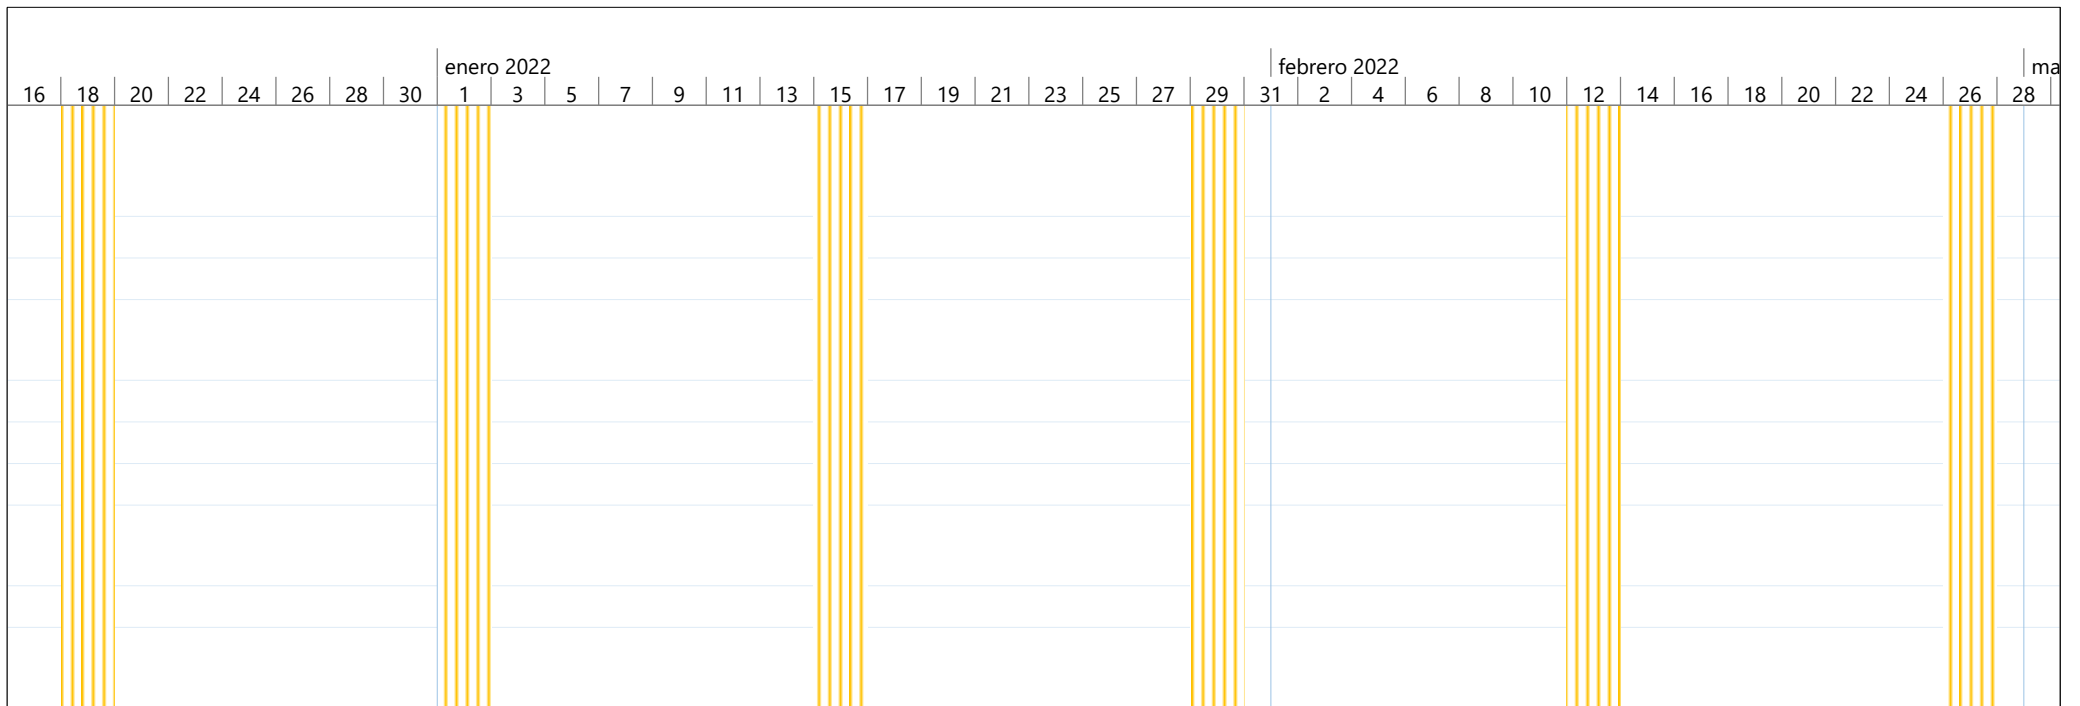

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



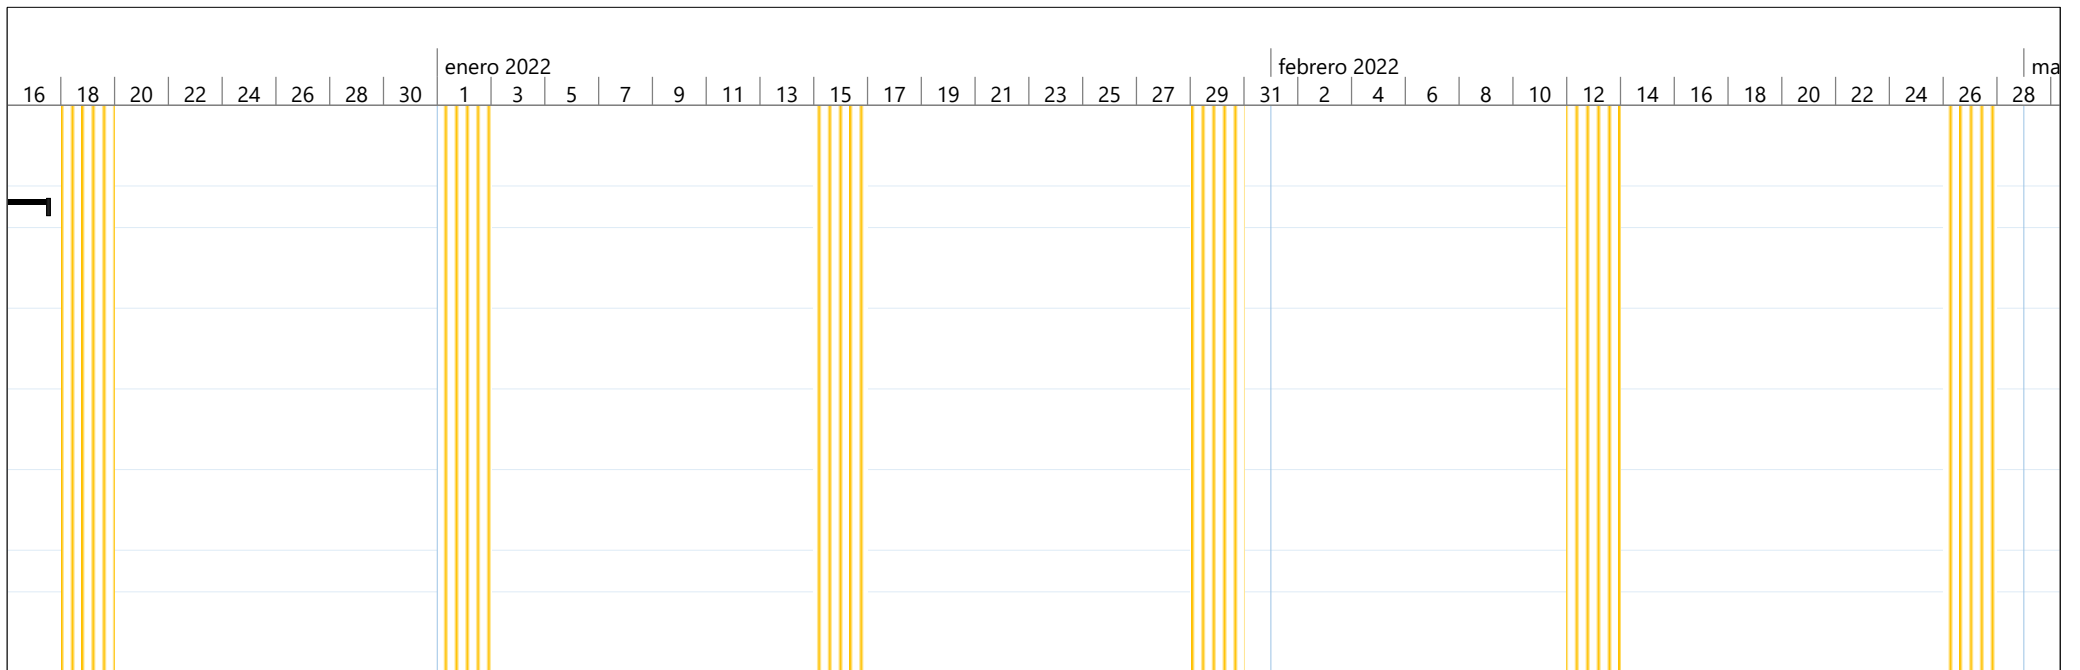

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	






Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




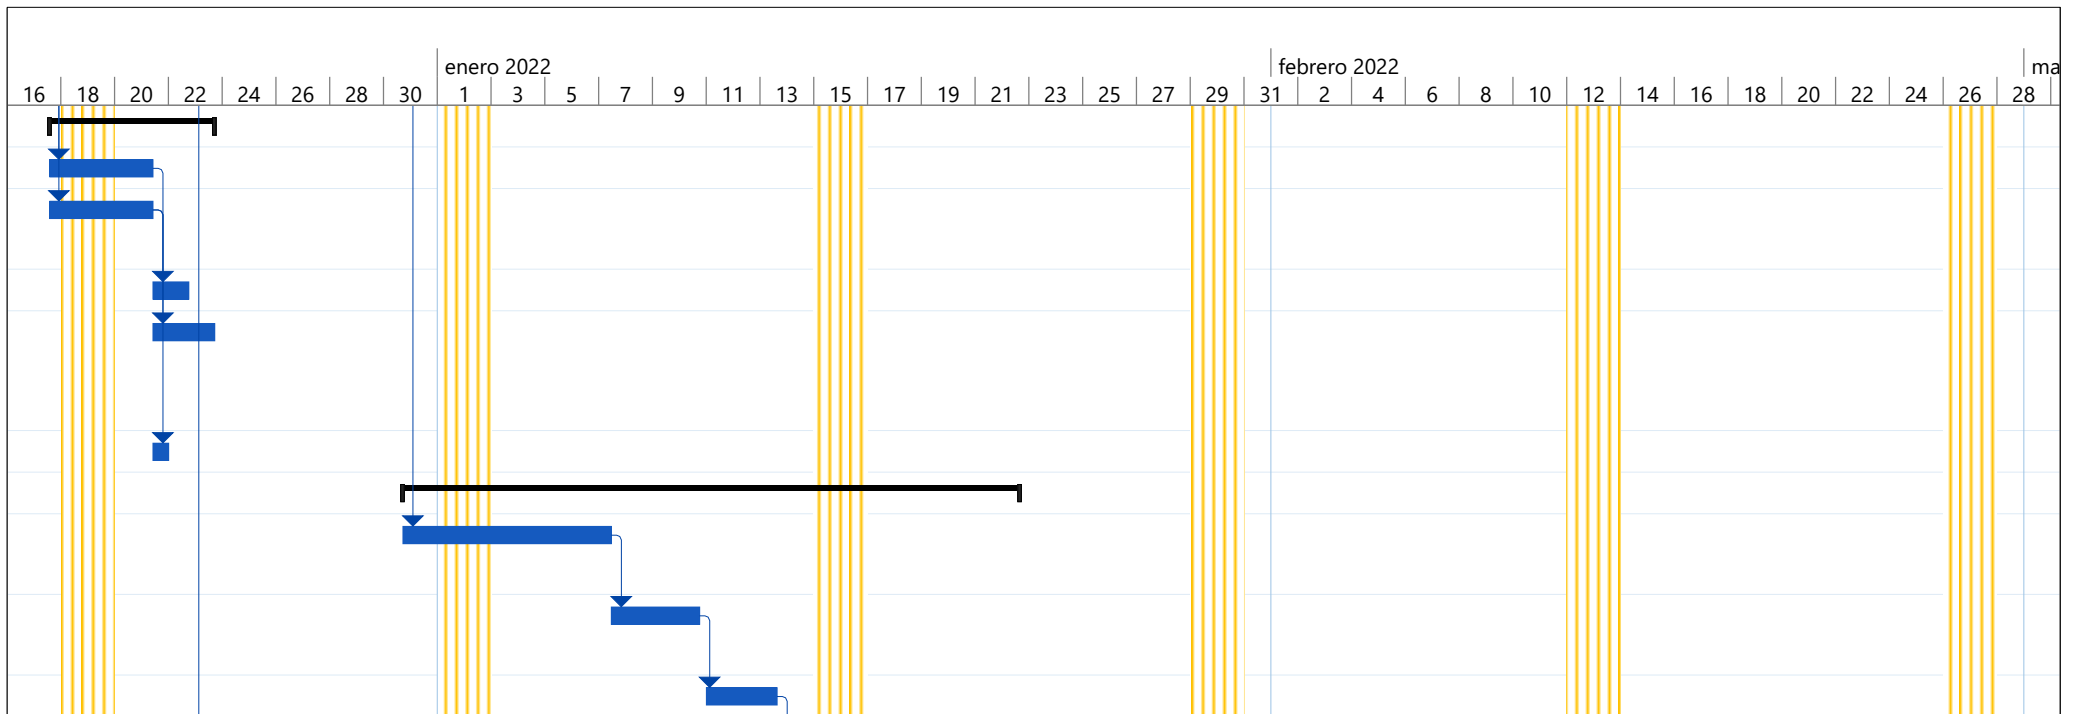

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




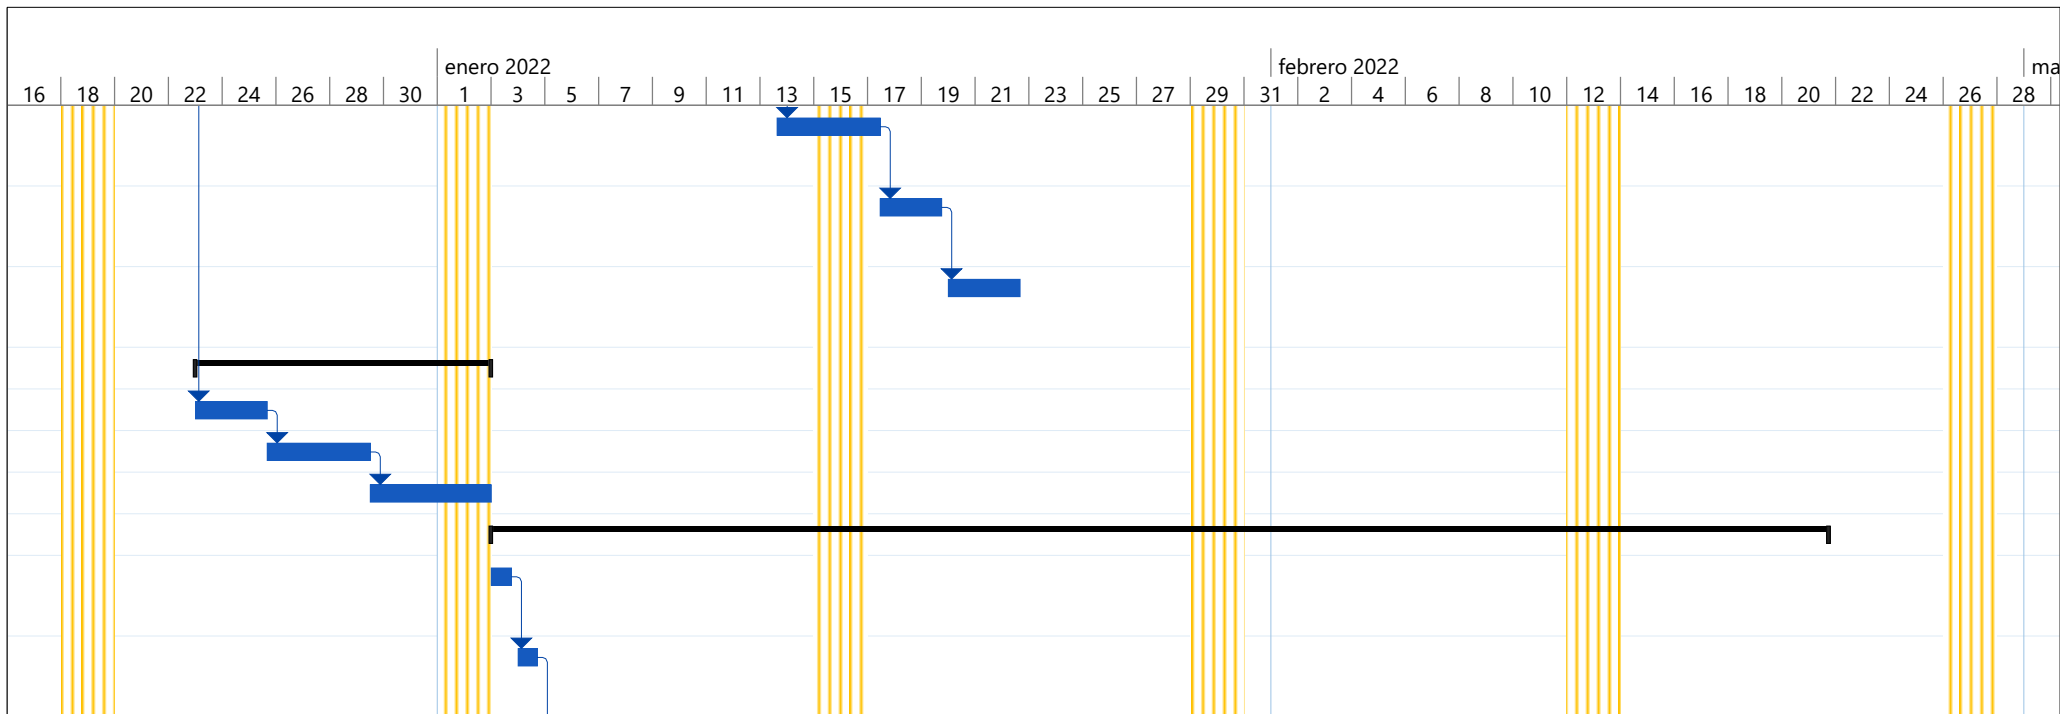

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




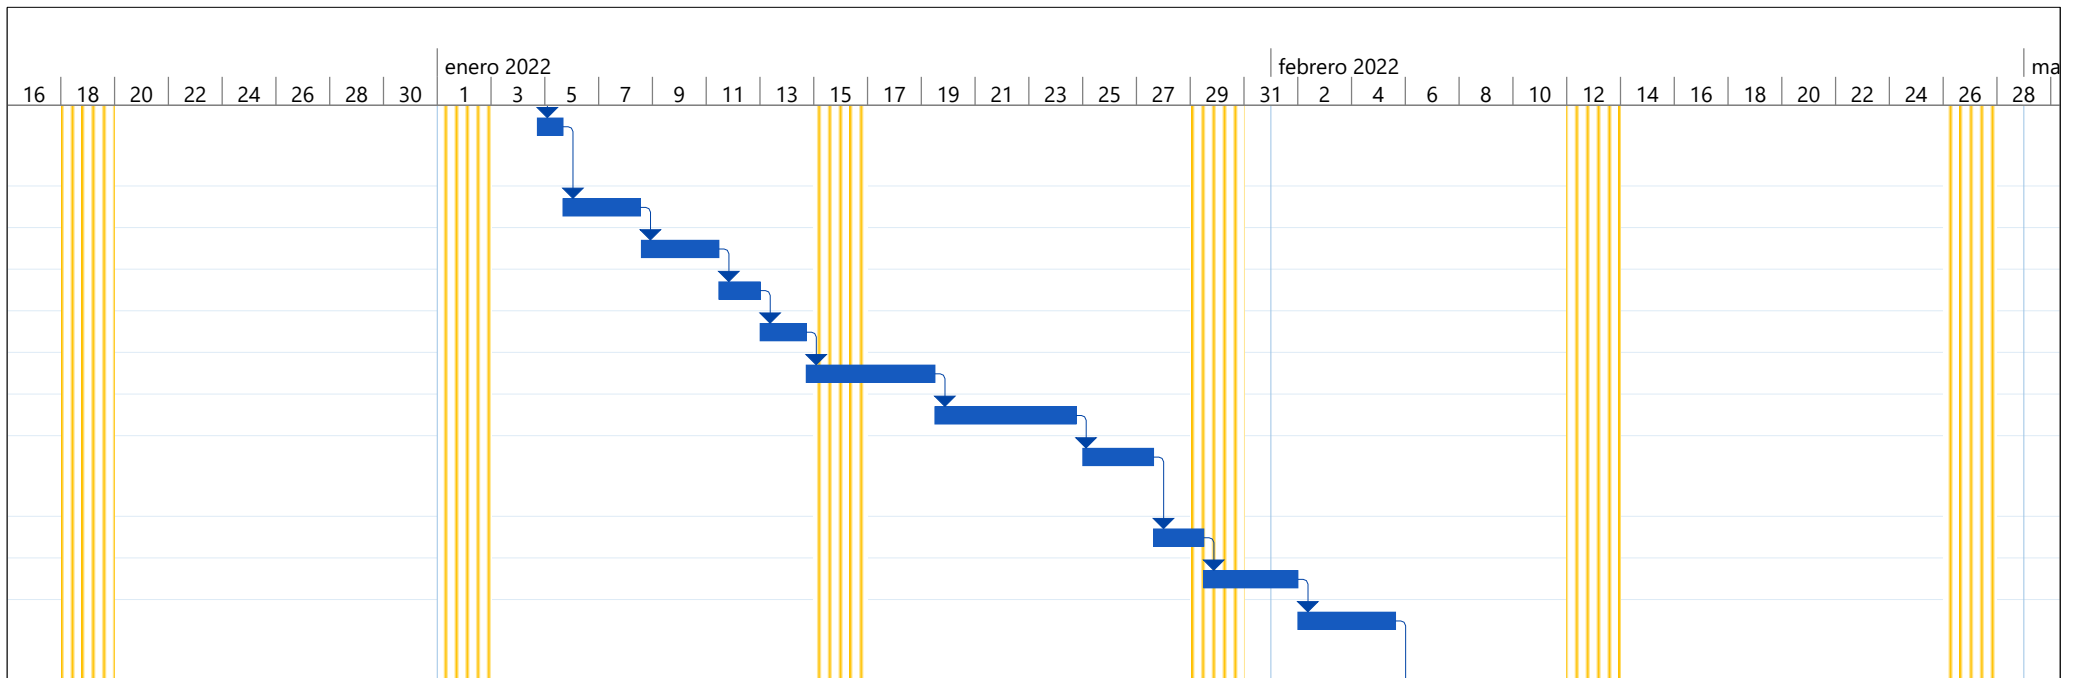

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




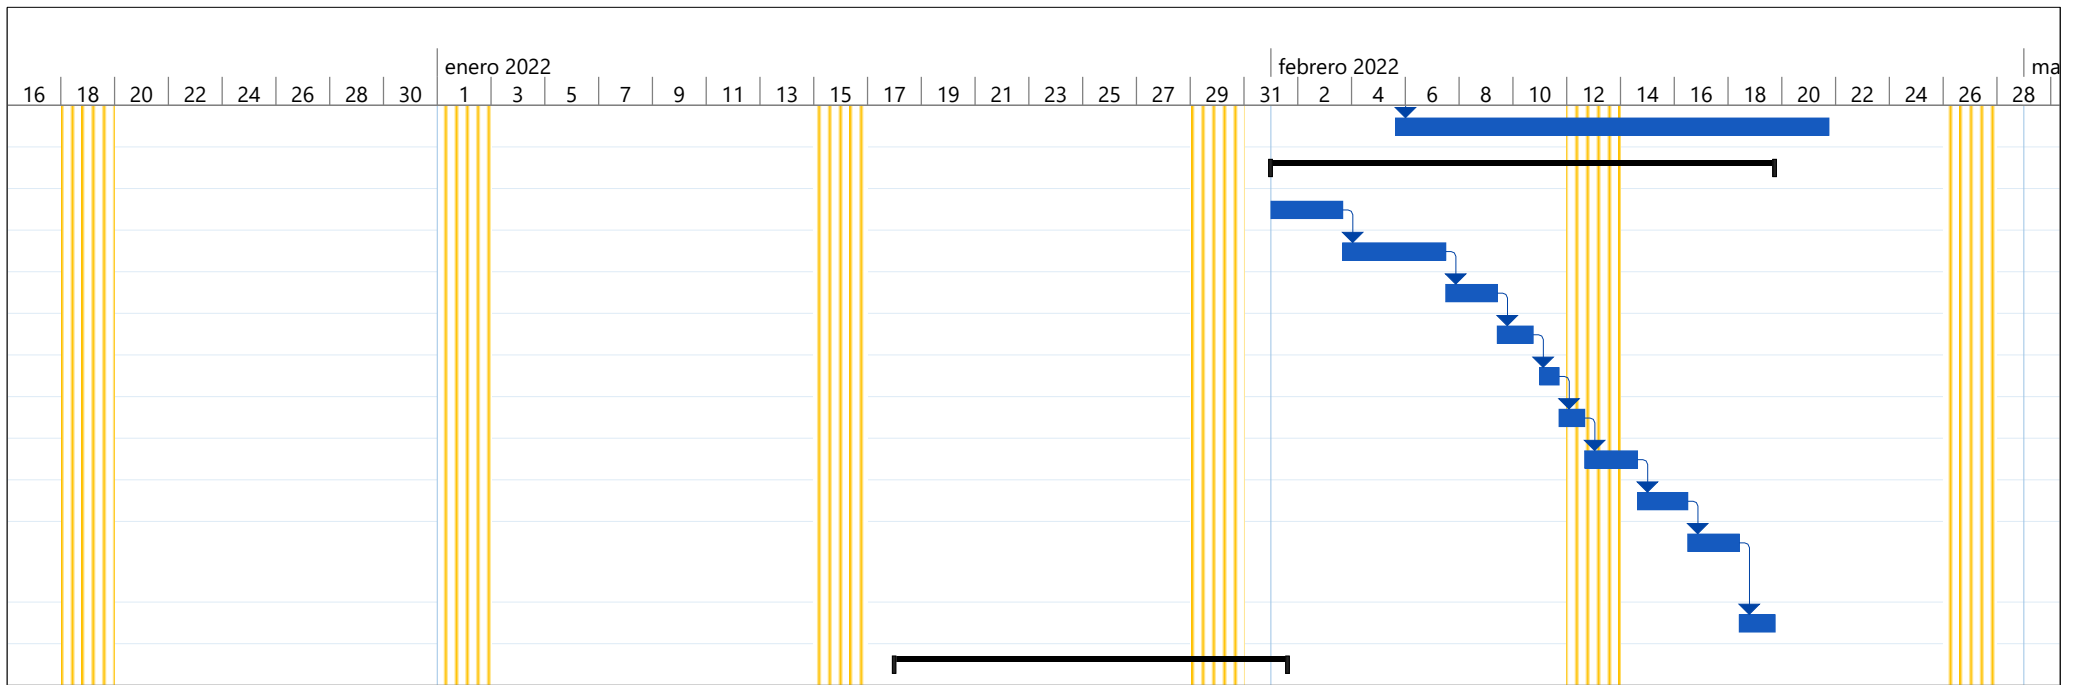

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




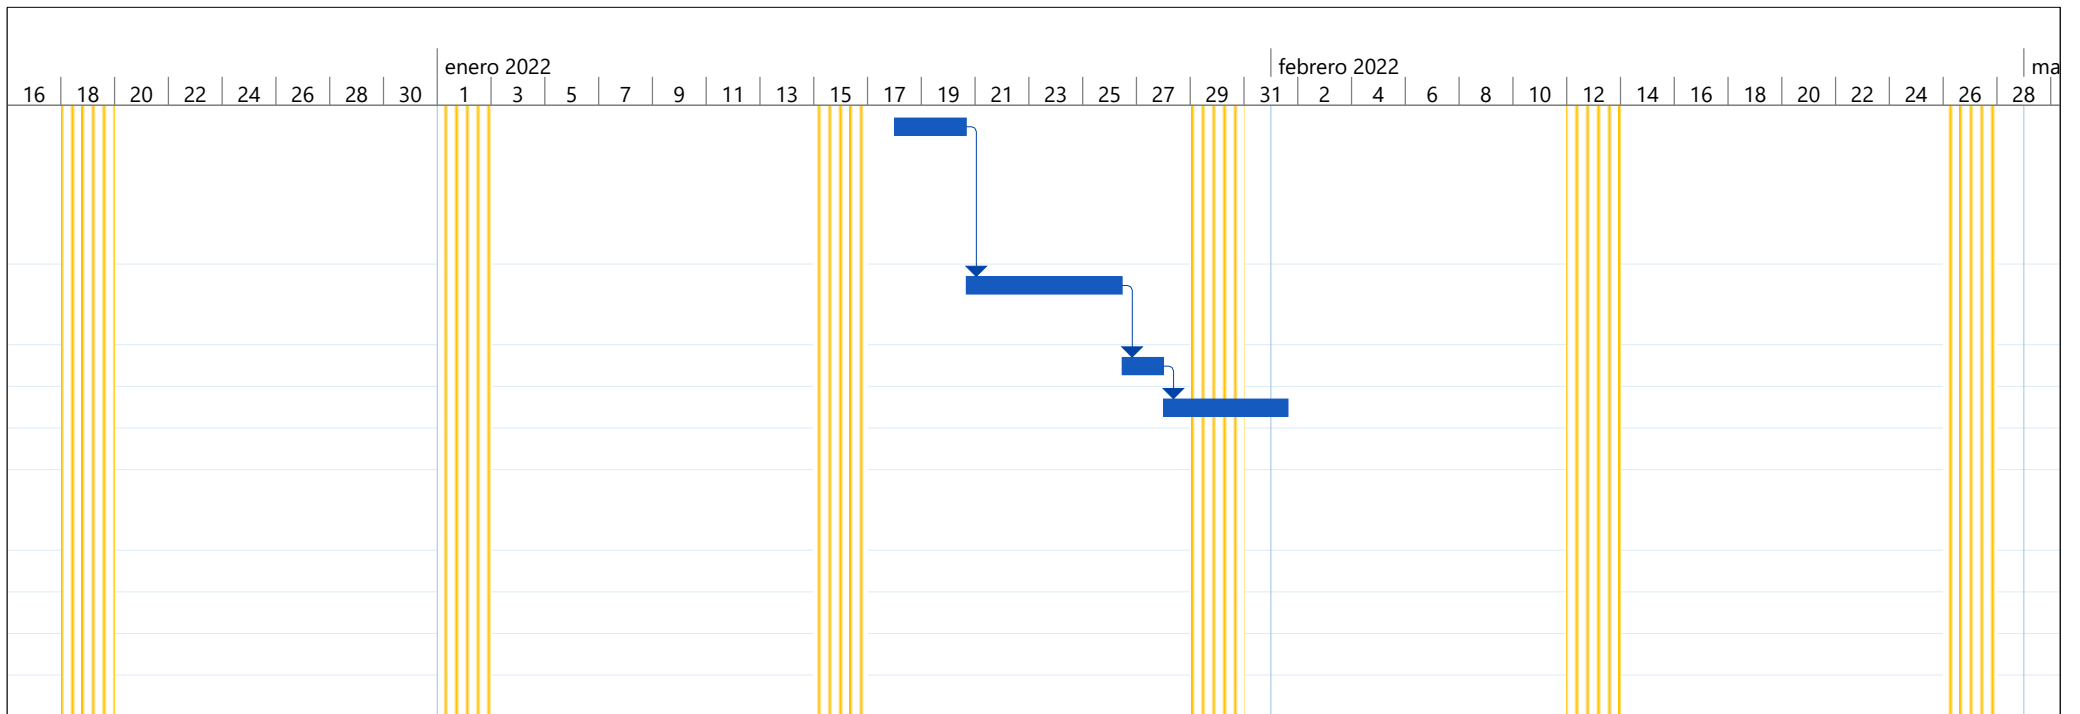

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21


Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



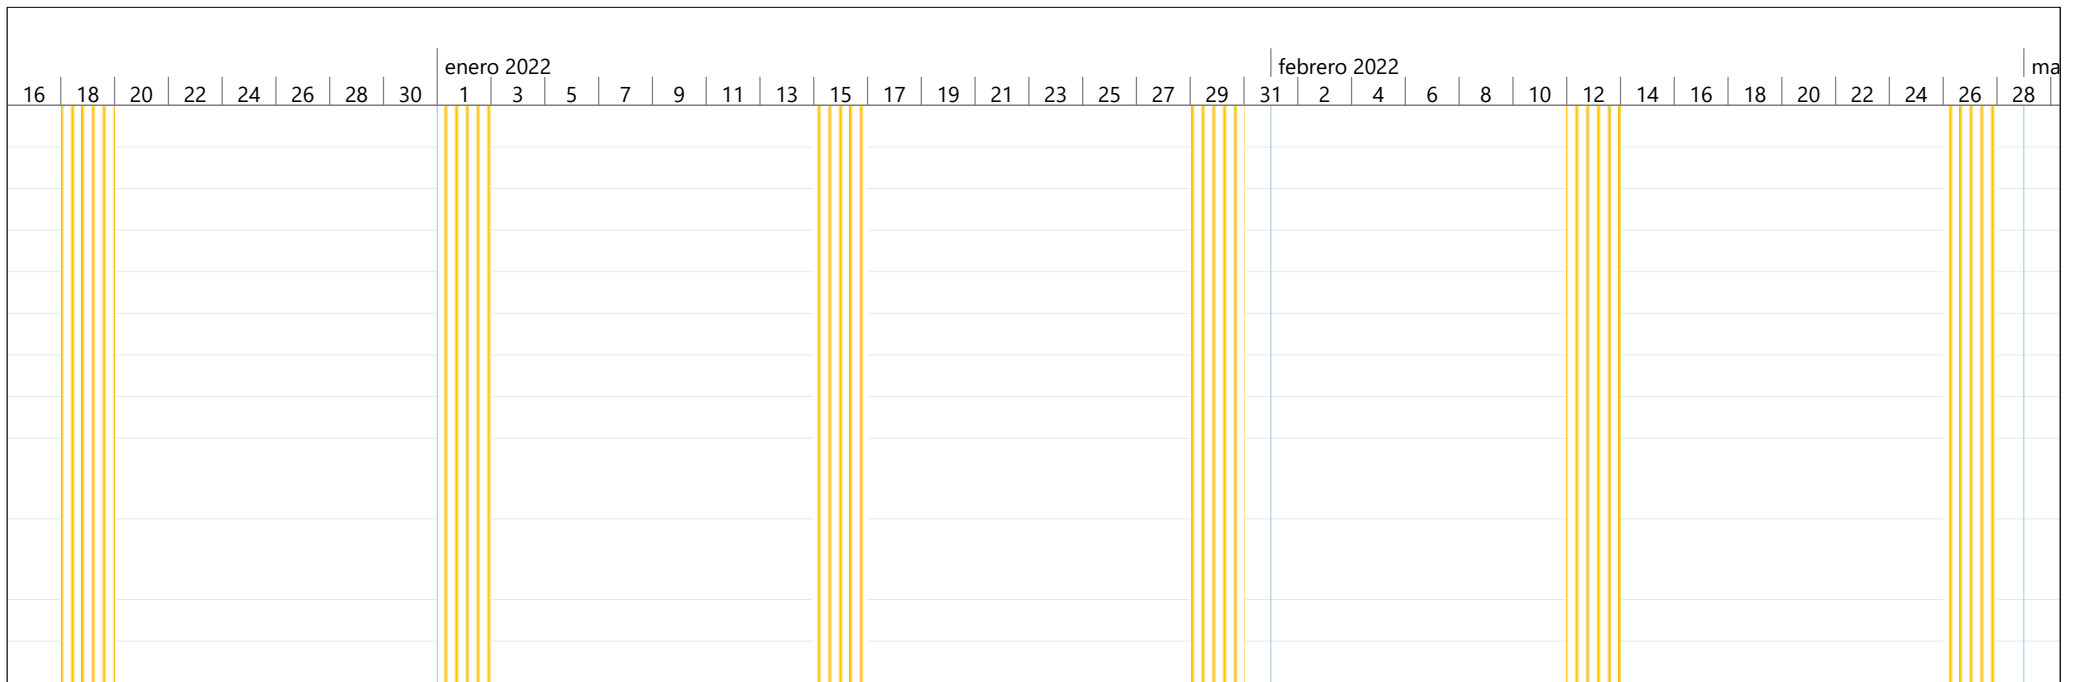


Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	



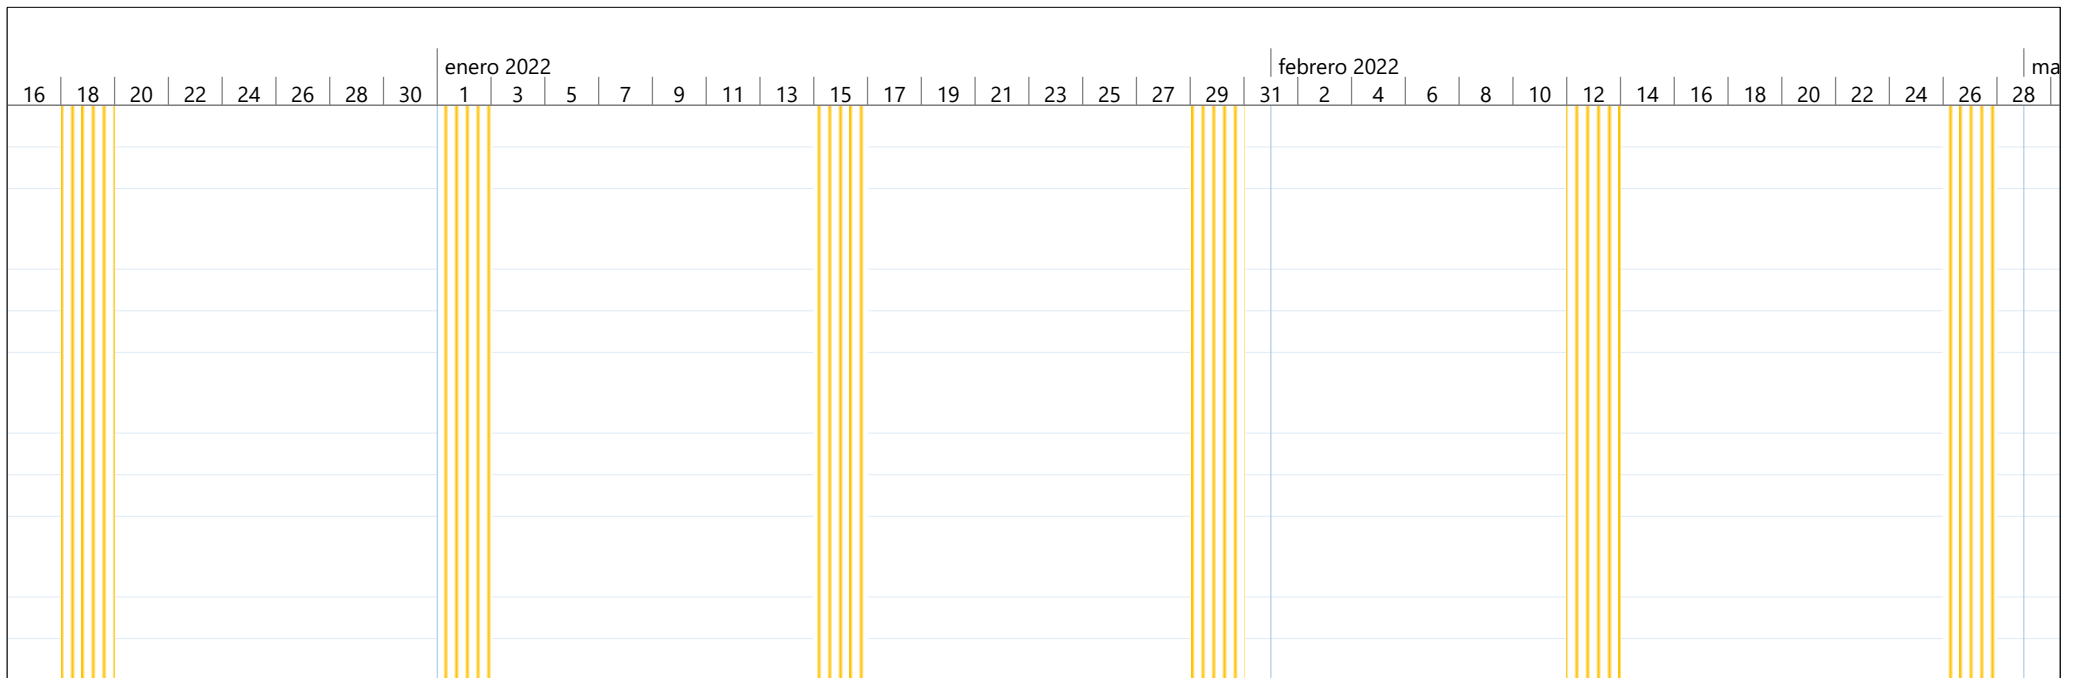


Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	



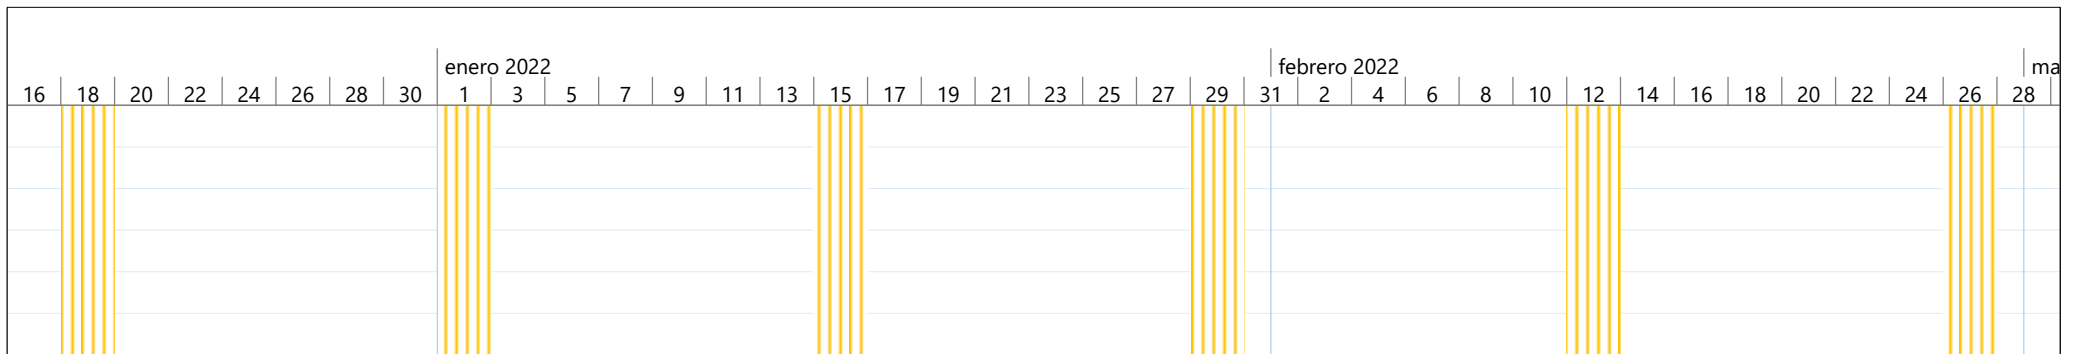

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	




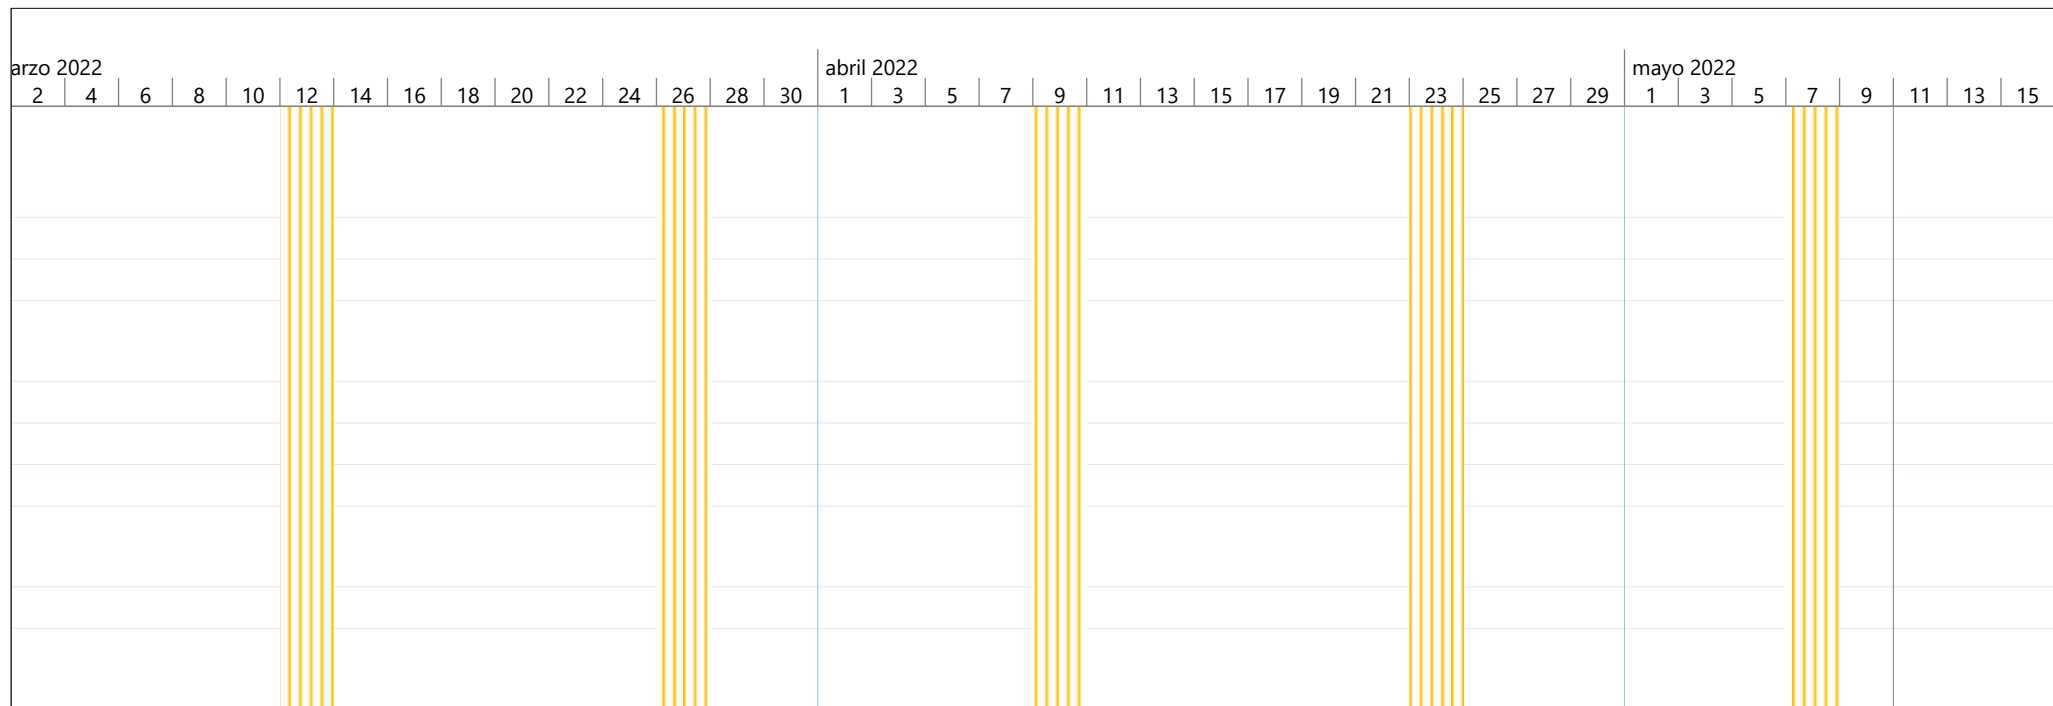

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




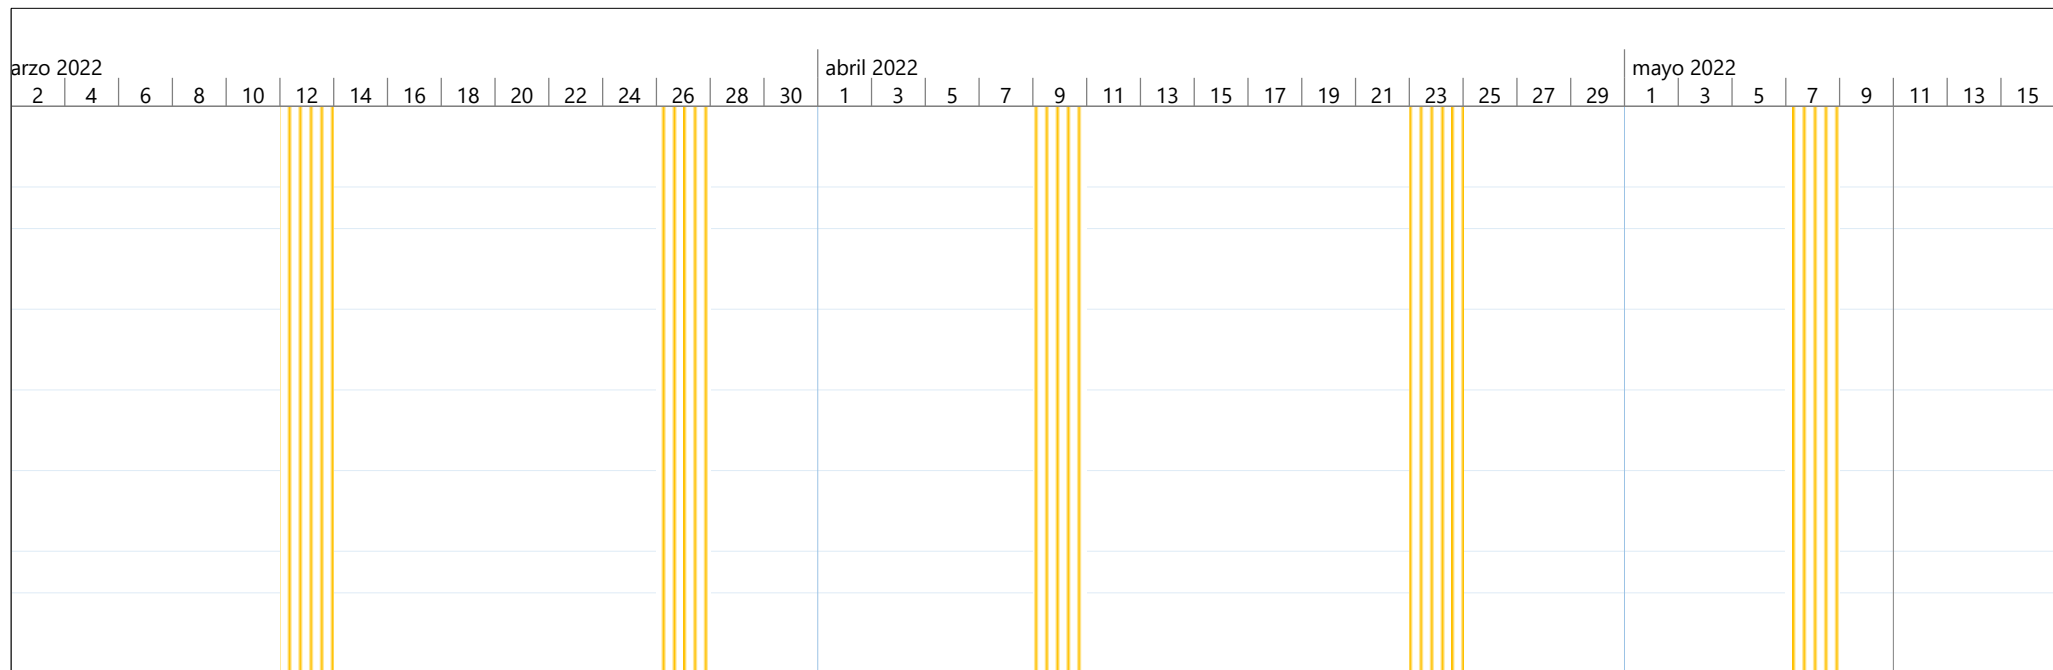

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




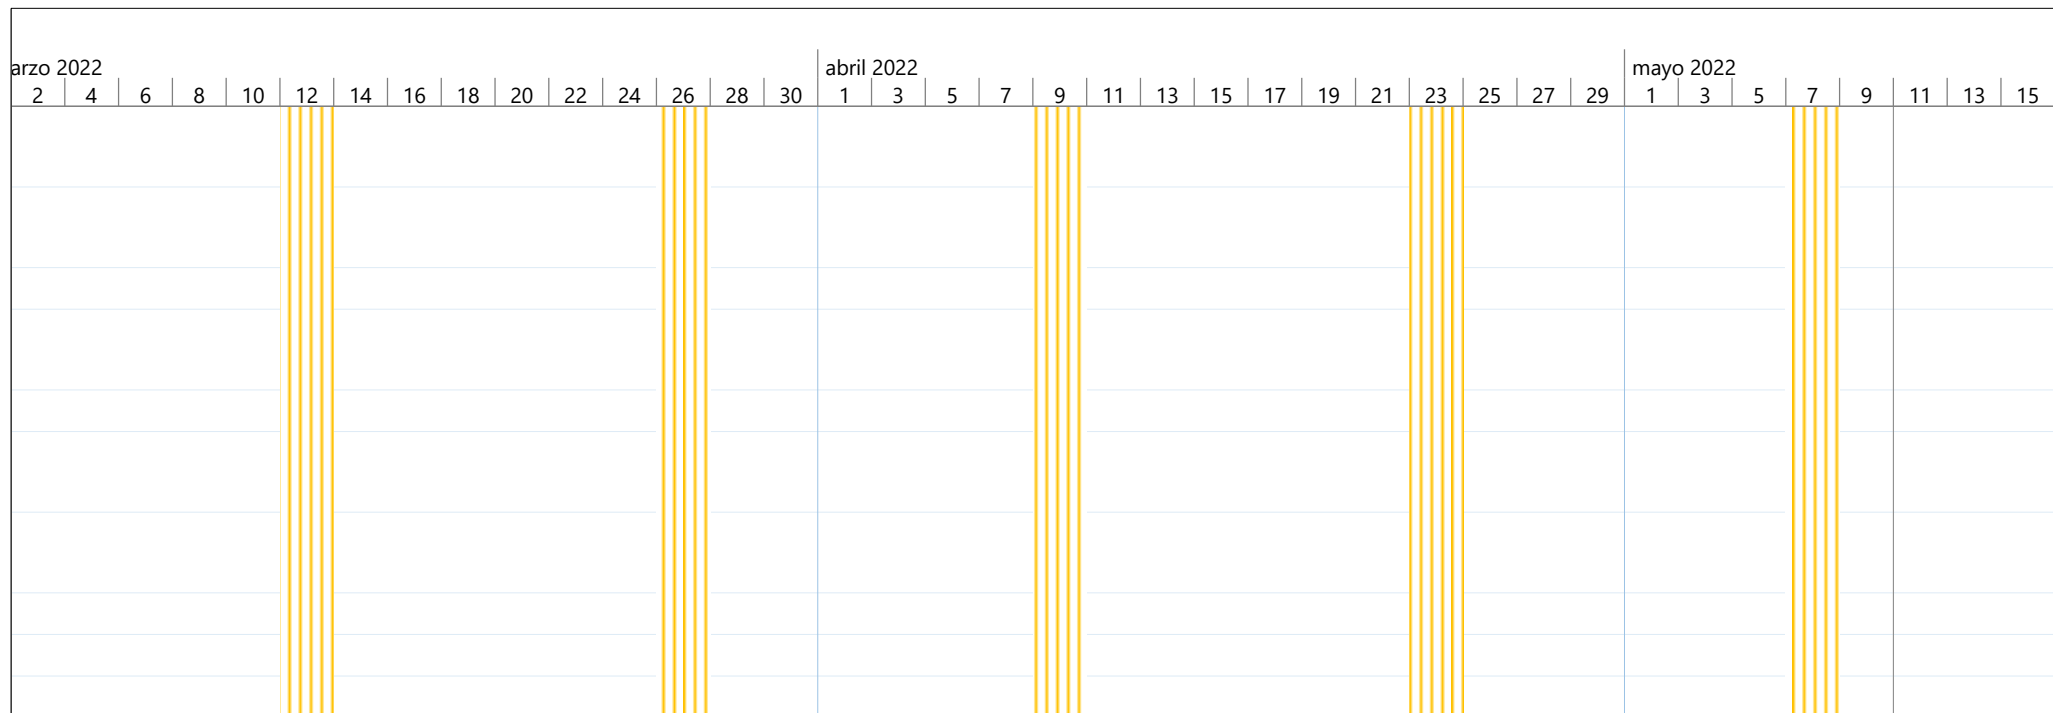

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




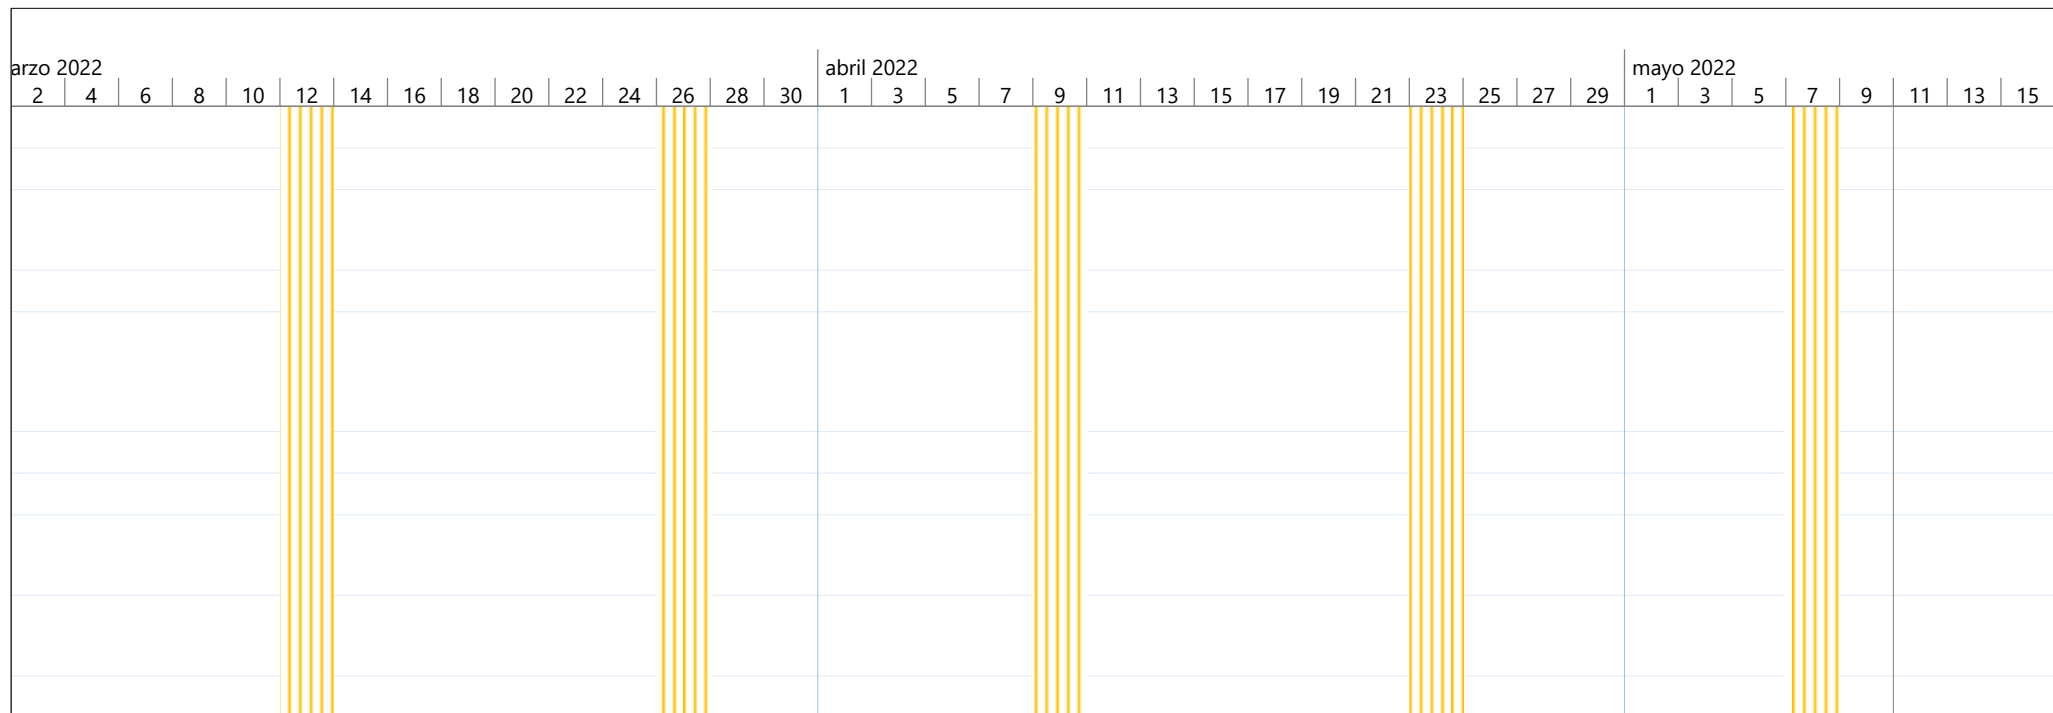

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




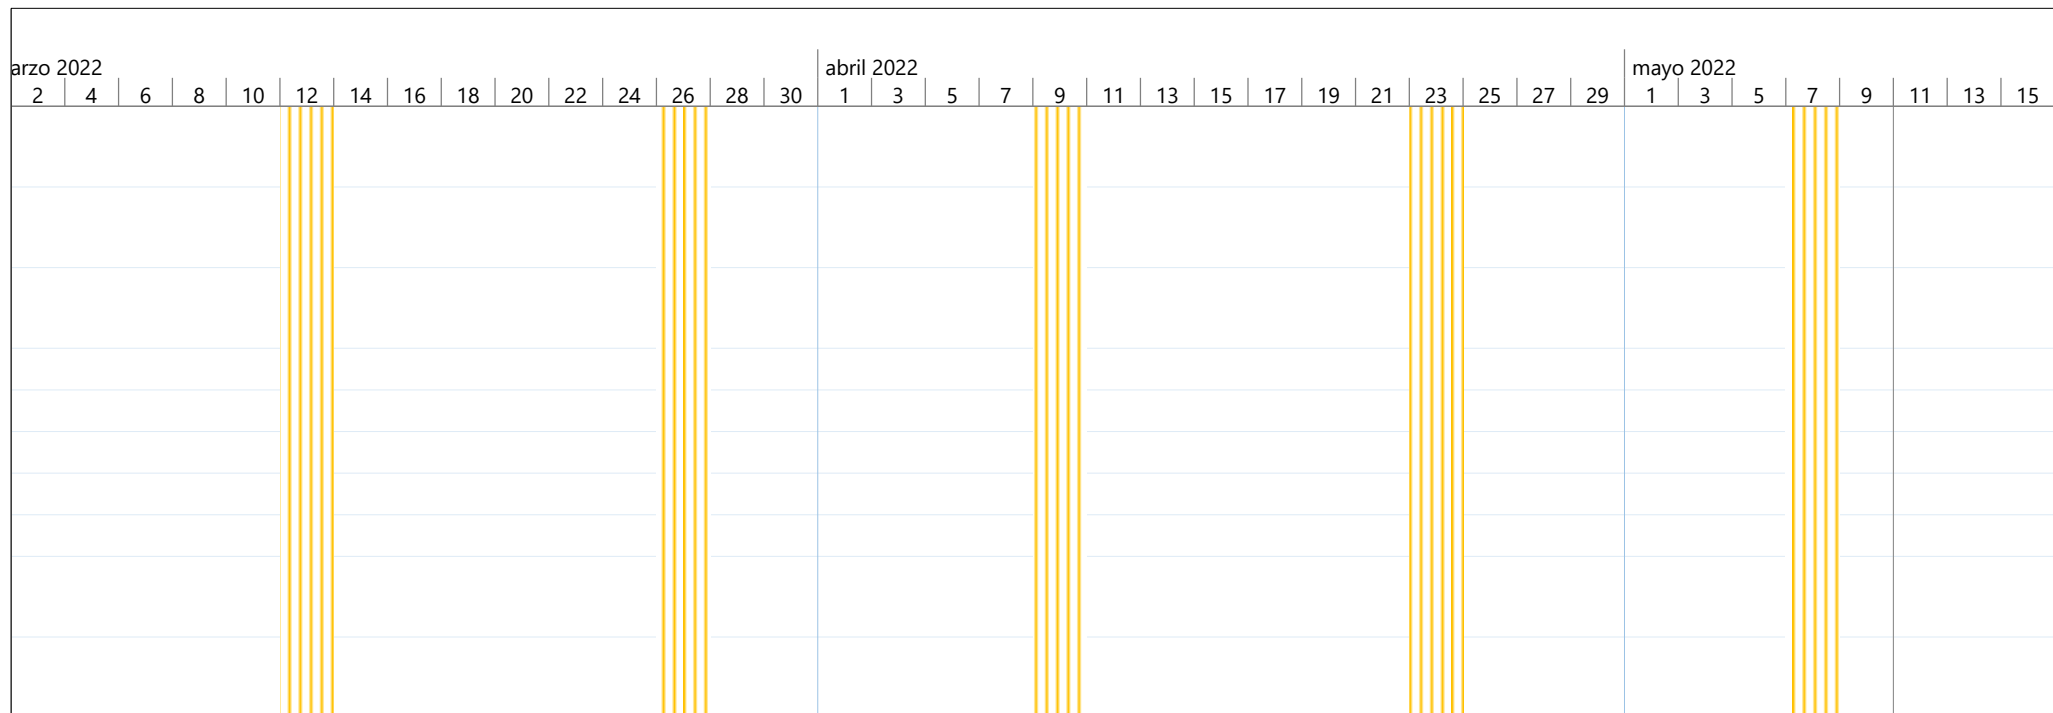

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




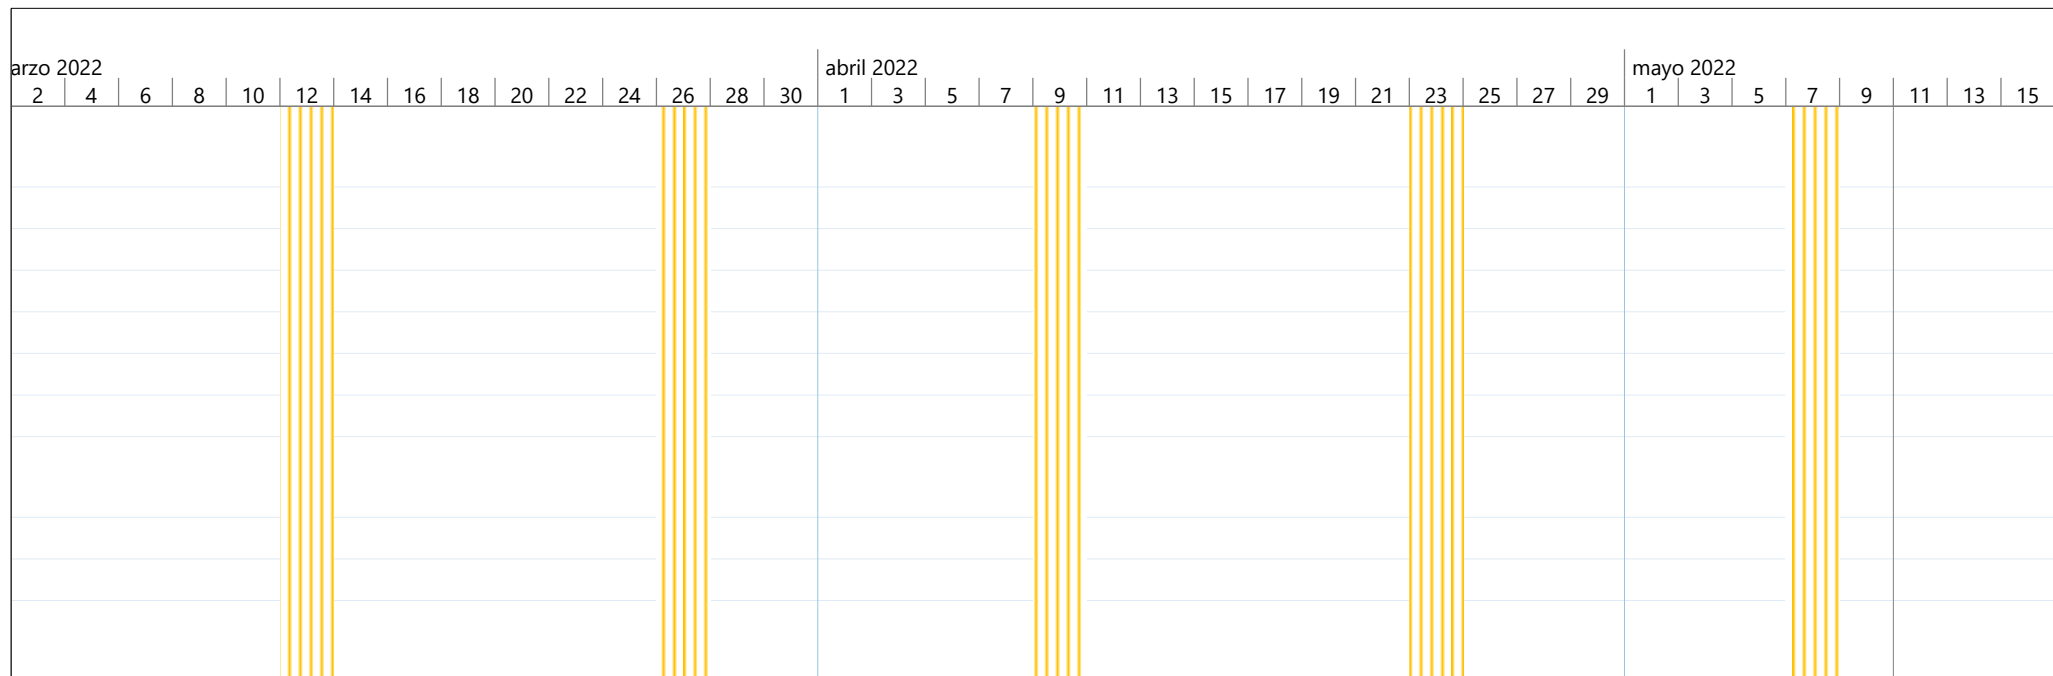

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




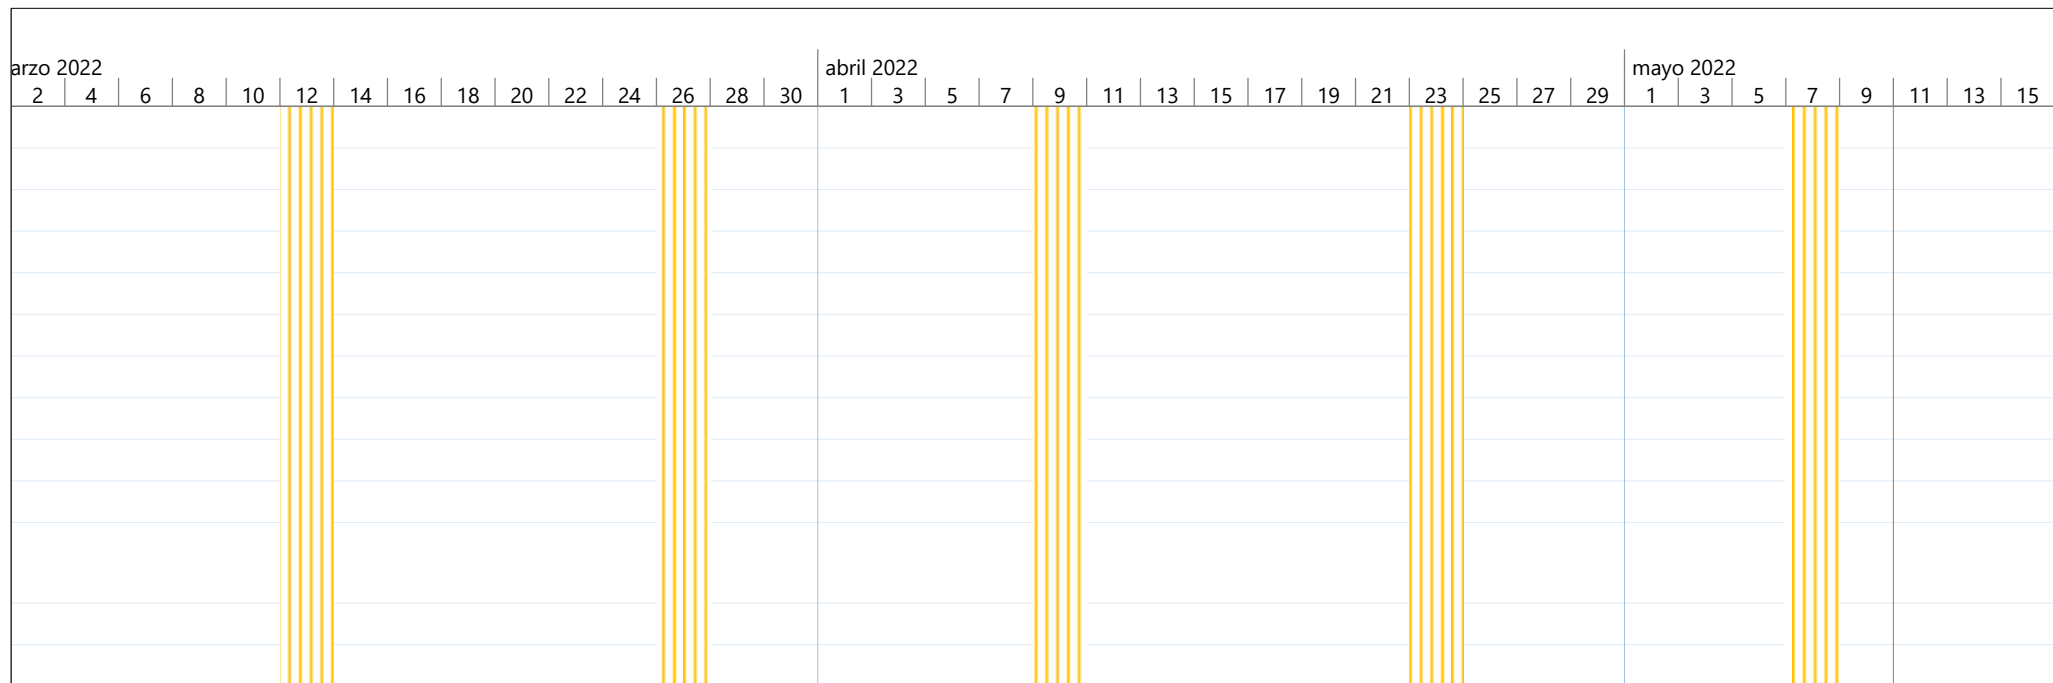

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




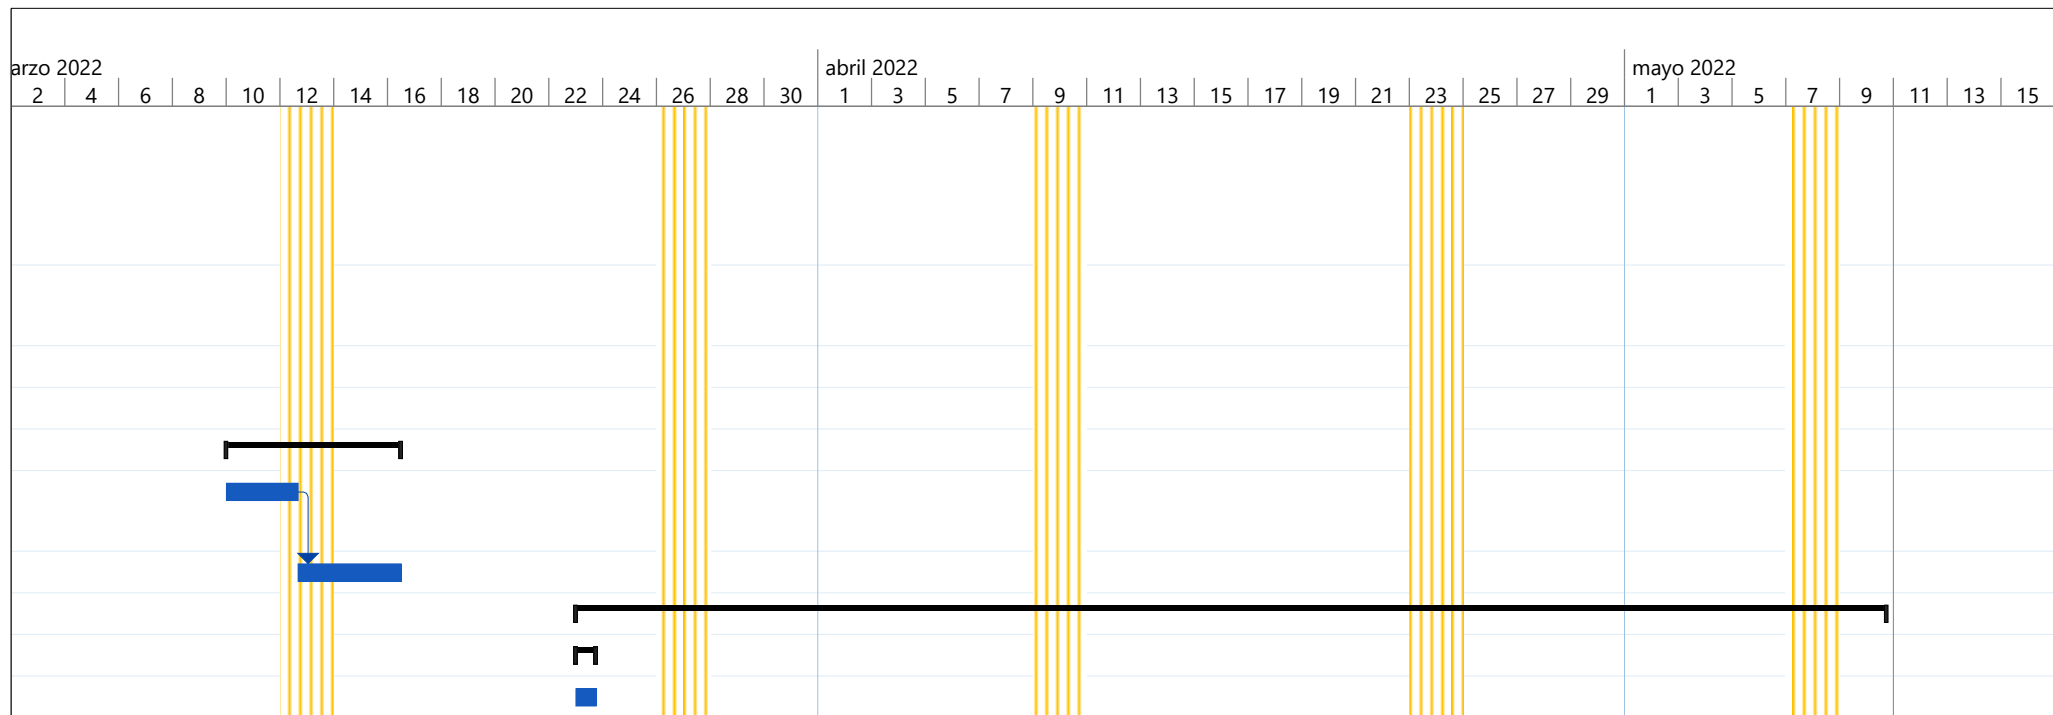

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




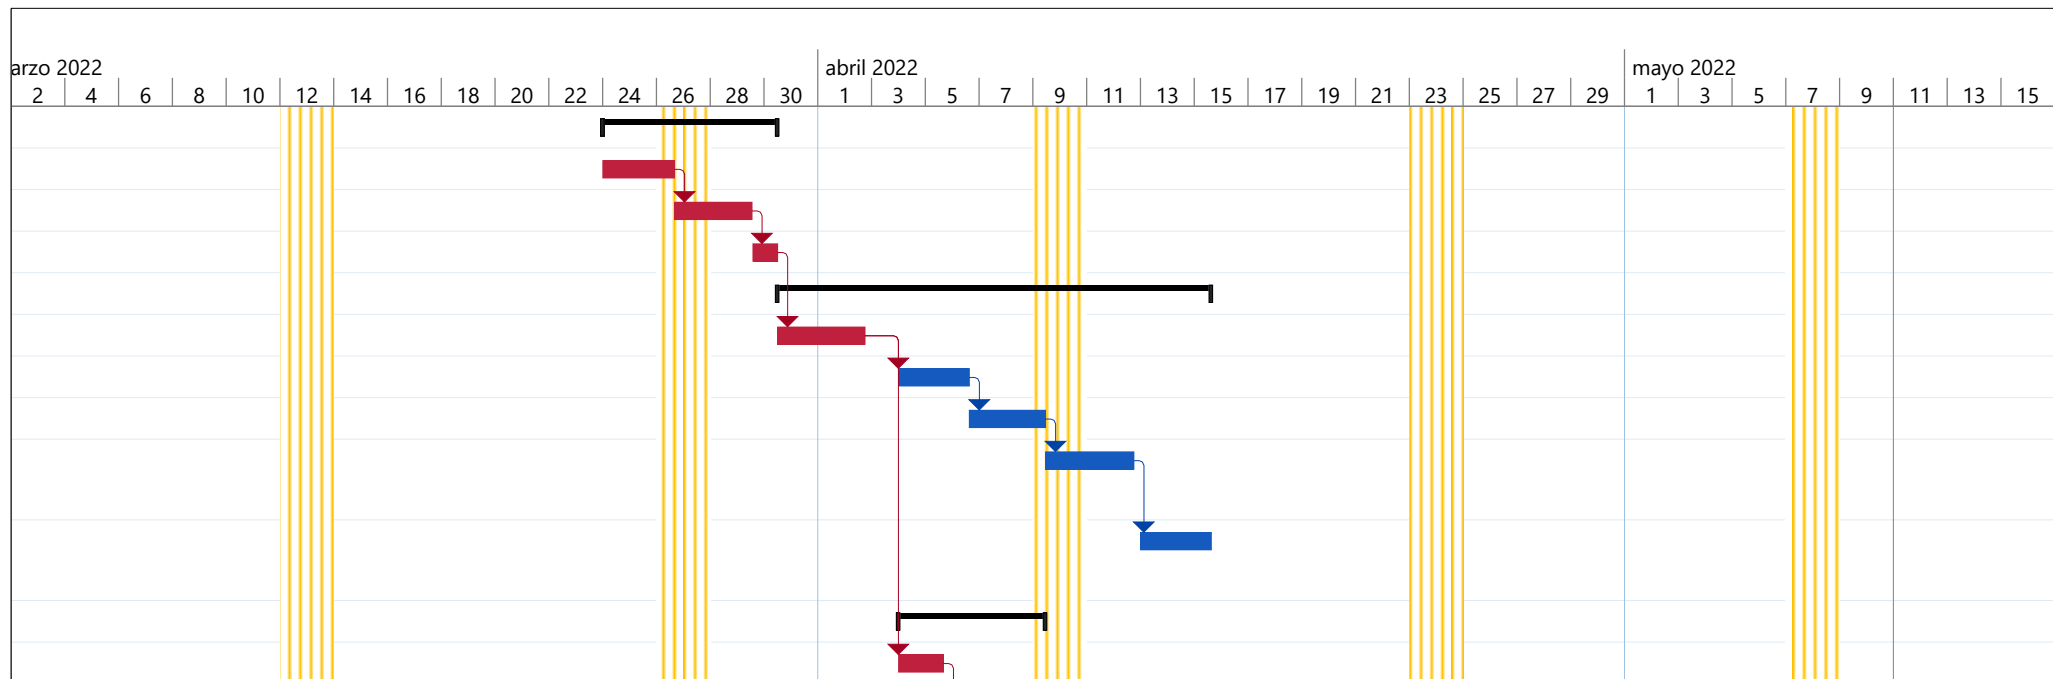

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




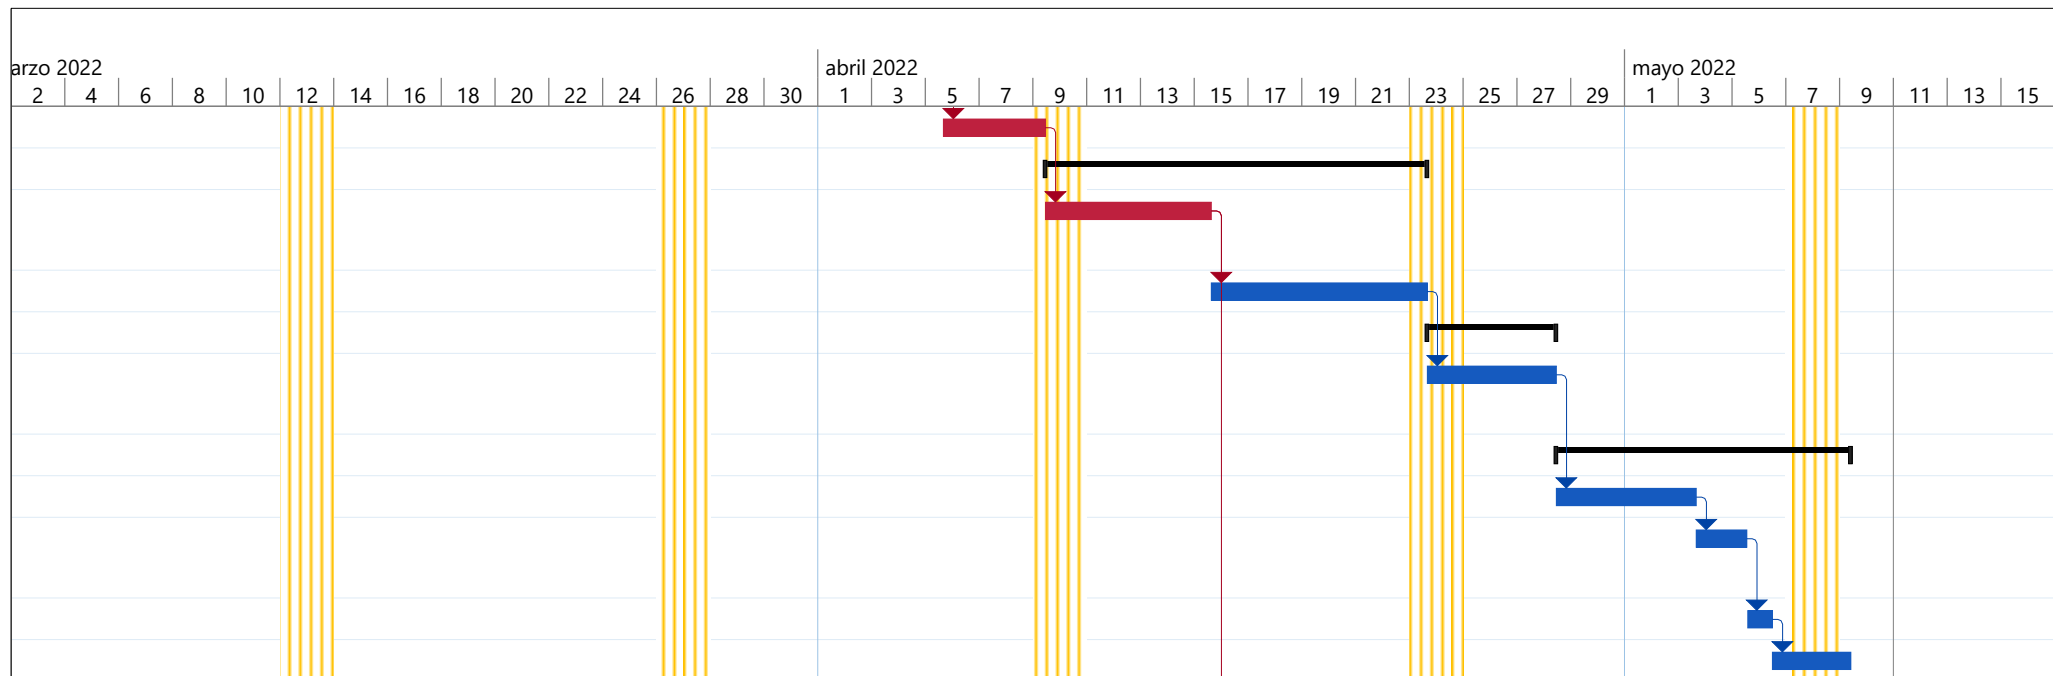

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



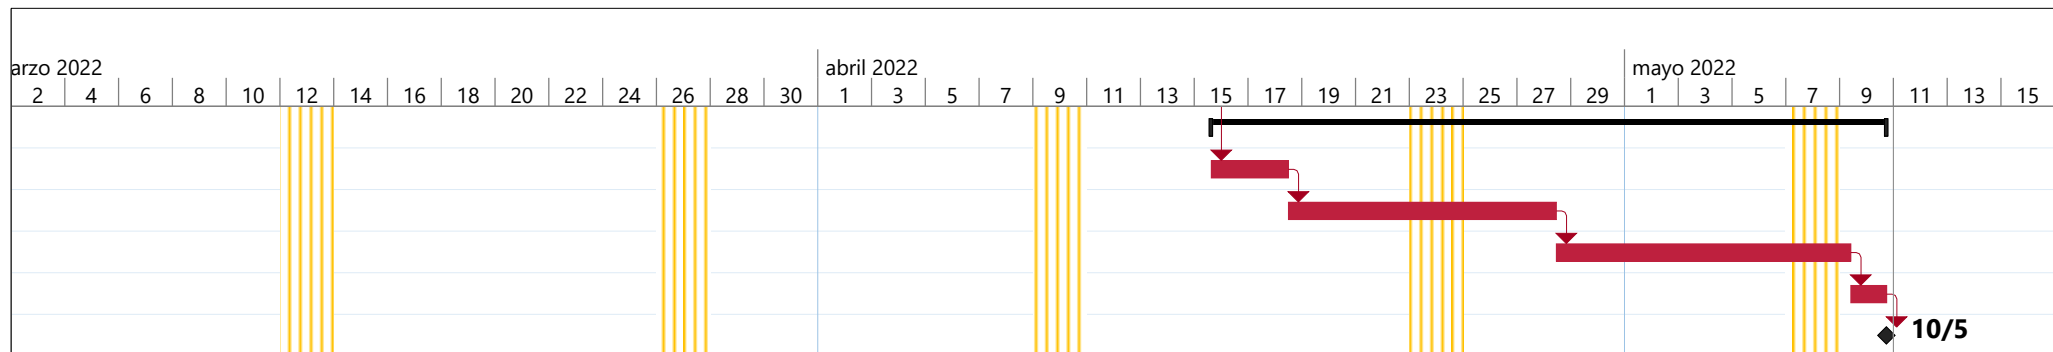

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	

