





Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	

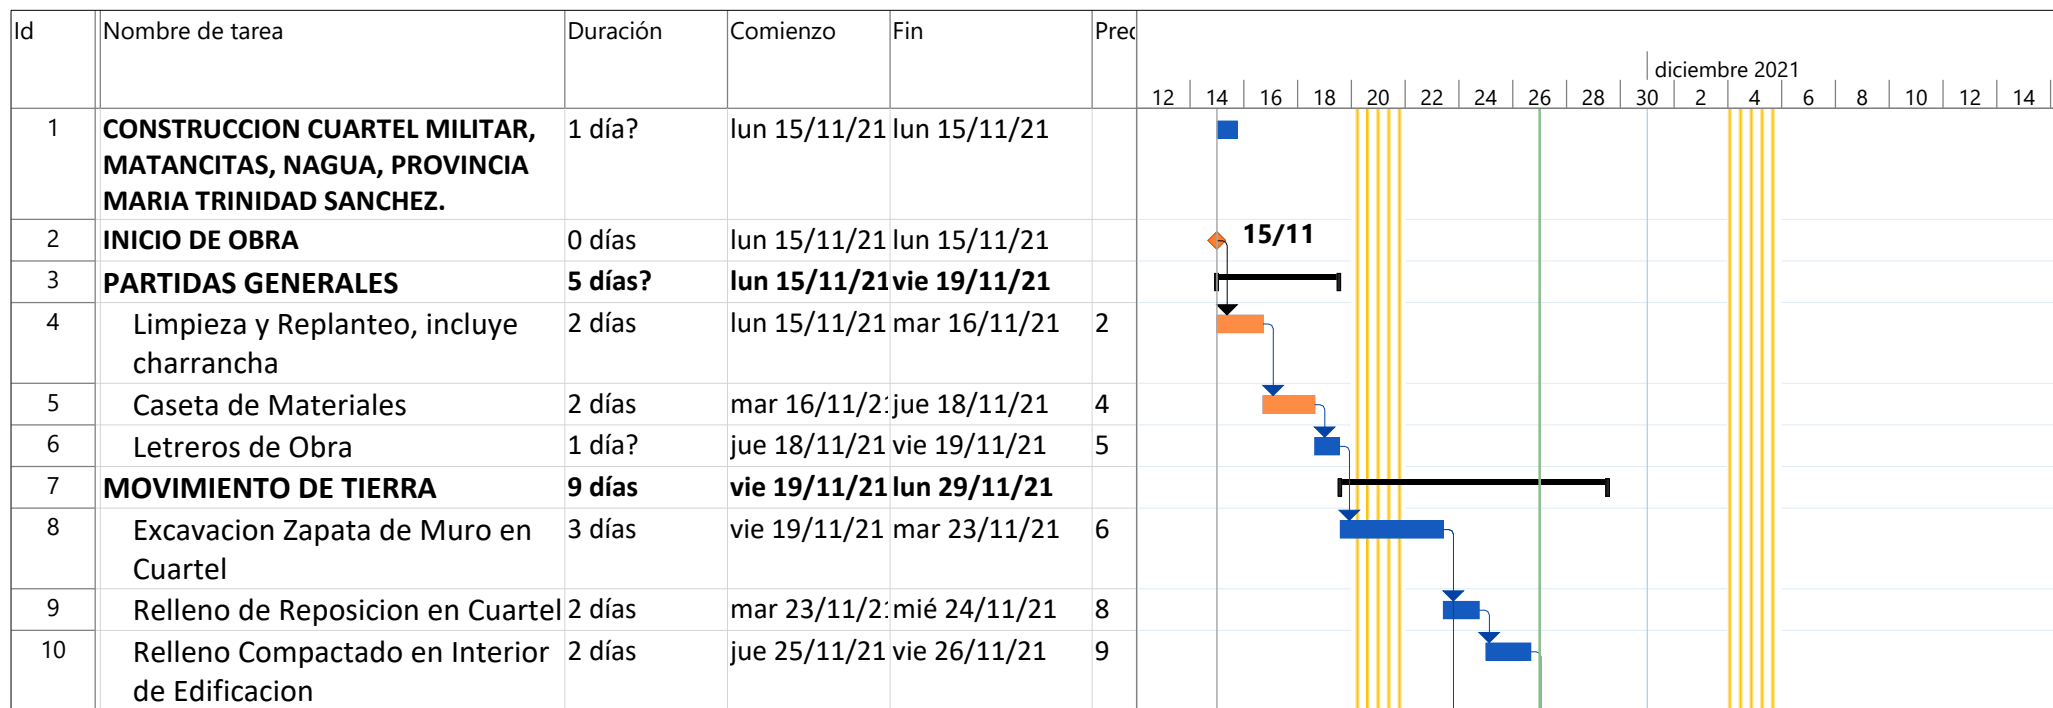

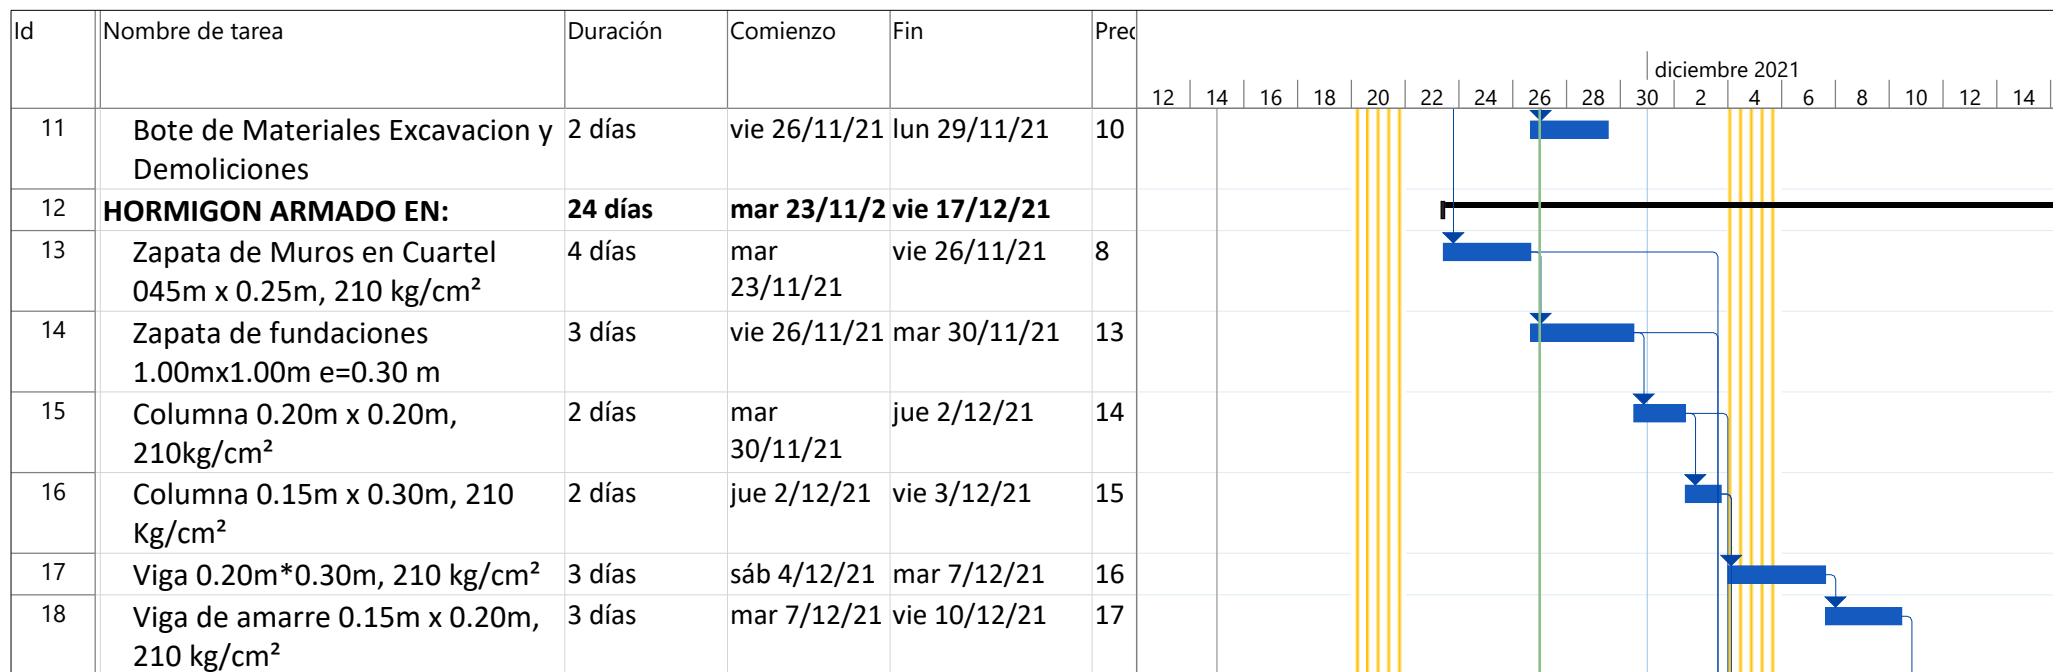

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedentes	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	Dinteles 0.15m x 0.20m, 210 kg/cm²	2 días	vie 10/12/21	lun 13/12/21	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14
29	TERMINACION DE TECHO	6 días?	vie 17/12/21	jue 23/12/21																		
30	Fino de techo plano	3 días	vie 17/12/21	mar 21/12/21	20																	
31	Antepecho Terminado muro bloques 6", h=0,60m	3 días	vie 17/12/21	mar 21/12/21	20																	
32	Zabaleta en techo	2 días	mar 21/12/21	mié 22/12/21	31																	
33	Impermeabilizante Manto Asfáltico Granular 3mm, con Pintura Termoreductora.	3 días	mar 21/12/21	jue 23/12/21	30																	
34	Desague en Techo de 3"	1 día?	mar 21/12/21	mié 22/12/21	31																	
35	PUERTAS Y VENTANAS	19 días	jue 30/12/21	sáb 22/1/22																		
36	Ventana Salomonica de Aluminio AA	5 días	jue 30/12/21	vie 7/1/22	27																	
37	Puerta Polimetal (0.80m 7 0.70m x 2.10m) en Banos	3 días	vie 7/1/22	lun 10/1/22	36																	
38	Puerta en Closet Tipo Libro	3 días	mar 11/1/22	jue 13/1/22	37																	

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precio	diciembre 2021																
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14
39	Gabinete de piso en pino Tratado	3 días	jue 13/1/22	lun 17/1/22	38																	
40	Gabinete de pared en pino Tratado	3 días	lun 17/1/22	mié 19/1/22	39																	
41	Tope de Granito Natural en Cocina	2 días	jue 20/1/22	sáb 22/1/22	40																	
42	PINTURA	8 días	jue 23/12/21	lun 3/1/22																		
43	Economica en Techo	2 días	jue 23/12/21	sáb 25/12/21	26																	
44	Acrilica en muros exteriores	3 días	sáb 25/12/21	mié 29/12/21	43																	
45	Semigloss en muros interiores	3 días	mié 29/12/21	lun 3/1/22	44																	
46	INSTALACIONES SANITARIAS	46 días?	lun 3/1/22	lun 21/2/22																		
47	Inodoros AS Blancos c/tapa, incl. sum y col	1 día	lun 3/1/22	lun 3/1/22																		
48	Lavamanos Royal Blanco, inc. Mezcladora, sum y col	1 día?	mar 4/1/22	mar 4/1/22	47																	

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
49	Fregadero Dos Bocas de Ainox, incl. Sum y col	1 día?	mar 4/1/22	mié 5/1/22	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
60	Construccion de cisterna	15 días	sáb 5/2/22	lun 21/2/22	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedentes	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
73	Piso en porcelanato importado 0,40m*0,40m, incluye torta de 10cms con malla 0,10m*0,10m*,2,3	3 días	mar 18/1/22	jue 20/1/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedente	diciembre 2021																		
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14		
83	Movimiento de tierra	6 días	jue 24/3/22	mié 30/3/22																				
84	Excavacion zapata en muro	3 días	jue 24/3/22	sáb 26/3/22																				
85	Relleno de reposicion	2 días	sáb 26/3/22	mar 29/3/22	84																			
86	Bote de material de excavacion	1 día	mar 29/3/22	mié 30/3/22	85																			
87	HORMIGON ARMADO EN	16 días	mié 30/3/22	vie 15/4/22																				
88	Zapata de muros	4 días	mié 30/3/22	sáb 2/4/22	86																			
89	Zapata de columnas c1	3 días	lun 4/4/22	mié 6/4/22	88																			
90	zapata de columna c2	3 días	mié 6/4/22	sáb 9/4/22	89																			
91	columnas 0.15m*0.20m, 210kg/cm2	3 días	sáb 9/4/22	mar 12/4/22	90																			
92	columnas 0.20m*0.20m, 210kg/cm2	3 días	mié 13/4/22	vie 15/4/22	91																			
93	MUROS DE BLOQUES	6 días	lun 4/4/22	sáb 9/4/22																				
94	Block de 6* BNP	2 días	lun 4/4/22	mar 5/4/22	88																			

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
95	Block de 6* SNP	4 días	mar 5/4/22	sáb 9/4/22	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedente	diciembre 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
106	MISCELANEOS	24 días	vie 15/4/22	mar 10/5/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21


Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



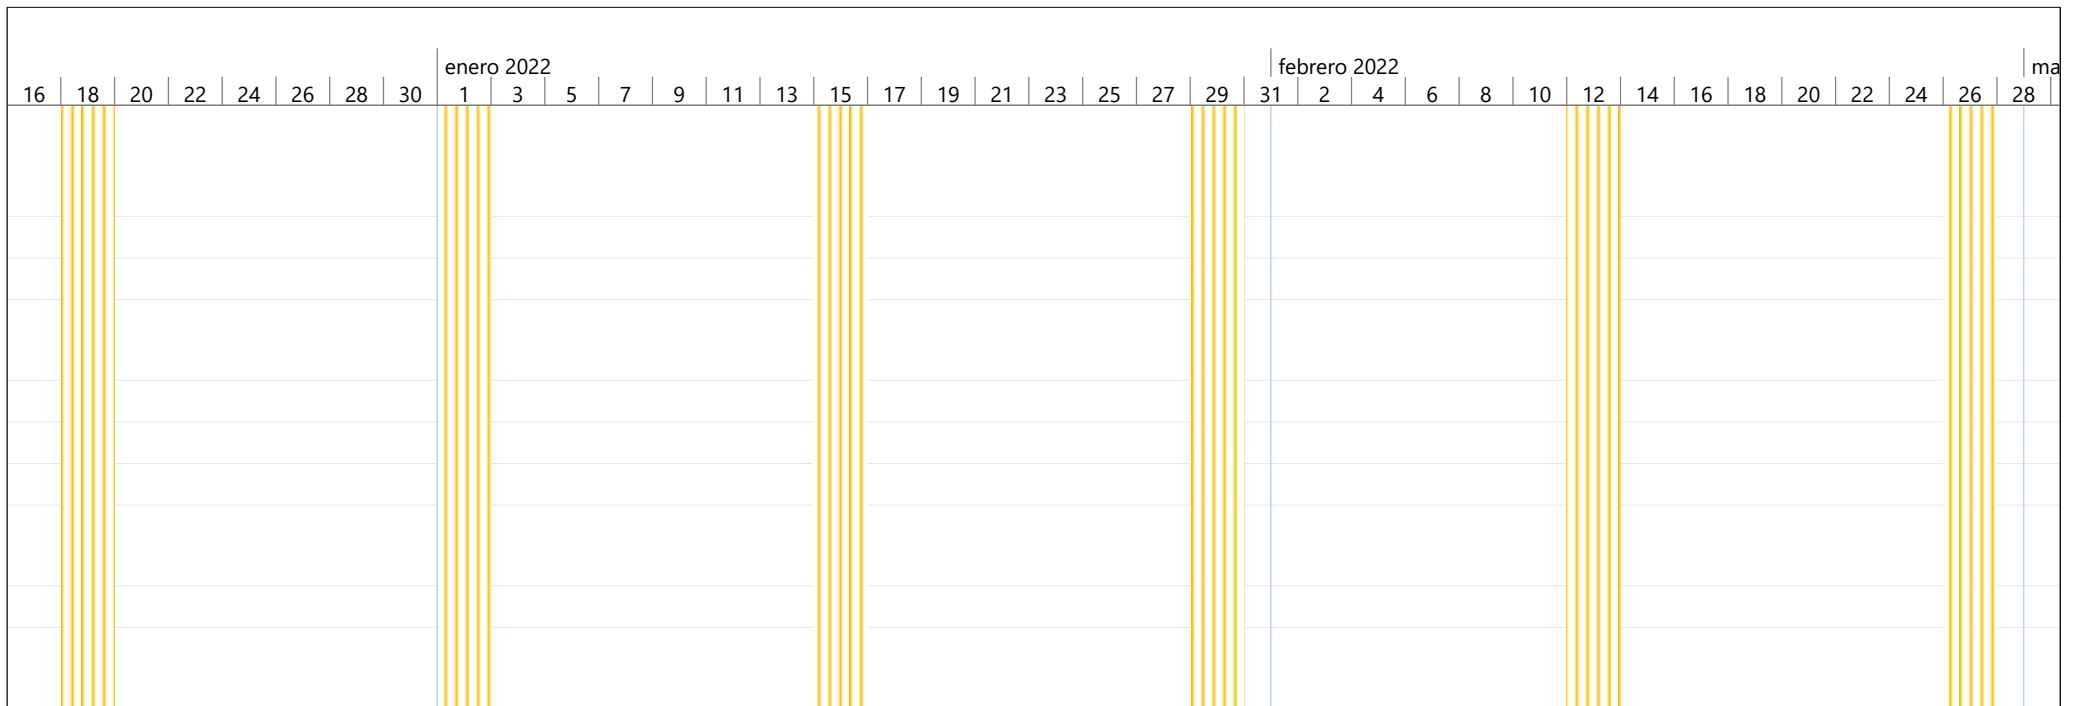

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	



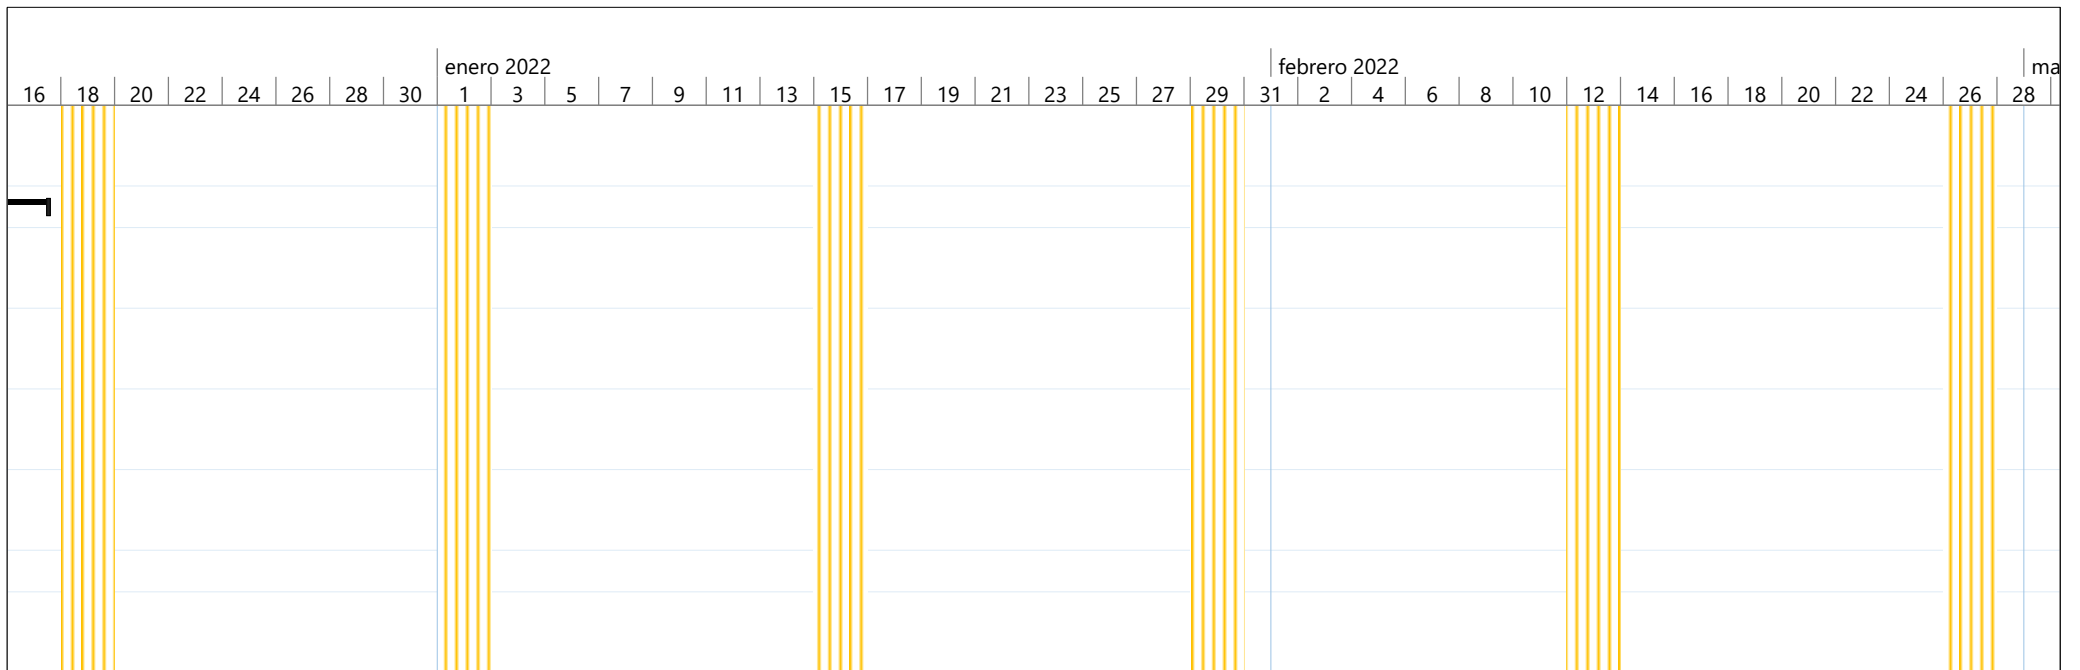


Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	



Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




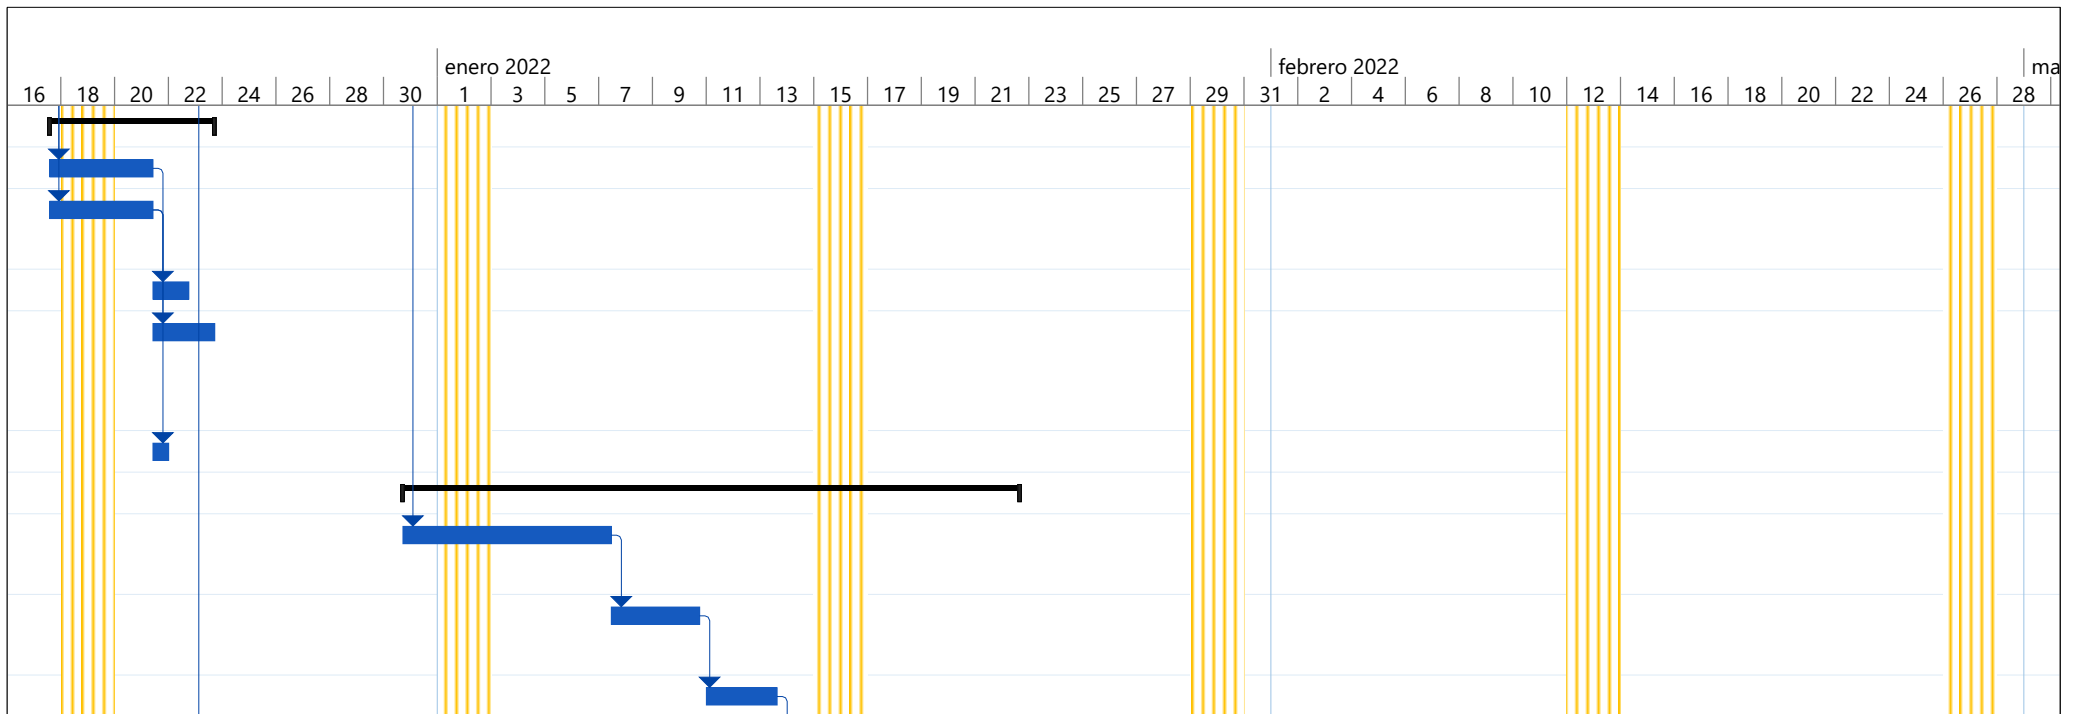

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




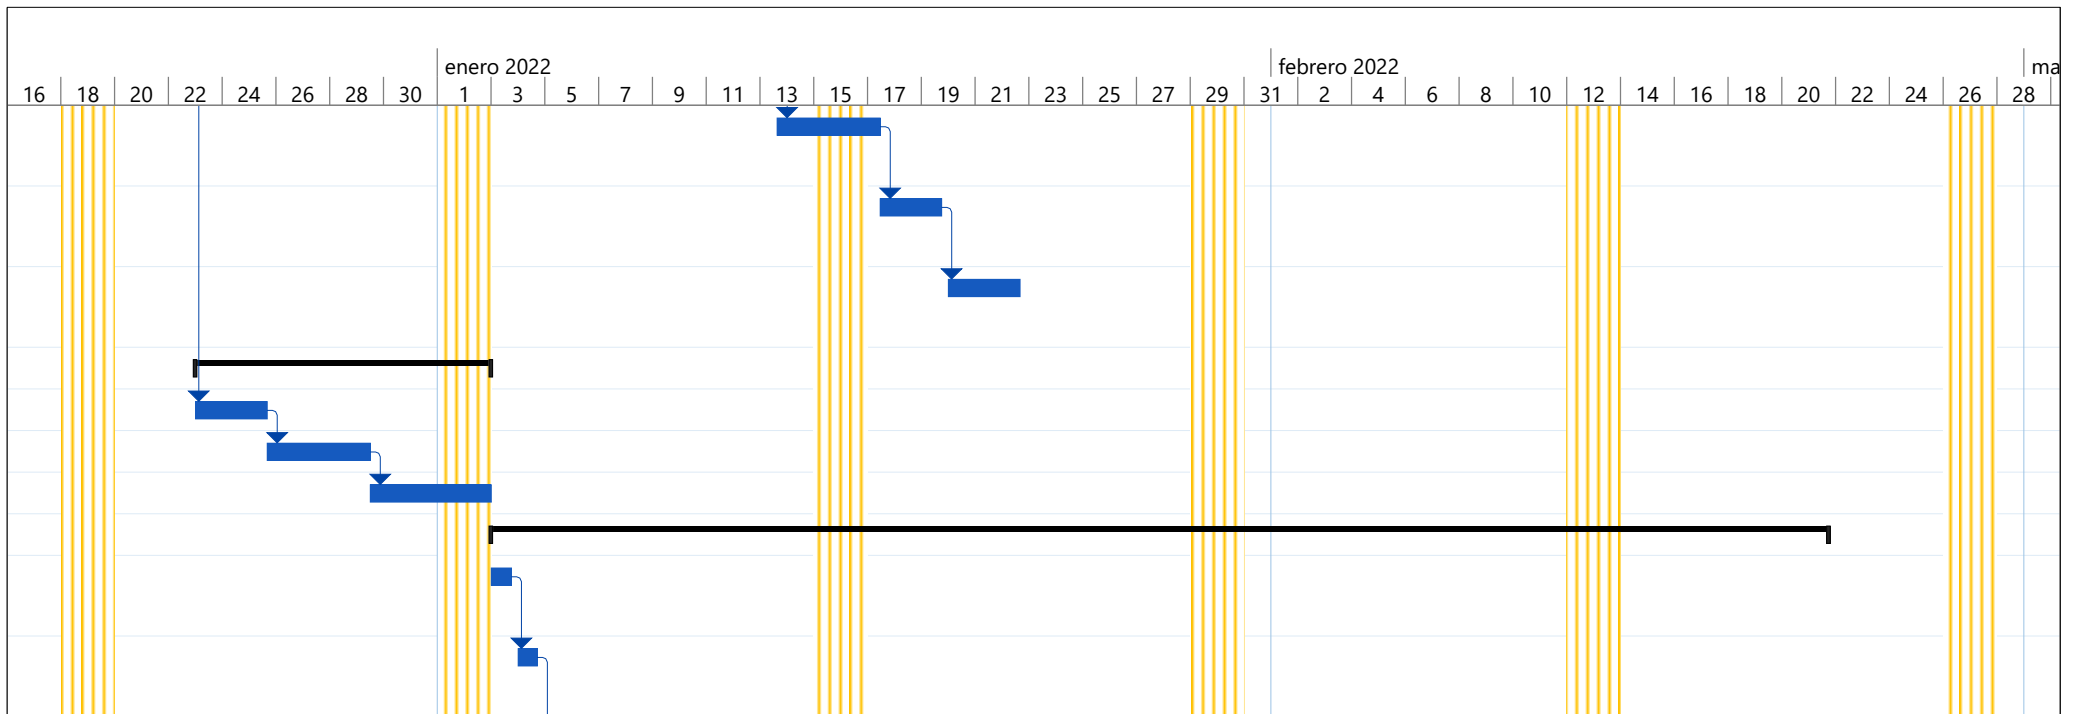

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




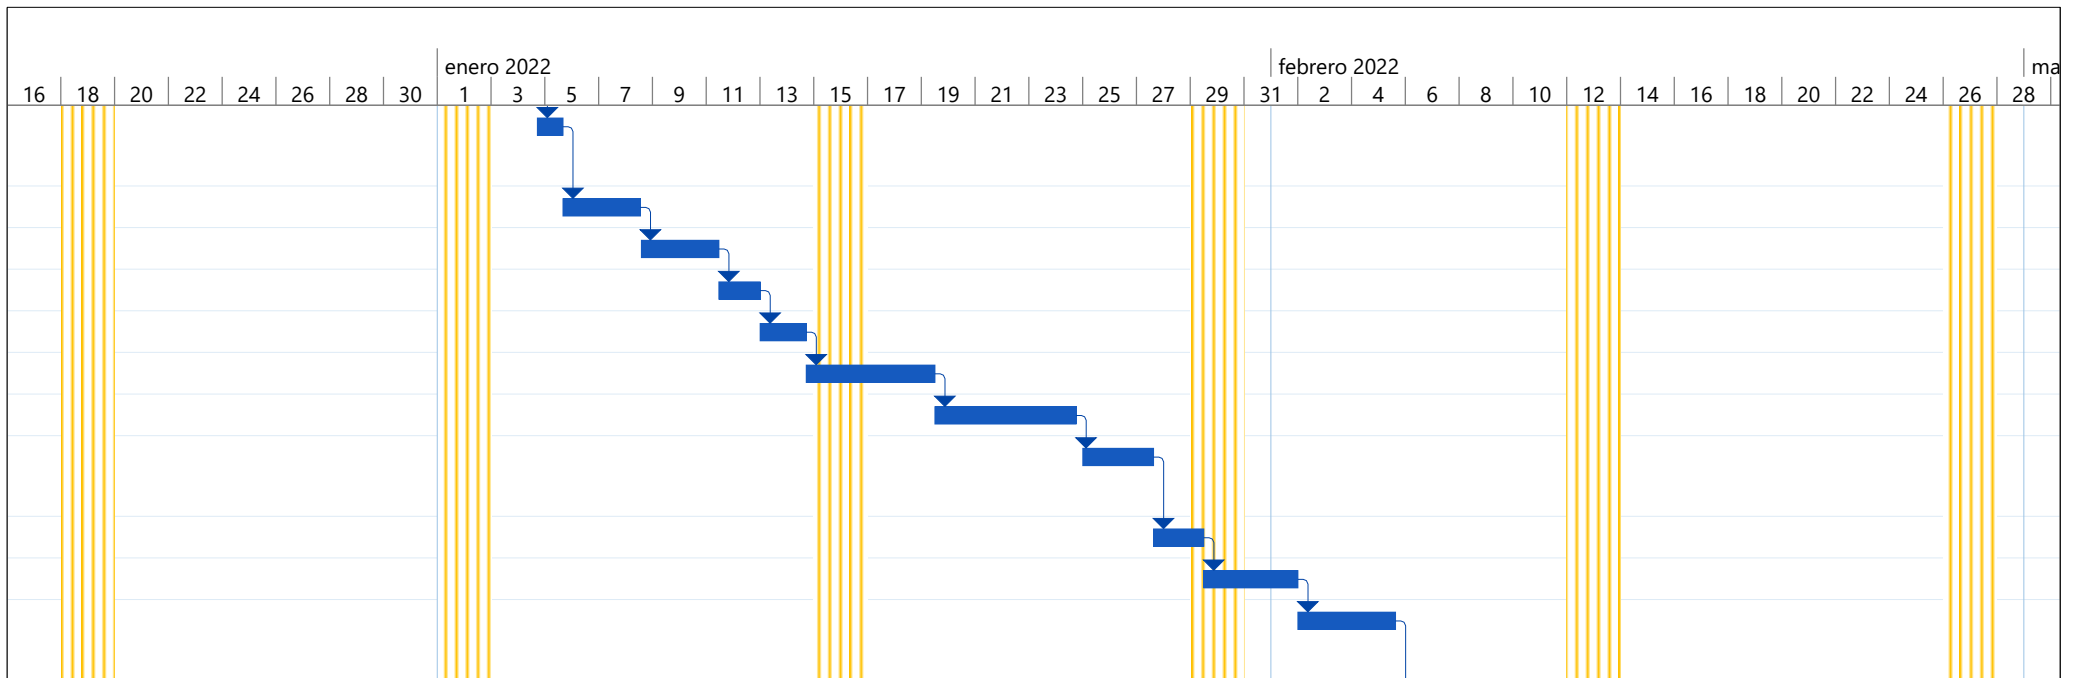

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




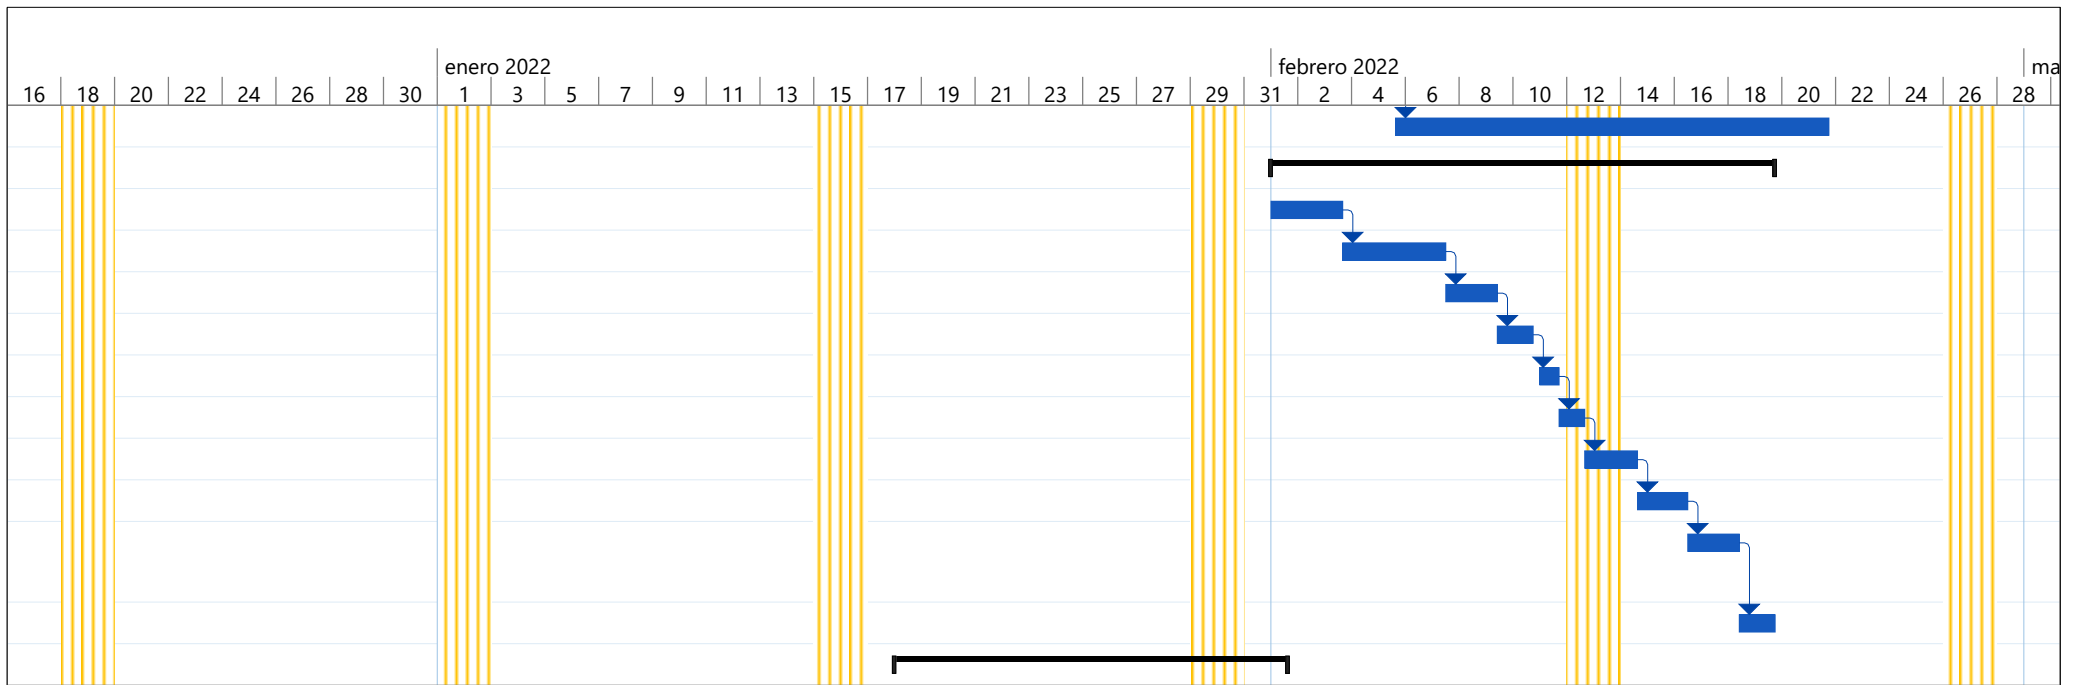

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




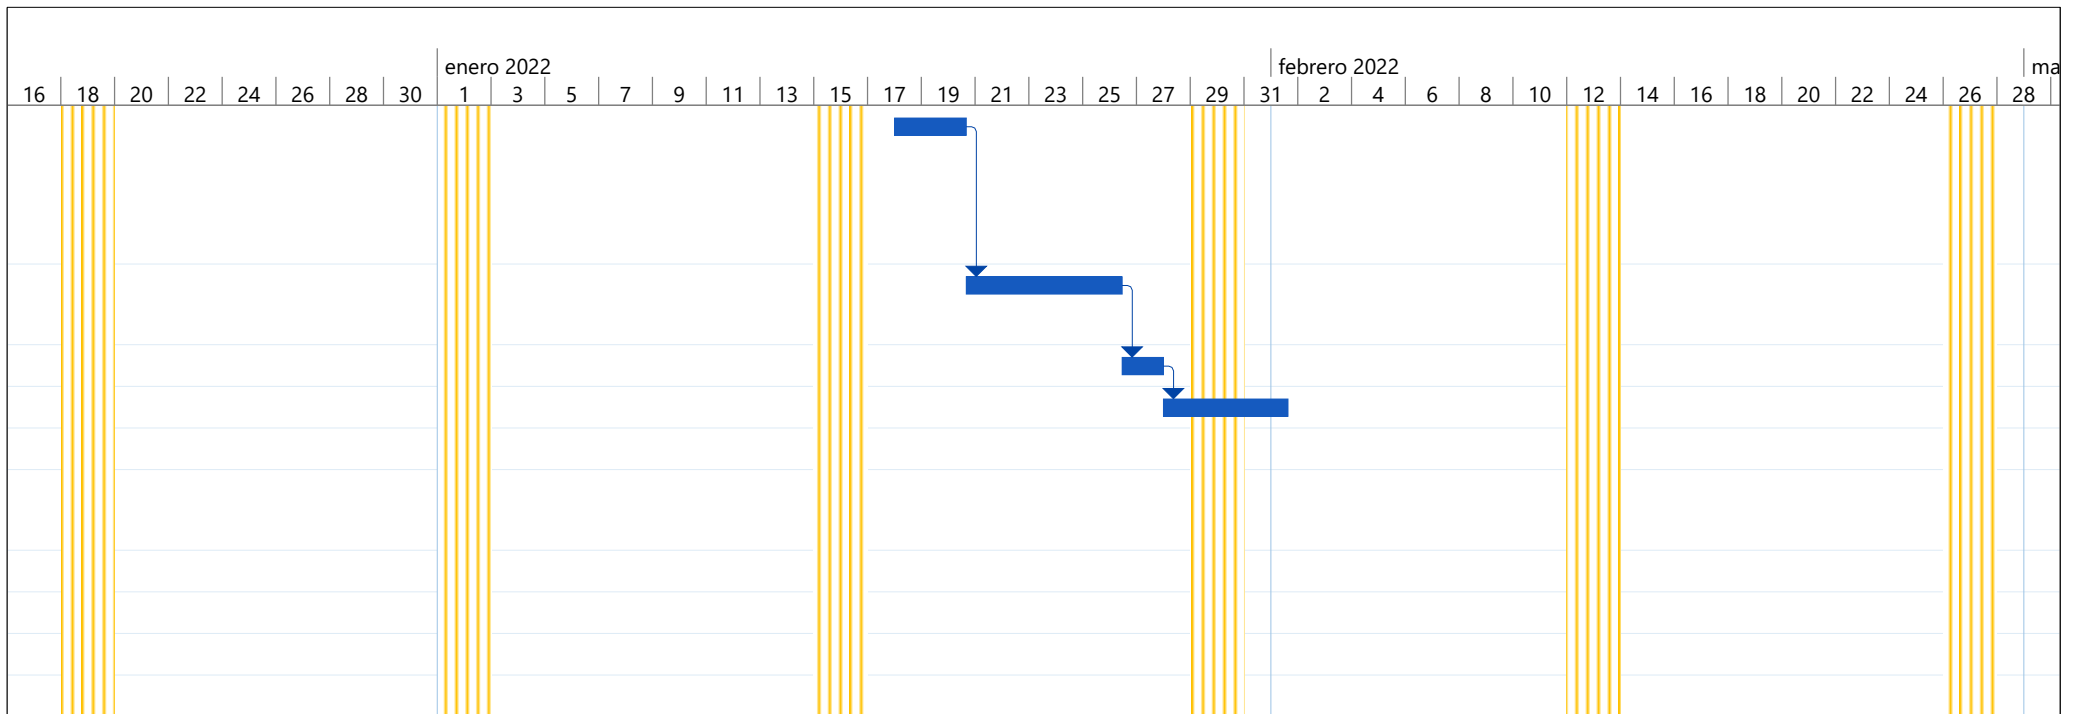

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21


Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



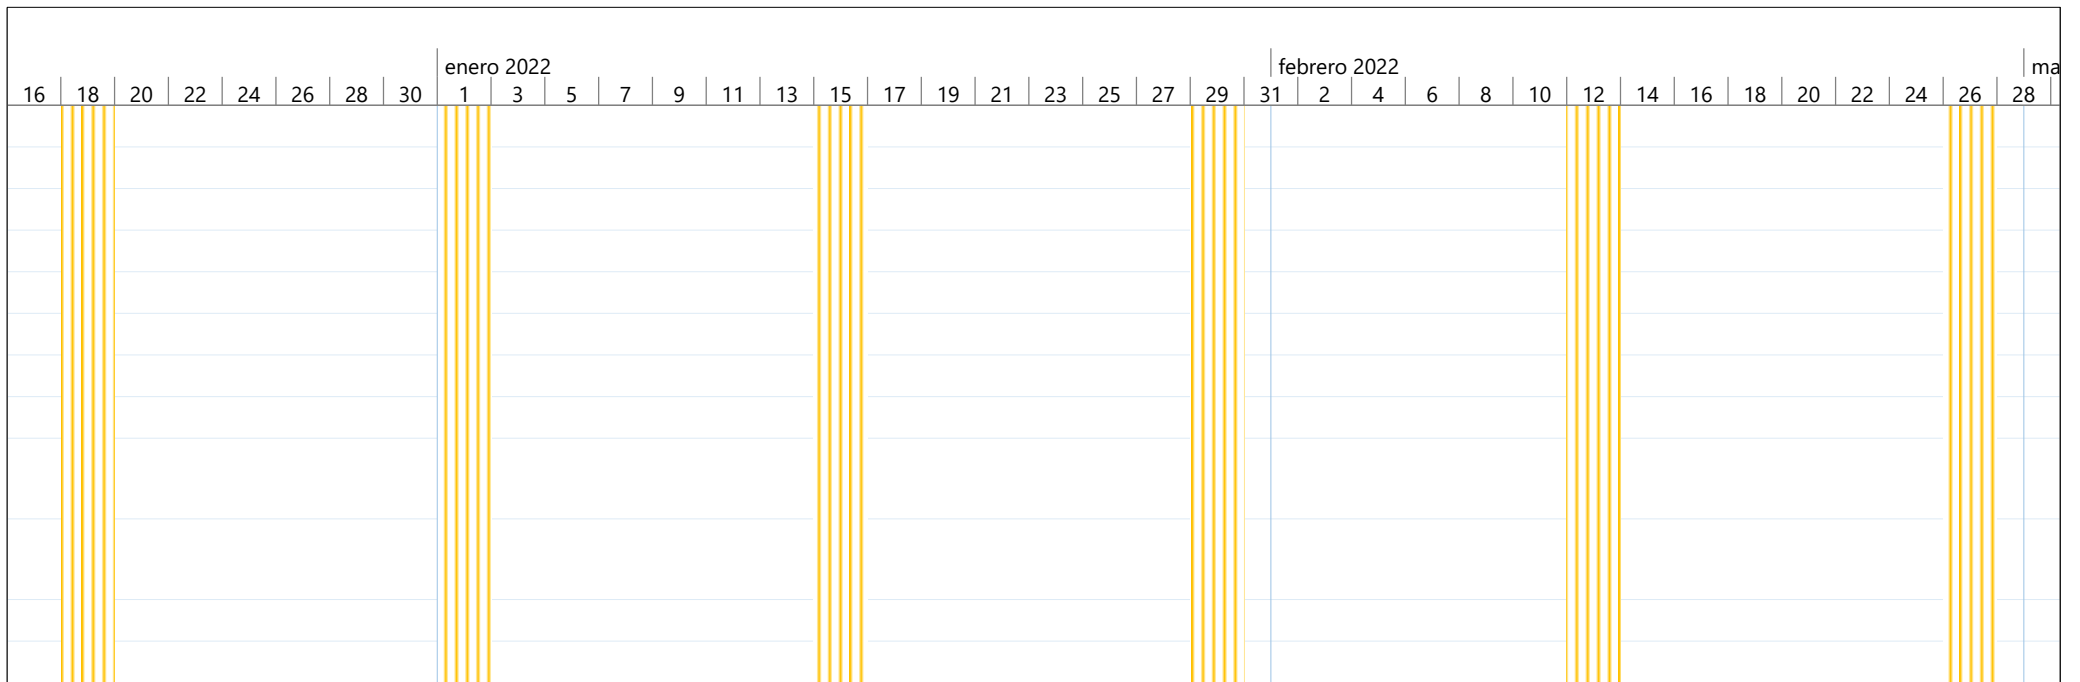

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	




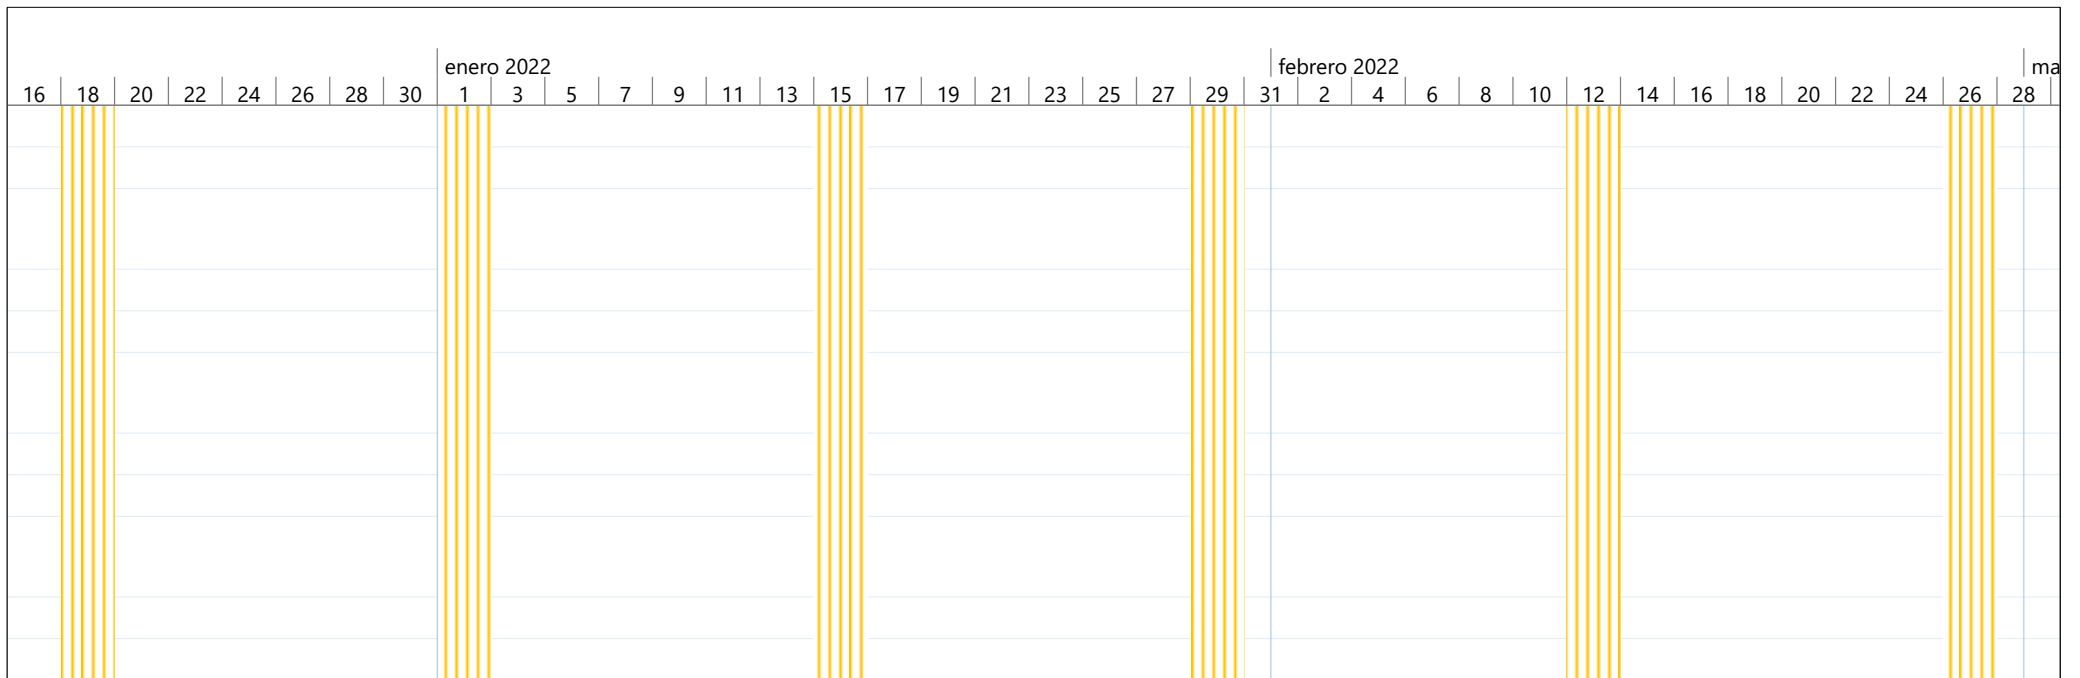


Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	






Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: sáb 27/11/21	Tarea		Tareas externas	
	División		Hito externo	
	Hito		Fecha límite	
	Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Hito inactivo		Tareas críticas	
	Resumen inactivo		División crítica	
	Tarea manual		Línea base	
	solo duración		Hito de línea base	
	Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	
	solo fin		Atraso	

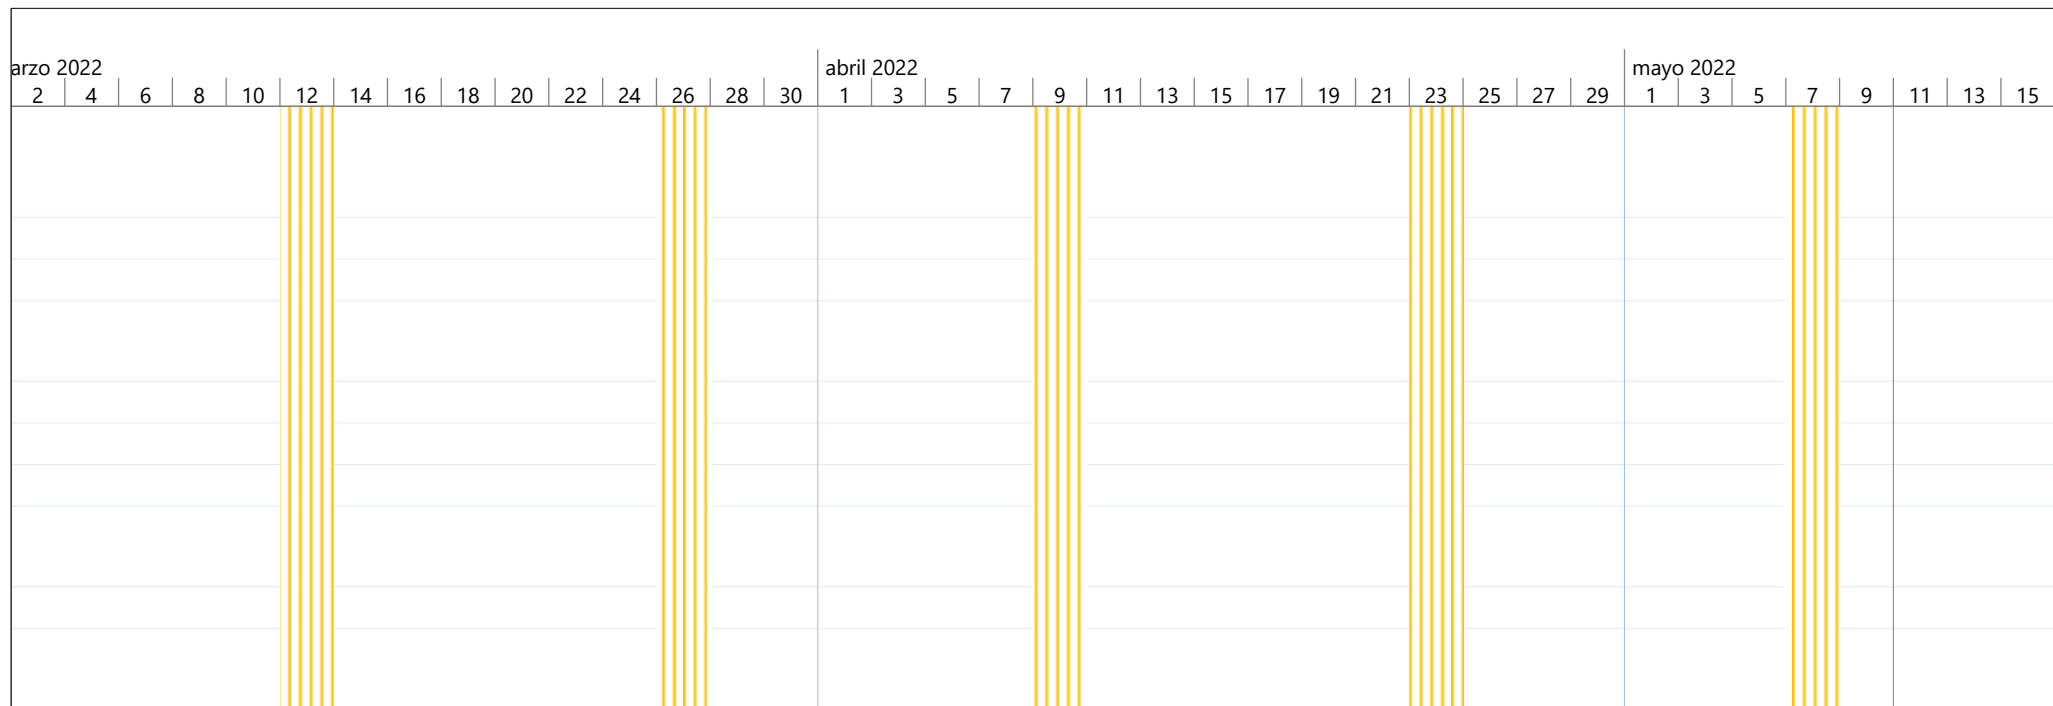

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




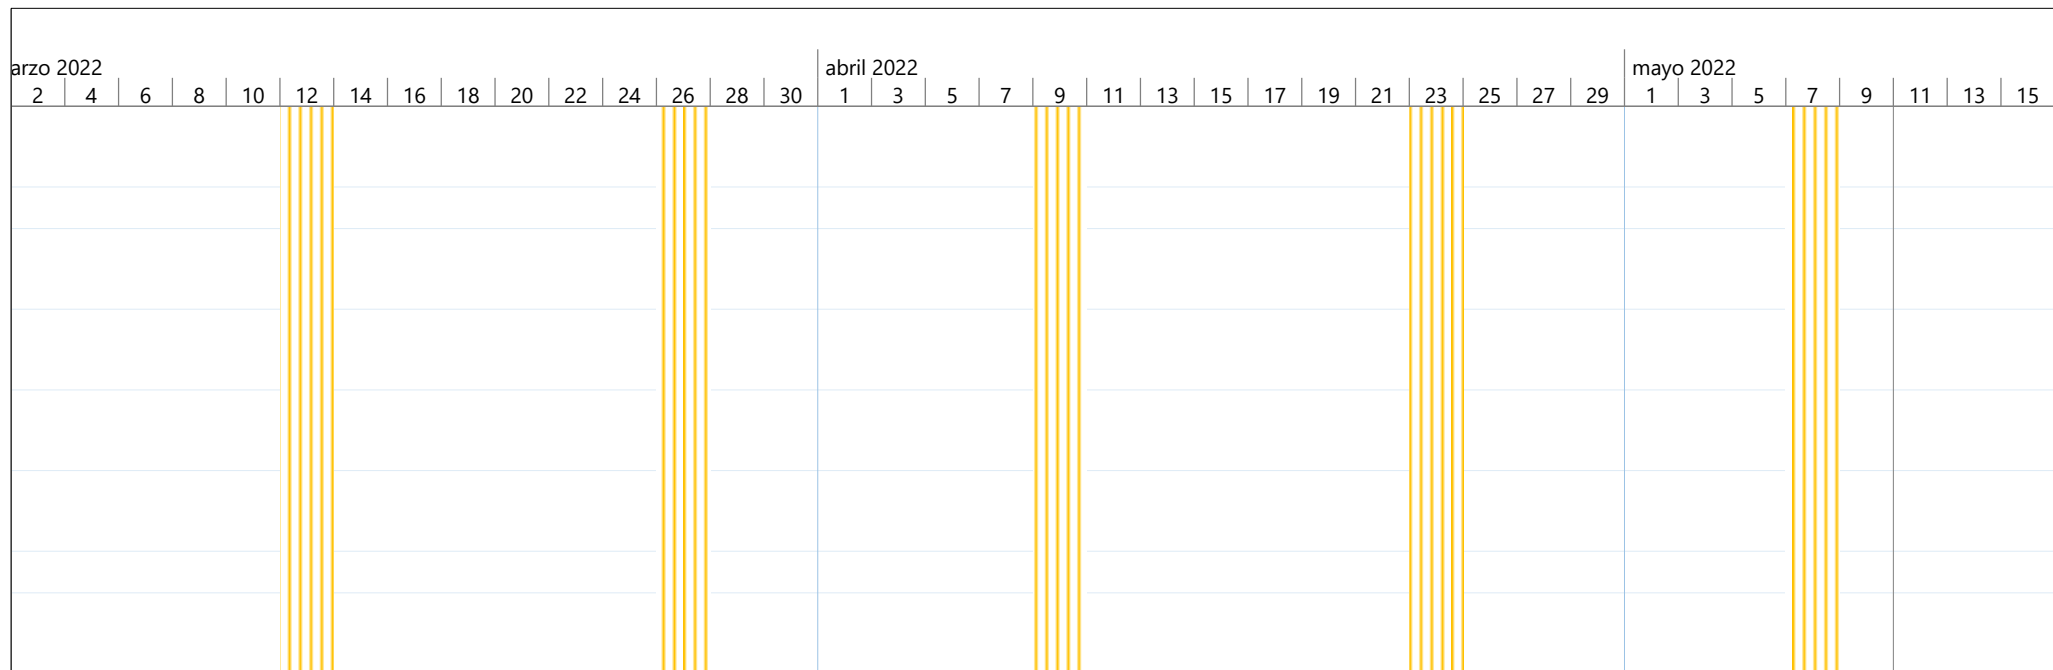

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




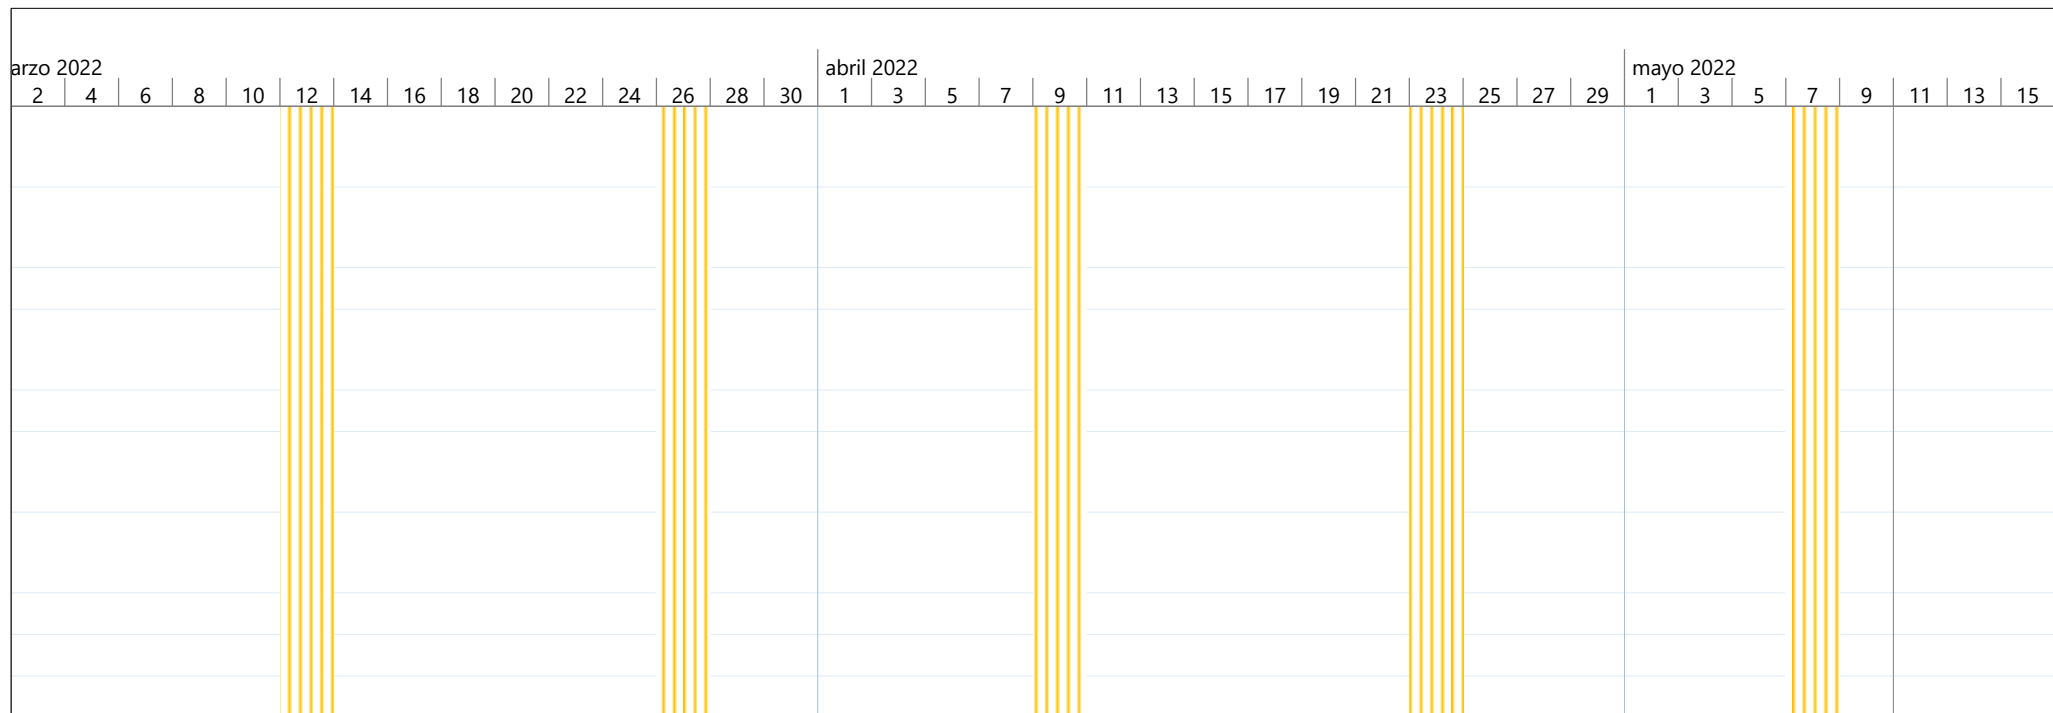

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




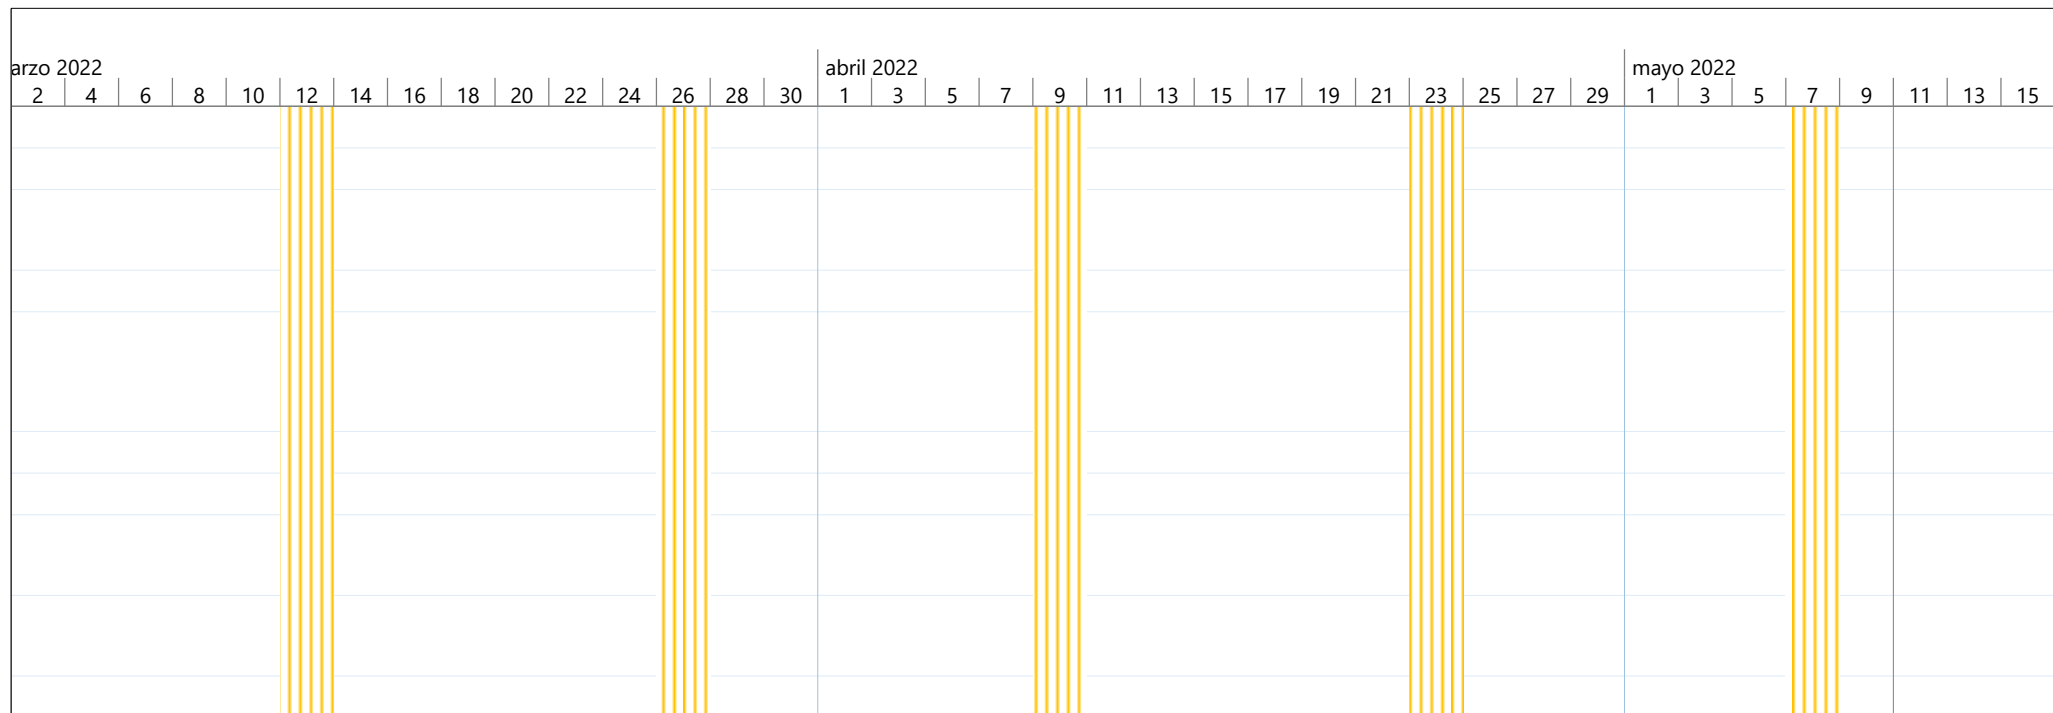

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




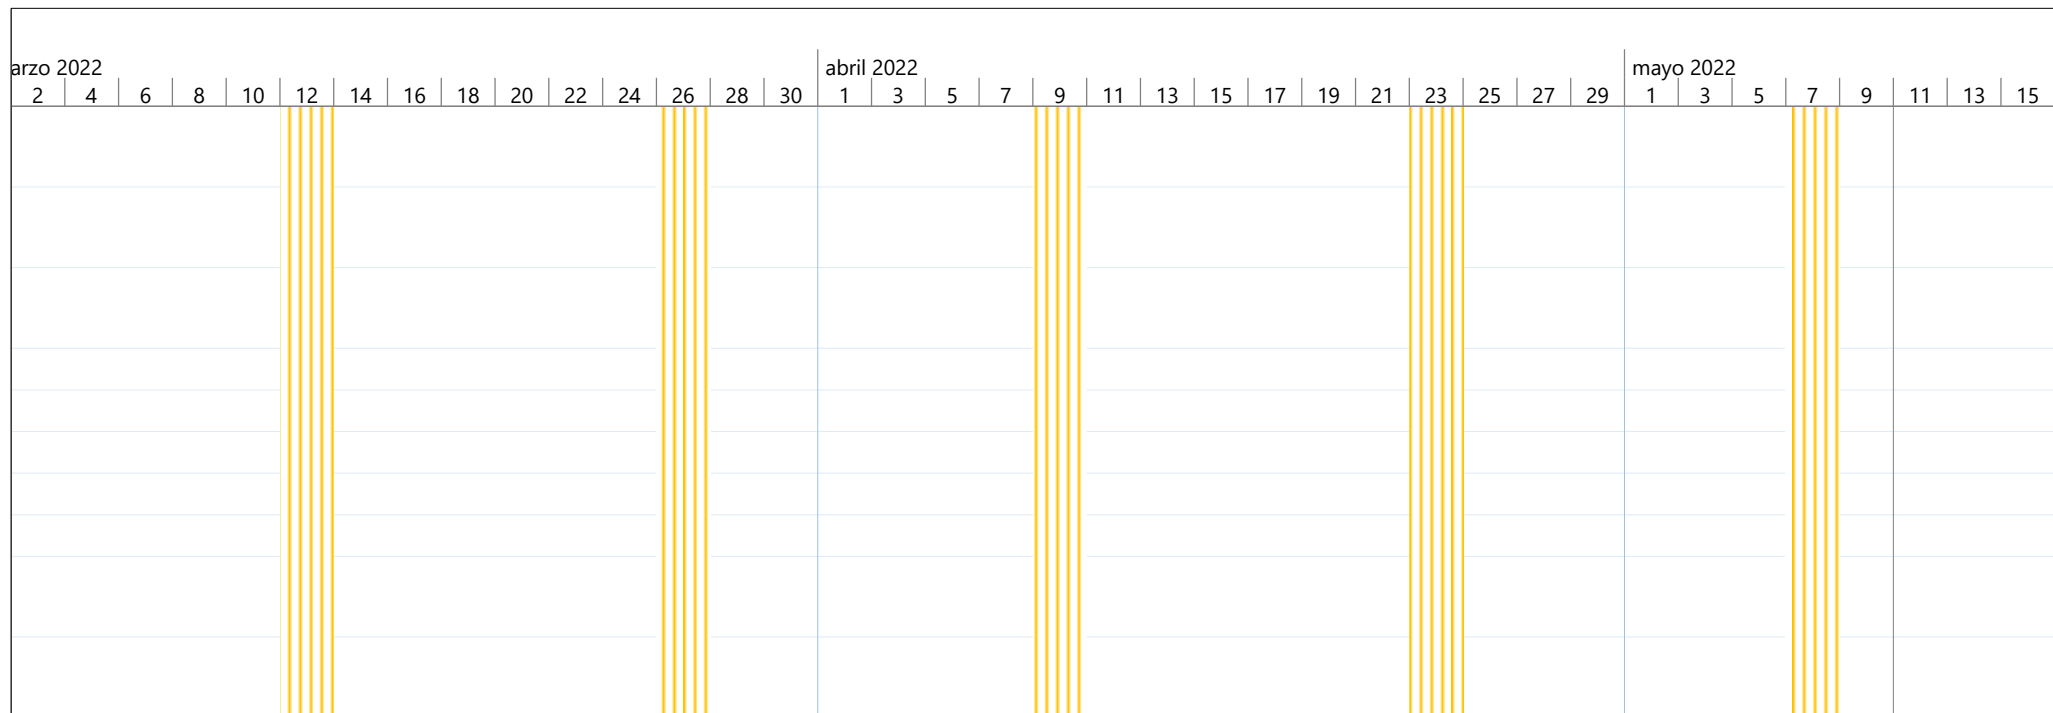

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




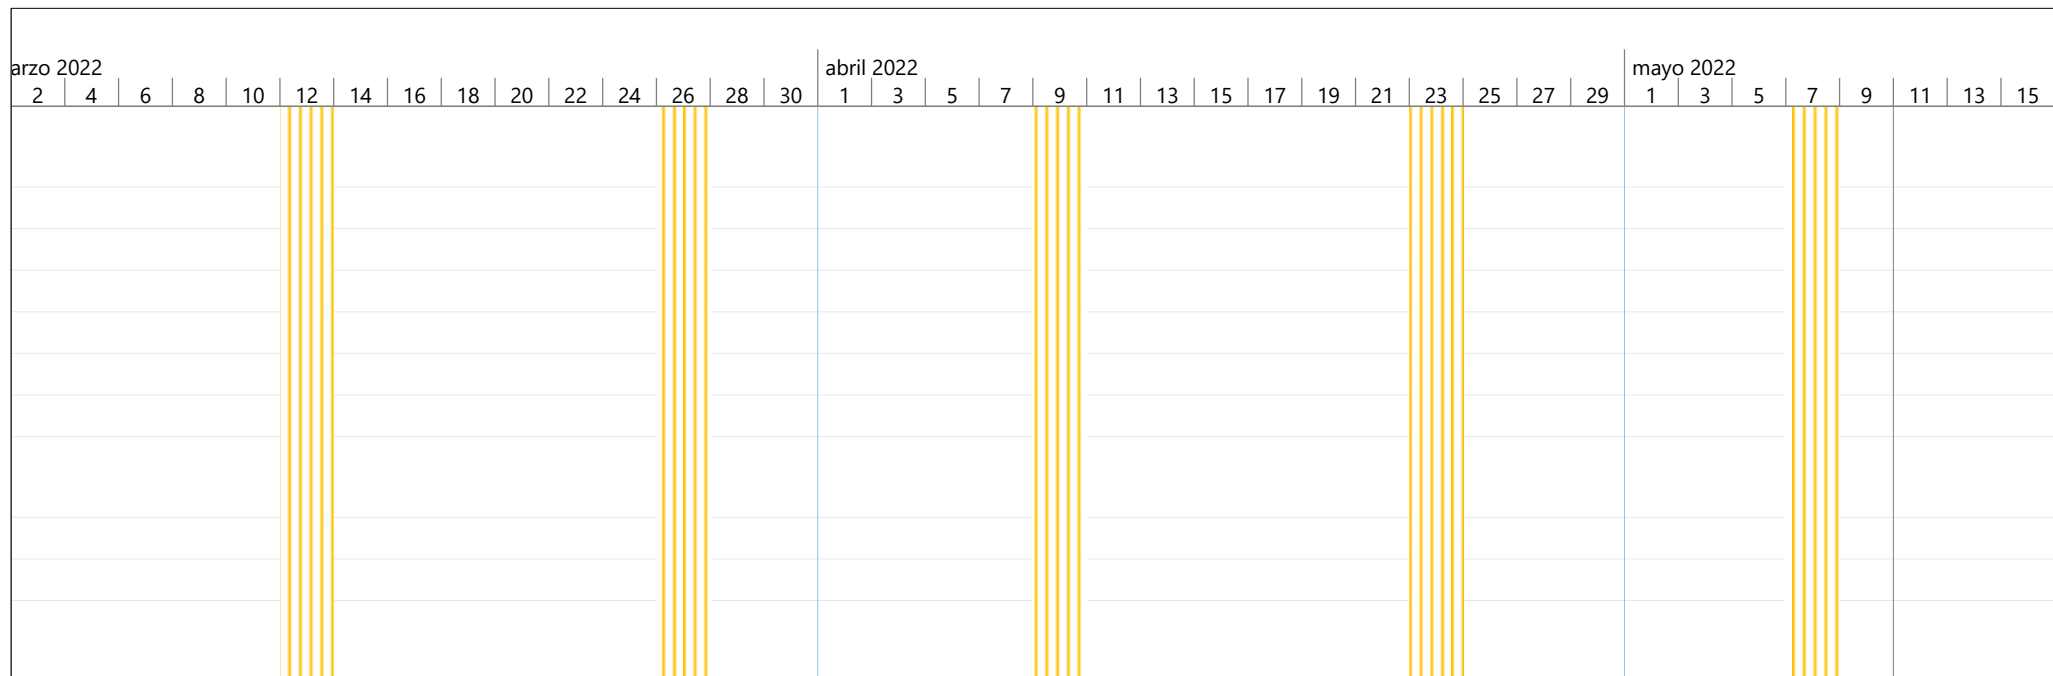

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




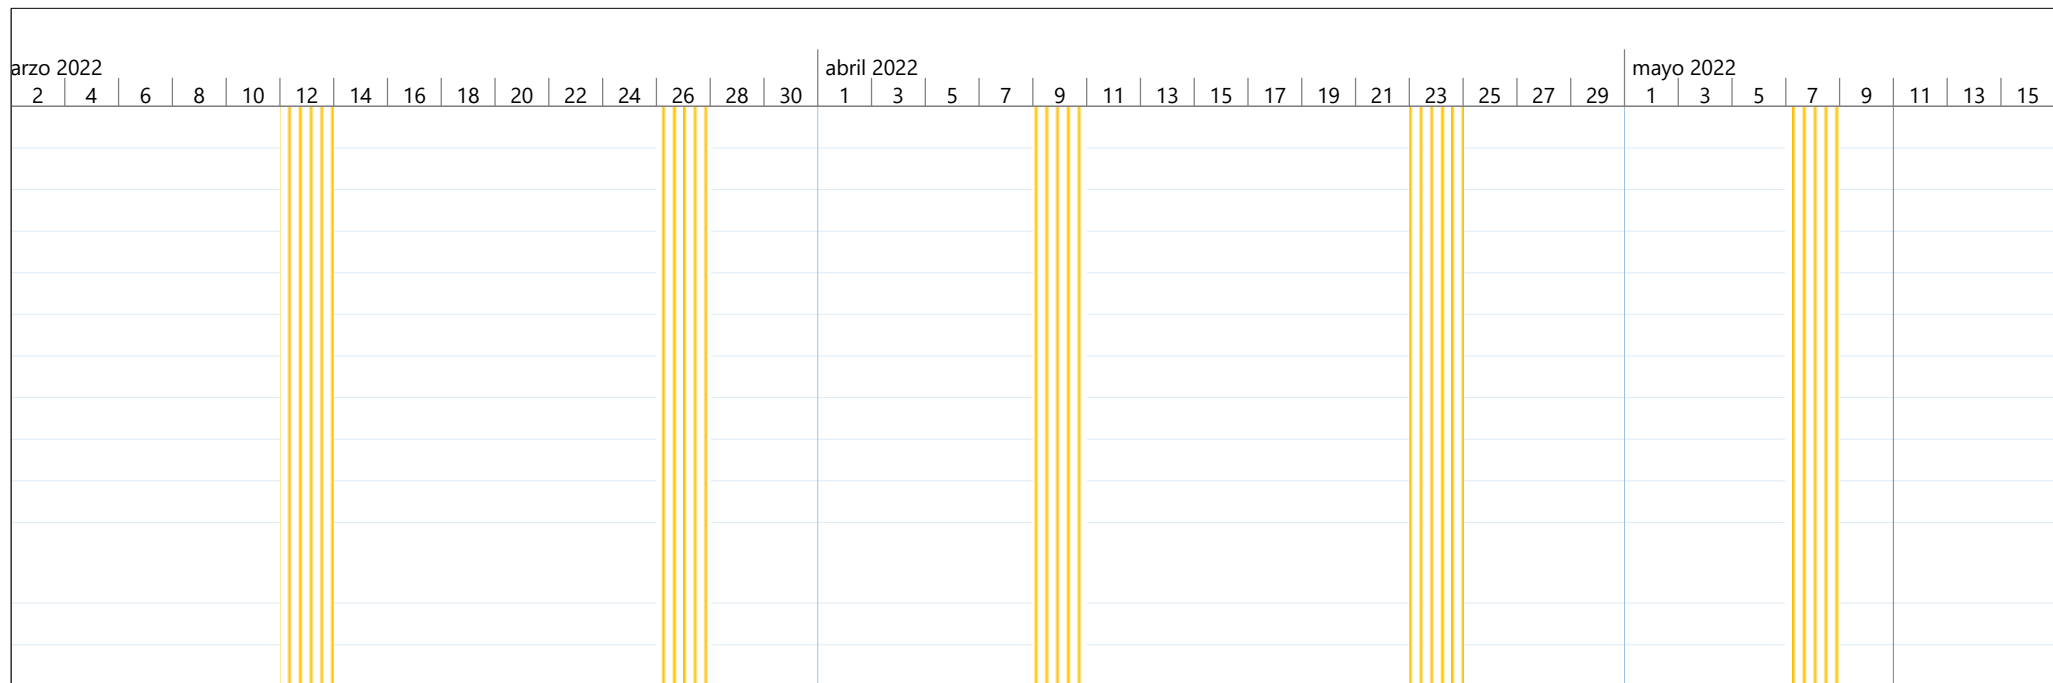

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




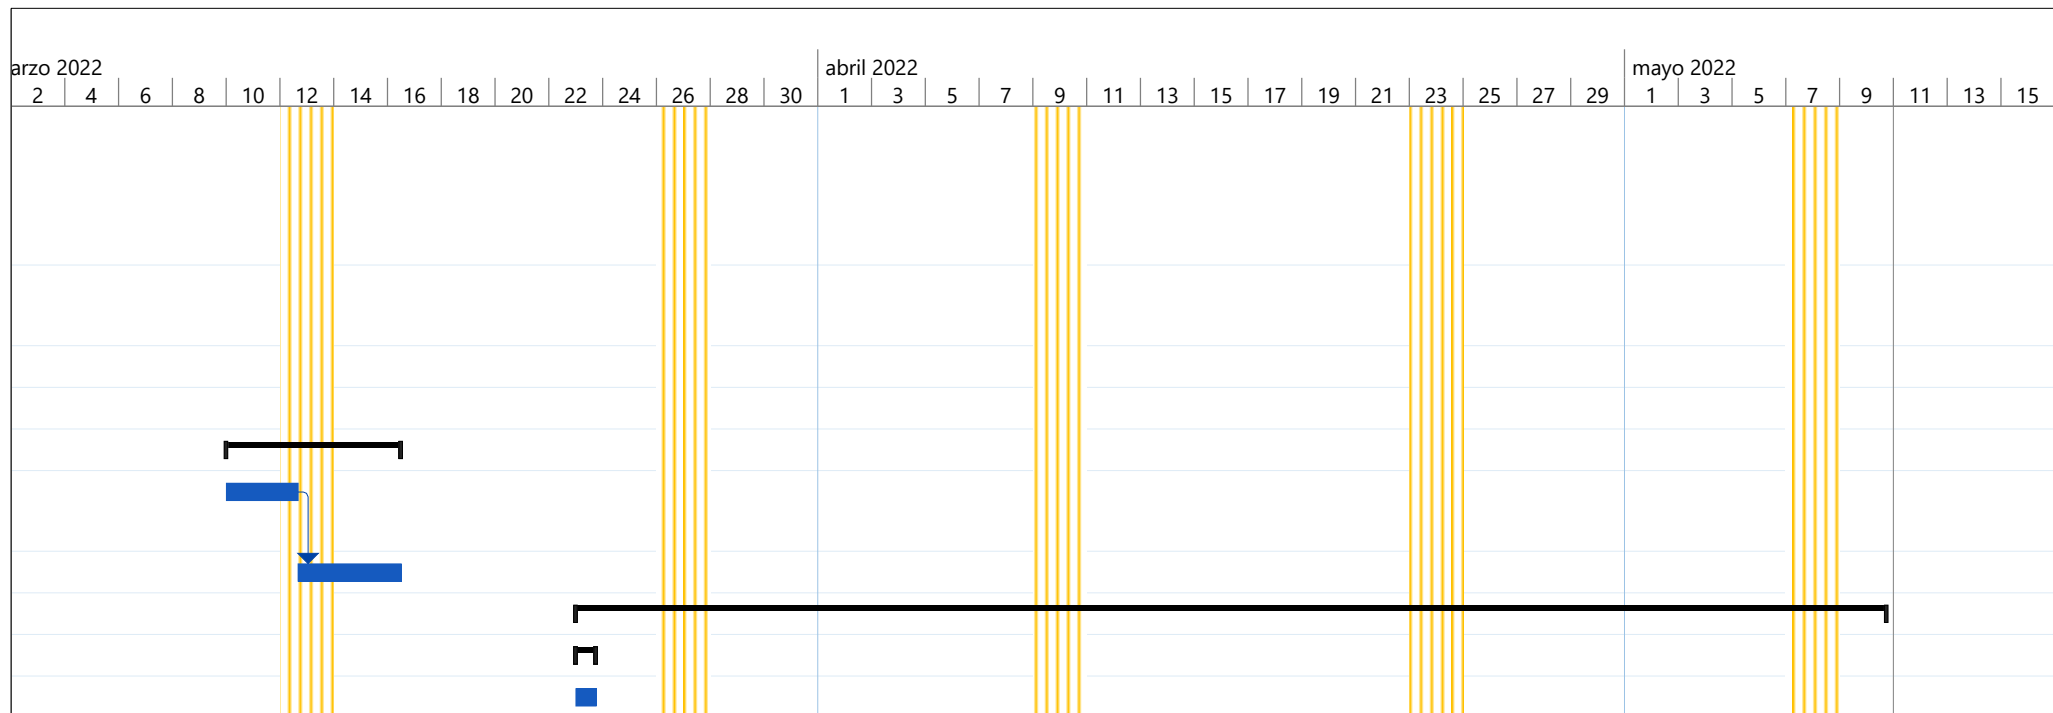

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




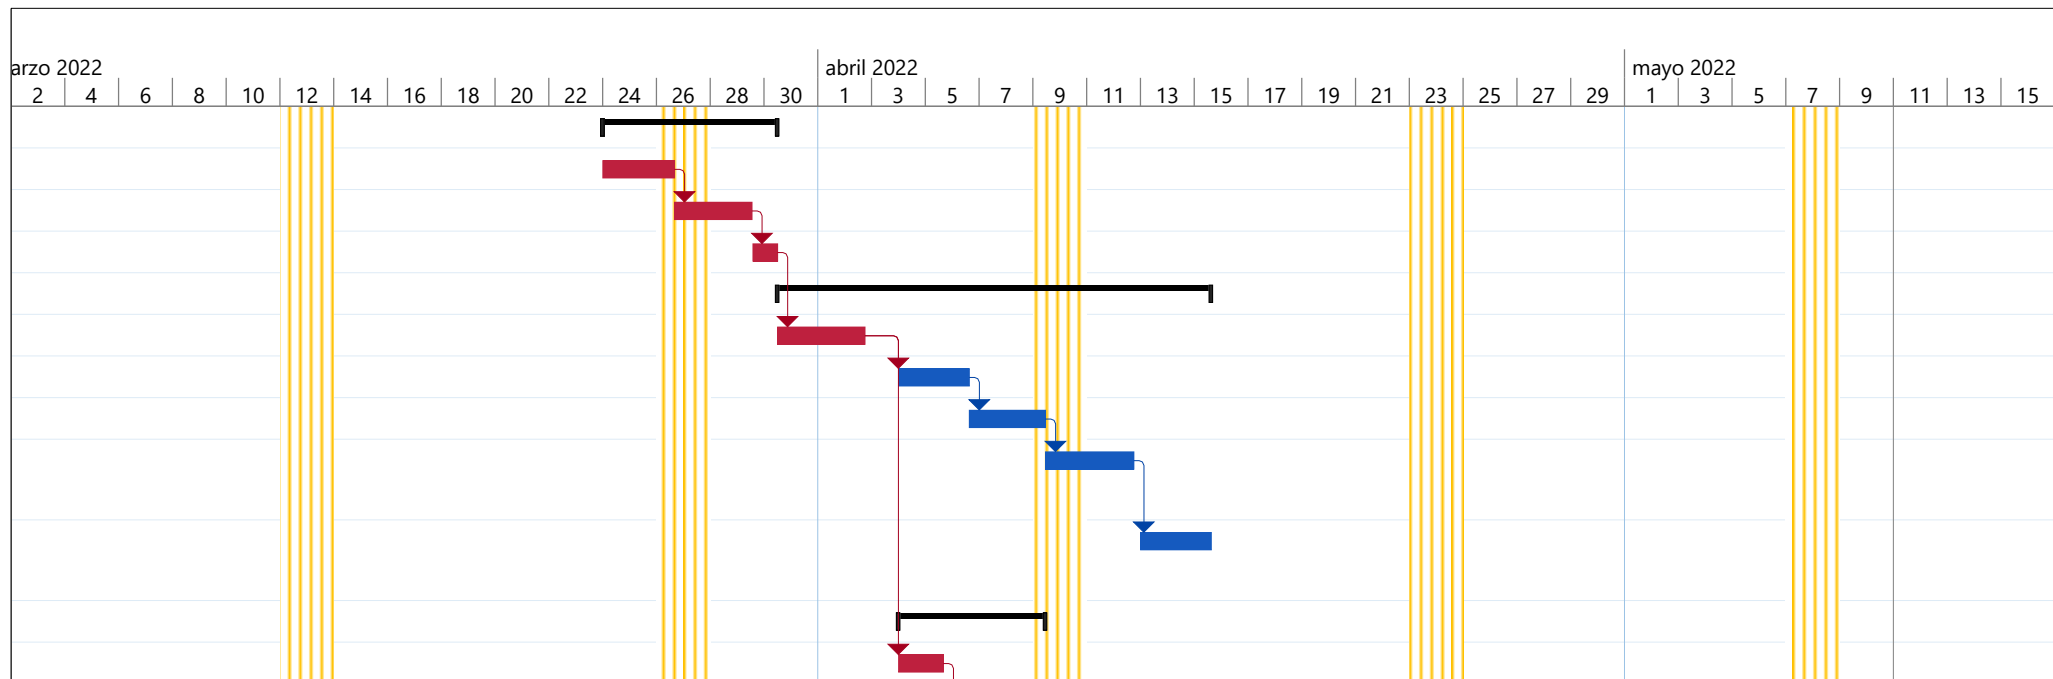

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	




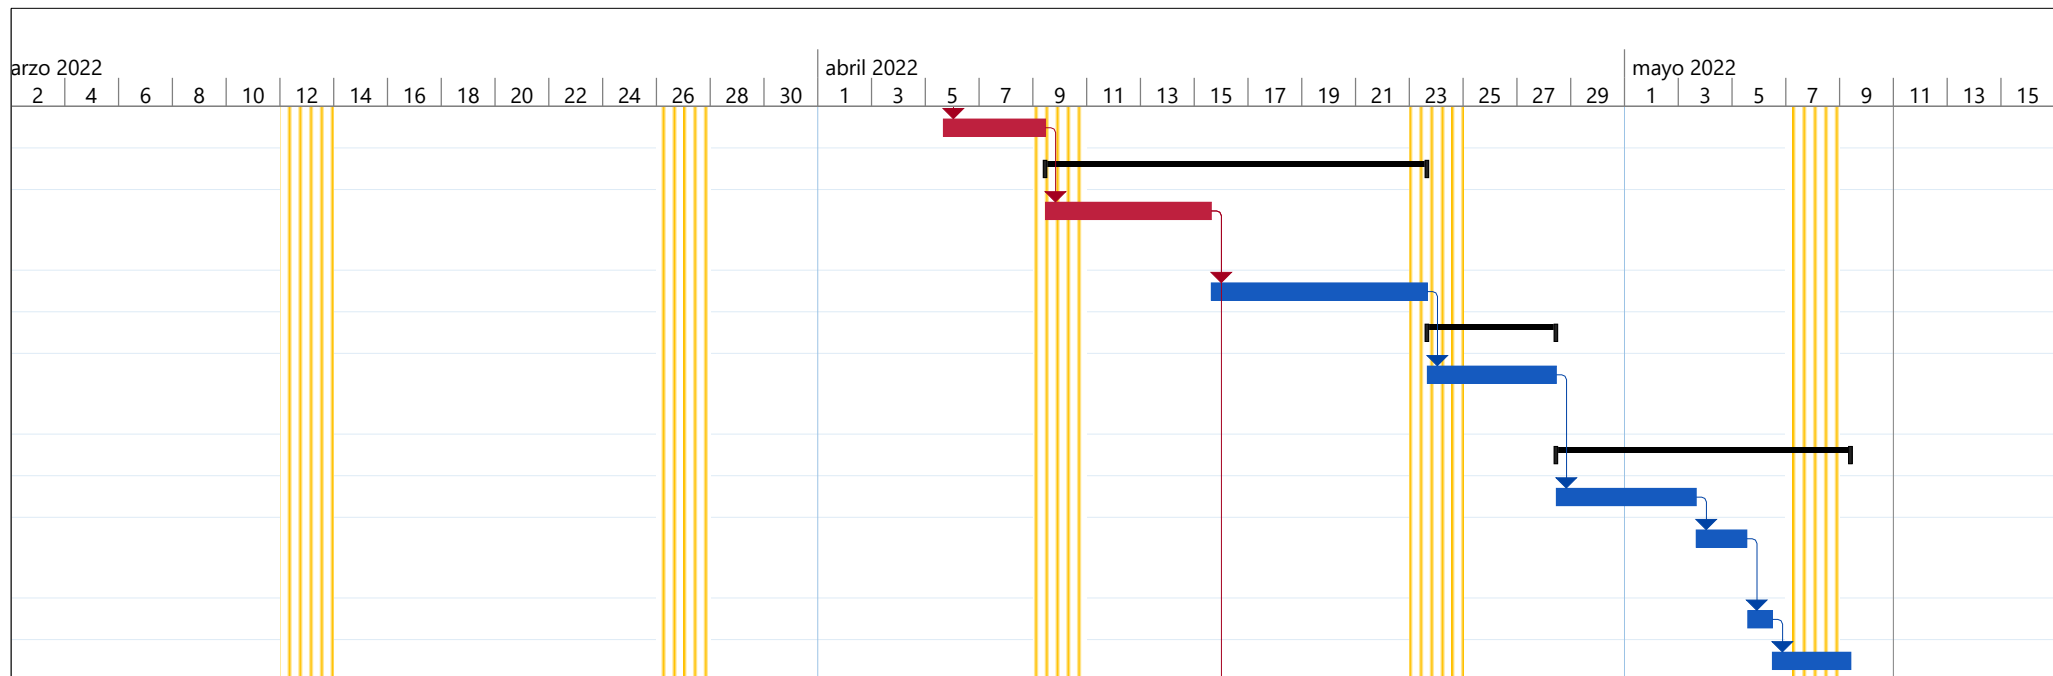

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	



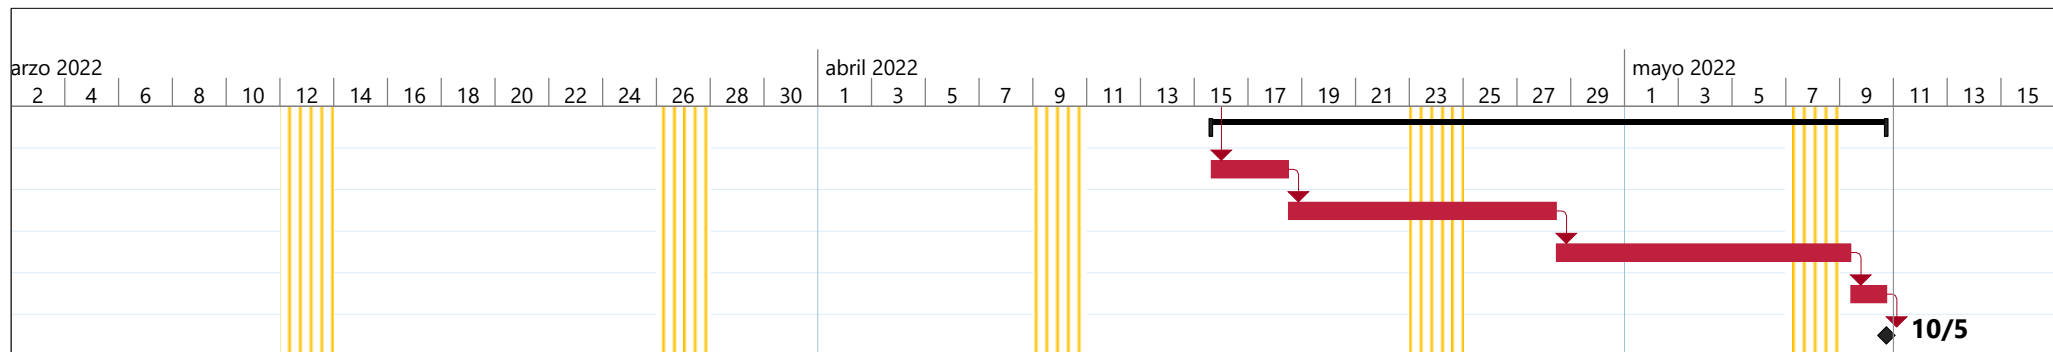

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M
Fecha: sáb 27/11/21

Tarea		Tareas externas	
División		Hito externo	
Hito		Fecha límite	
Resumen		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
Resumen del proyecto		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
Tarea inactiva		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Línea base	
solo duración		Hito de línea base	
Informe de resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen manual		Progreso	
solo el comienzo		Progreso manual	
solo fin		Atraso	

