





Página 1

CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR MIRAMAR, PEDEERNALES						FECHA: 25 AGOSTO 2022						POR: GRUPO EMPRESARIAL PRESTISA						
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	julio					agosto				septiembre		
							26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09
16			Columnas	8 días	vie 04/11/22	mié 16/11/22												
17			Viga de amarre y dinteles	3 días	mié 16/11/22	lun 21/11/22												
18			Losa de techo	10 días	lun 21/11/22	lun 05/12/22												
19				1 día?	jue 14/07/22	vie 15/07/22												
20			MURO DE BLOQUES	20 días	vie 07/10/22	vie 04/11/22												
21			Muro de bloques	20 días	vie 07/10/22	vie 04/11/22												
22			TERMINACION DE SUPERFICIE	54 días	vie 04/11/22	jue 19/01/23												
23			Pañete de muros exteriores, vigas y columnas	20 días	jue 10/11/22	jue 08/12/22												
24			Pañete de muros interiores, vigas, columnas	20 días	jue 24/11/22	jue 22/12/22												
25			Pañete en techo	5 días	jue 22/12/22	jue 29/12/22												
26			Cantos en general	15 días	jue 29/12/22	jue 19/01/23												
27			Fraguache	4 días	vie 04/11/22	jue 10/11/22												
28																		
Proyecto: CRONOGRAMA CUA Fecha: jue 25/08/22			Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica									
			División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso									
			Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual									
			Resumen		solo duración		Hito externo											
			Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite											
			Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas											
Página 2																		

CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR MIRAMAR, PEDEERNALES						FECHA: 25 AGOSTO 2022						POR: GRUPO EMPRESARIAL PRESTISA					
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	julio					agosto			septiembre		
							26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09
29			TERMINACION DE TECHO	11 días	lun 05/12/22	mar 20/12/22											
30			Fino de techo plano	2 días	mié 07/12/22	vie 09/12/22											
31			Antepecho terminado muro de bloques y zabaleta	4 días	vie 09/12/22	jue 15/12/22											
32			Impermeabilizante con manto asfaltico	3 días	jue 15/12/22	mar 20/12/22											
33			Desague de techo	2 días	lun 05/12/22	mié 07/12/22											
34																	
35			PUERTAS Y VENTANAS	35 días	jue 22/12/22	jue 09/02/23											
36			Suministro e instalacion de ventanas y puertas	15 días	jue 22/12/22	jue 12/01/23											
37			Puertas en closet tipo libro	7 días	jue 12/01/23	lun 23/01/23											
38			Gabinetes de piso	5 días	lun 23/01/23	lun 30/01/23											
39			Gabinetes de pared	8 días	lun 30/01/23	jue 09/02/23											
40			Tope de Marmolite	3 días	lun 30/01/23	jue 02/02/23											
41																	
Proyecto: CRONOGRAMA CUA Fecha: jue 25/08/22			Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica								
			División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso								
			Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual								
			Resumen		solo duración		Hito externo										
			Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite										
			Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas										
Página 3																	

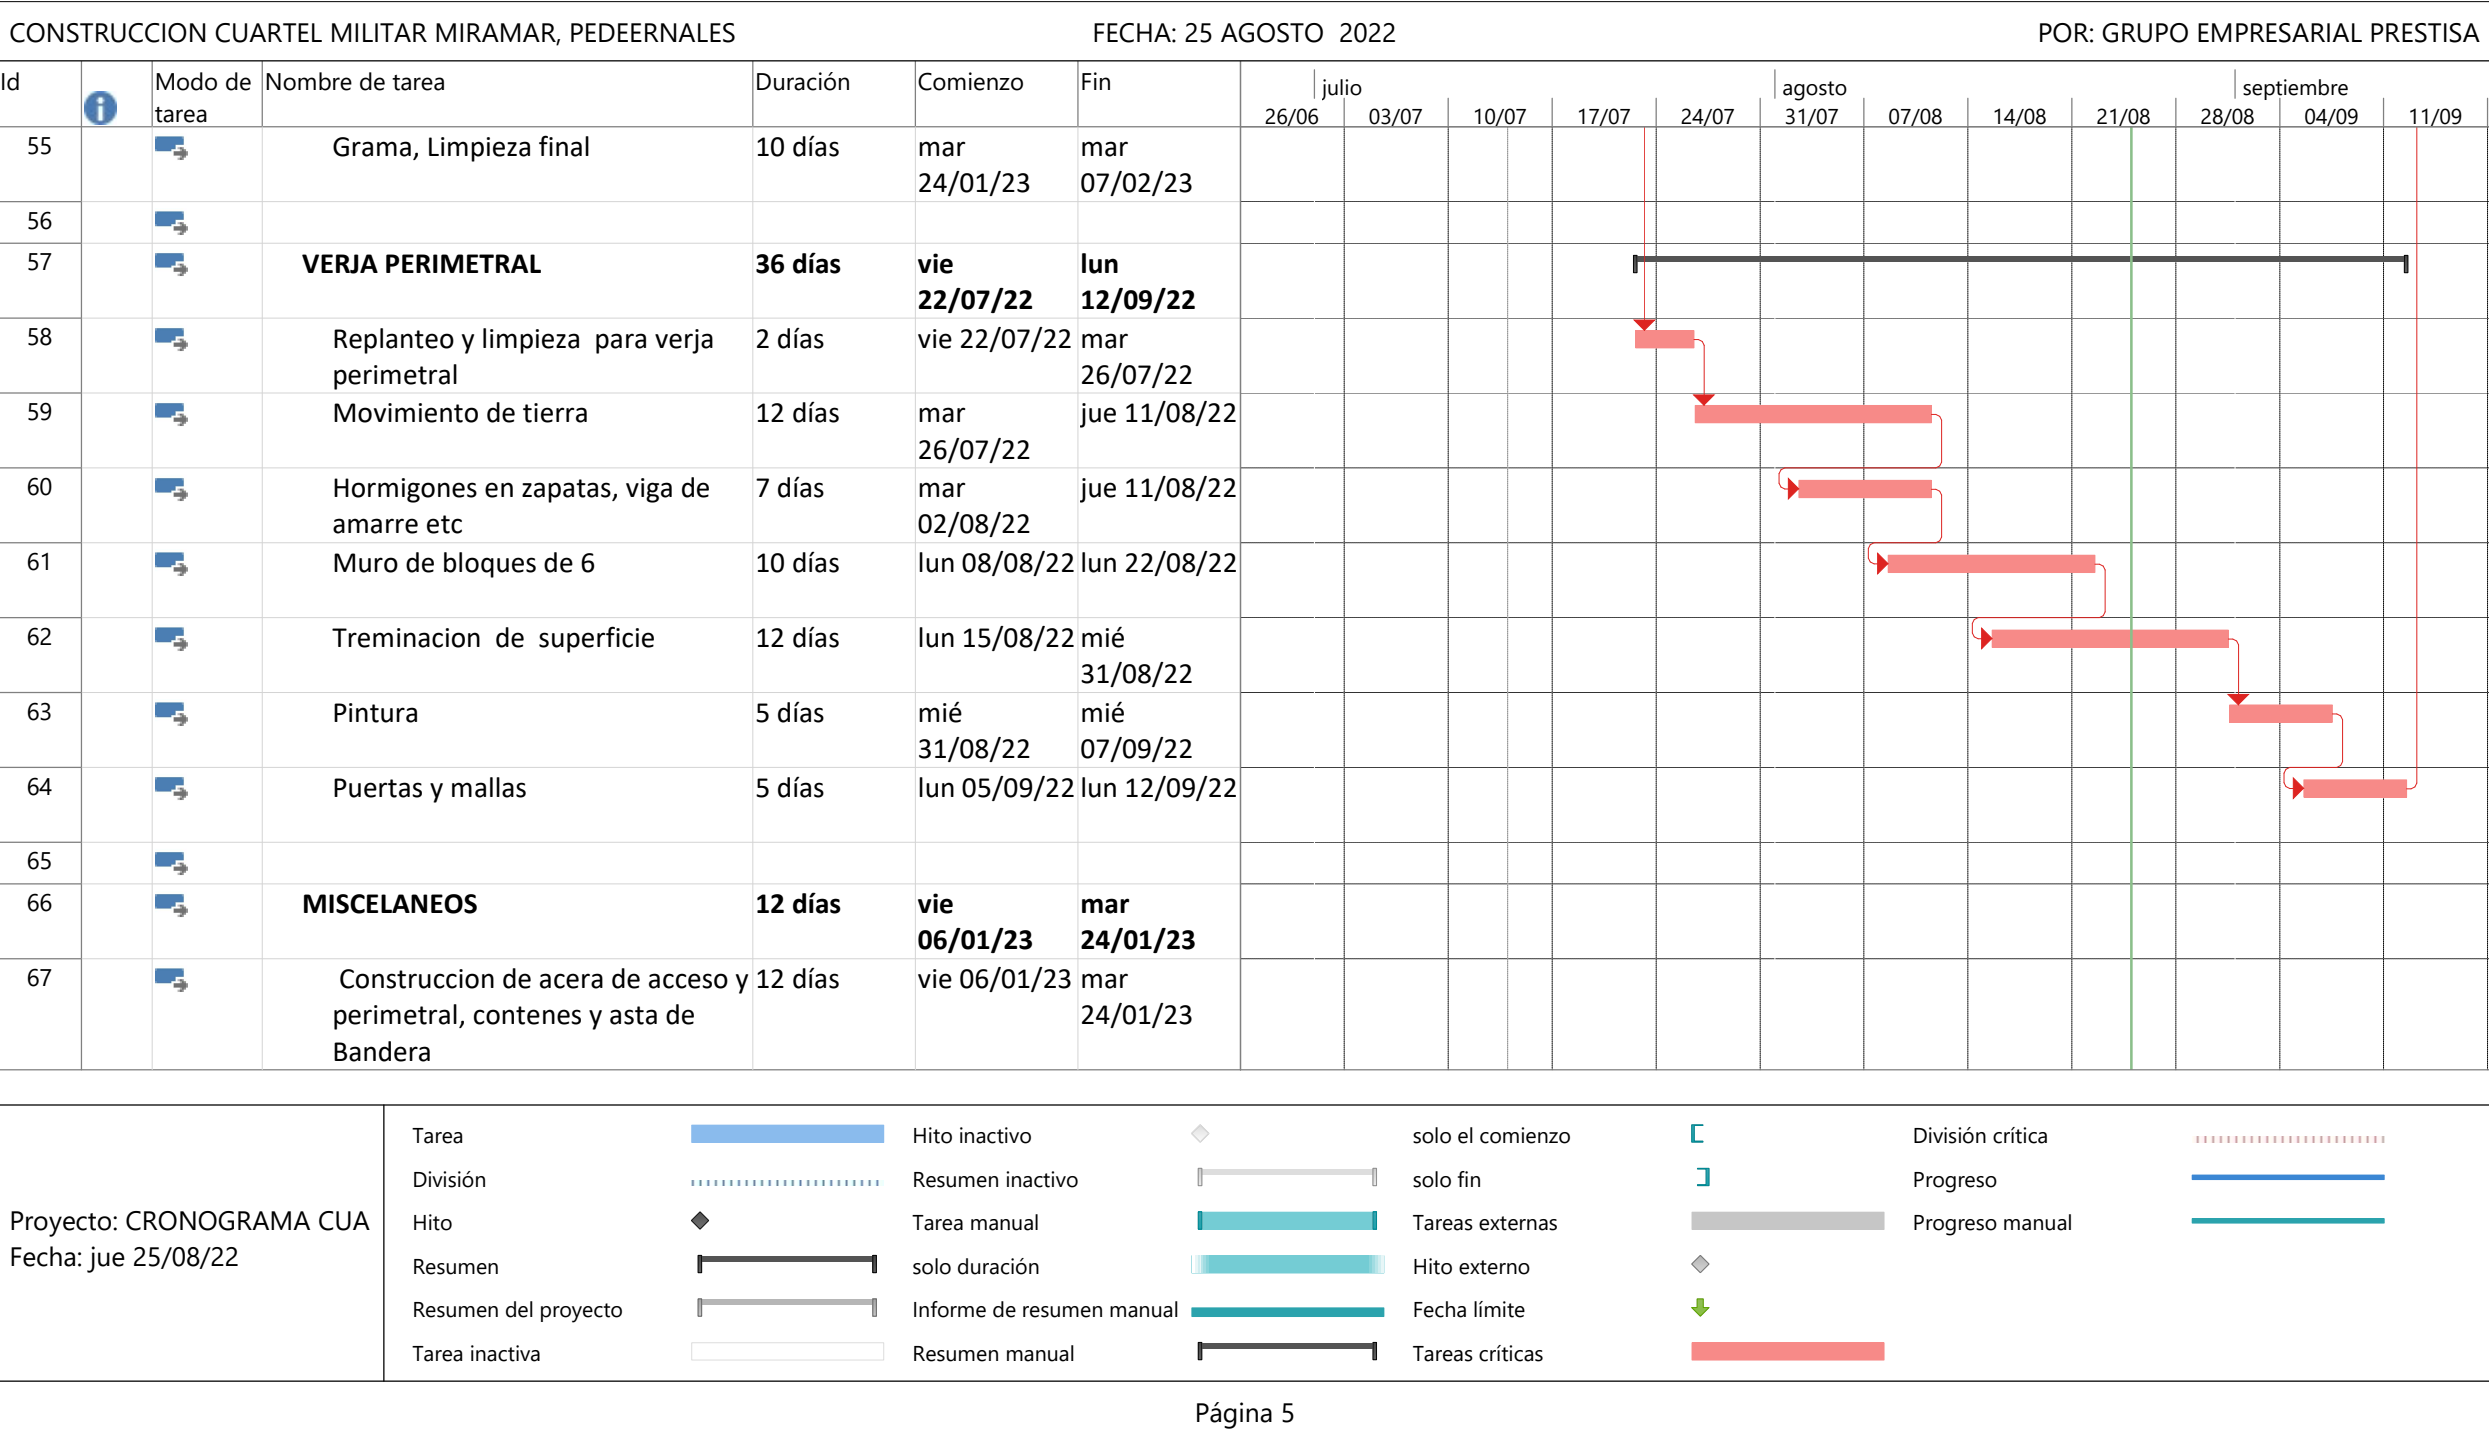

Página 5

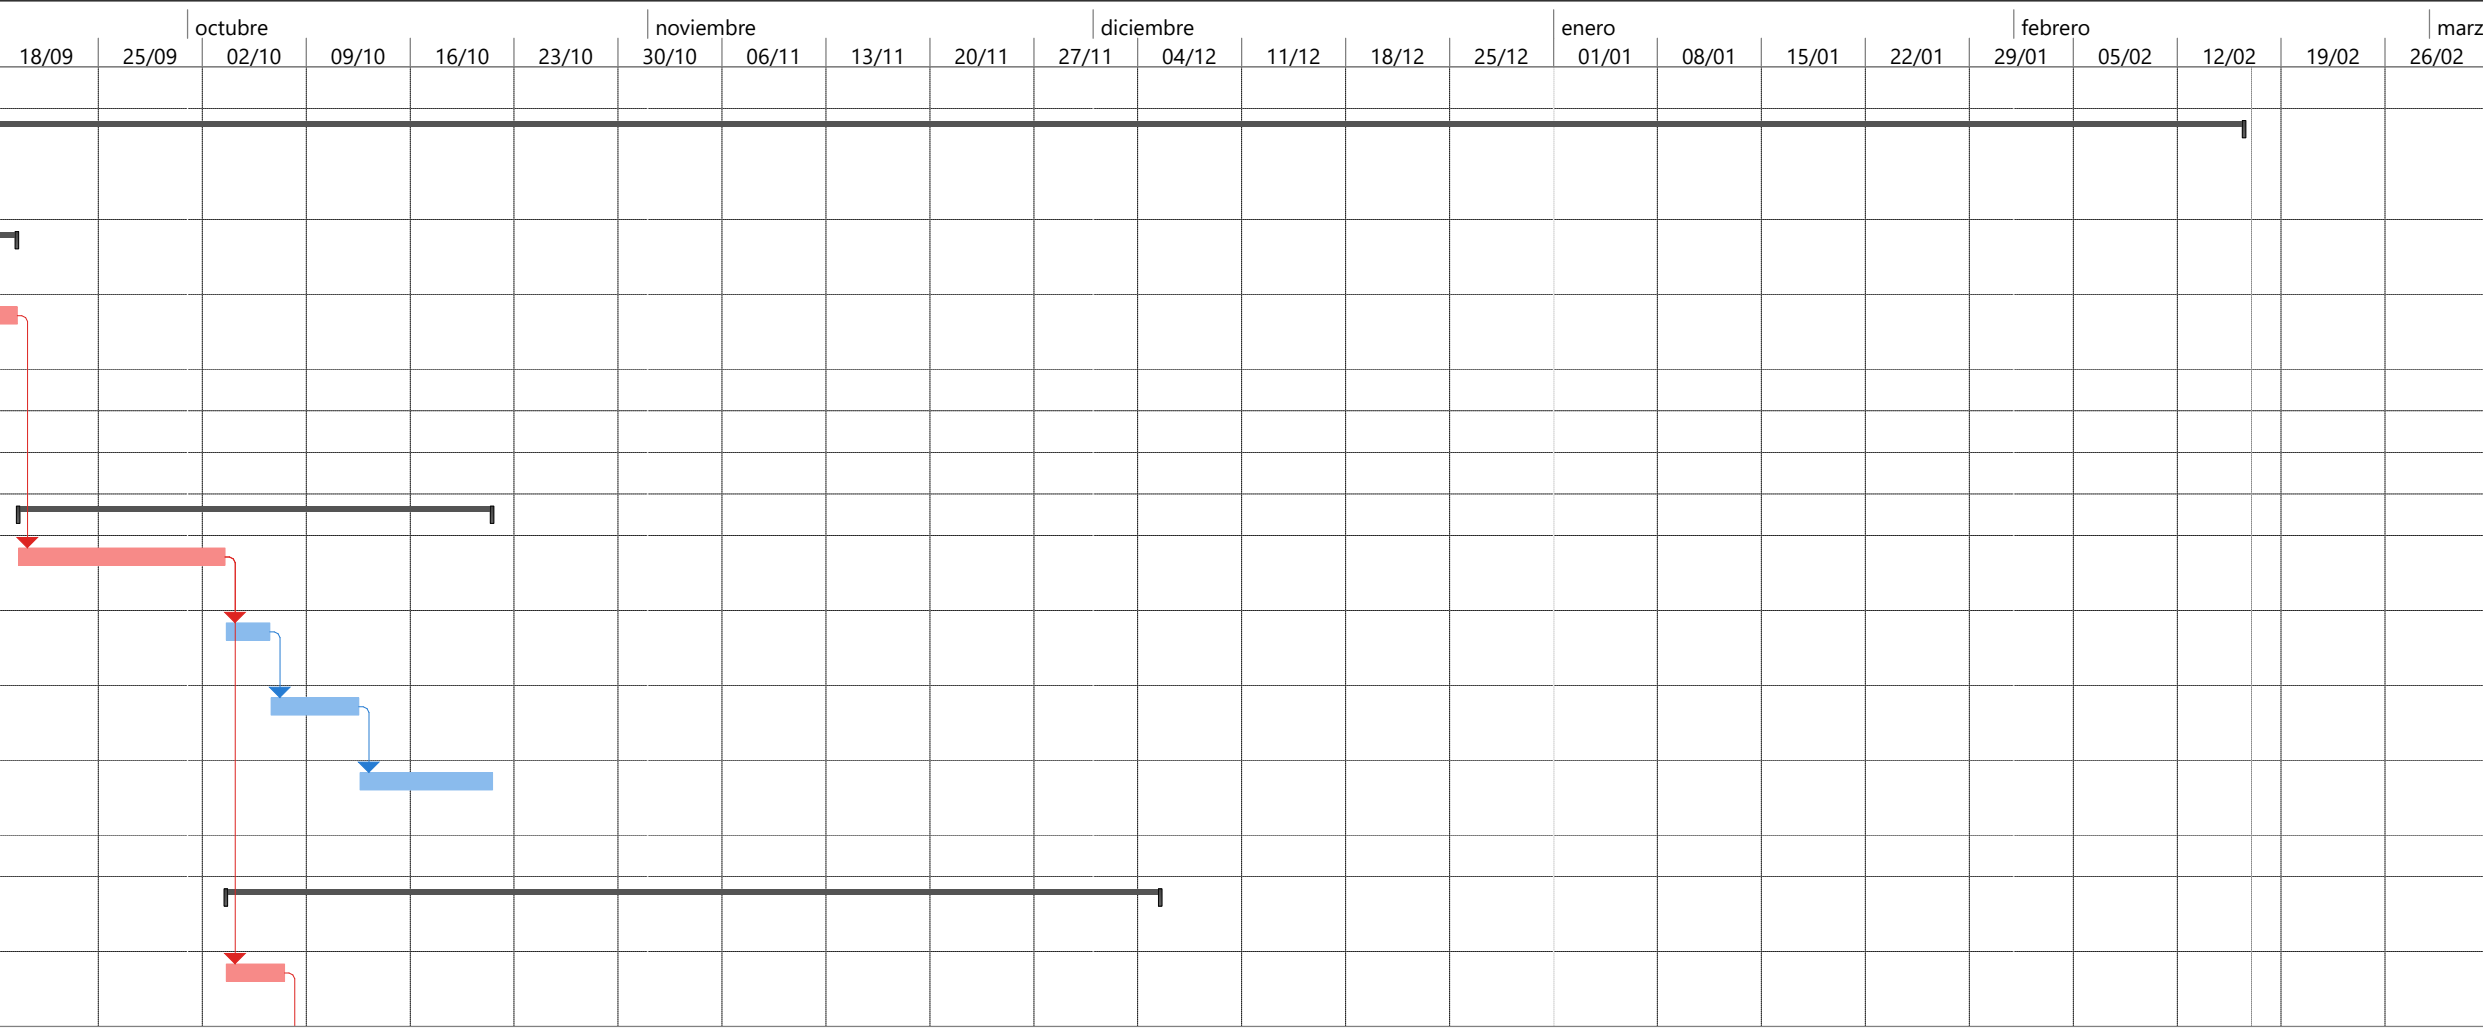

Proyecto: CRONOGRAMA CUA
Fecha: jue 25/08/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas


División crítica

Progreso

Progreso manual

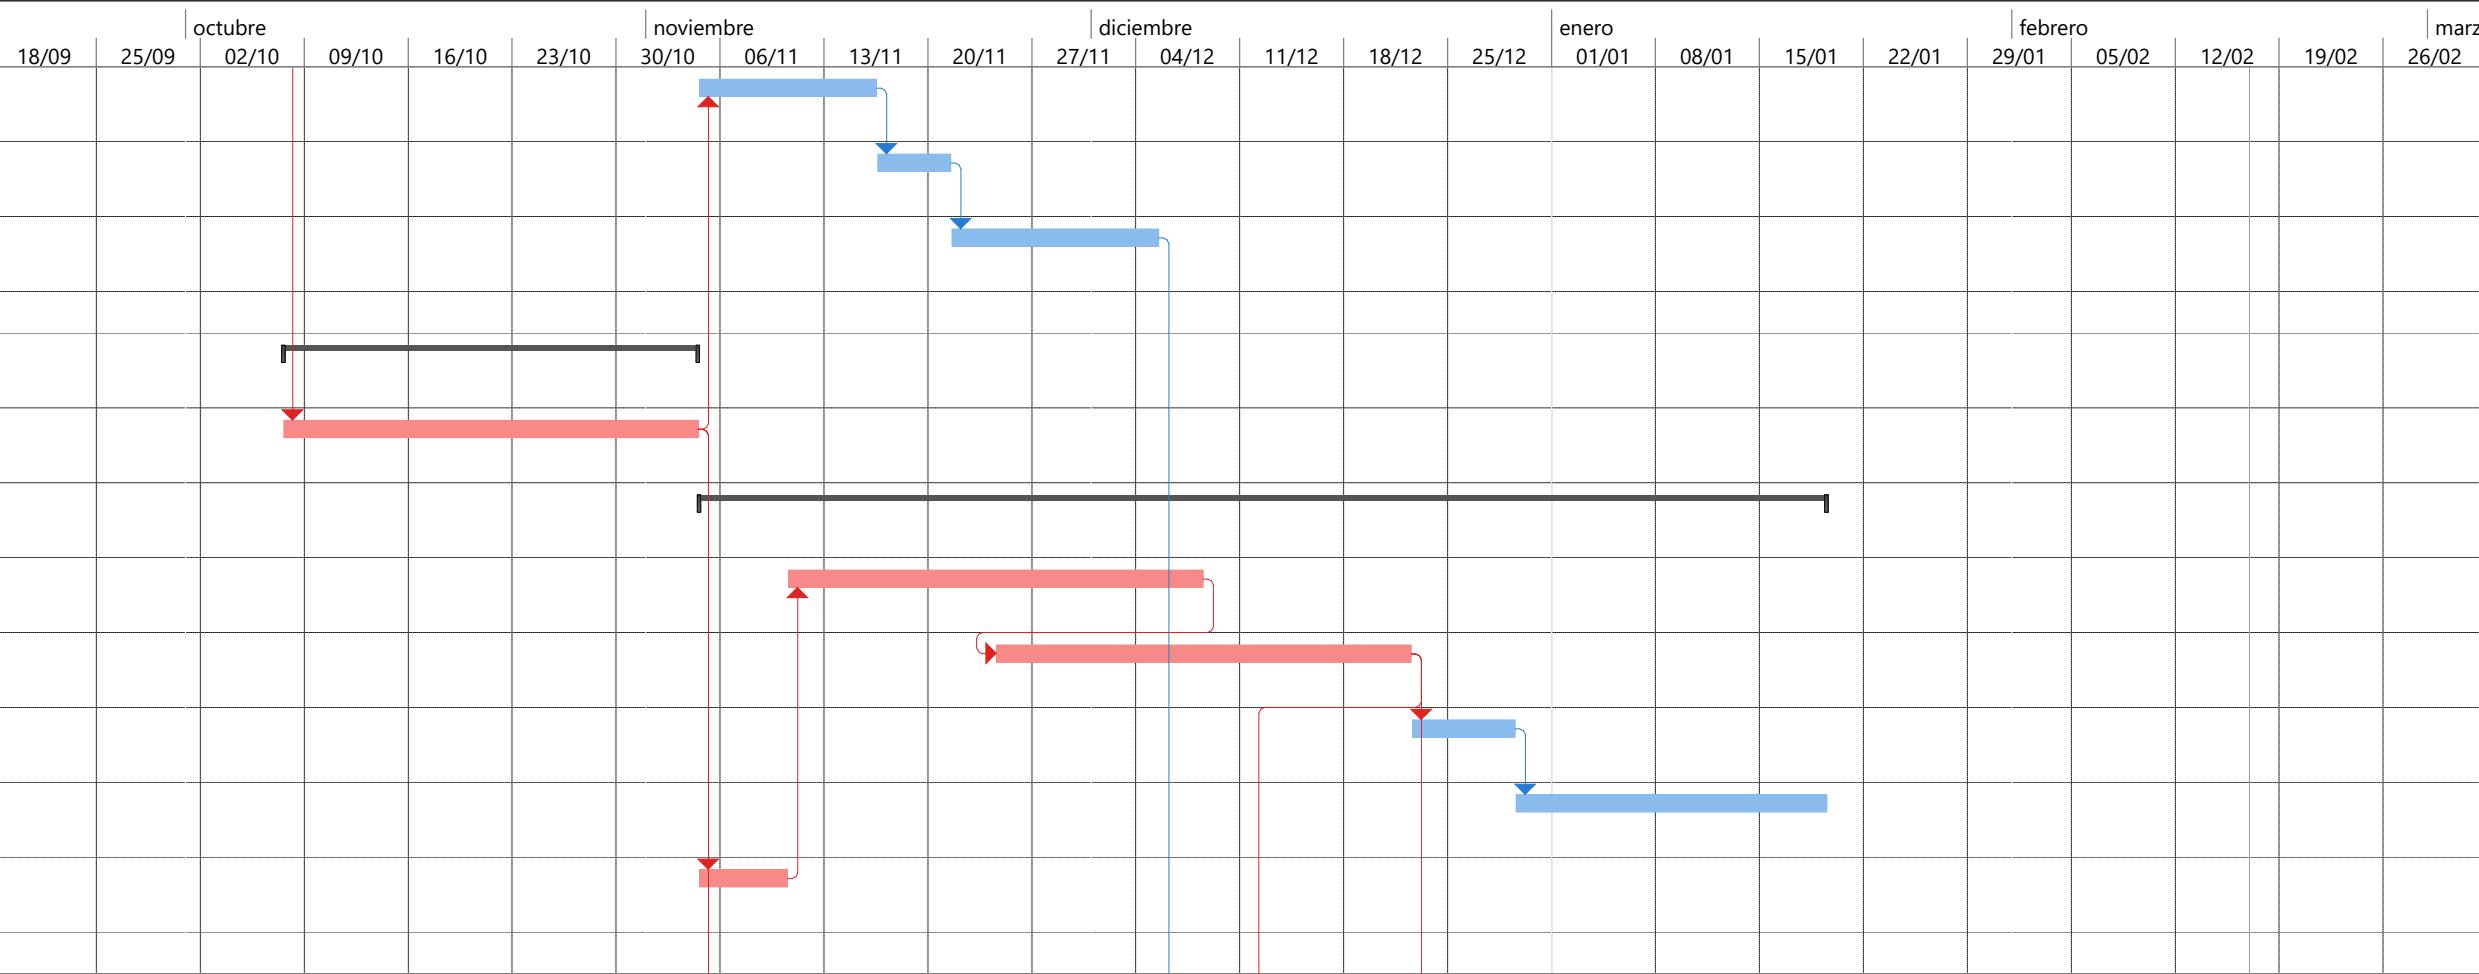

Proyecto: CRONOGRAMA CUA Fecha: jue 25/08/22	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

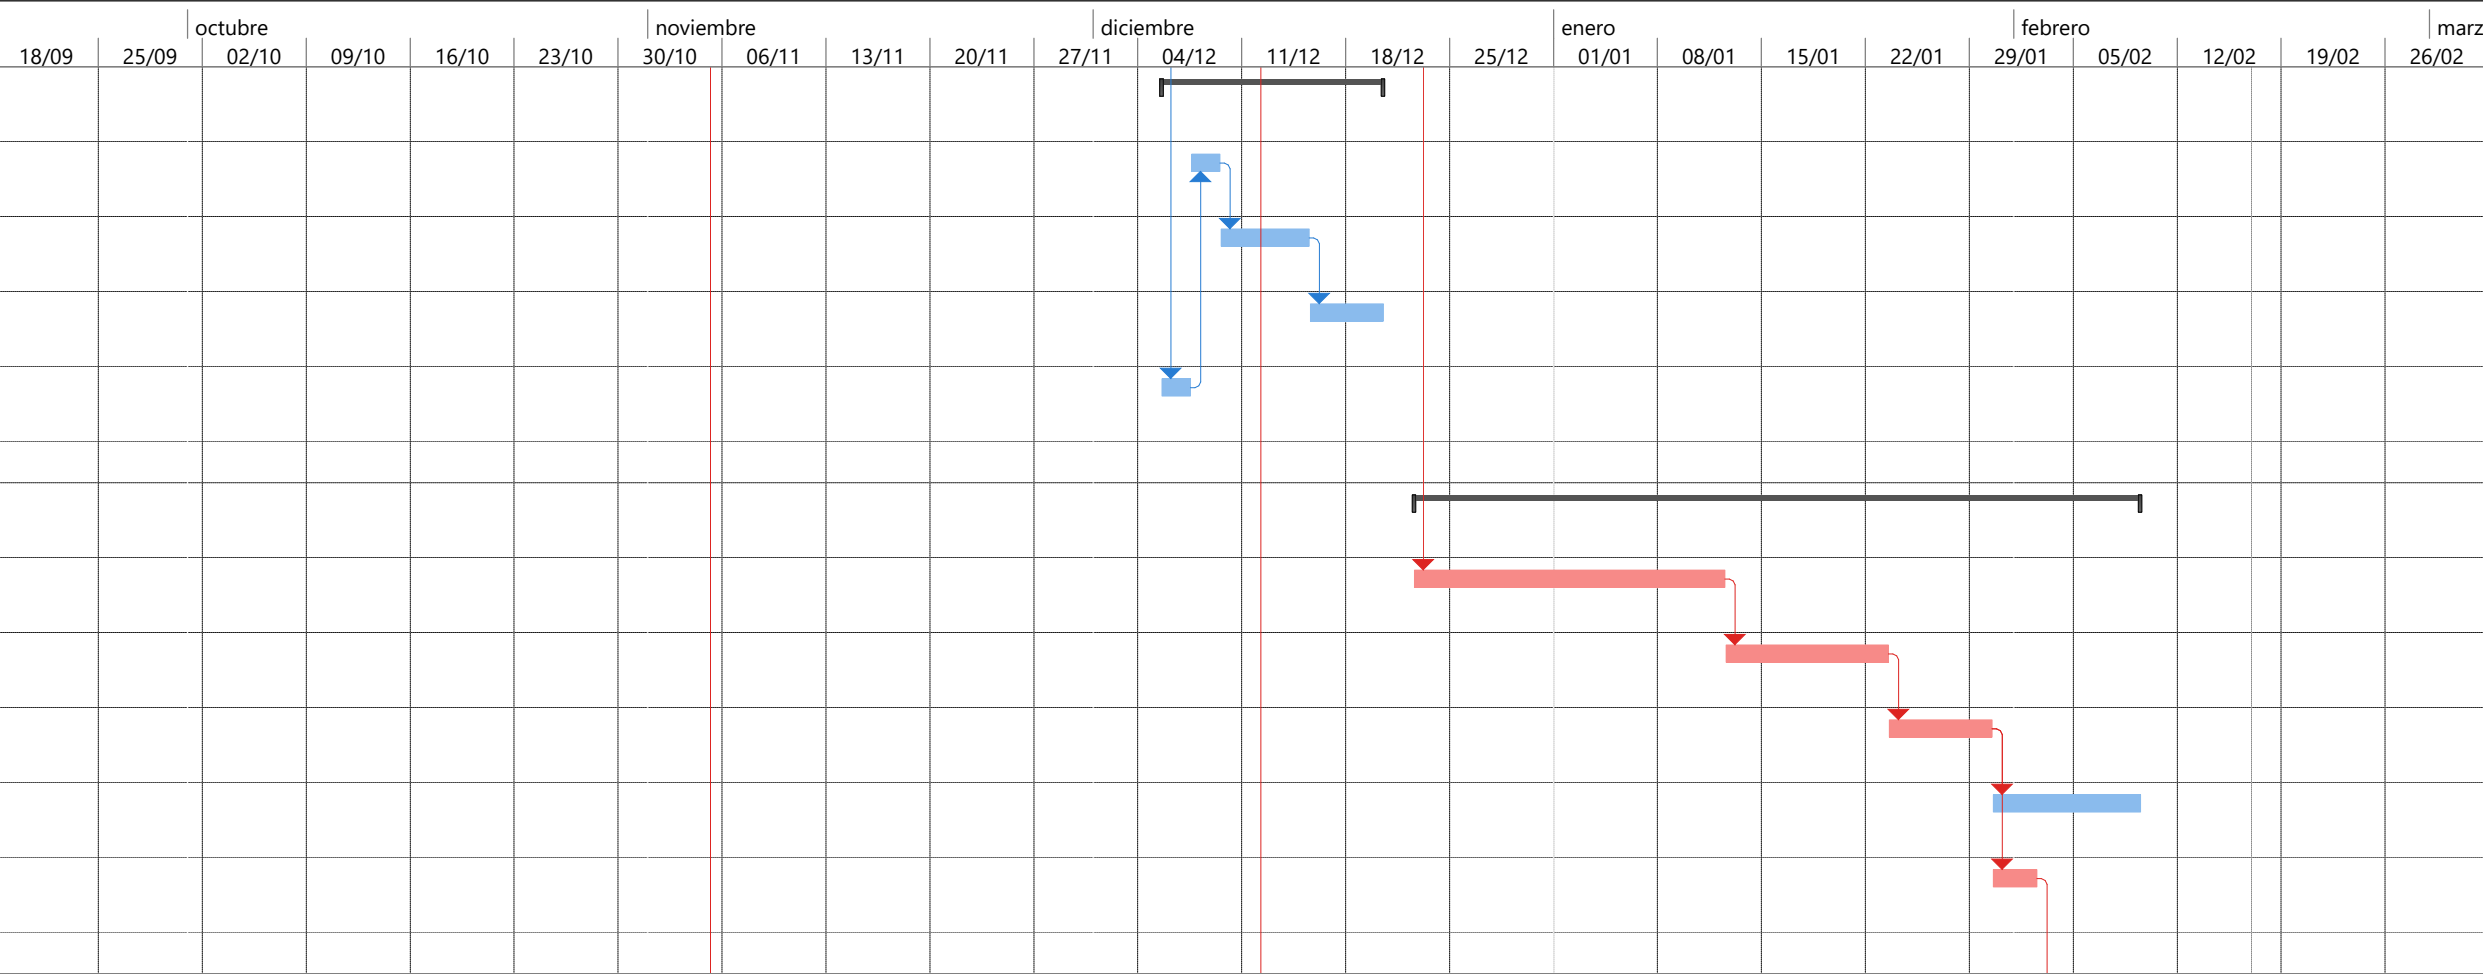

Proyecto: CRONOGRAMA CUA
Fecha: jue 25/08/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

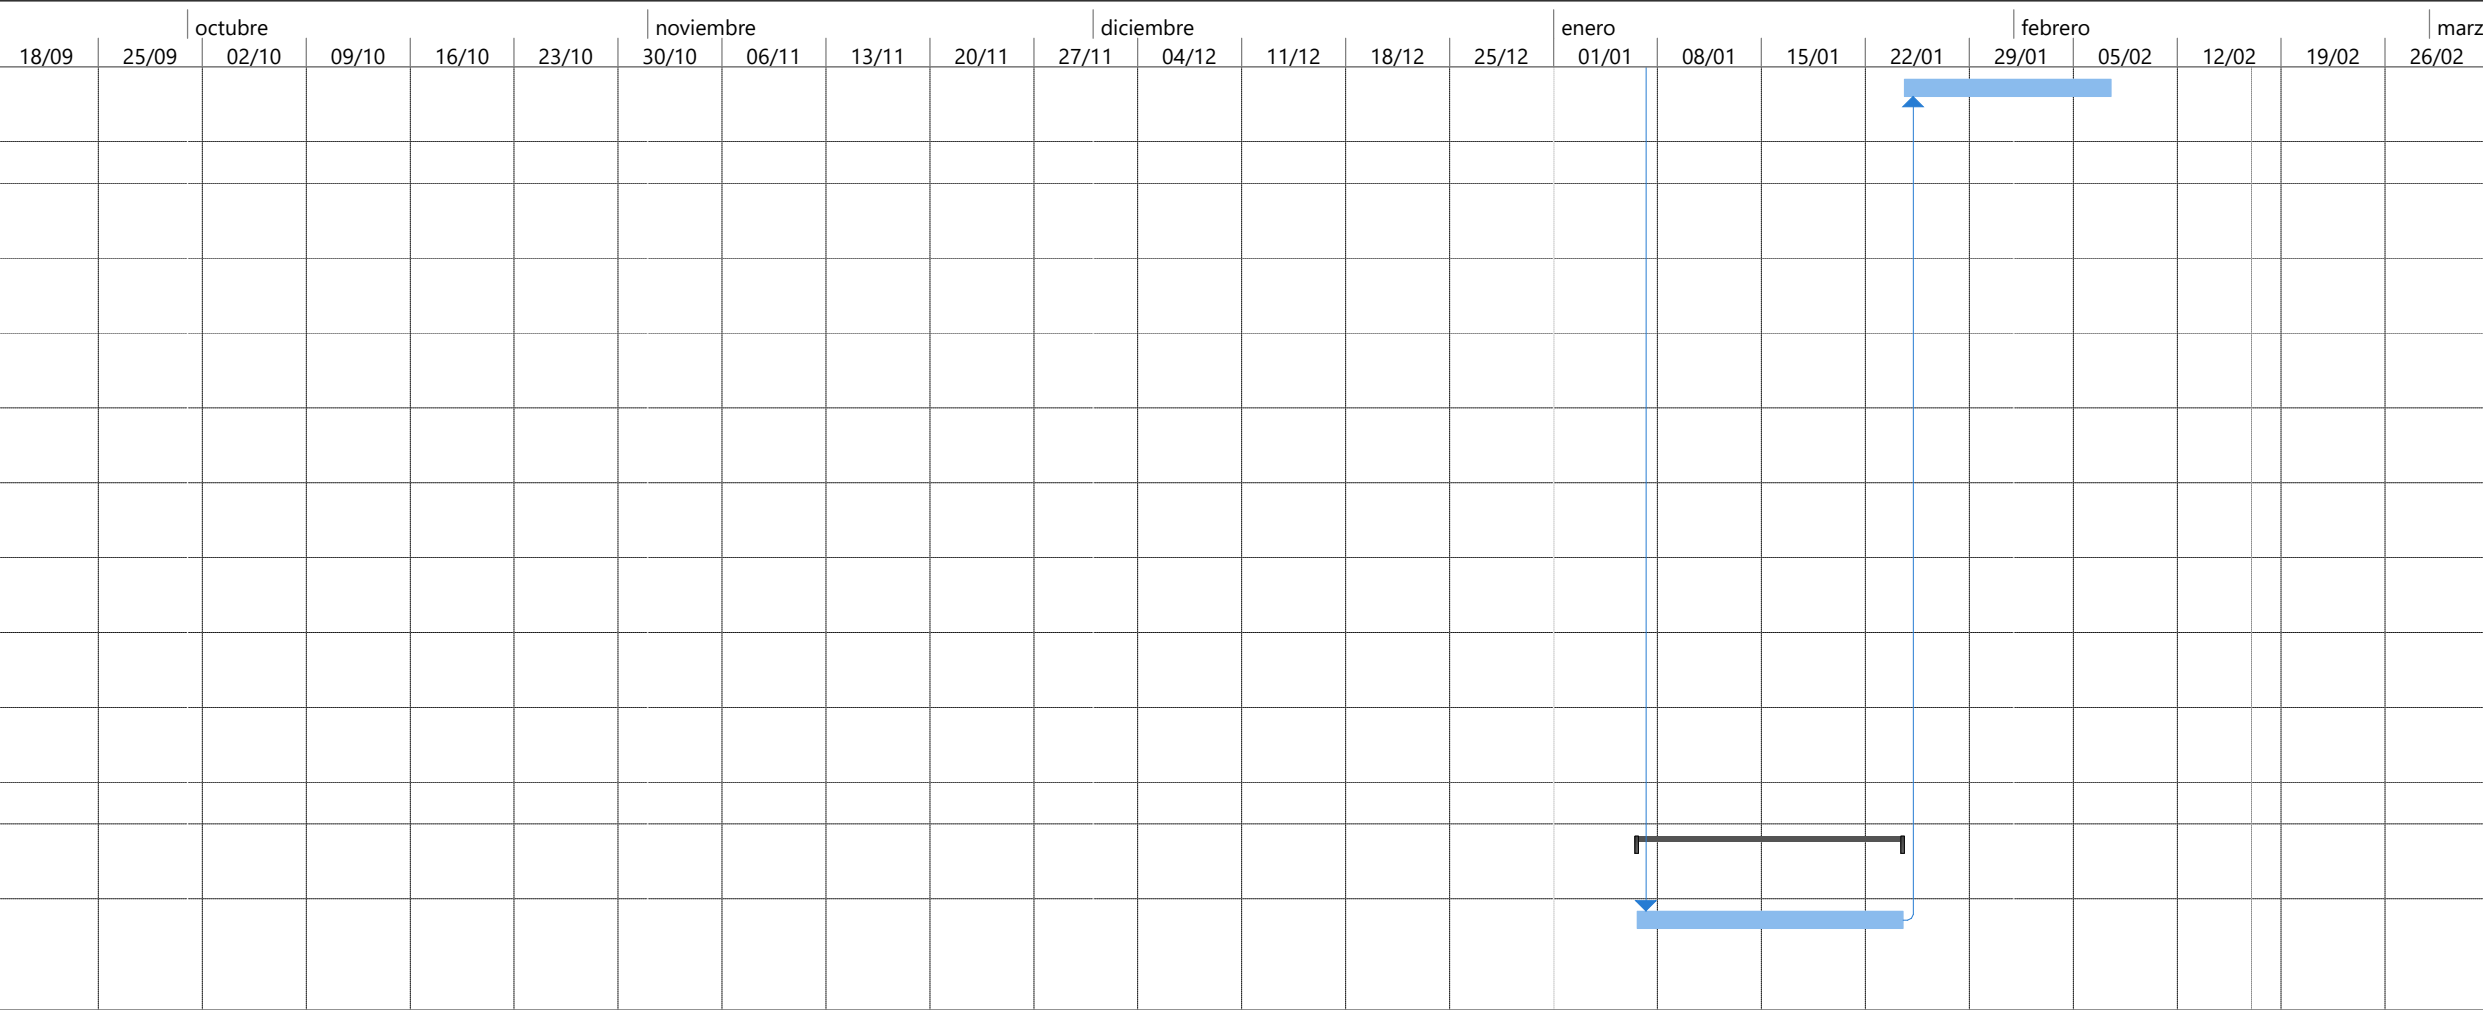

Proyecto: CRONOGRAMA CUA
Fecha: jue 25/08/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
