



ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20	S	M	
24		Suministro y Colocación de Piezas Especiales para empalme varios en Hg y Pvc.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																												
25		Perforación de (1) Pozo con maquina de rotación para abastecimiento de agua en diametro de 8 pulgs. Para ser encamisado en tubería de hierro negro de 6 pulgs. Con un espesor de 1/4", incluye	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	16																												
26		Suministro y Colocación Valvula de Ø 2" en Hg.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
27		Suministro y Colocación de Valvula de Ø 3" en Hg	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
28		Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3HP, Incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1de presión, alambre de vinil 10/3, tubos eléctricos de 3/4", alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, cable de acero	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
29		Suministro Switch de seguridad de 50 amp. , incluye alambrado desde trasformador hasta Bomba.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
30		Mano de Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde transformador hasta la	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
31		Suministro de Postes de Luz de 35 DAN	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
32		Instalación de Postes de 35 DAN, incluye hincado	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
33		Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
34		Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																												
35		Suministro e Instalación de Cutao y Pararrayos.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																												



Proyecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	solo duración	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	
			solo el comienzo	
			solo fin	
			Tareas externas	
			Hito externo	







ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	F	S	Apr 5, '20	S	M
108	✓	Dinteles	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																							
109	✓	Losa.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	108																							
110	✓	Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																							
111	✓	Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																							
112	✓	Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																							
113	✓	Piso de Hormigón Pulido a col.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
114	✓	Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																							
115	✓	Pintura Acrilica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																							
116	✓	Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																							
117	✓	Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
118	✓	Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
119	✓	Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
120	✓	Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
121	✓	Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																							
122	✓	Tubería y Piezas	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	120																							
123	✓	Limpieza Final	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	122																							




royecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
	Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas	
			Hito externo	

T W T F S Apr 12, '20 S M T W T F S Apr 19, '20 S M T W T F S Apr 26, '20 S M T W T F S May 3, '20 S M T W T F S May 10, '20 S M T W T F S May 17, '20 S M T W T




Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			




Elaborado por  
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: Vista hermosa, la plat  
Fecha: Wed 3/18/20

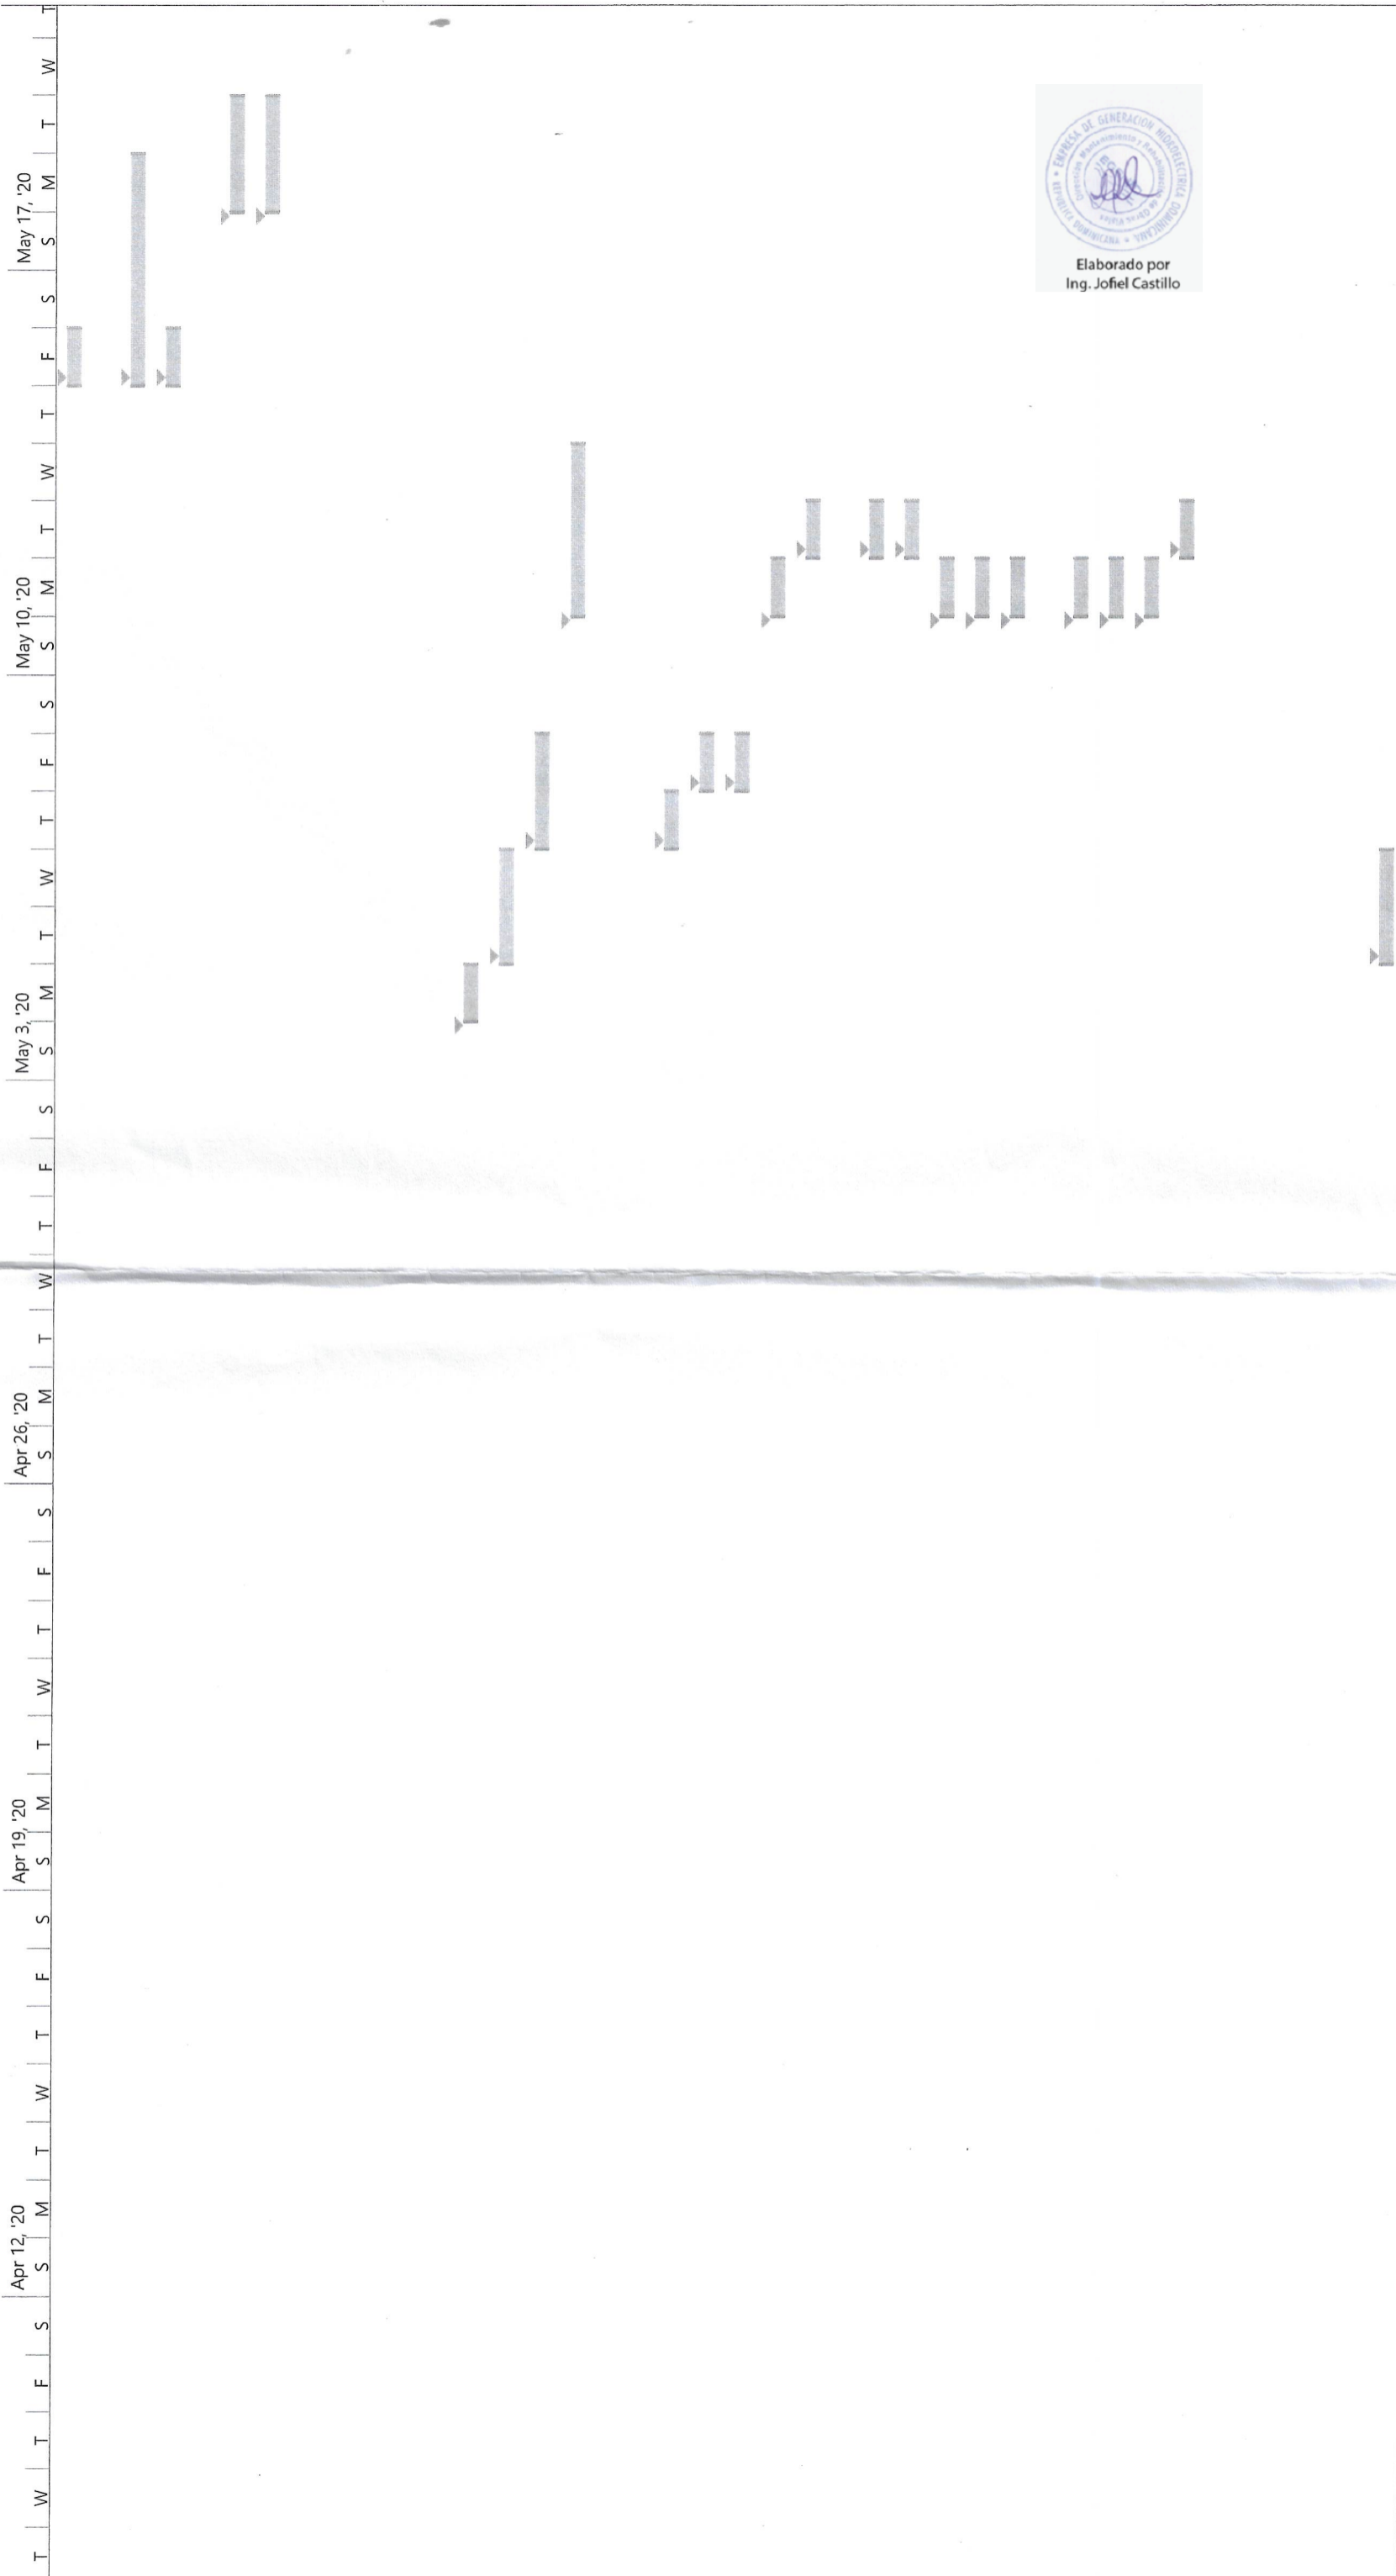


Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		solo el comienzo		Fecha límite
	División		solo fin		Progreso
	Hito		Tareas externas		Progreso manual
	Resumen		Hito externo		

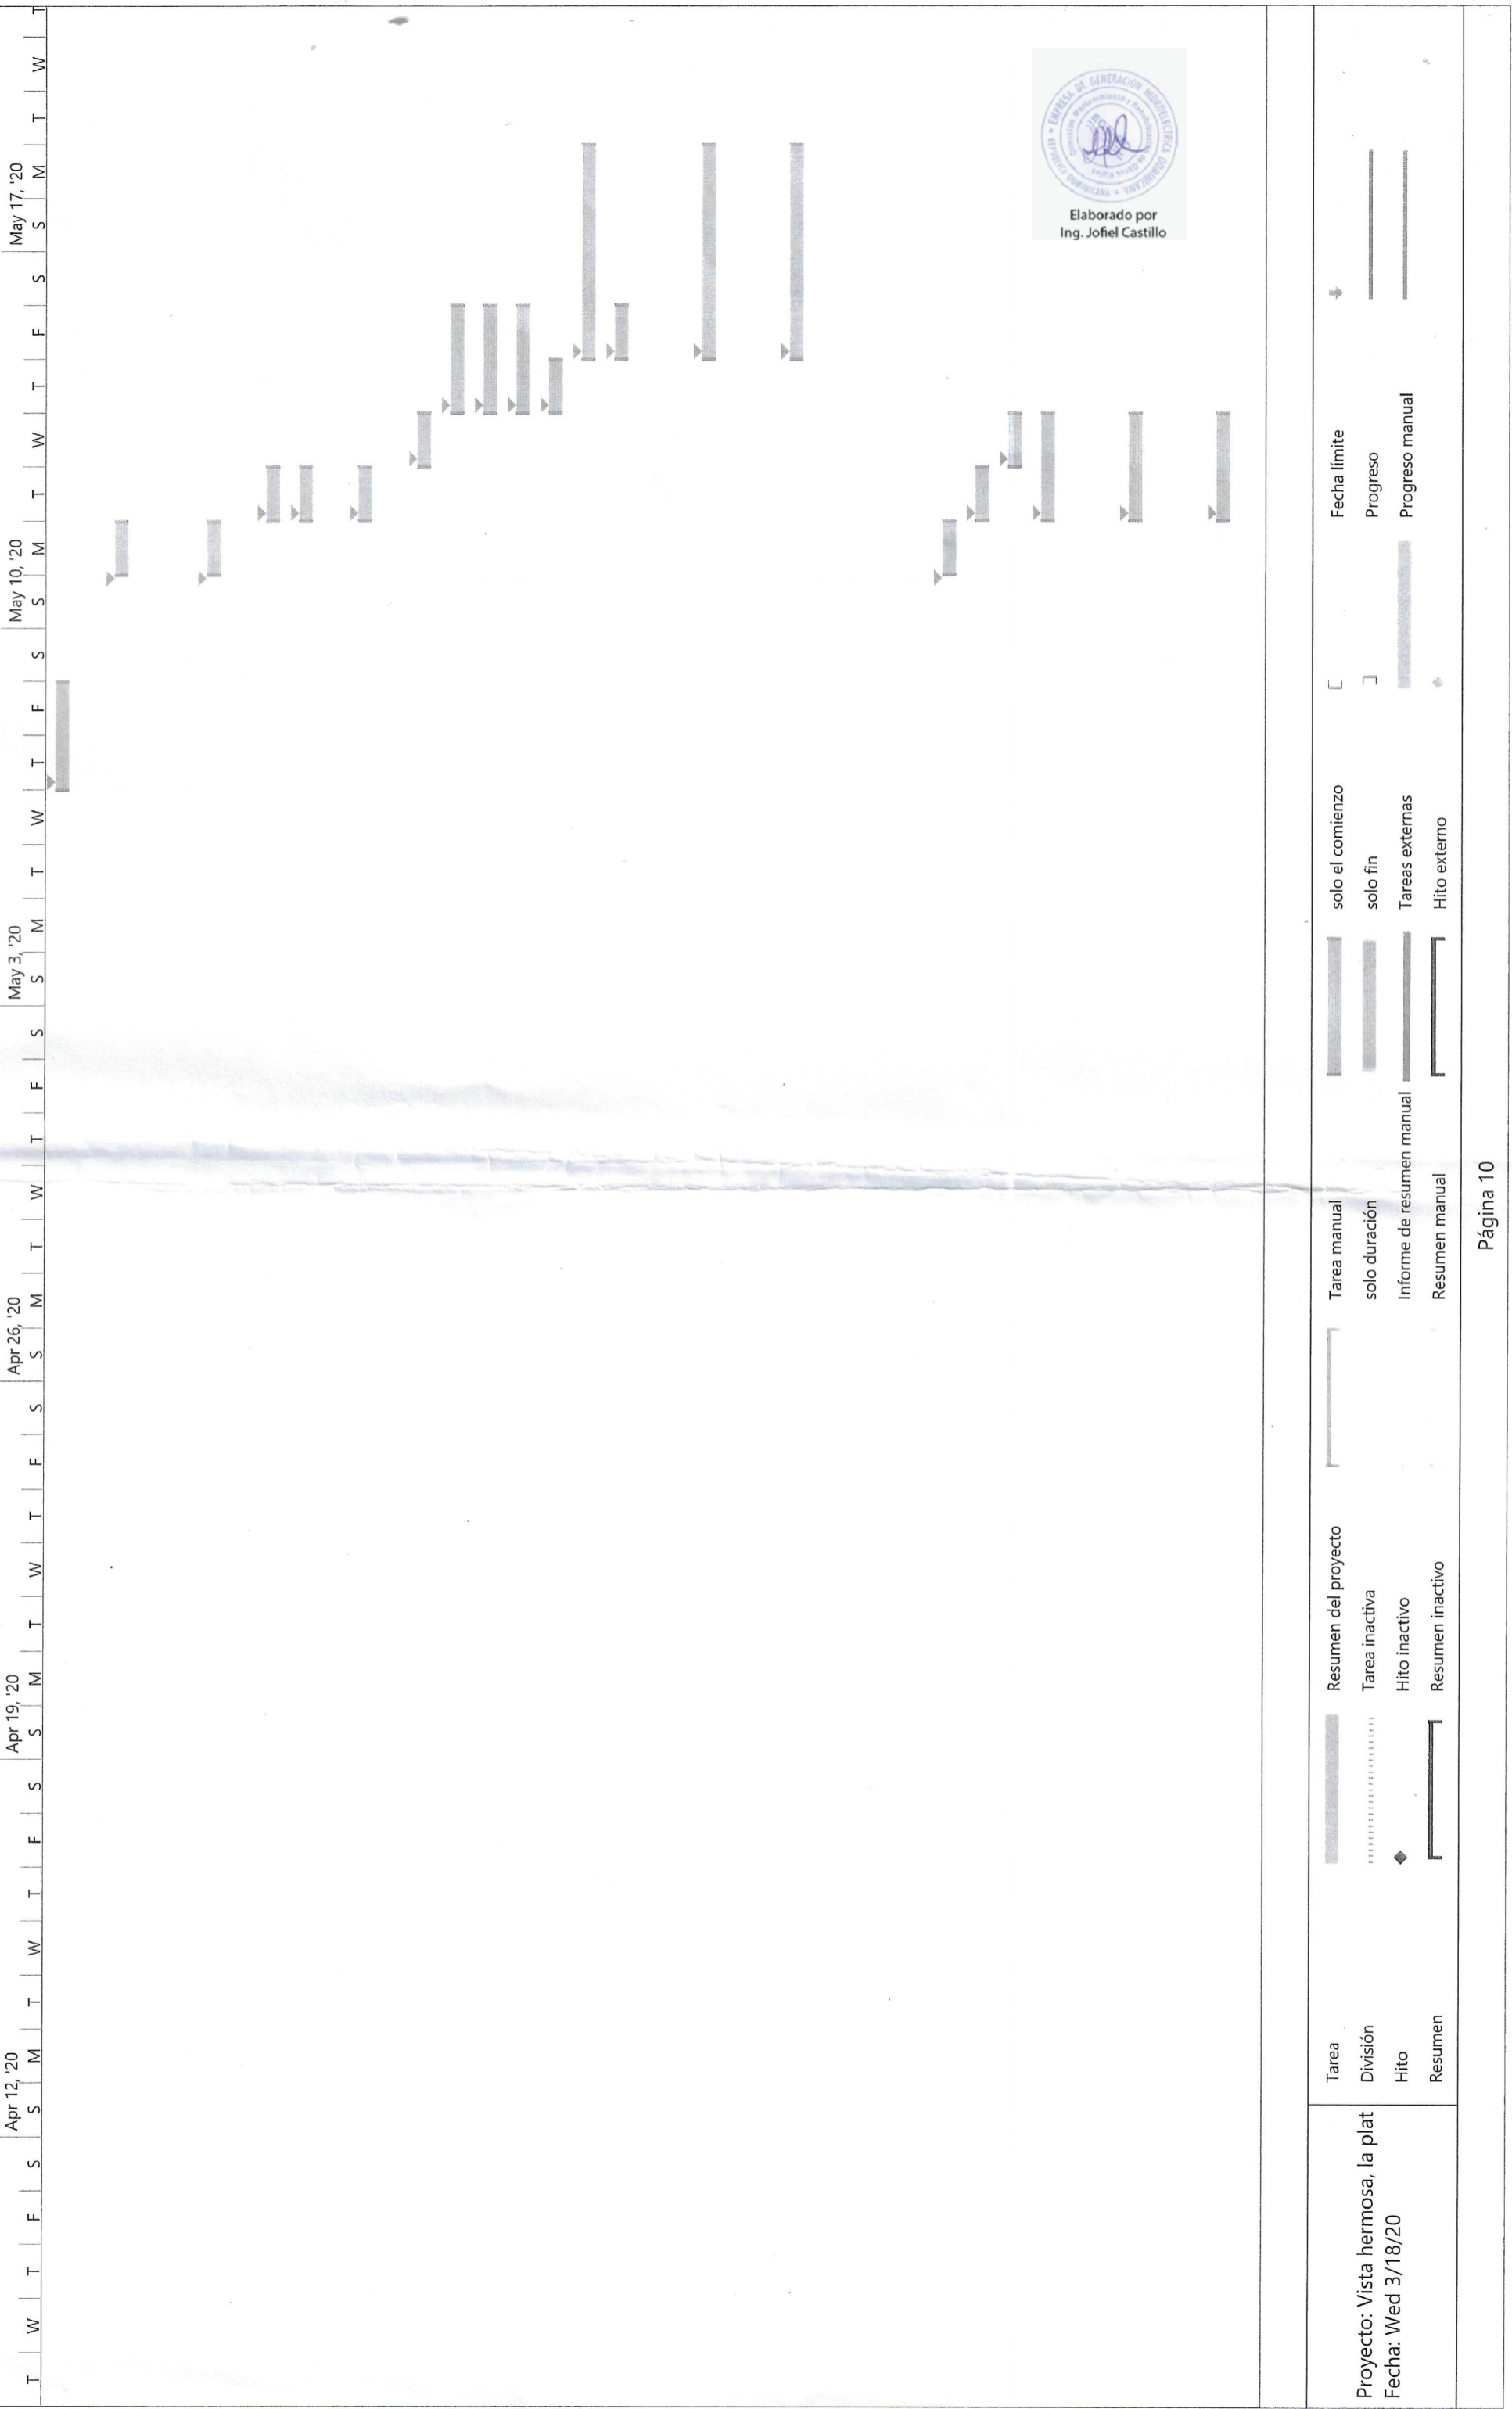

Elaborado por  
Ing. Jofiel Castillo


Proyecto: Vista hermosa, la plat  
Fecha: Wed 3/18/20

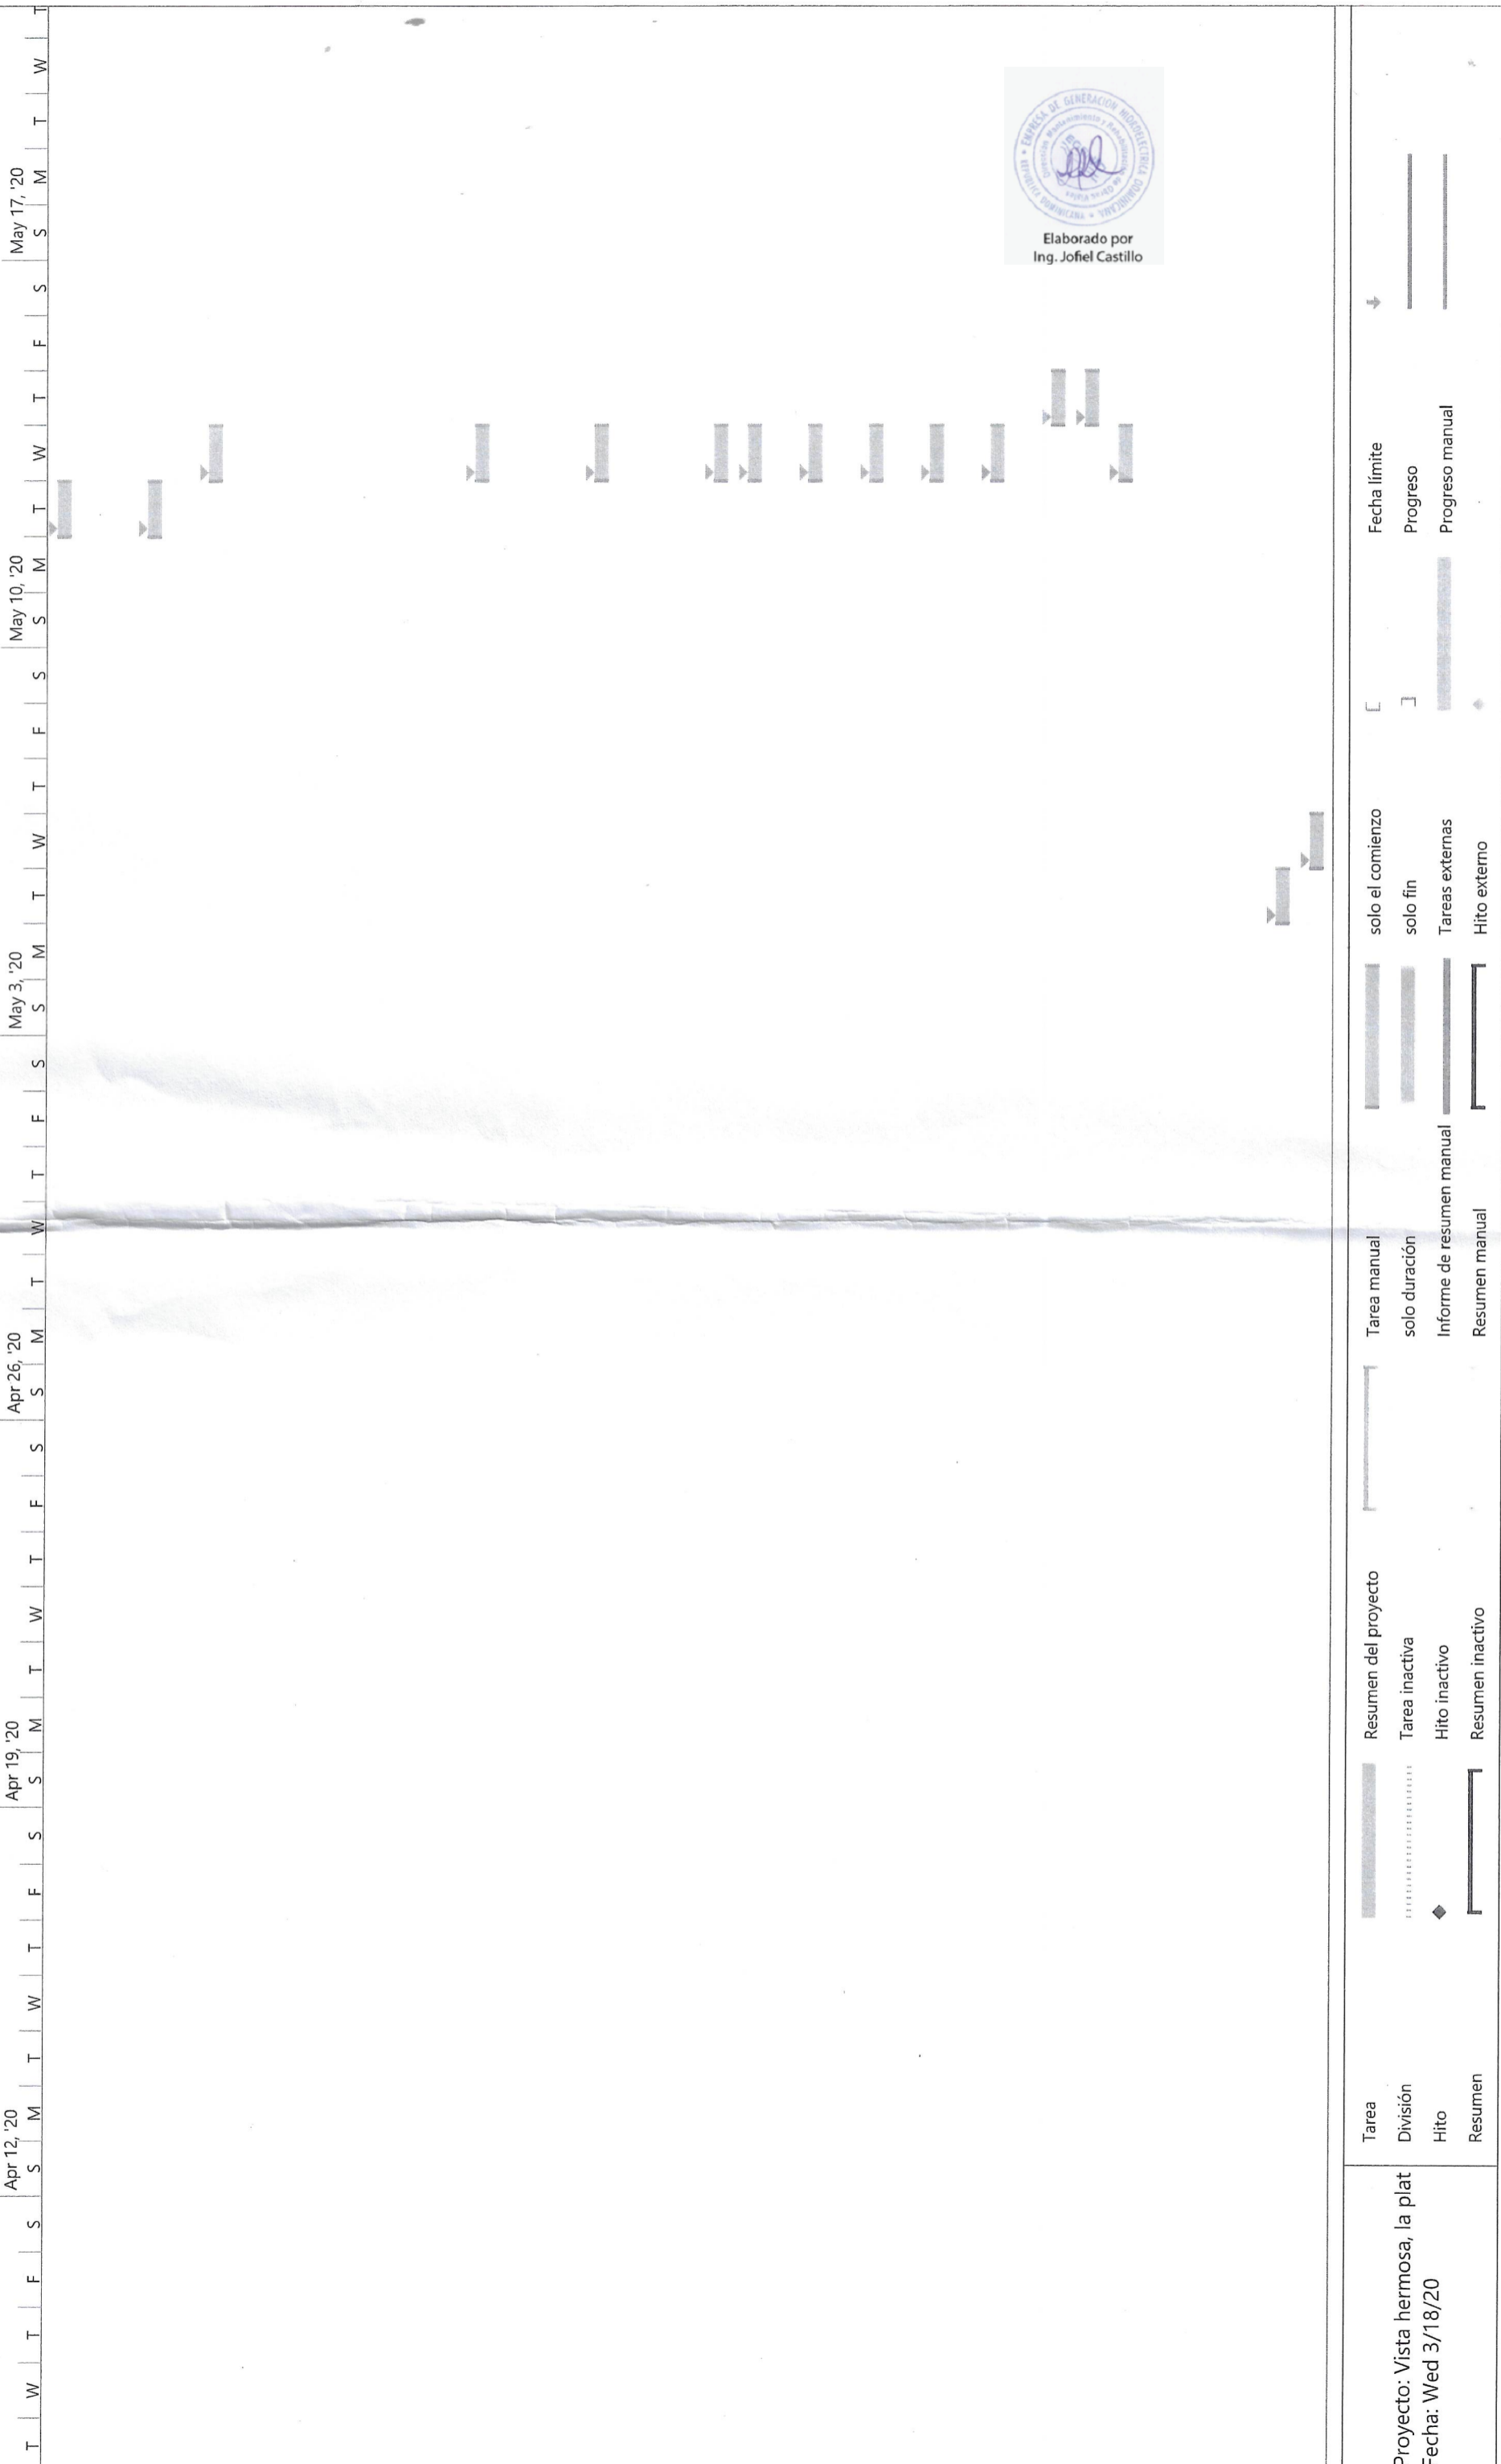

Elaborado por  
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: Vista hermosa, la plat  
Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

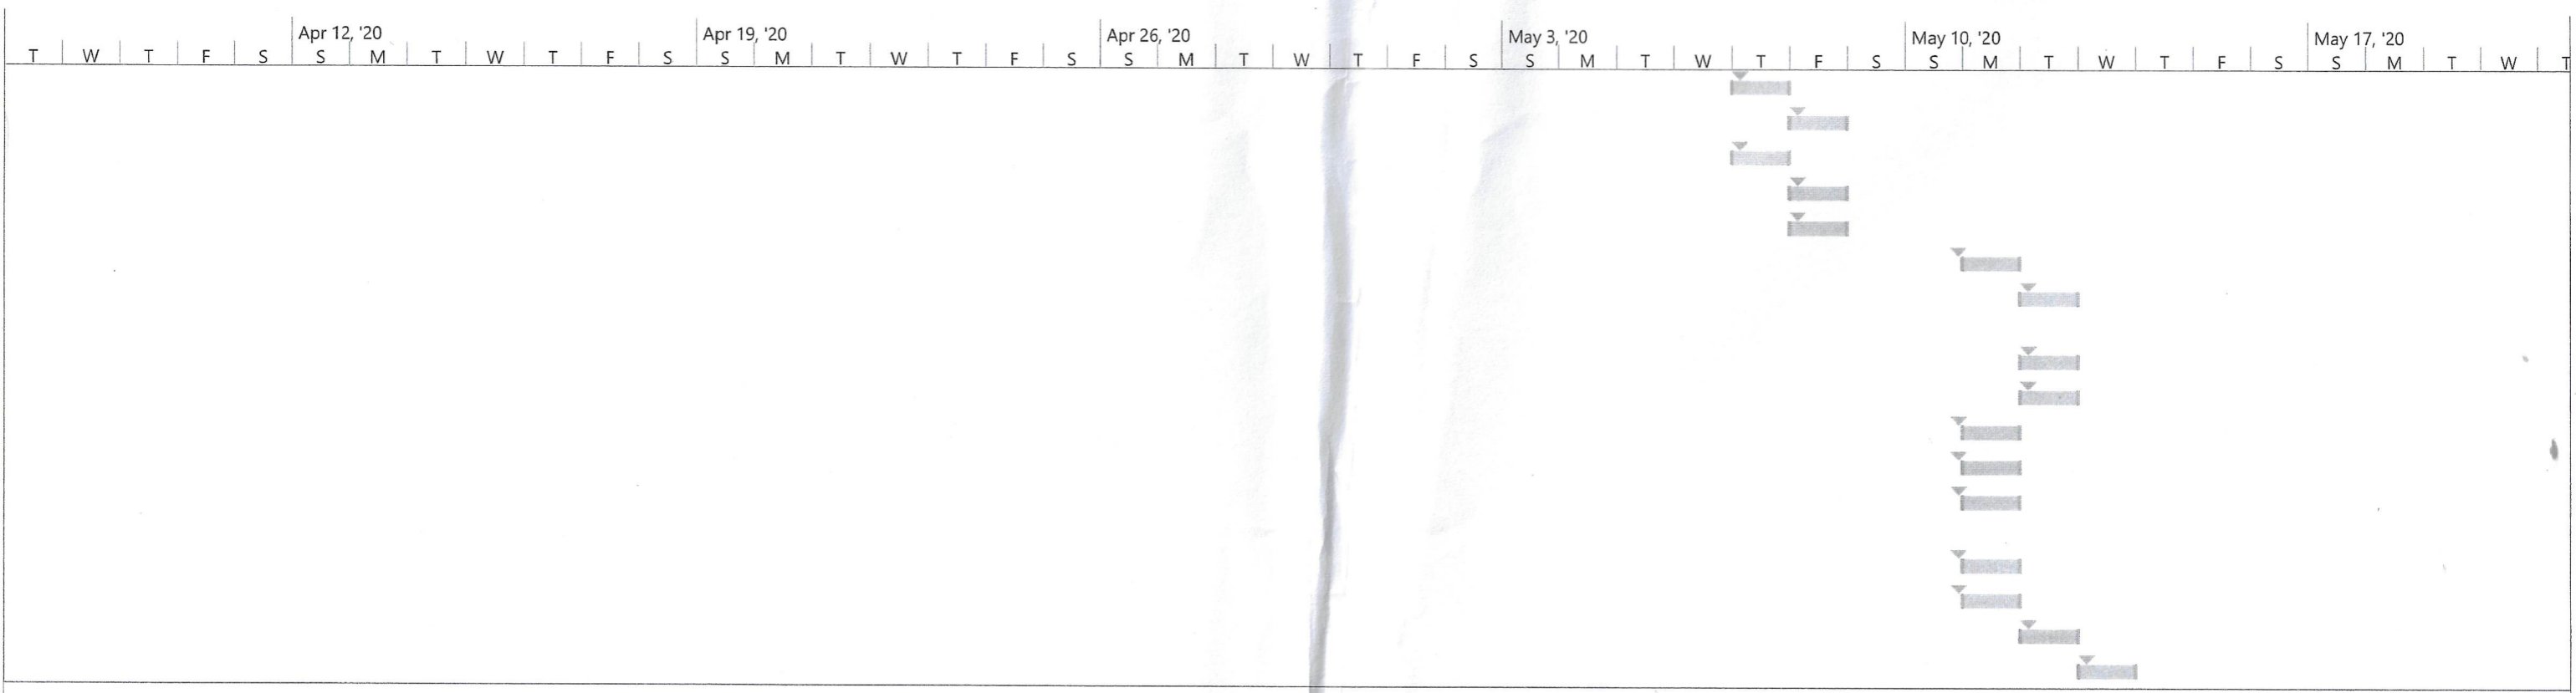

Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
