


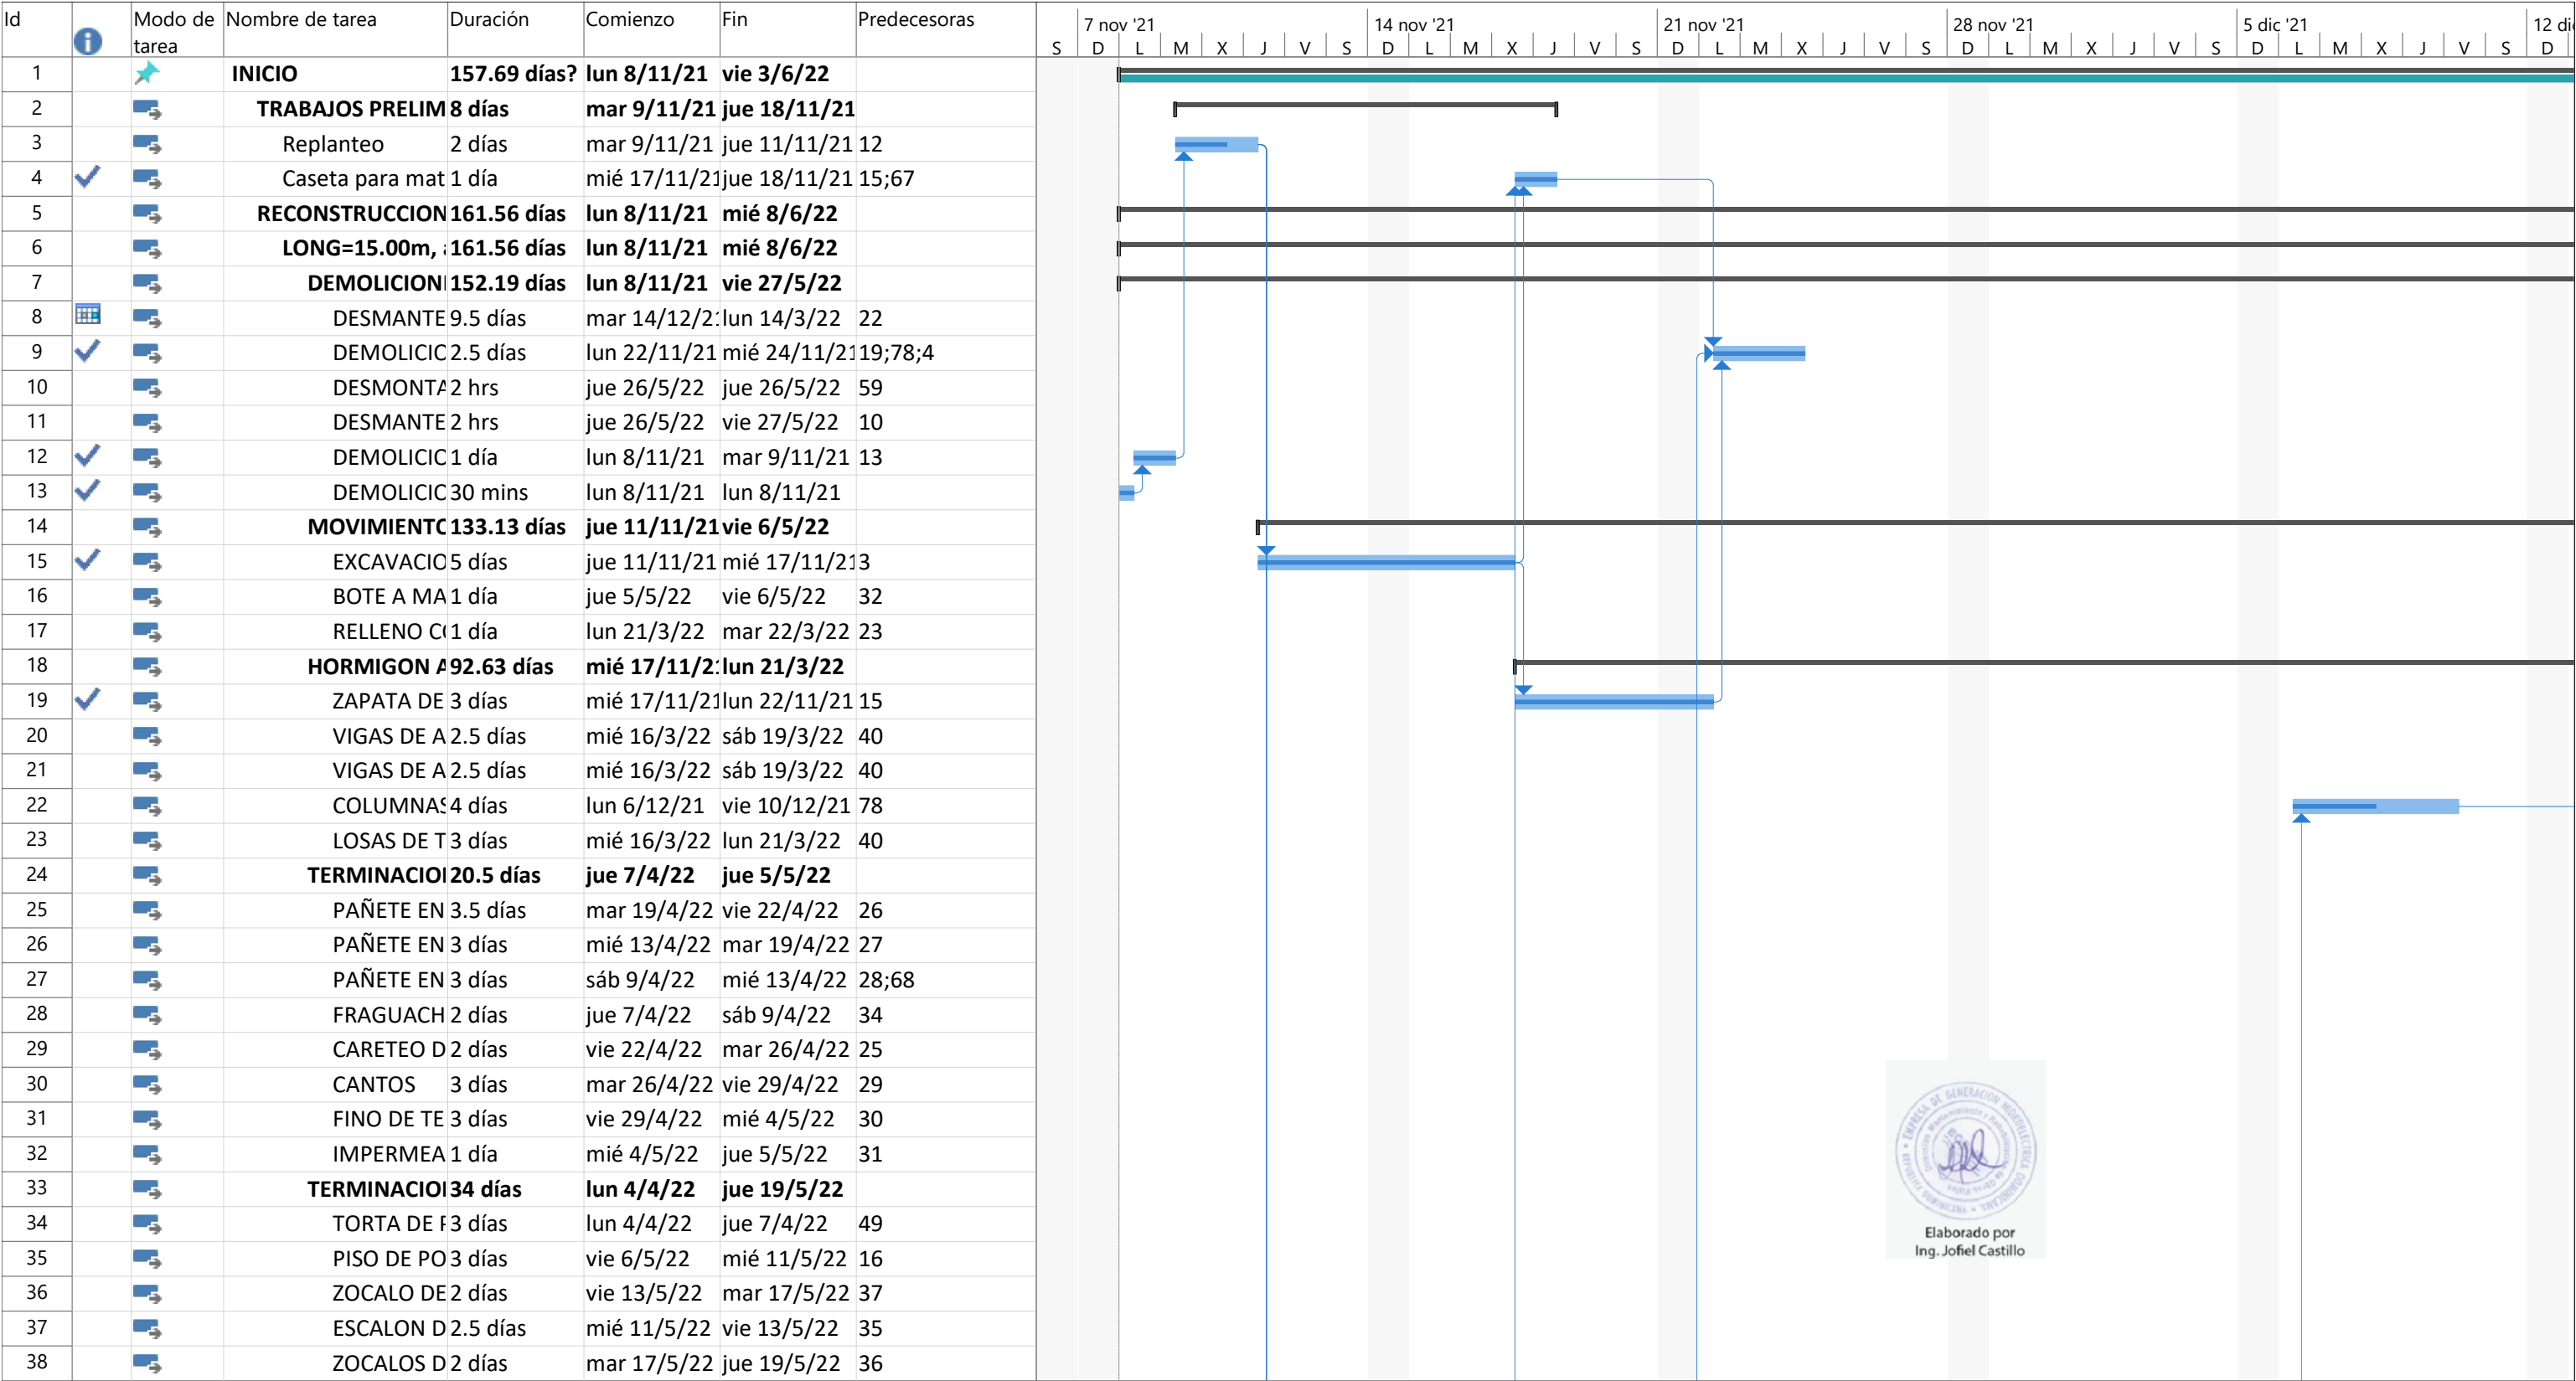

Proyecto: Programacion de trab
Fecha: jue 30/12/21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																								
								S	7 nov '21																						
77			MUROS DE	5 días	vie 19/11/21	vie 26/11/21	72;73																								
78			MUROS DE	7 días	vie 26/11/21	lun 6/12/21	77																								
79			TERMINACION	18 días	jue 7/4/22	mar 3/5/22																									
80			PAÑETE INT	5 días	lun 11/4/22	mar 19/4/22	82																								
81			PAÑETE EX	5 días	mar 19/4/22	lun 25/4/22	80																								
82			FRAGUACH	3 días	jue 7/4/22	lun 11/4/22	34																								
83			CARETEO D	3 días	lun 25/4/22	jue 28/4/22	81																								
84			CANTOS	2 días	jue 28/4/22	mar 3/5/22	83																								
85			TERMINACION	26 días	lun 4/4/22	lun 9/5/22																									
86			TORTA DE F	2 días	lun 4/4/22	mié 6/4/22	49																								
87			PISO DE CE	3 días	jue 21/4/22	mar 26/4/22	88																								
88			PISO DE PO	3 días	lun 18/4/22	jue 21/4/22	128																								
89			ZOCALO DE	2 días	jue 5/5/22	sáb 7/5/22	90																								
90			ESCALON D	1 día	mié 4/5/22	jue 5/5/22	87;99;100																								
91			ZOCALOS D	1 día	sáb 7/5/22	lun 9/5/22	89																								
92			REVESTIMIEN	5 días	lun 9/5/22	lun 16/5/22																									
93			CERAMICA	2.5 días	lun 9/5/22	jue 12/5/22	91																								
94			CERAMICA	1.5 días	jue 12/5/22	vie 13/5/22	93																								
95			BORDILLOS	5 hrs	vie 13/5/22	sáb 14/5/22	94																								
96			TOPE DE M	3 hrs	sáb 14/5/22	lun 16/5/22	95																								
97			INSTALACION	10.5 días	mar 19/4/22	mié 4/5/22																									
98			SALIDA CEN	1.5 días	mar 19/4/22	jue 21/4/22	129																								
99			SALIDAS IN	1 día	mar 3/5/22	mié 4/5/22	84;98																								
100			REGISTRO E	1 día	mar 3/5/22	mié 4/5/22	84;98																								
101			INSTALACION	161.63 días	jue 11/11/21	lun 13/6/22																									
102			INODOROS	1.5 días	vie 10/6/22	lun 13/6/22	103																								
103			LAVAMANC	1 día	jue 9/6/22	vie 10/6/22	104																								
104			FREGADERO	1 día	mié 8/6/22	jue 9/6/22	105																								
105			DUCHA	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	106																								
106			DESAGUE	1 día	lun 6/6/22	mar 7/6/22	107																								
107			ACCESORIO	1 día	vie 3/6/22	lun 6/6/22	123																								
108			BAJANTES F	1 día	lun 4/4/22	mar 5/4/22	118																								
109			BAJANTES I	1 día	mar 5/4/22	mié 6/4/22	108																								
110			BAJANTES I	1 día	mié 6/4/22	jue 7/4/22	109																								
111			LLAVE DE P	5 hrs	mar 29/3/22	mar 29/3/22	115																								
112			TRAMPA DI	2 días	jue 24/3/22	lun 28/3/22	114																								
113			CAMARAS I	2 días	jue 24/3/22	lun 28/3/22	114																								
114			EXCAVACION	3.5 días	lun 21/3/22	jue 24/3/22	119;121;23;74																								

Proyecto: Programacion de trab
Fecha: jue 30/12/21

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso



Progreso manual

↓


Página 3

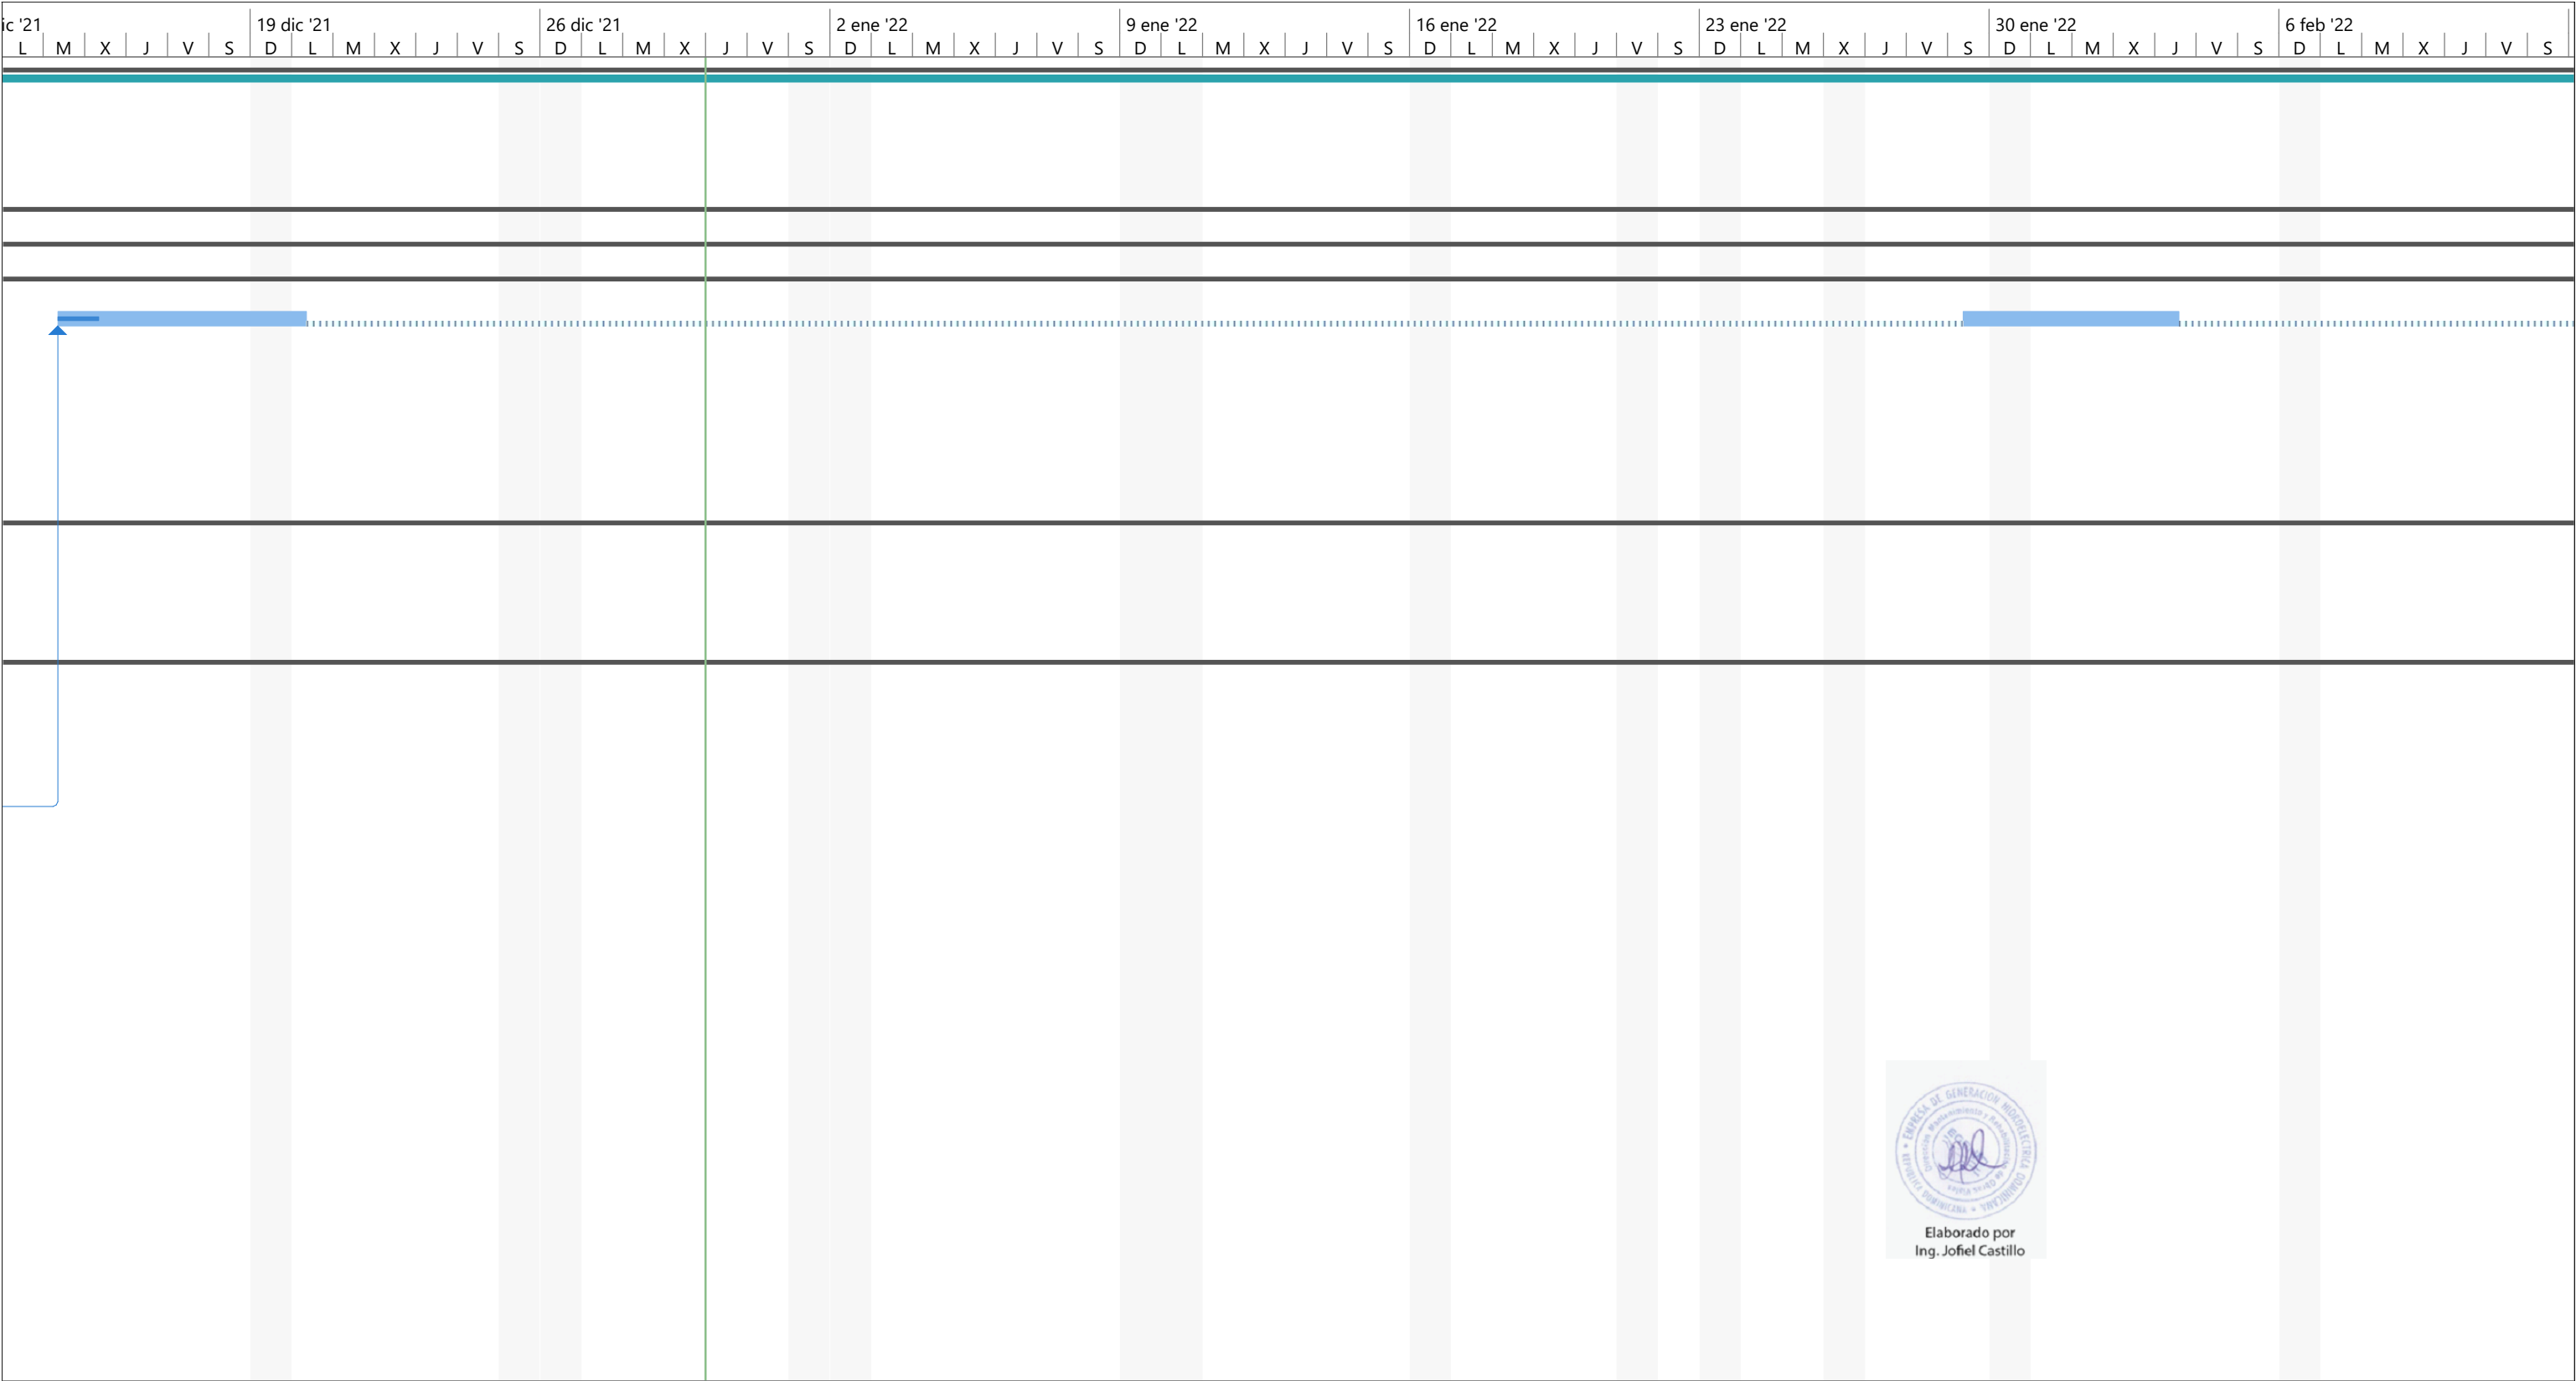

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

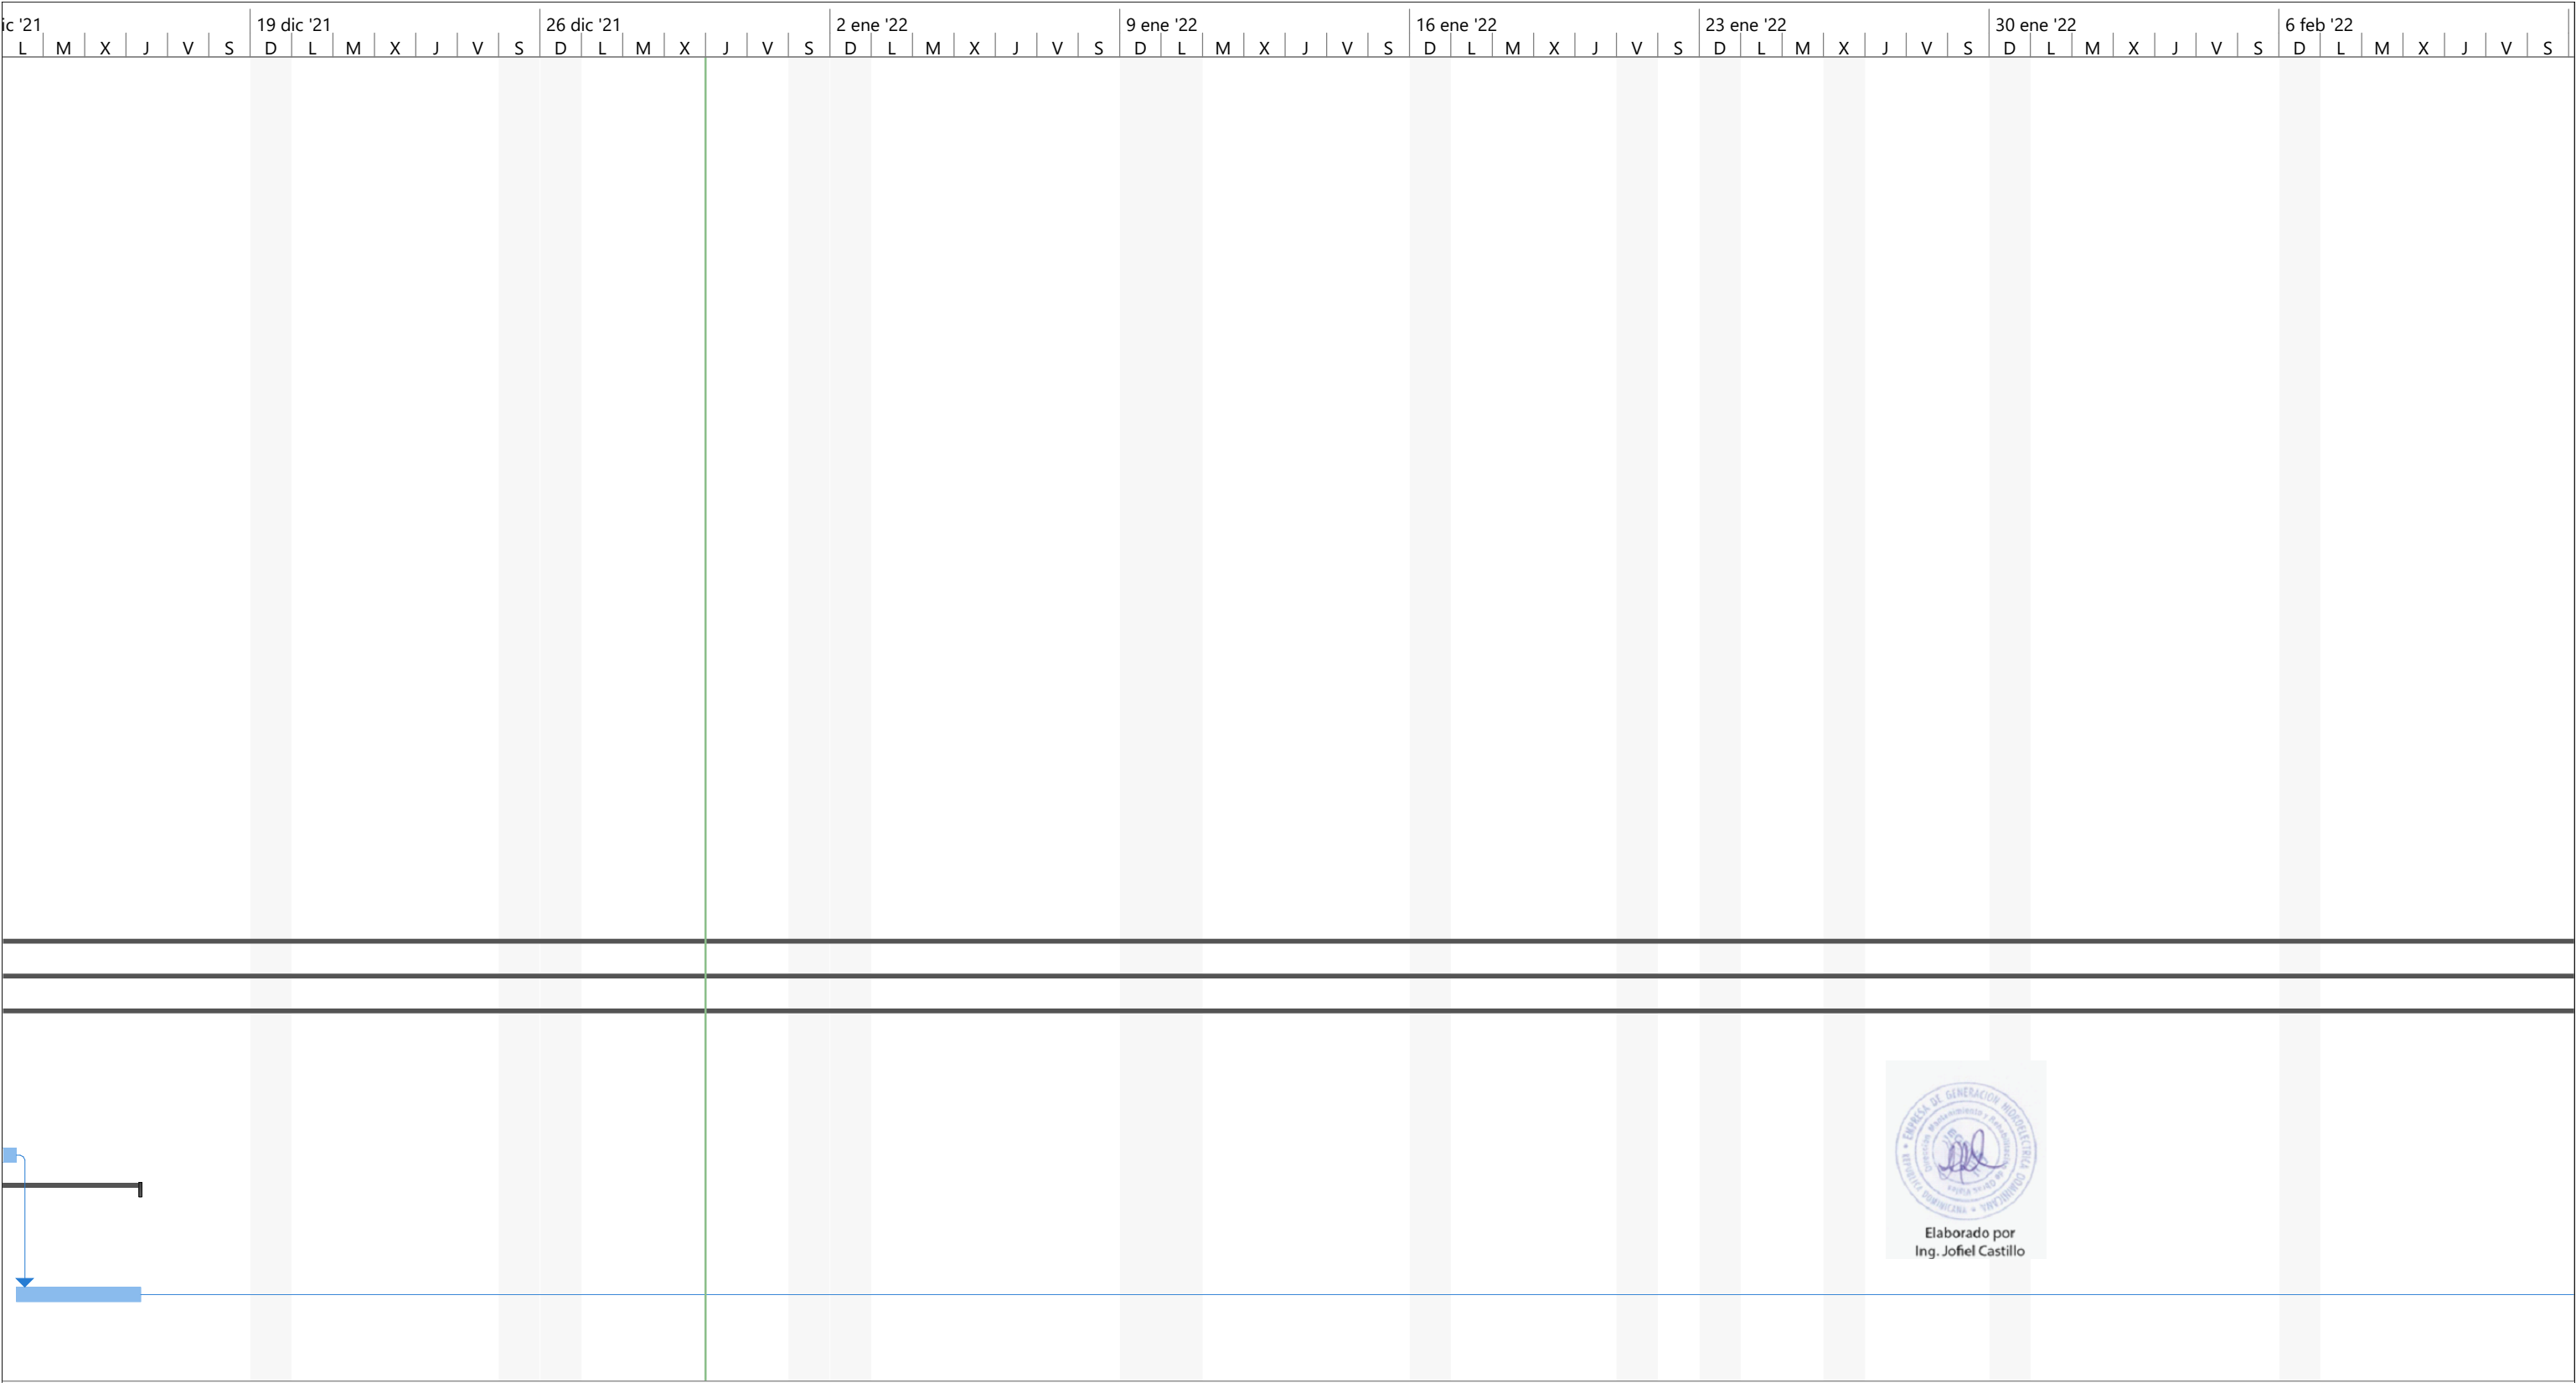

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

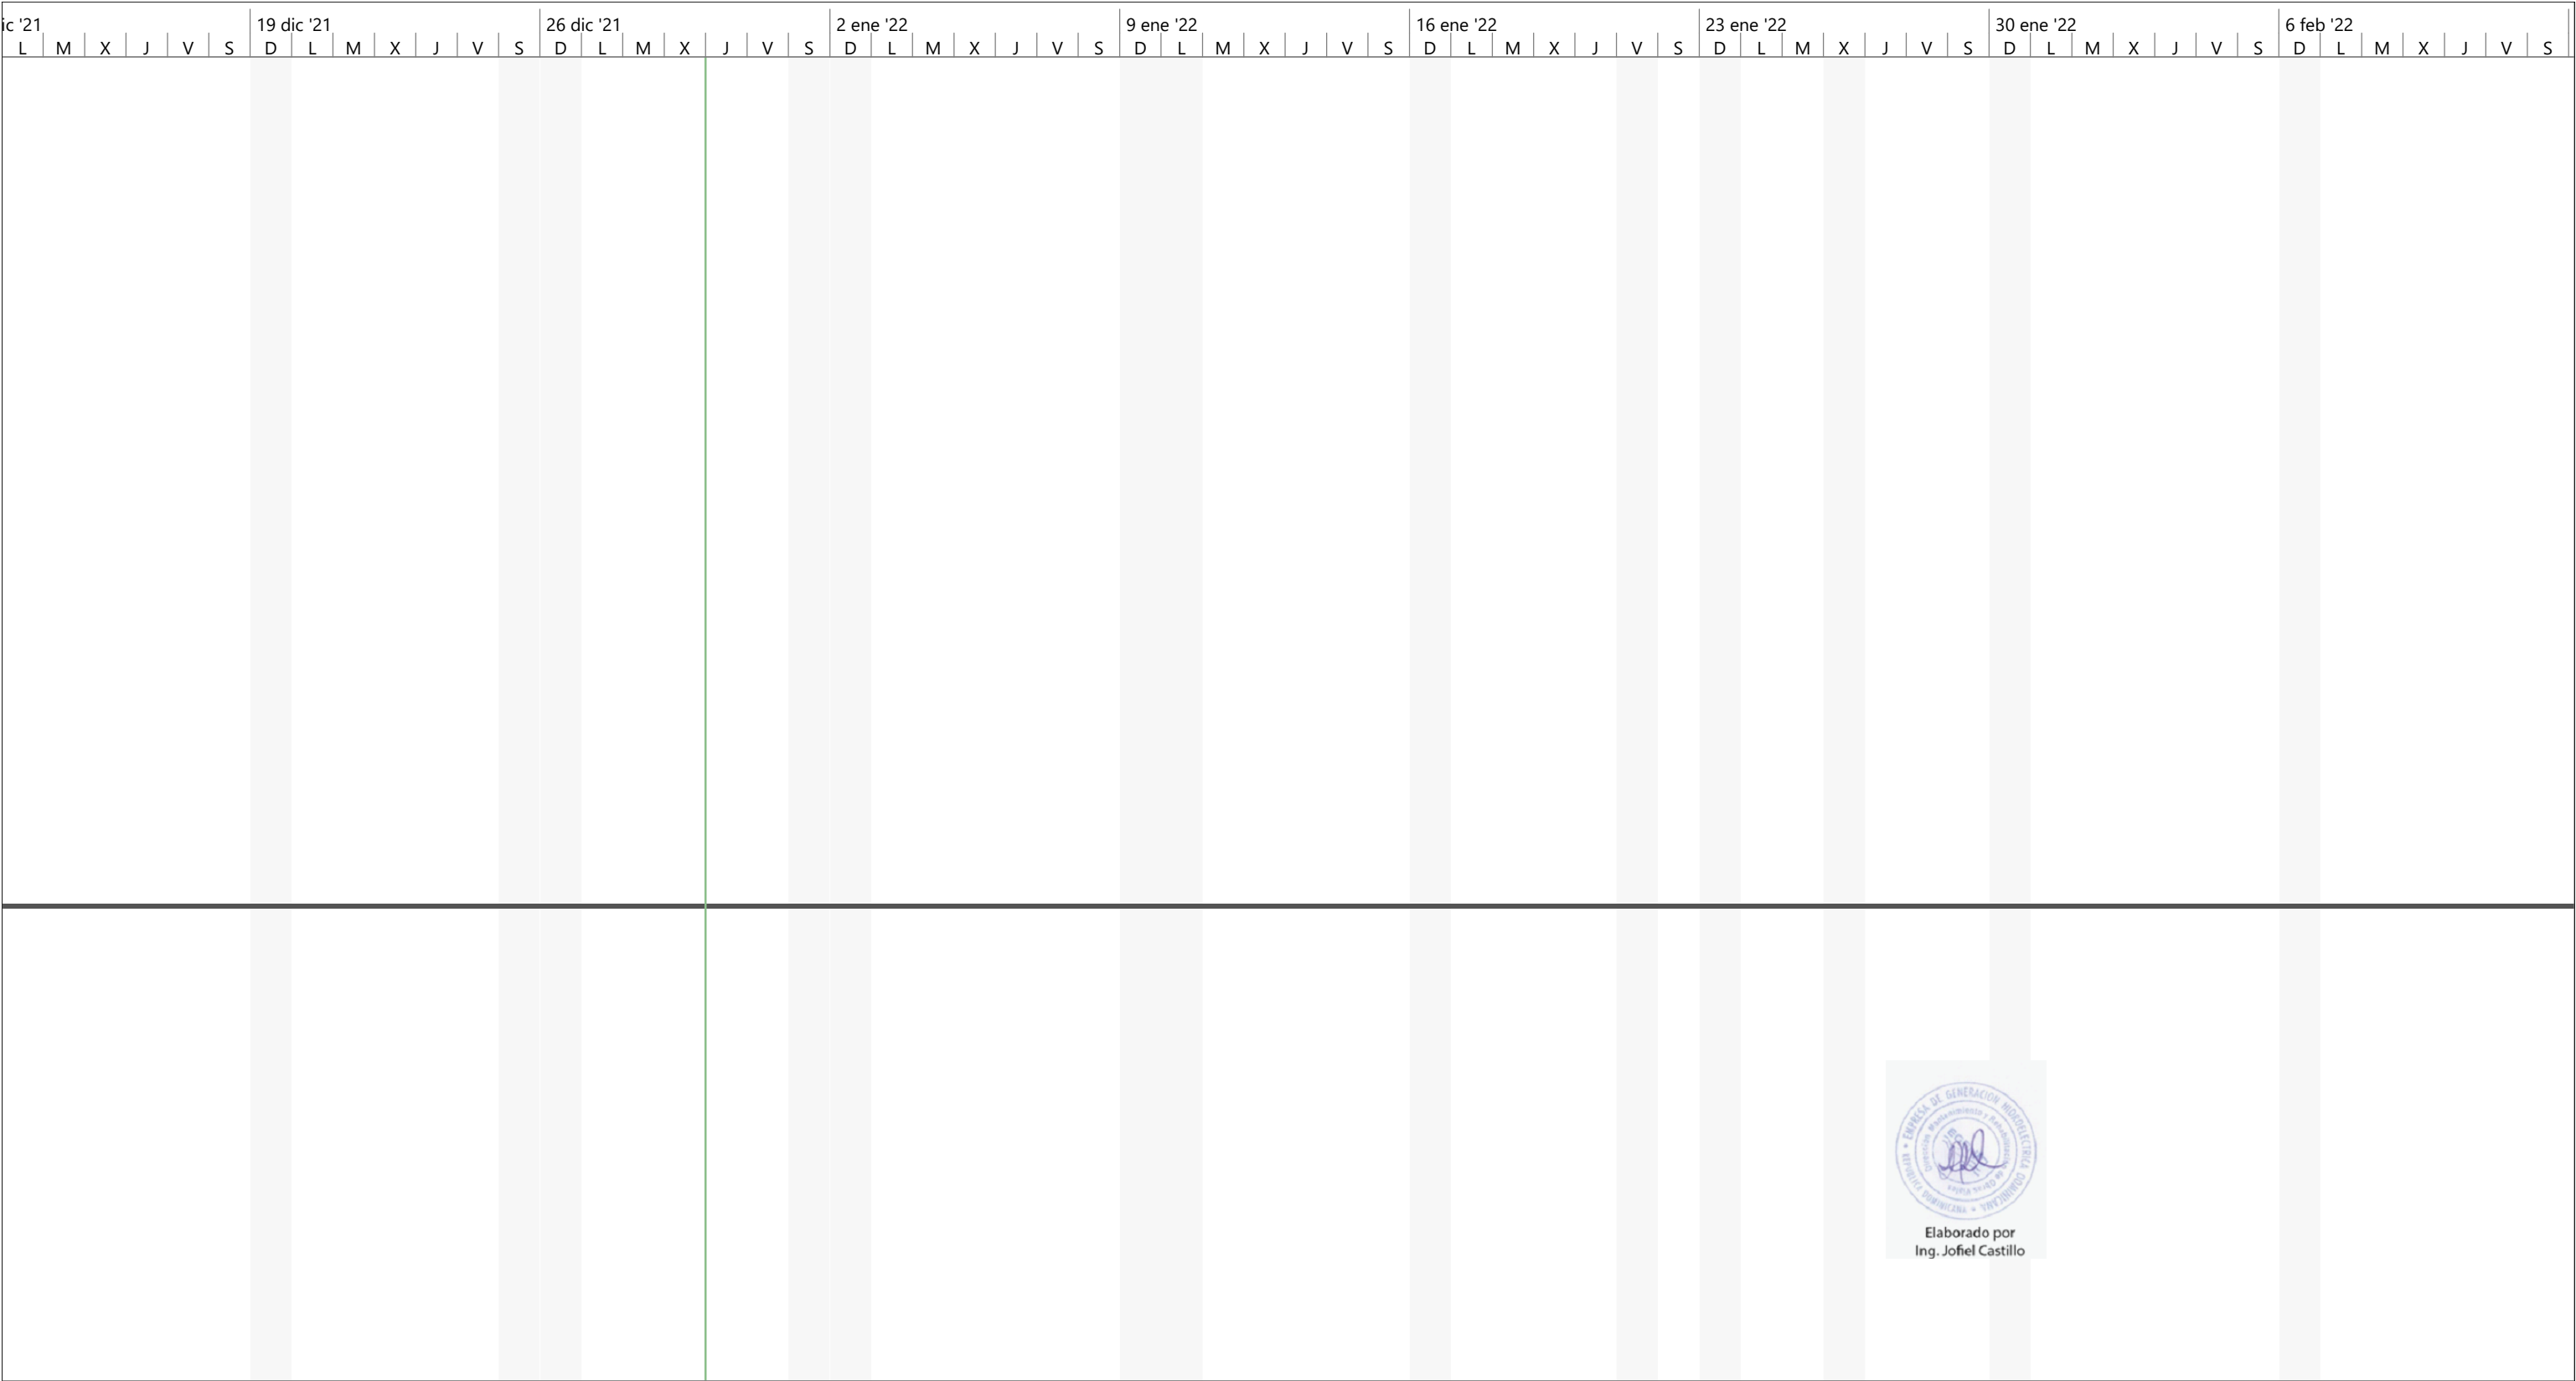

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

ic '21

L

M

X

J

V

S

19 dic '21

D

L

M

X

J

V

S

26 dic '21

D

L

M

X

J

V

S

2 ene '22

D

L

M

X

J

V

S

9 ene '22

D

L

M

X

J

V

S

16 ene '22

D

L

M

X

J

V

S

23 ene '22

D

L

M

X

J

V

S

30 ene '22

D

L

M

X

J

V

S

6 feb '22

D

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Programacion de trab

Fecha: jue 30/12/21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual


Elaborado por

Ing. Jofiel Castillo


Página 8

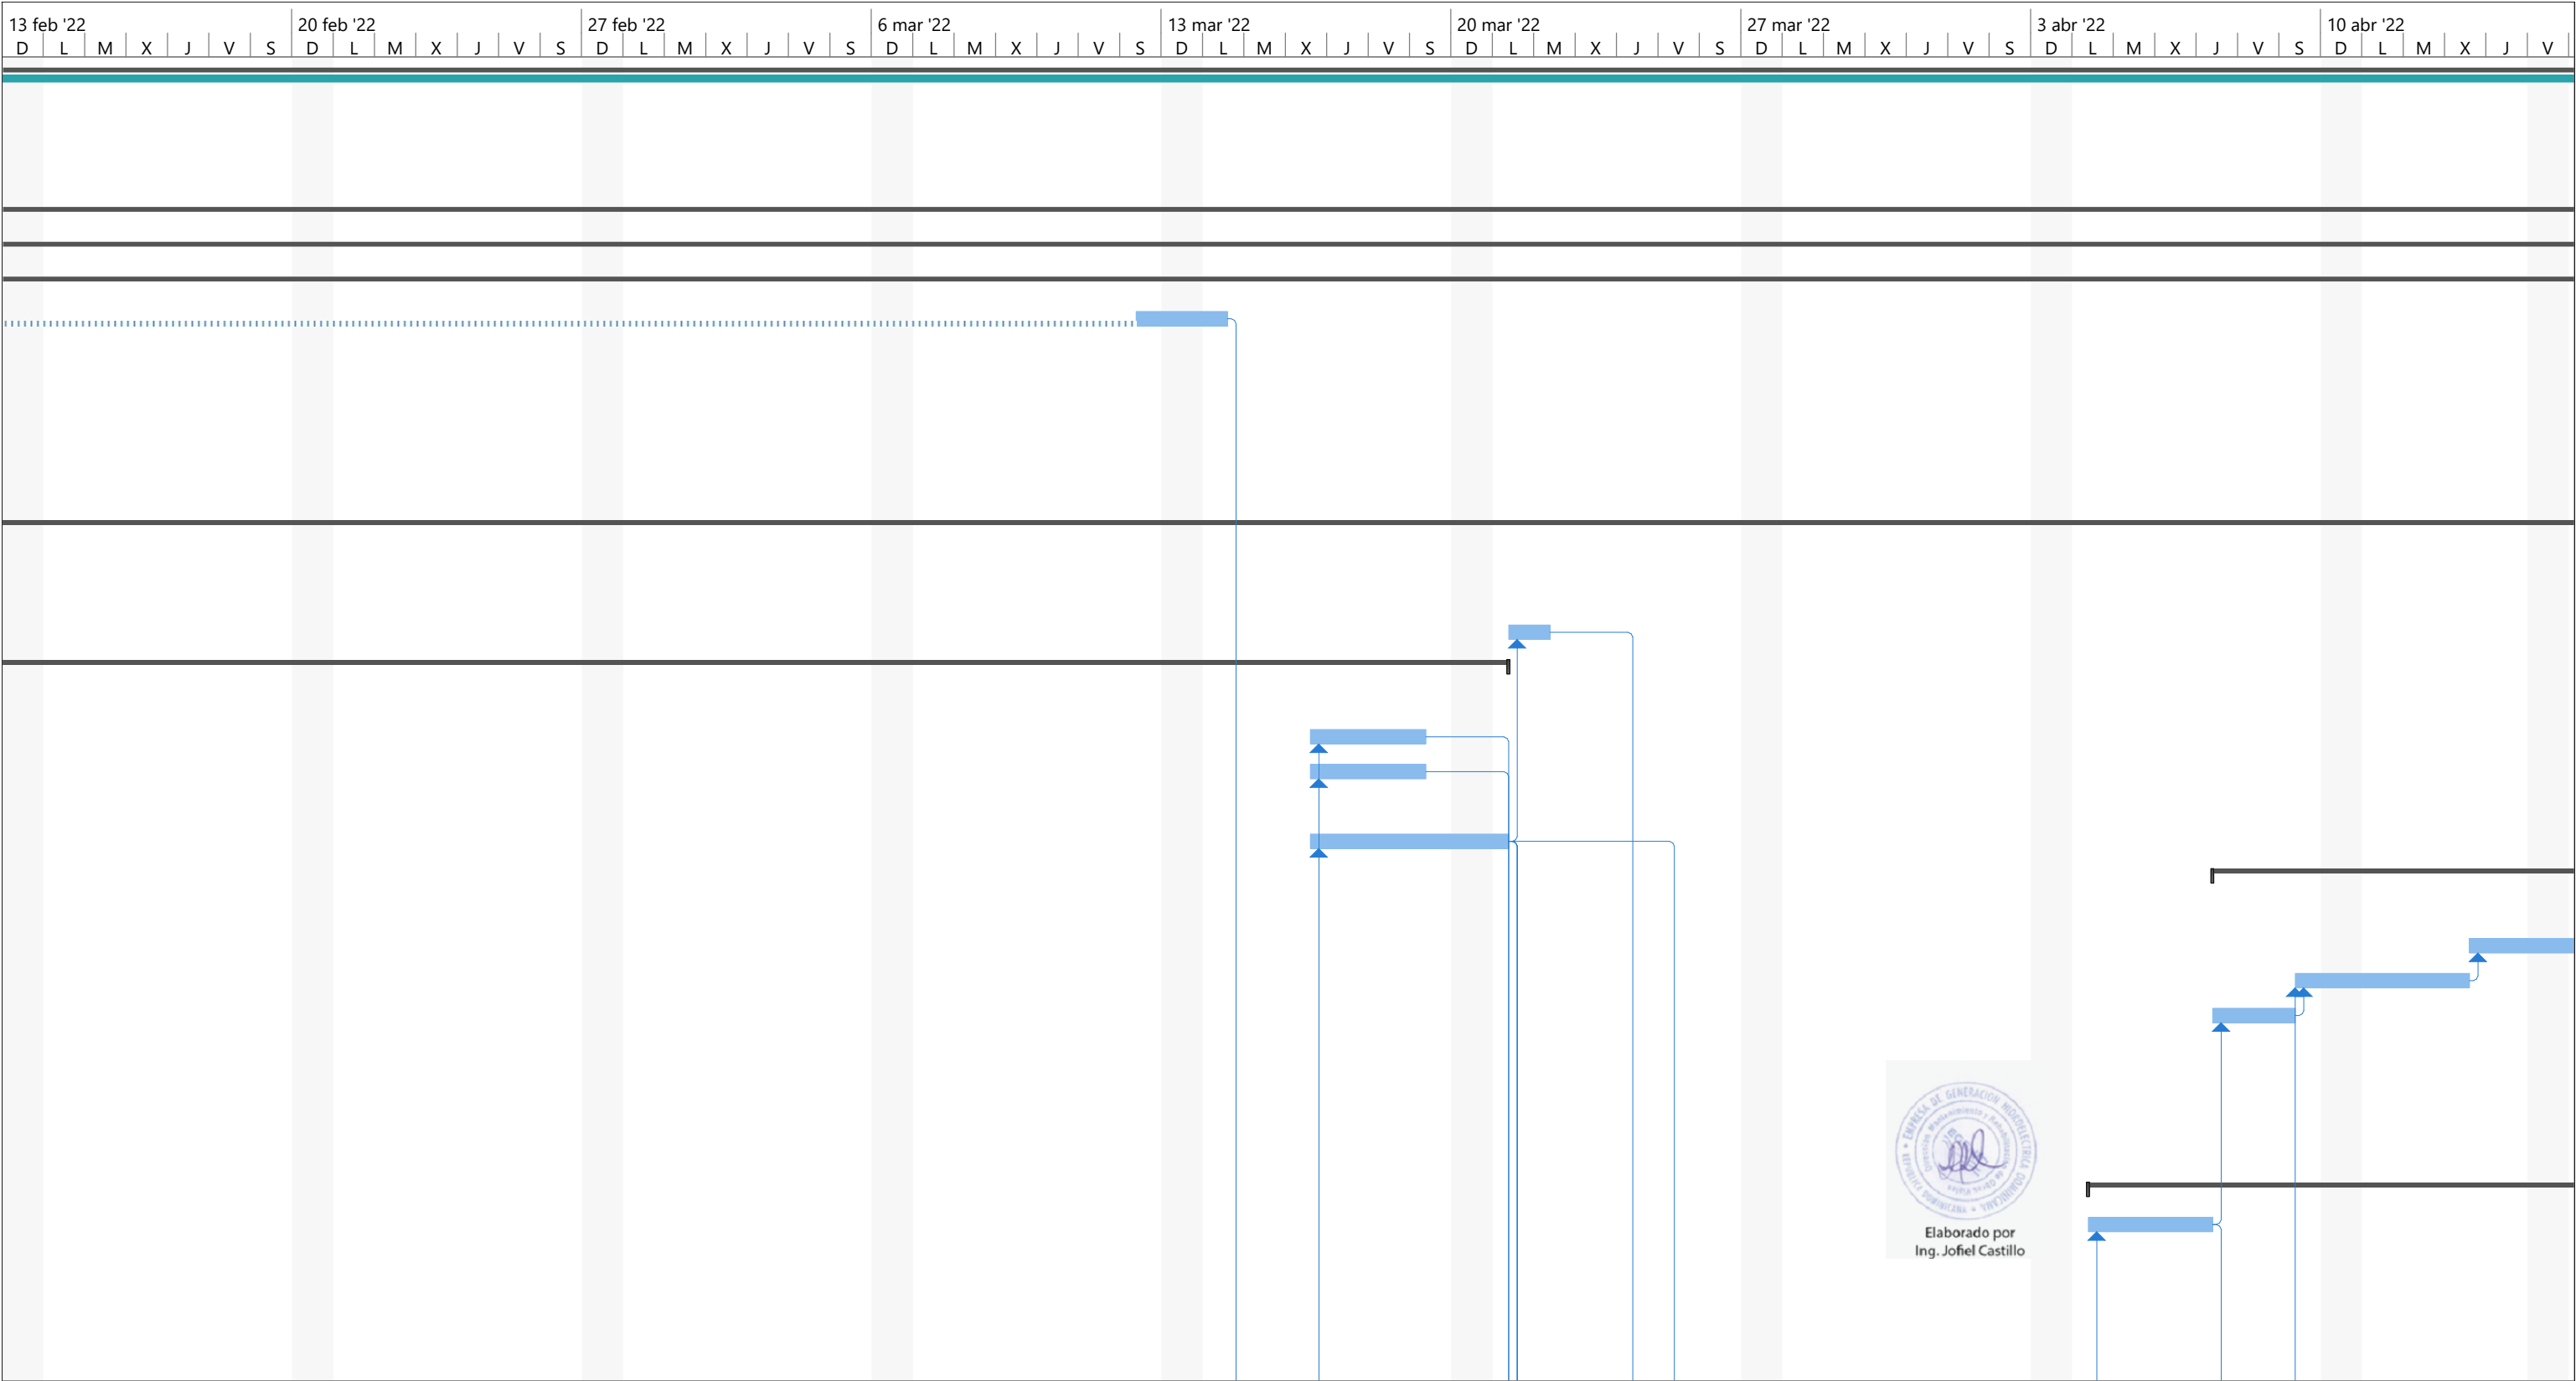


Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

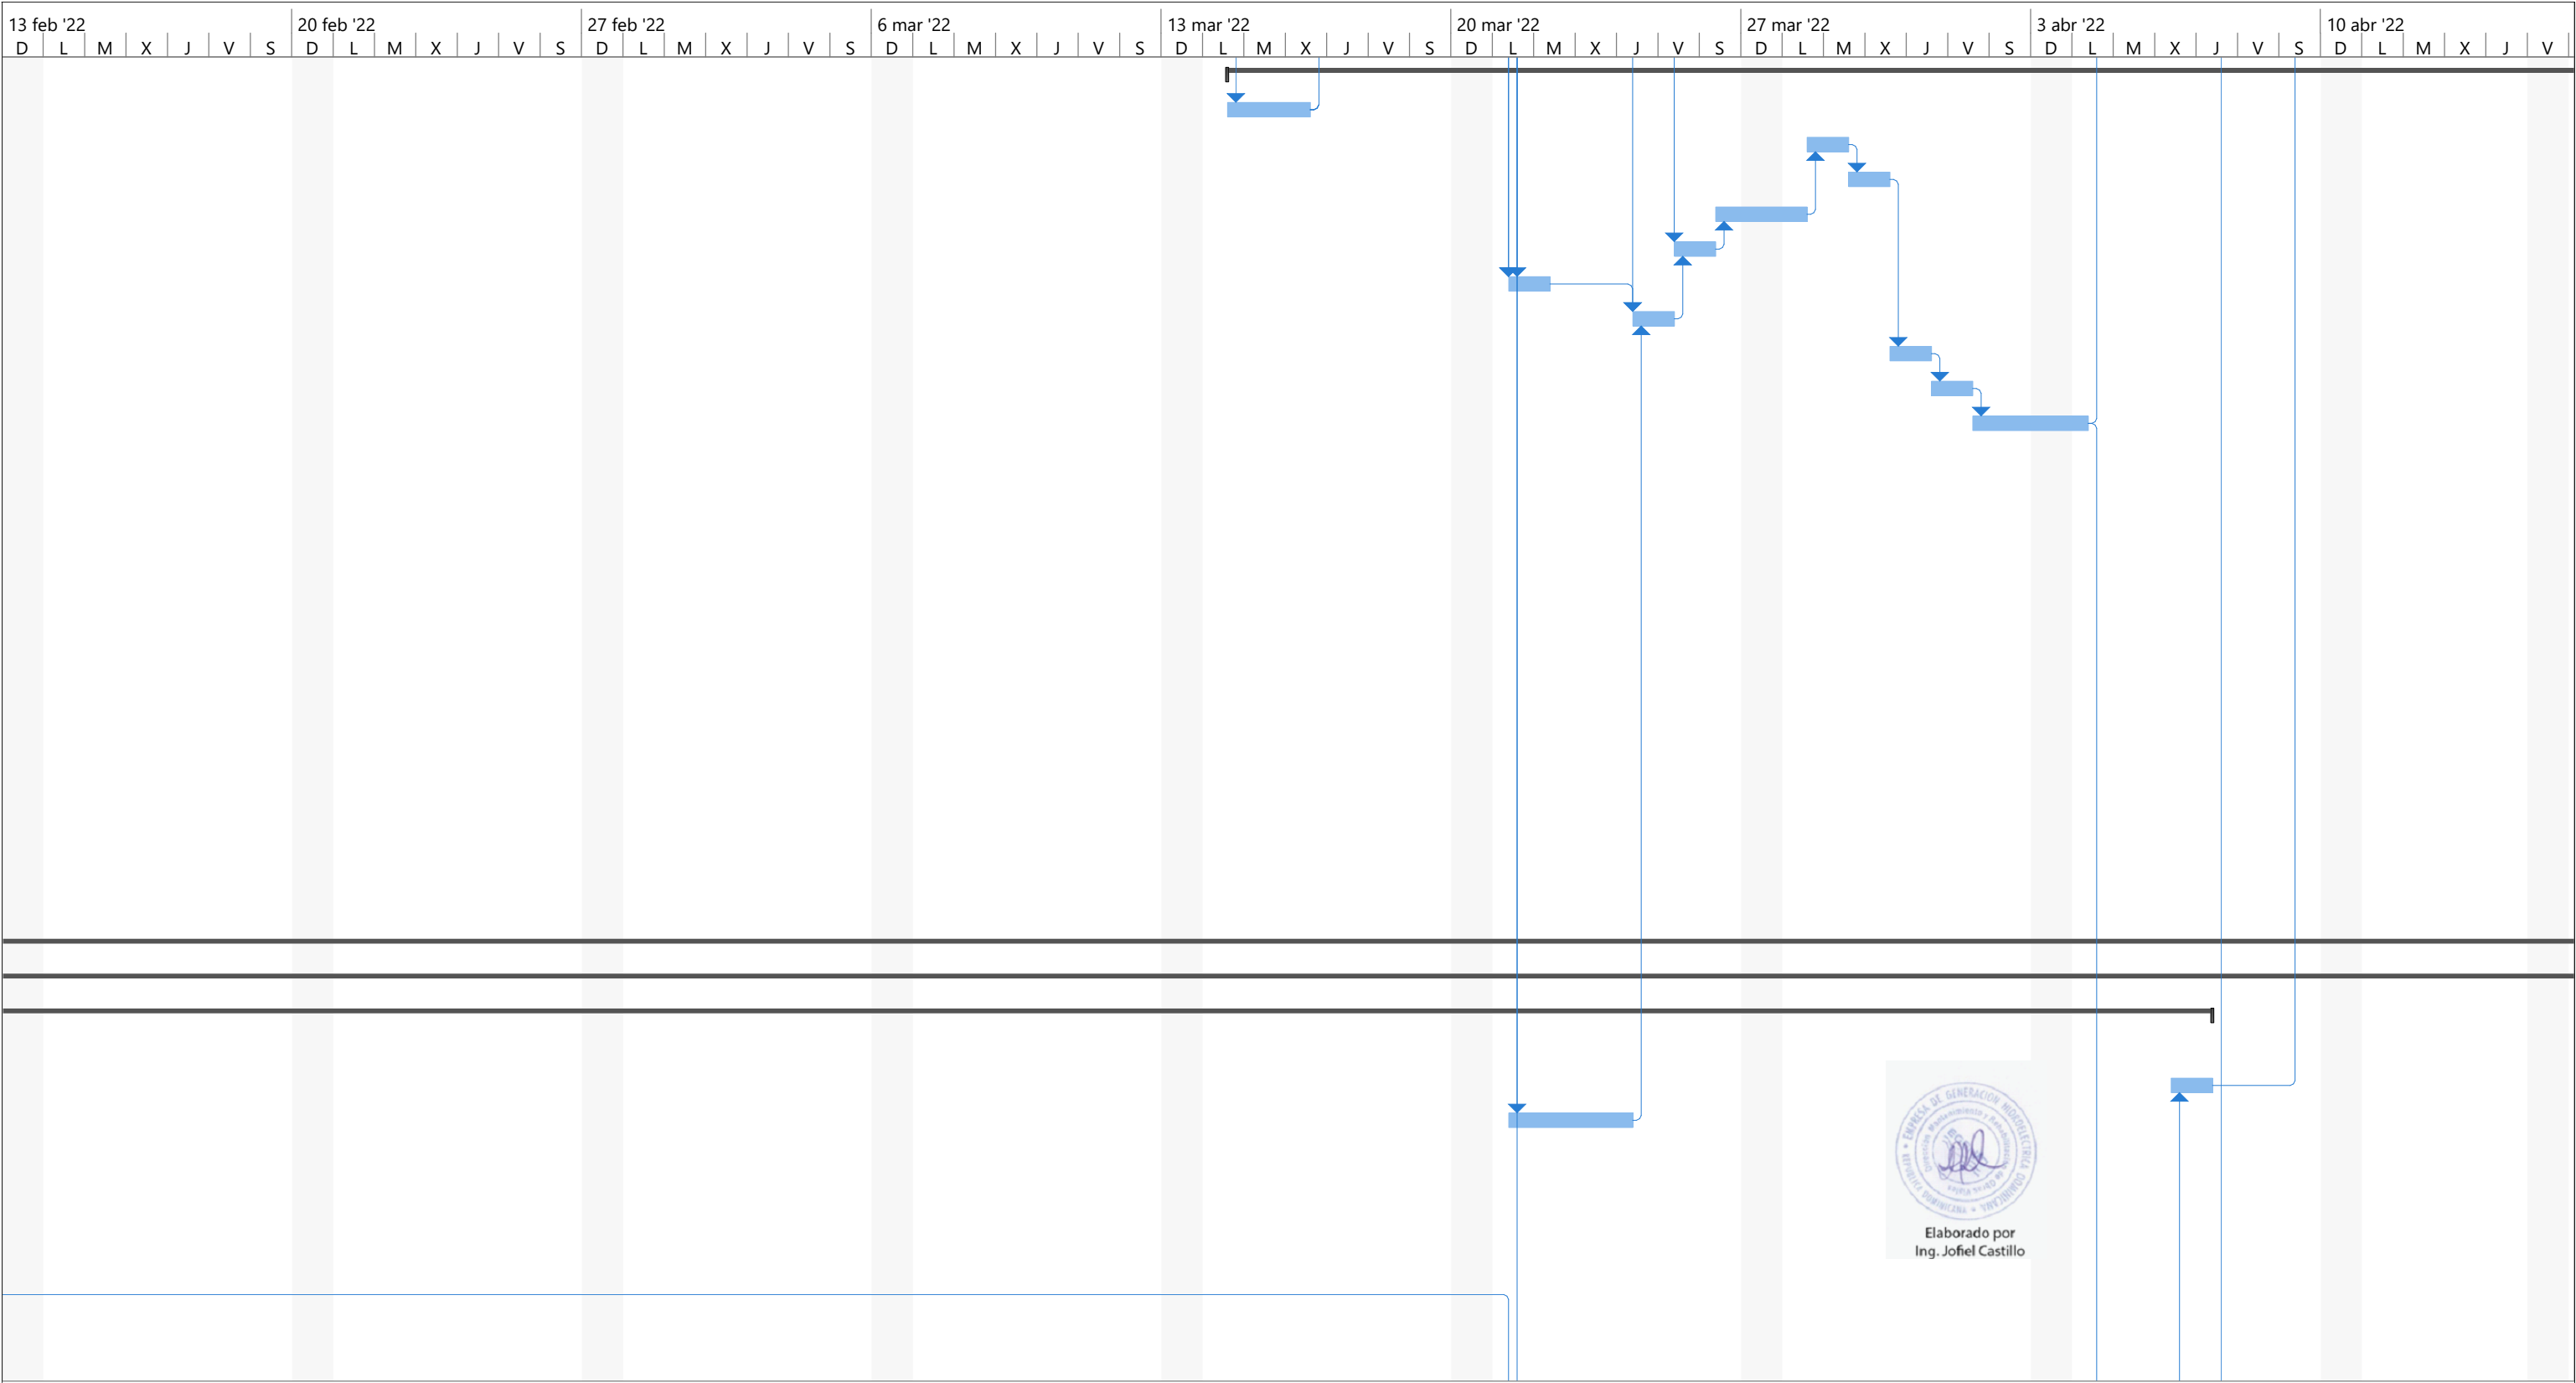

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

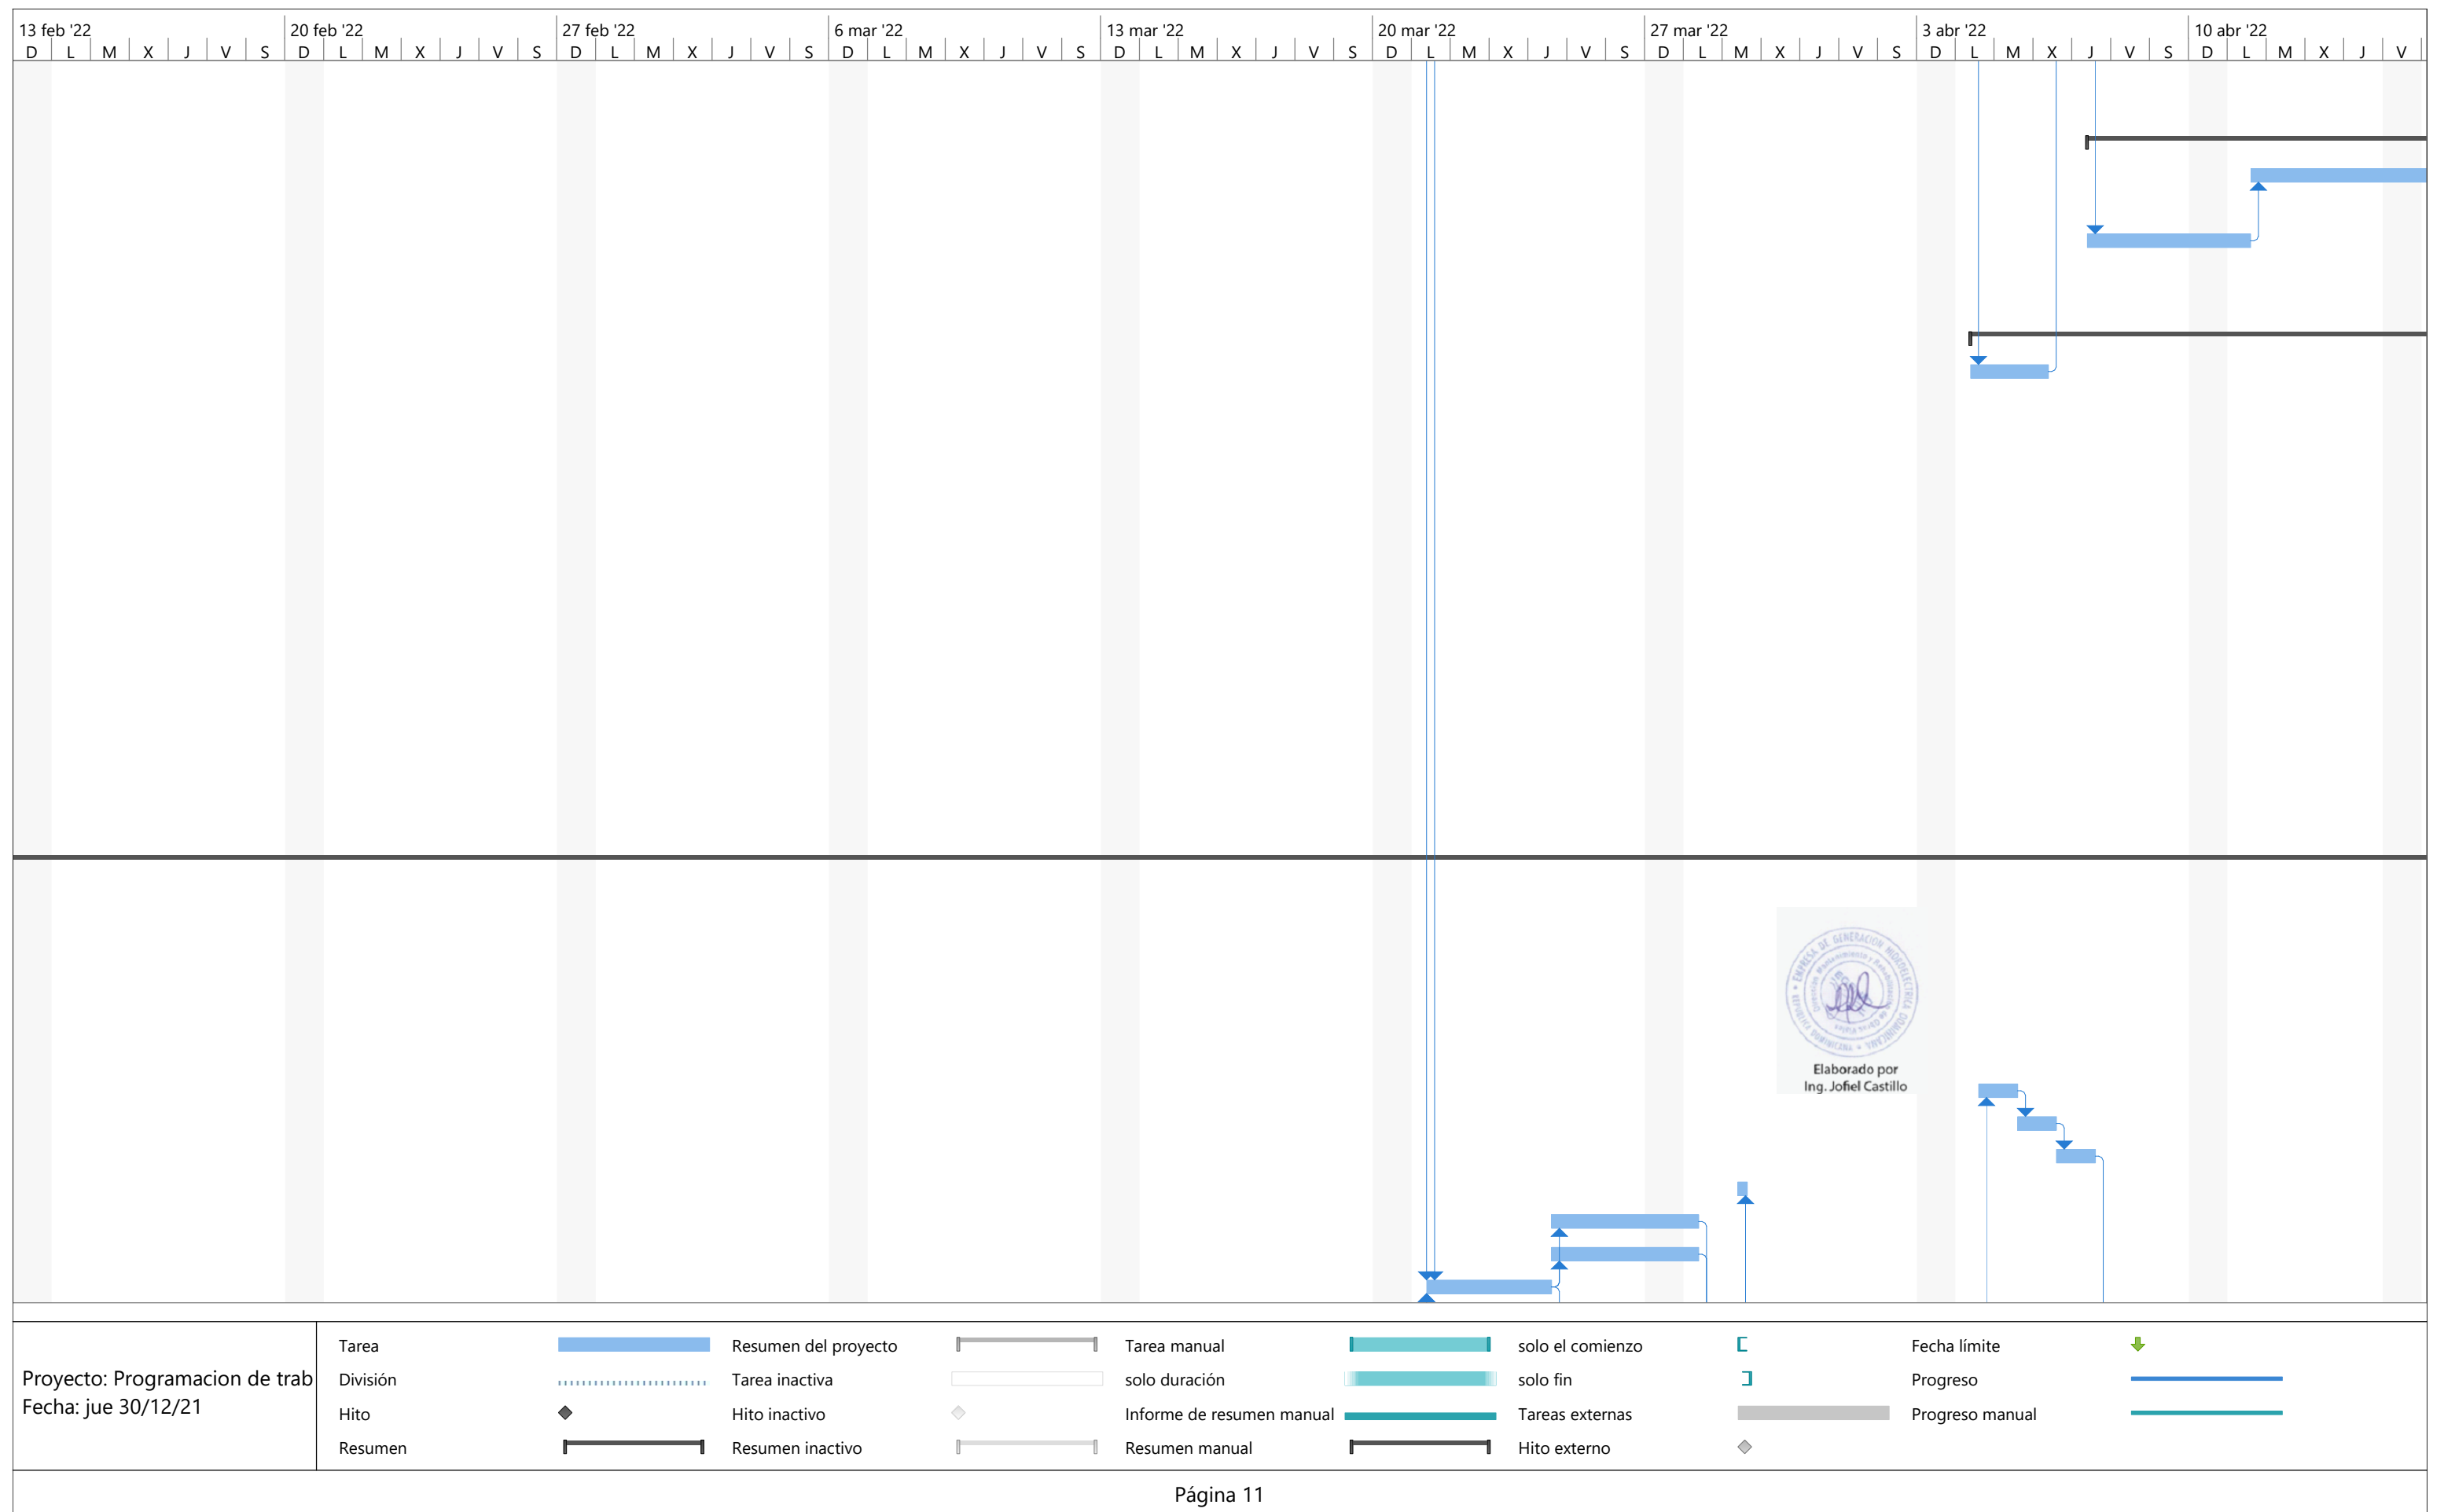


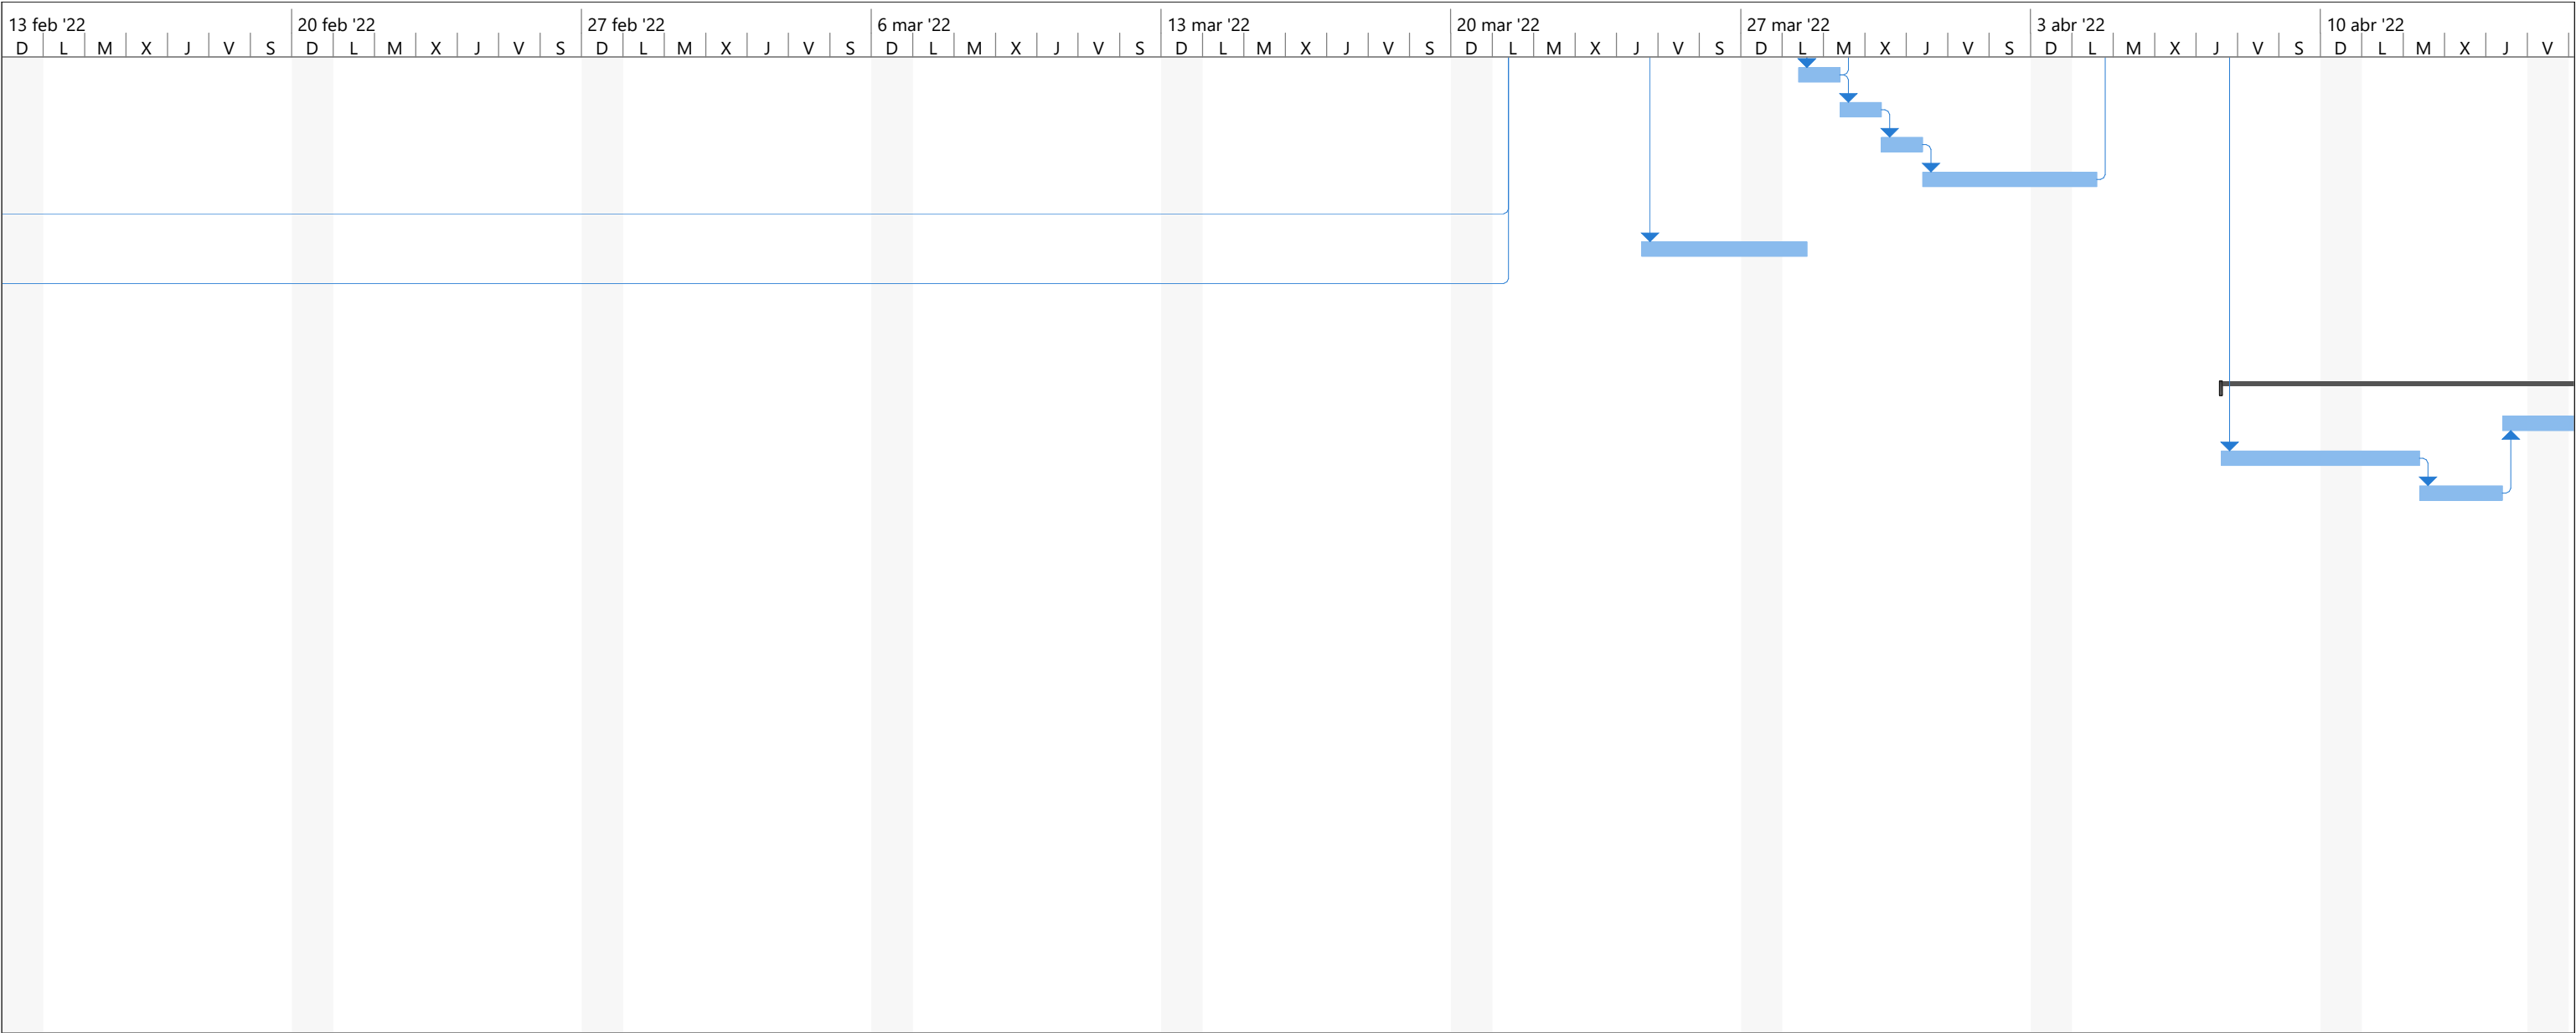


Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: Programacion de trab
Fecha: jue 30/12/21


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

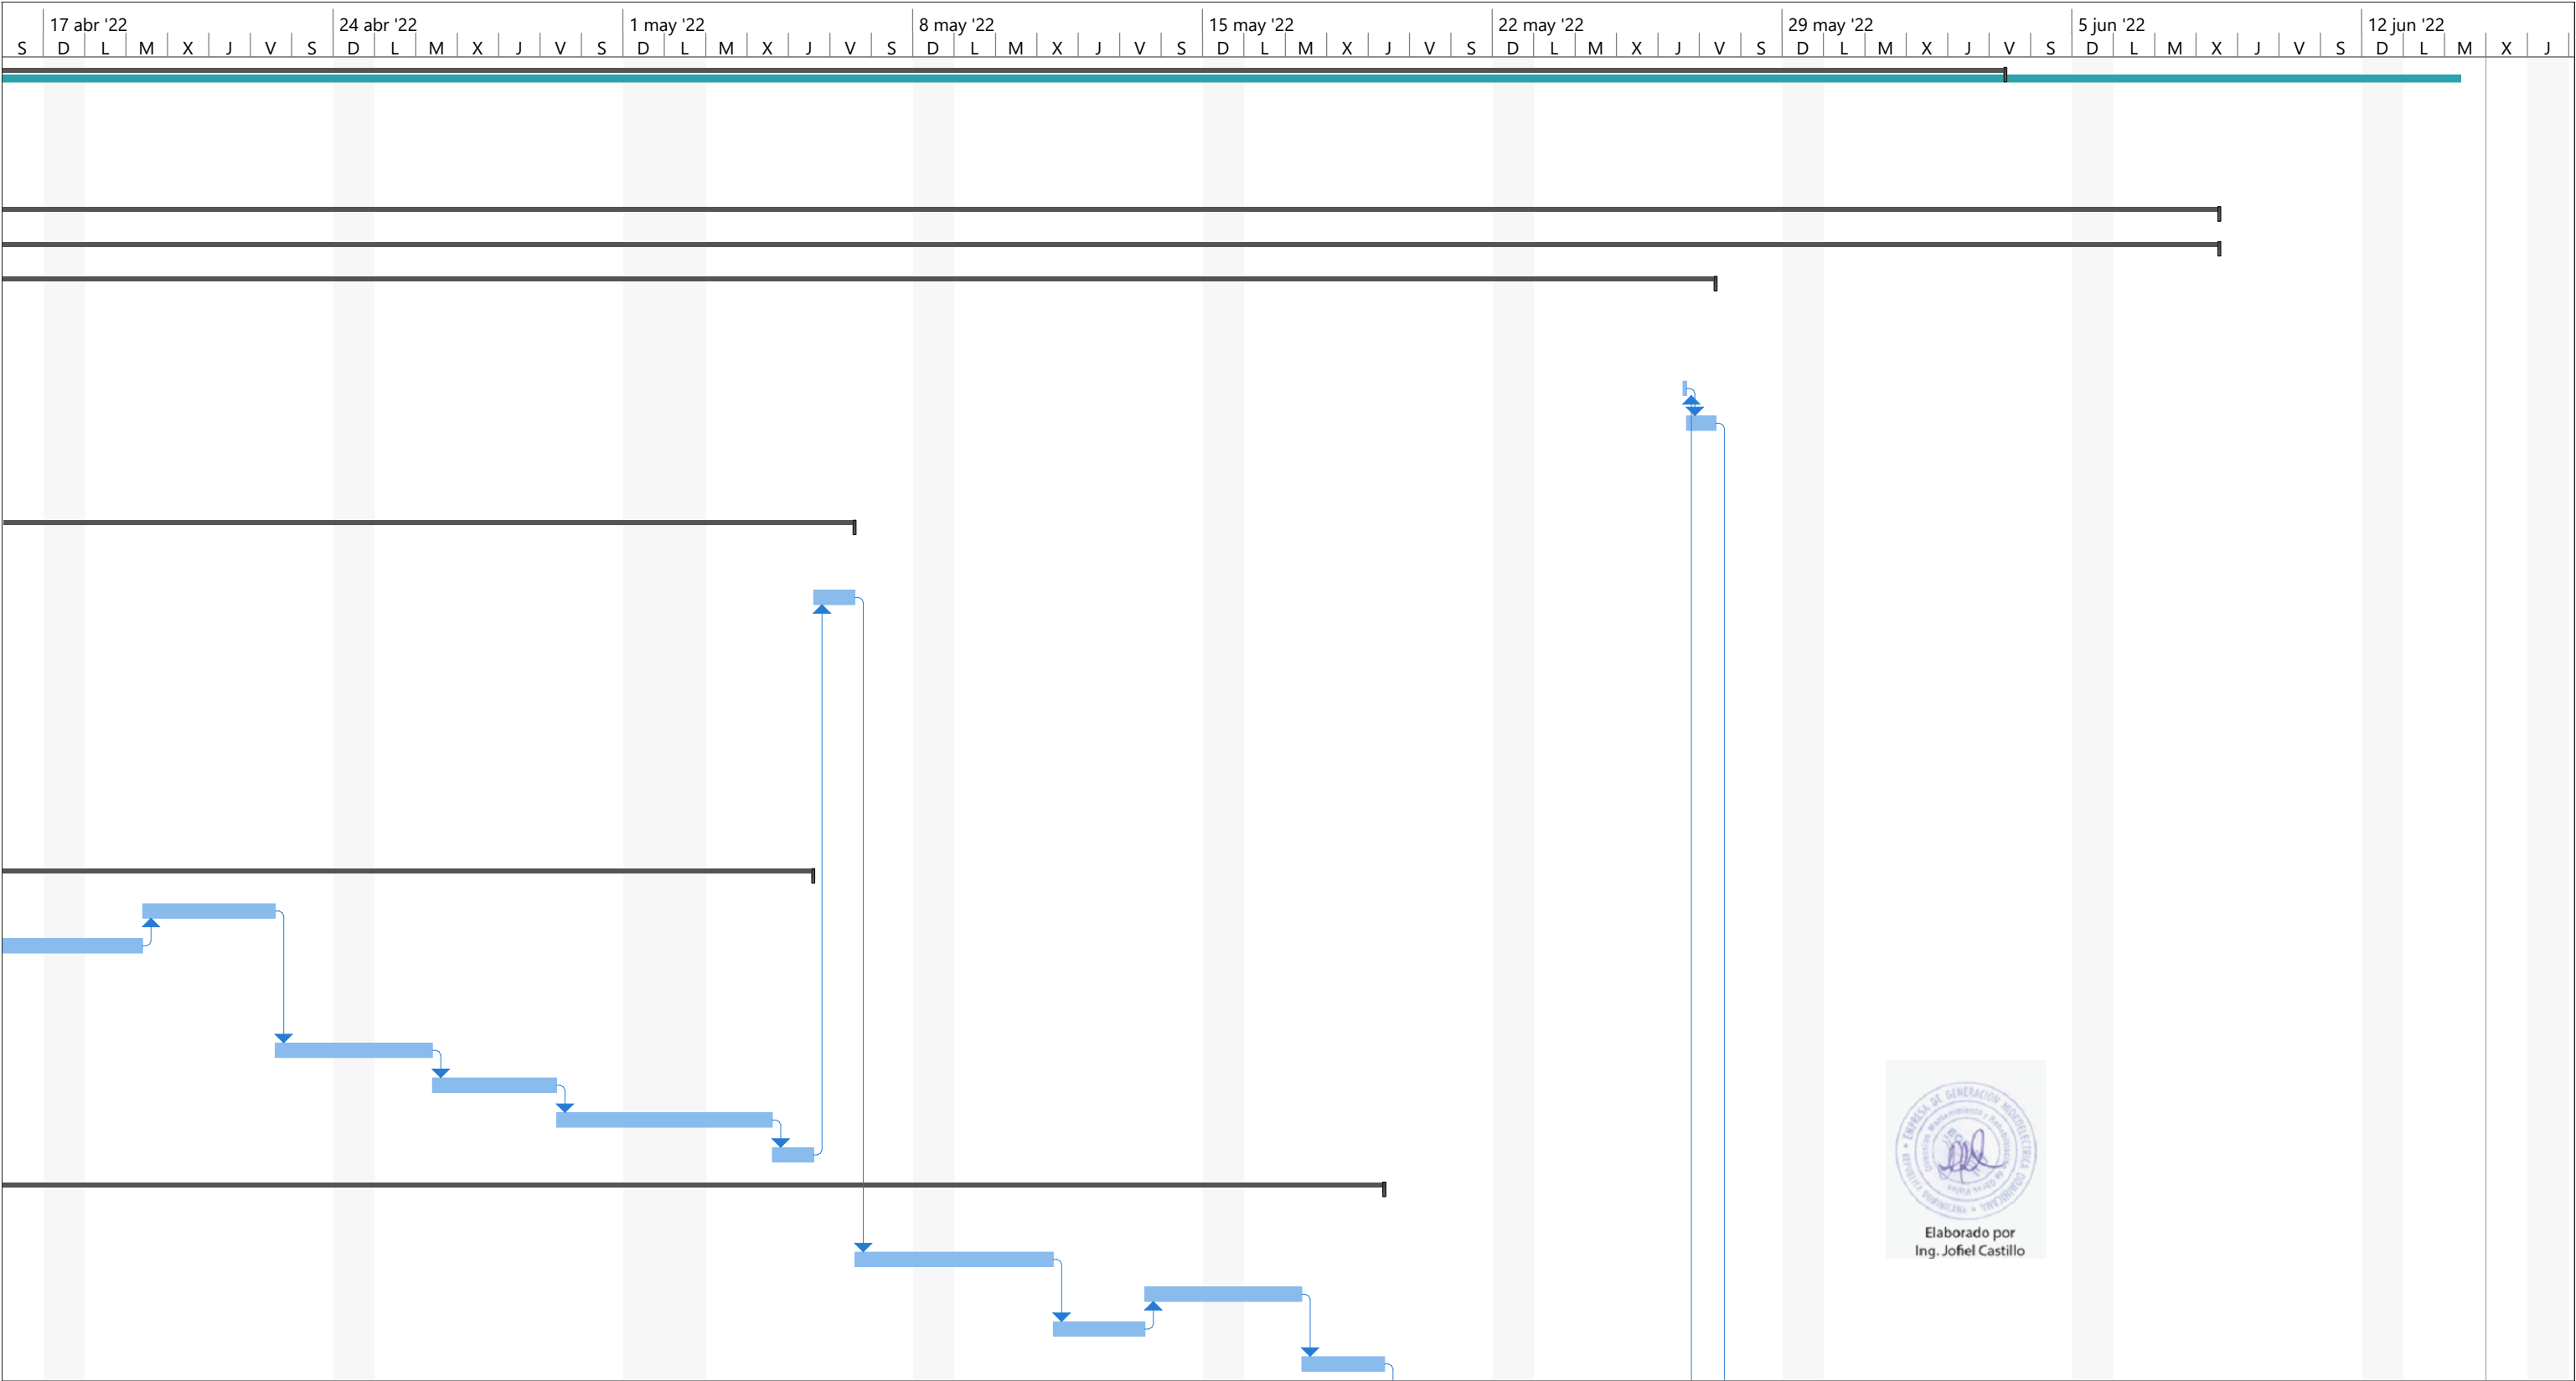


Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		solo fin		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		Tareas externas		Progreso			
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual			
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual							

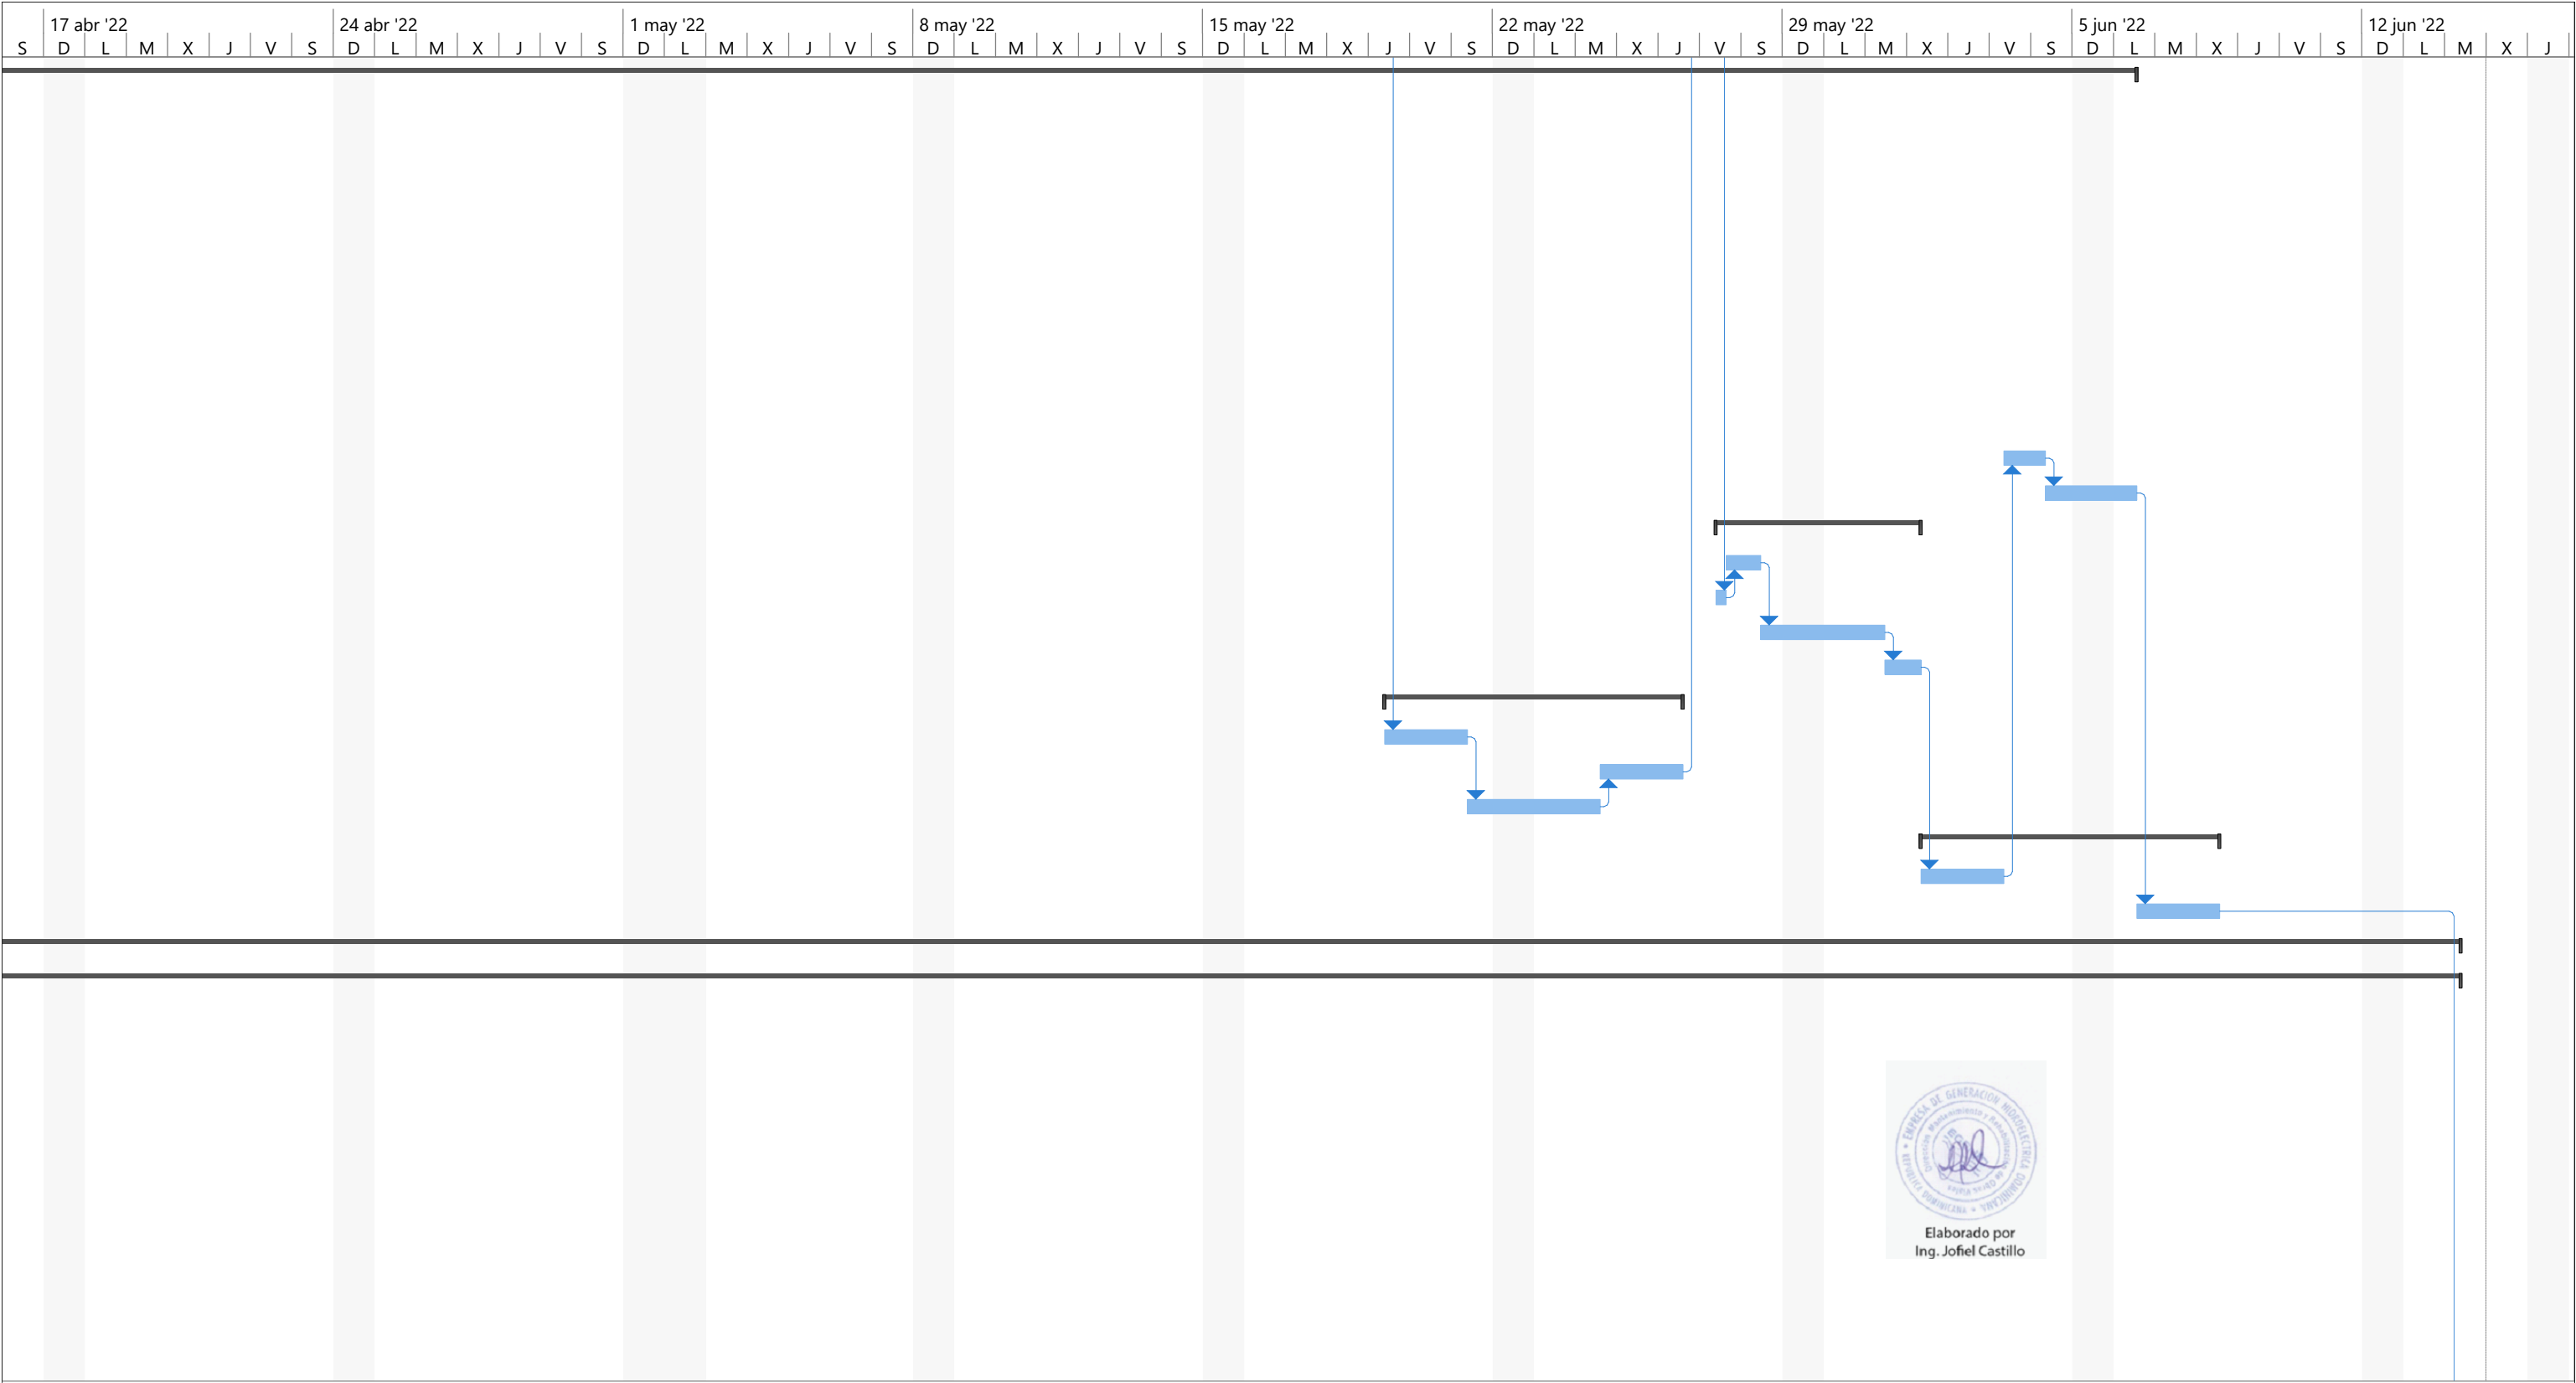

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

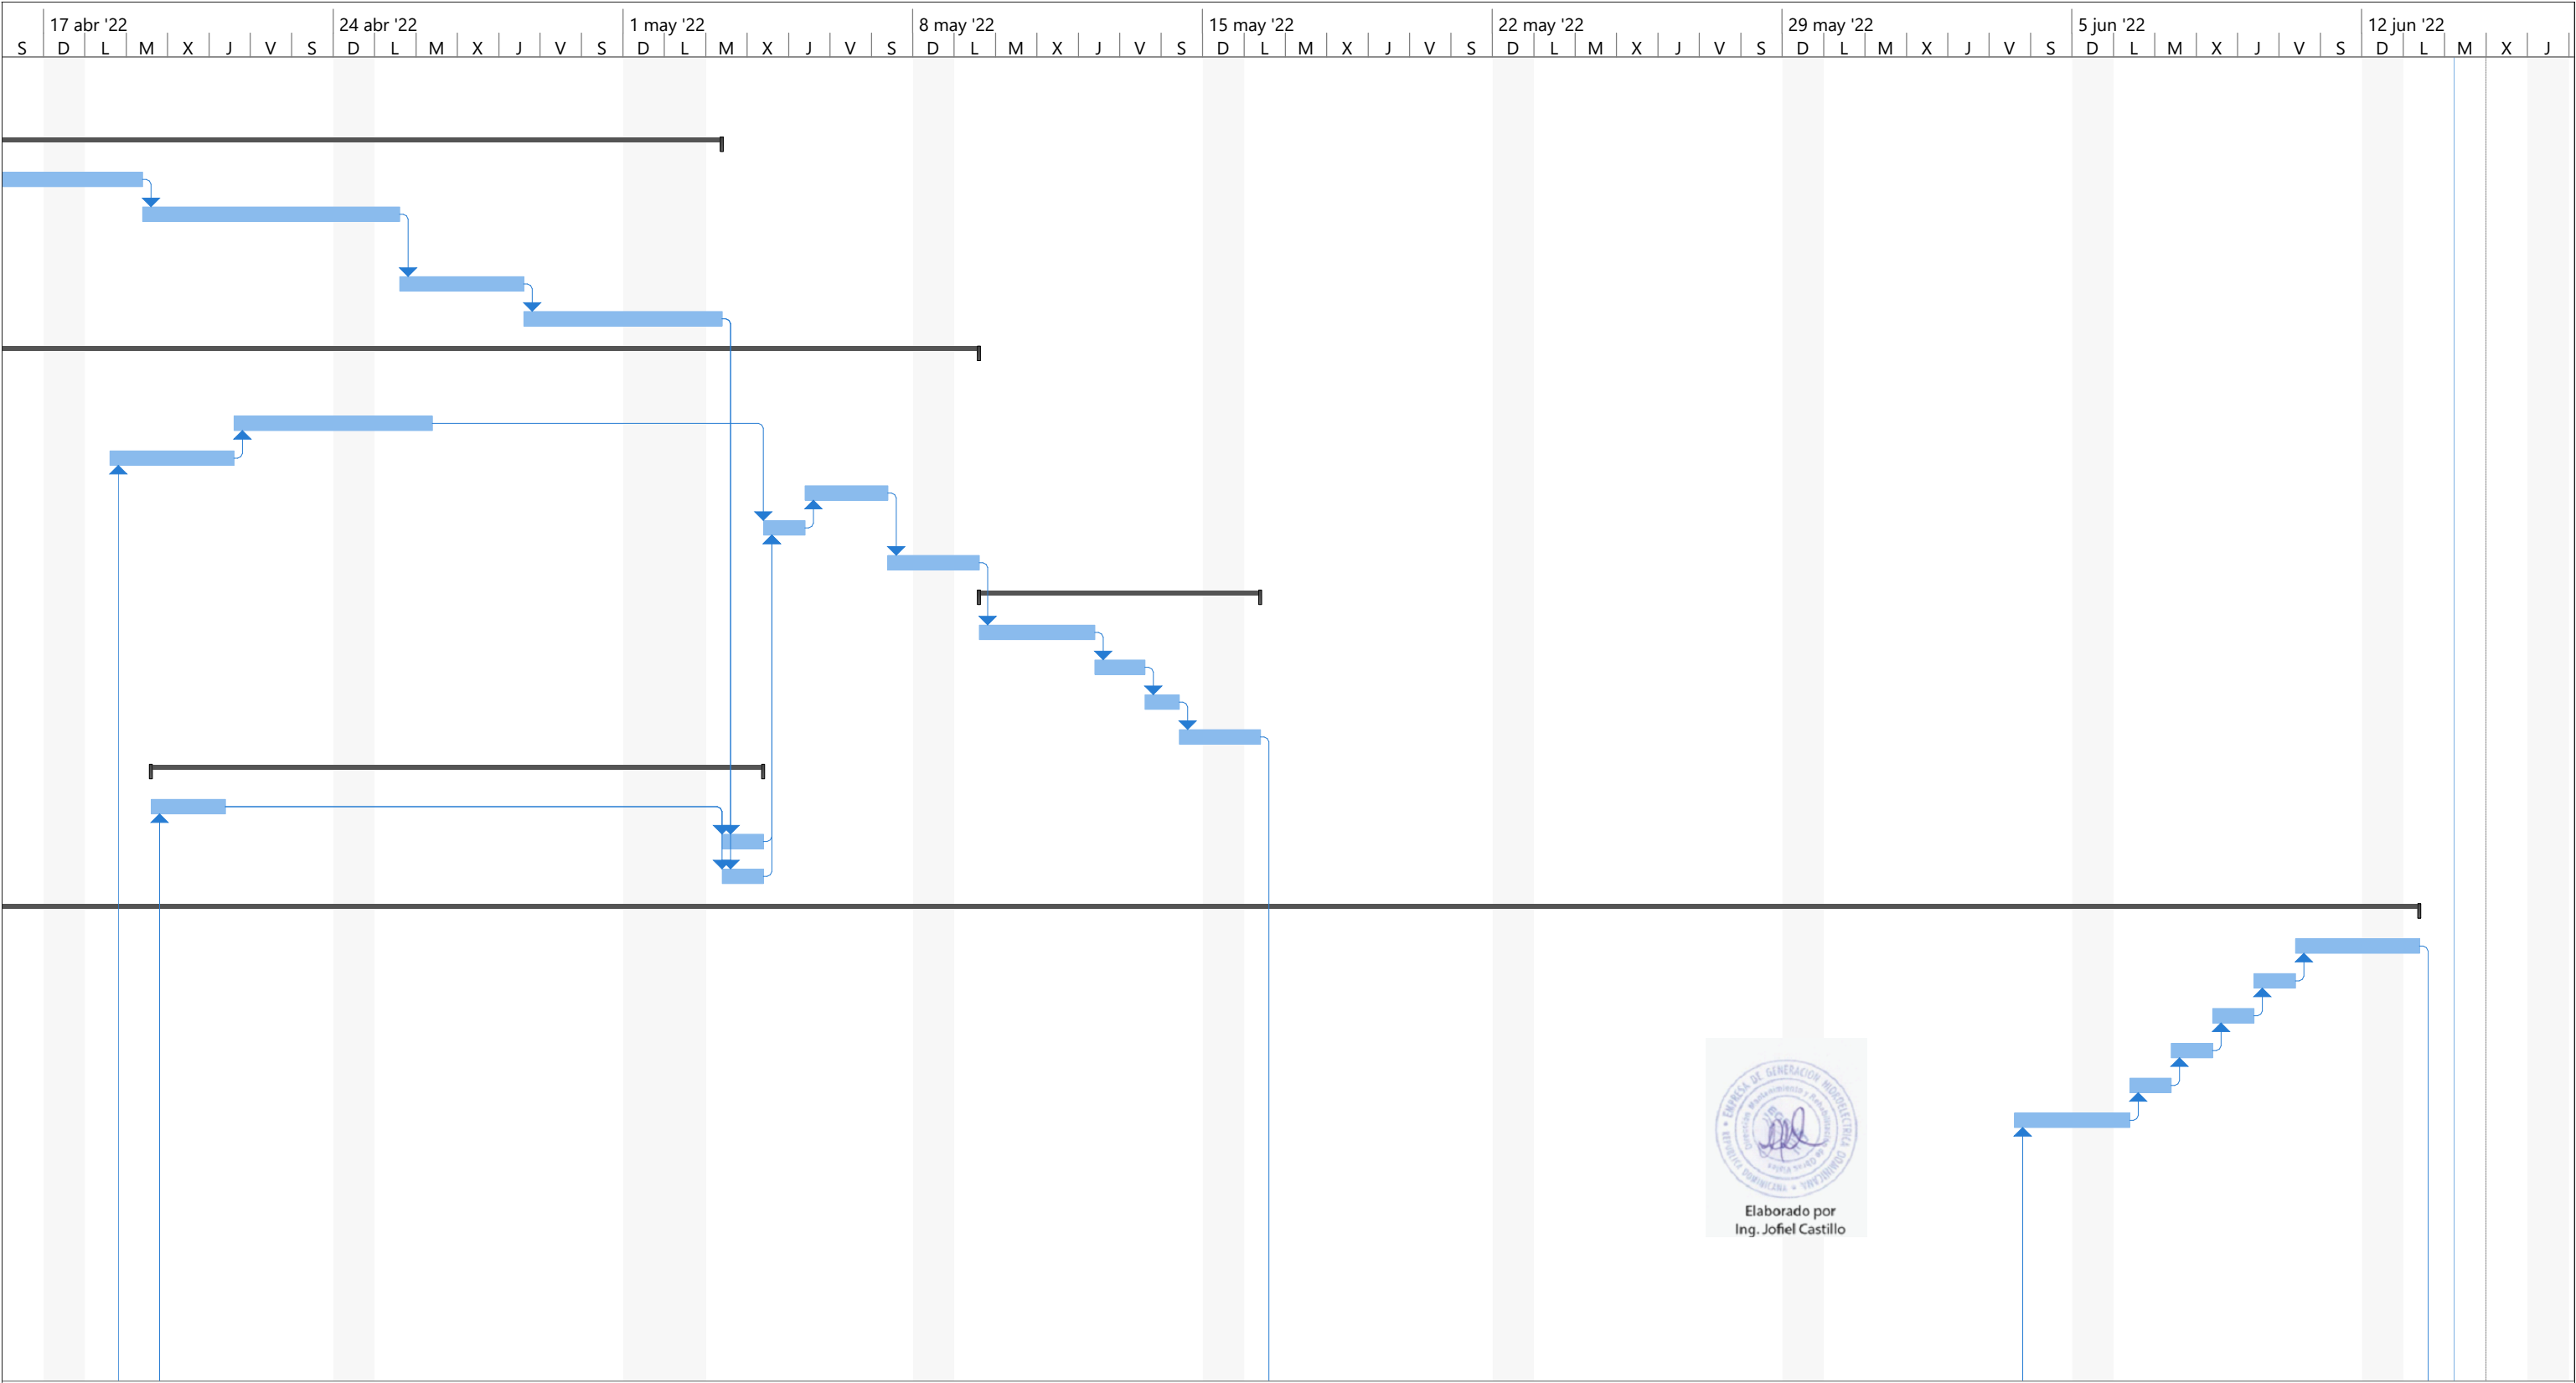

Proyecto: Programacion de trab Fecha: jue 30/12/21	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

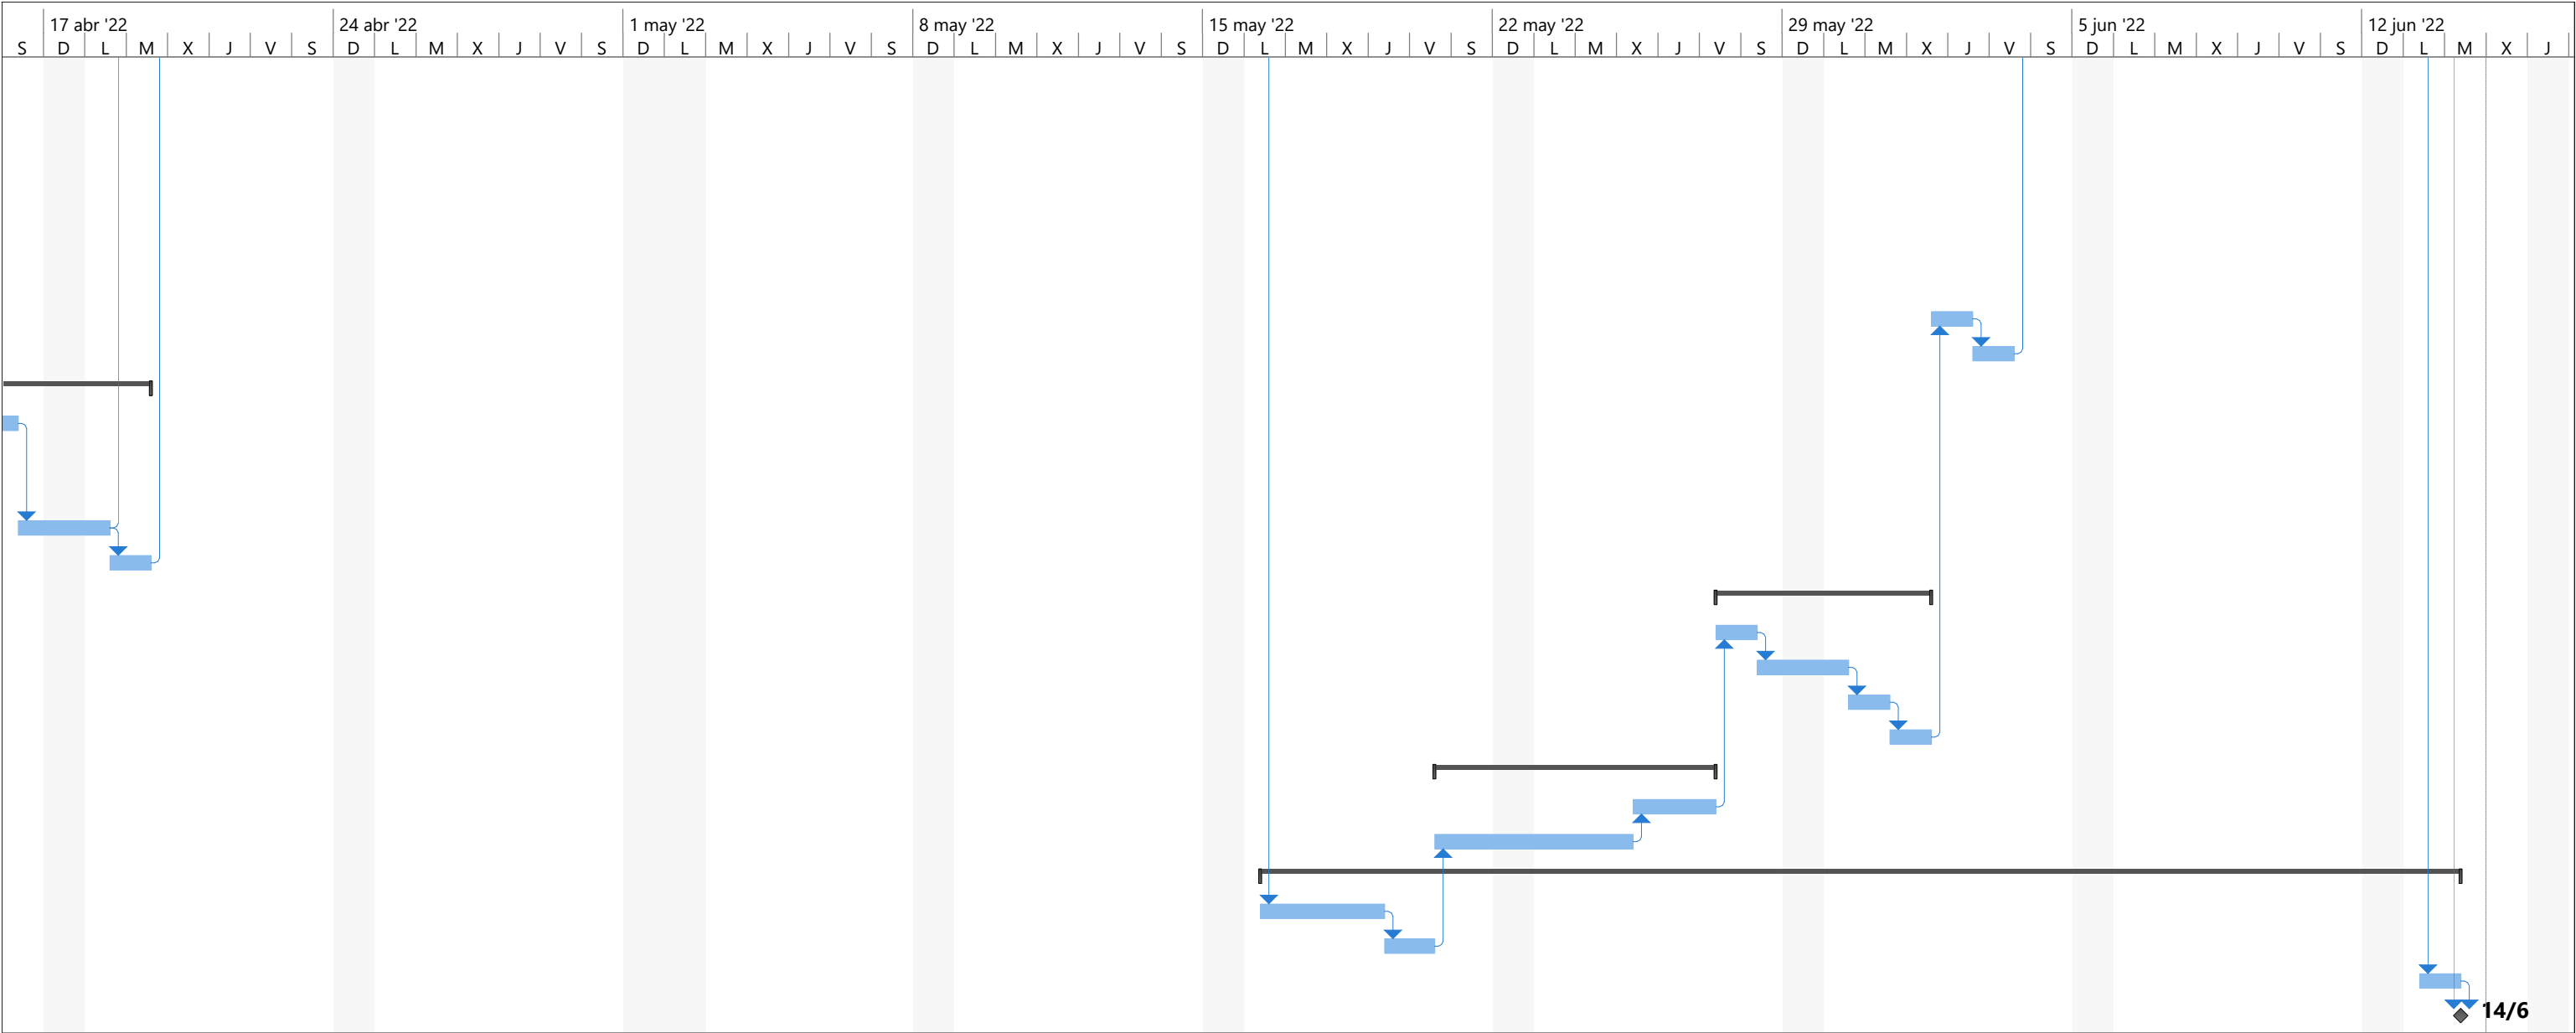

14/6




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: Programacion de trab
Fecha: jue 30/12/21

Tarea
División
Hito
Resumen




Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo



Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual



solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo



Fecha límite
Progreso
Progreso manual

