Id		Modo de tarea	Construccion funeraria Sabana del Puerto, Municipio Sabana del puerto, Provincia Monseñor Nouel	Duración	Comienzo	Fin
1			**CRONO-PARTIDAS FINALES PROYECTO**	**96 días**	**Lunes 8/09/25**	**Mierc. 10/12/25**
26						
27			**NOTA: ESTA PROGRAMACION ESTARA SUJETA SEGUN EL FLUJO DE LOS PAGO DE LAS CUBICACIONES**	96 días	Lunes 8/09/25	miercoles 14/12/25
28			**ACCESO A AUTOVIA**	**30 días**	**dom 08/09/25**	**ma8/10/2**
2			**1 ERA ETAPA**	20 días	mié 10/9/25	mar30/9/25
4			1a.-limpieza y desyerbo a mano	4 días	mié 13/9/25	lun 18/9/25
5			Puerta Vehicular de Acceso	3 días	jue 14/9/25	lun 18/8/25
10			**0.1-Topografia (visita no.01)**	1 día		mié 10/9/25
3			**A-Construccion Puente acceso vehicular**	15 días	11/10/25	26/10/25
6			2a. Suministro y Colocacion de Relleno para acceso vehicular	**20 días**	**27/10/25**	jue 17/11/25
7			**4a. Aceras estampadas(e=0.10cm)**	5 días	31/10/25	mier 5/11/25
9			3b.-Carpinteria	5 días	lun 3/11/25	sab 8/11/25
14			1b. Colocacion de Hormigon en Acera (e=0.10 cm)	3 días	jue 27/11/25	mar 30/11/25
16						
8			**B-OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**ma 2/11/25**	**lun17/11/25**
15			**2 DA ETAPA**	**20 días**	jue 6/11/25	lun 26/11/25
17			2b.-Contenes.	6 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25
18			**3b. Colocacion de Hormigon en Parqueos**	**8 días**	**mar 4/11/25**	**jue 13/2/25**
11			3b.-Carpinteria	10 días	vie 7/11/25	mié 19/11/25
12			4b.-Construccion de Zapata de Muro de Blocks de 6",acero de 3/8" a 0,60m Hormigon 210kg/cm(profundidad 0.60 cm aprox.)	15 días	mie 12/11/25	sab 29/11/25
13			**3 ERA ETAPA**	**17 días**	**lun 10/11/25**	sab 29/11/25
19			**C-VERJA PERIMETRAL**			
20			~~1c.-Construccion de Muro de Blocks de 6"~~ (SNP) Acero de 3/8" a 0,60m	~~15 días~~	~~vie 7/11/25~~	~~mar 25/11/25~~
21			2c.-Pañete de Muro	4 días	mar 18/11/25	sáb 22/11/25
22			3c.-Cantos	3 días	mie 26/11/25	sab 29/11/25
23			Puertas Peatonal de Vehicular	8 días	vie 28/11/25	sab 6/12/25
24			**Puertas Peatonal de Acceso**	**5 días**	**dom 1/6/26**	**vie 6/6/26**
25			**D-LIMPIEZA GENERAL(Entrega Proyecto)**	**6 días**	**dom 1/6/26**	**vie 6/6/26**

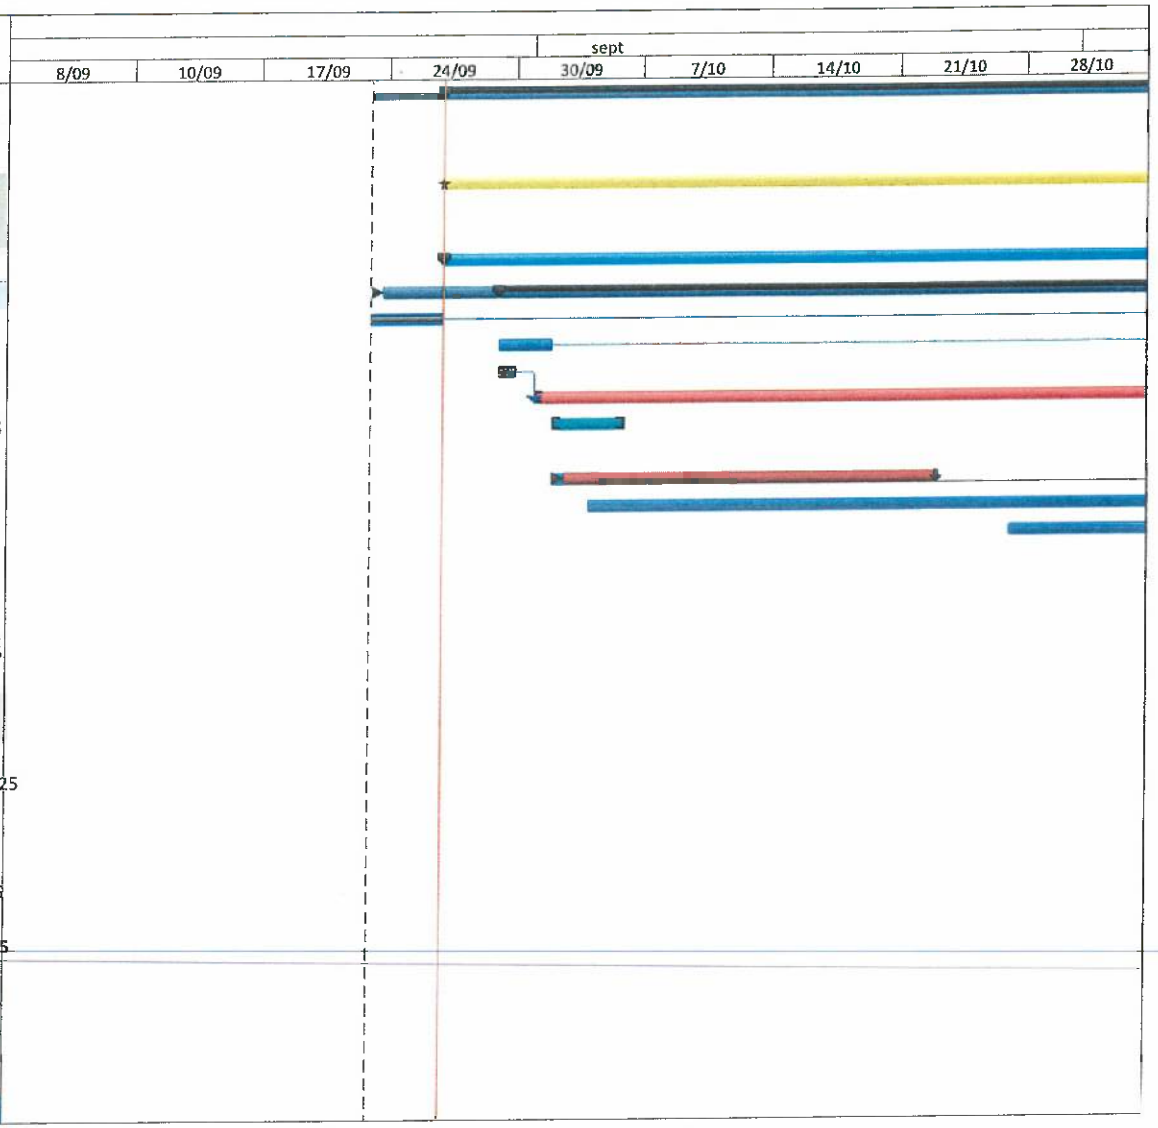

Project: CRONO-4 TERMINACION
Date: dom 06/06/2026

División crítica		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Tareas críticas	

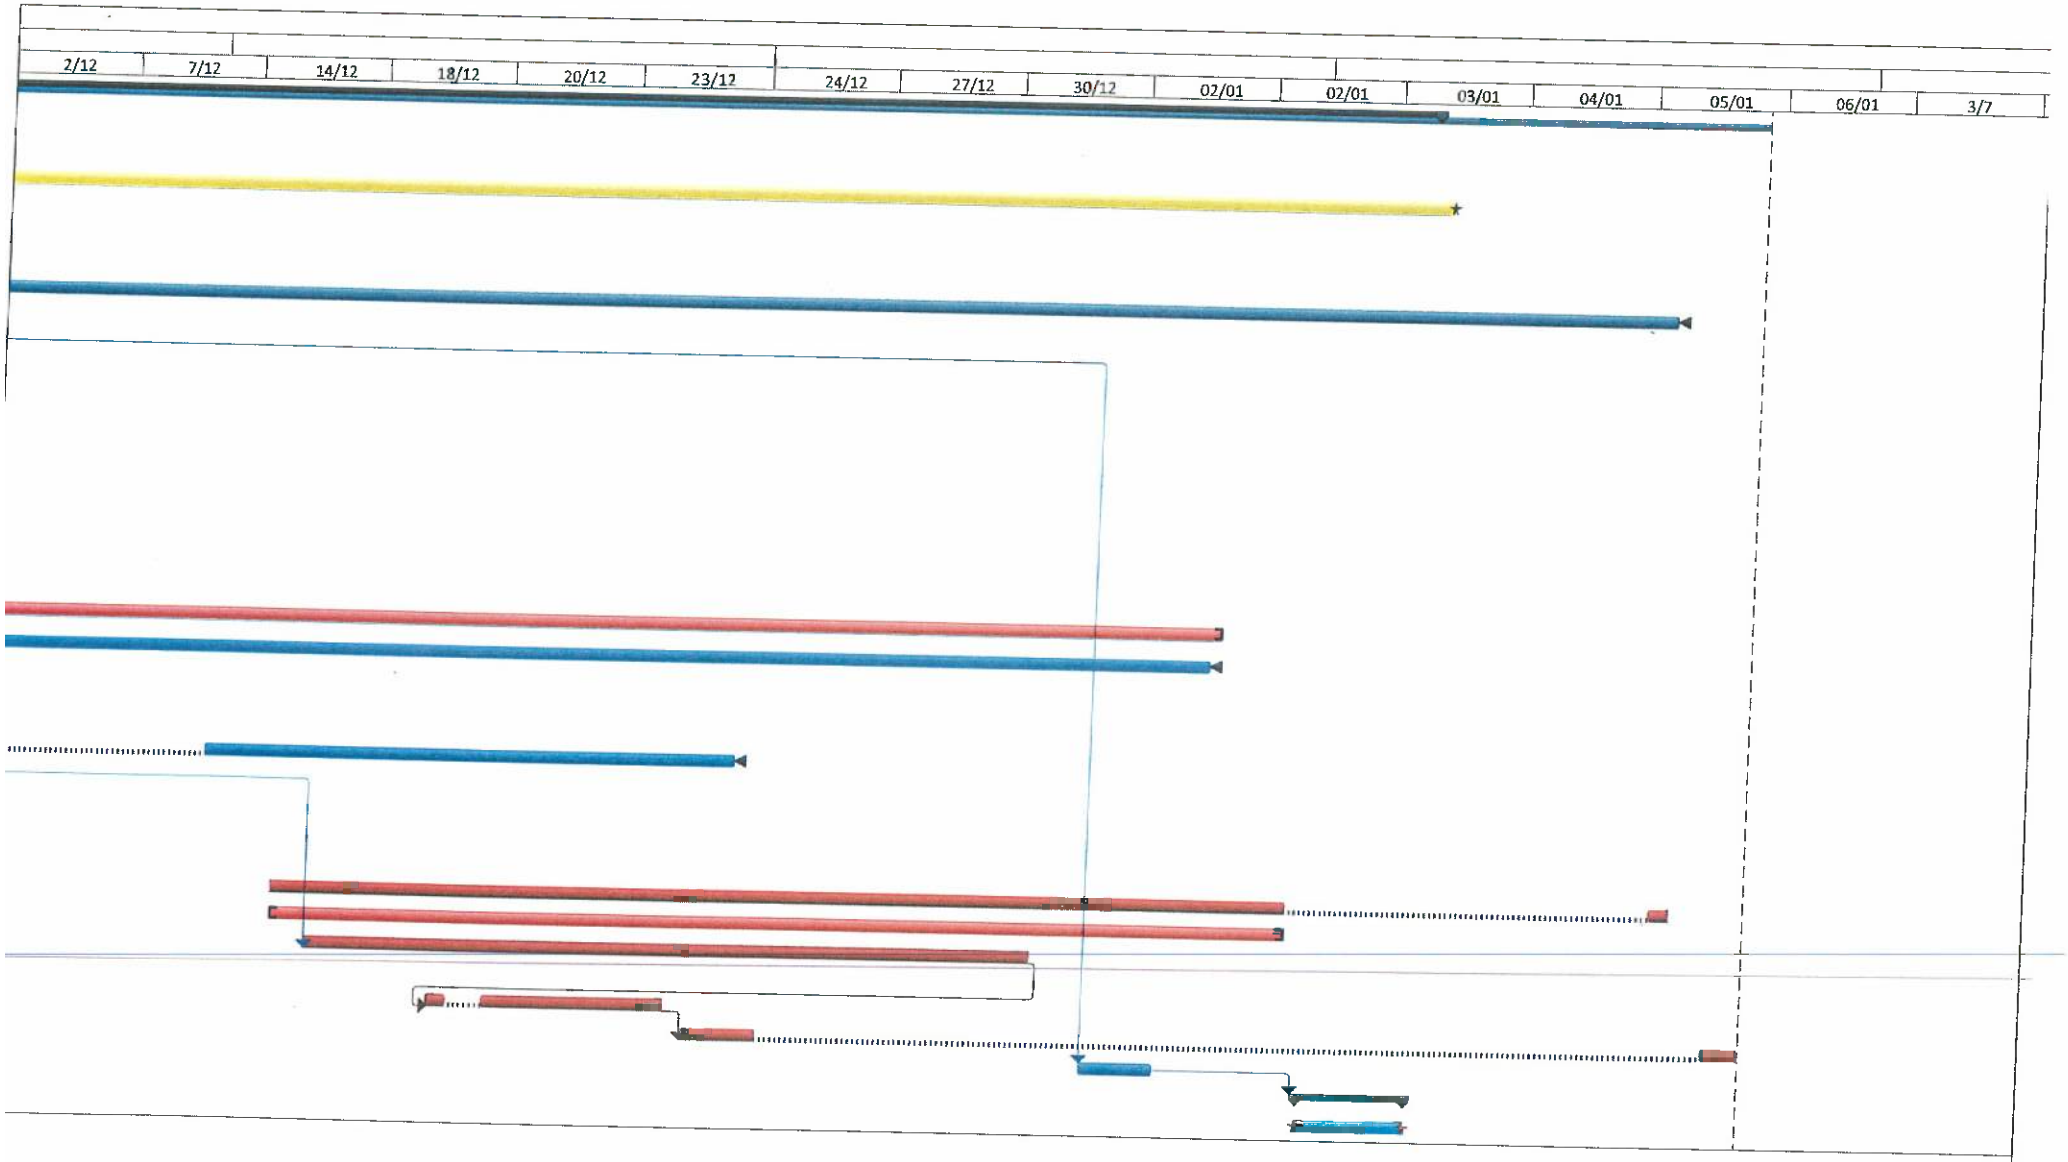

ject: CRONO-4 TERMINACION
e: dom 06/06/2026

División crítica		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Tareas críticas	
